



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO


Area Urbane - I Atto integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

14

Piano Economico-Finanziario Complessivo

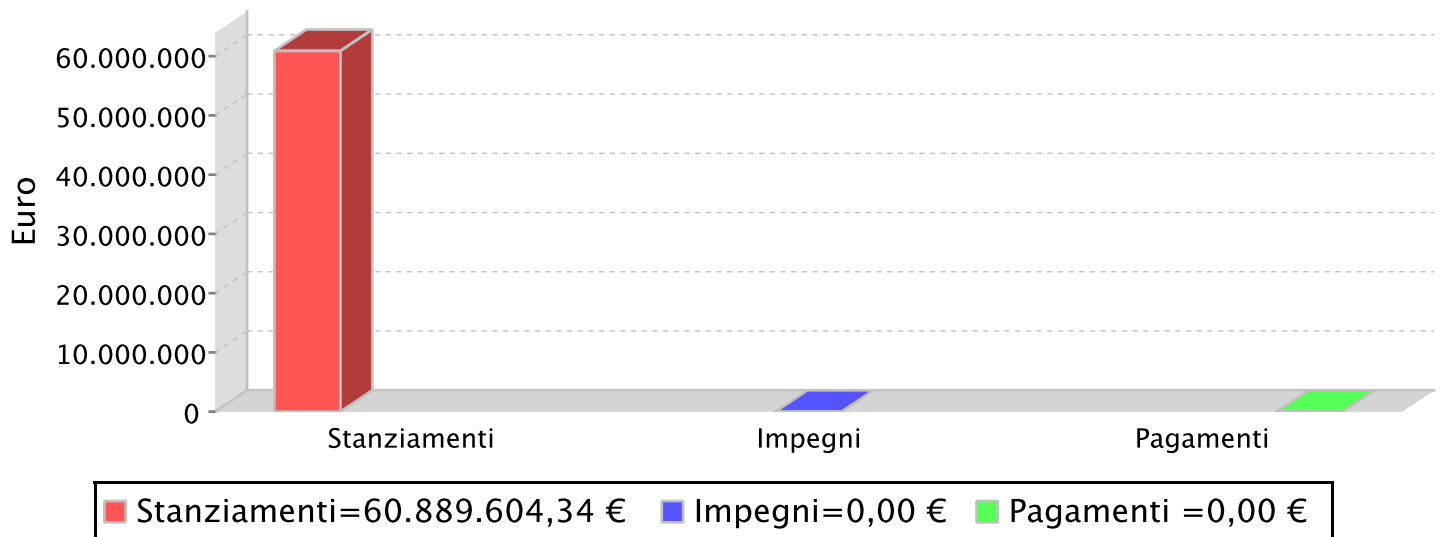


Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

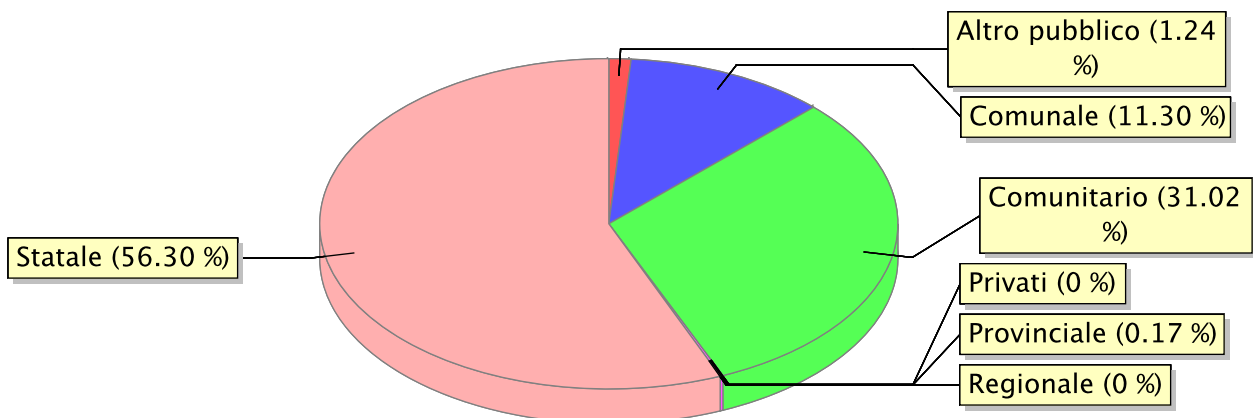

● Altro pubblico = 751.995,45	● Comunale = 6.877.895
● Comunitario = 18.883.426,71	● Privati = 0
● Provinciale = 100.000	
● Regionale = 0	● Statale = 34.276.287,18

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

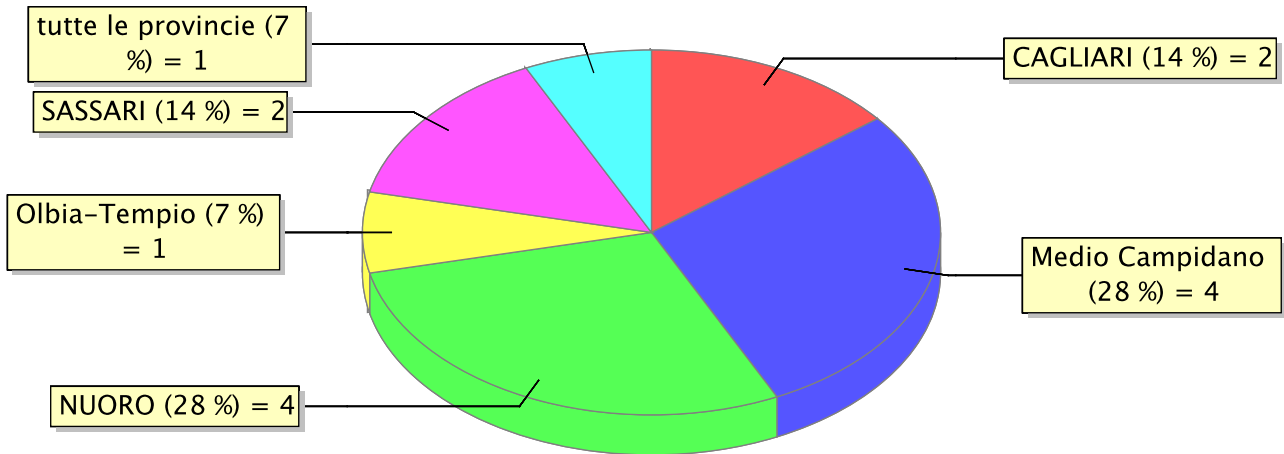

● CAGLIARI (14 %) = 2 ● Medio Campidano (28 %) = 4 ● NUORO (28 %) = 4
● Olbia-Tempio (7 %) = 1 ● SASSARI (14 %) = 2 ● tutte le provincie (7 %) = 1

Report del progetto: polis 1 - NUORO_Percorso della scultura

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

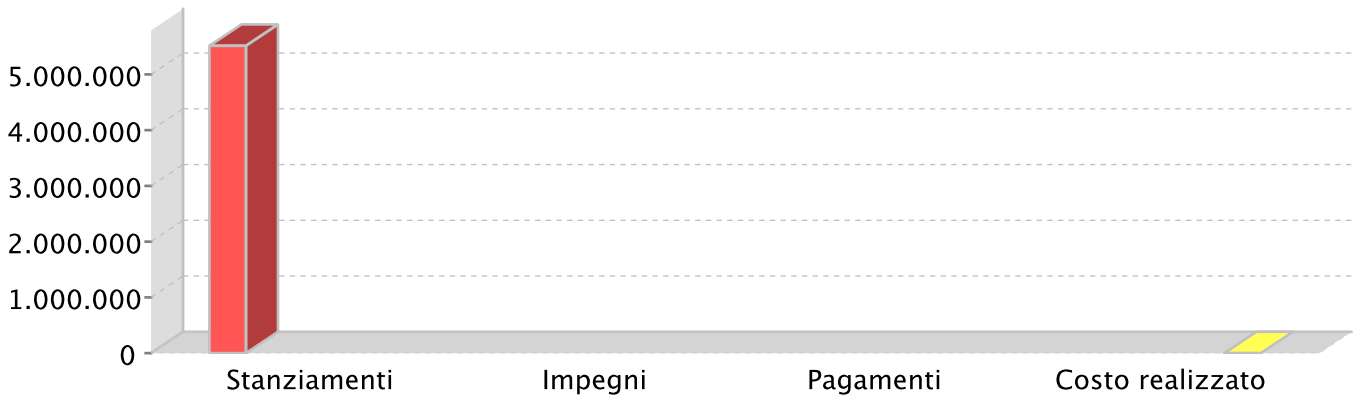

■ Stanziamenti=5.513.756,01 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 2 - NUORO_Percorso dell'artigianato e del folklore

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Anntonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

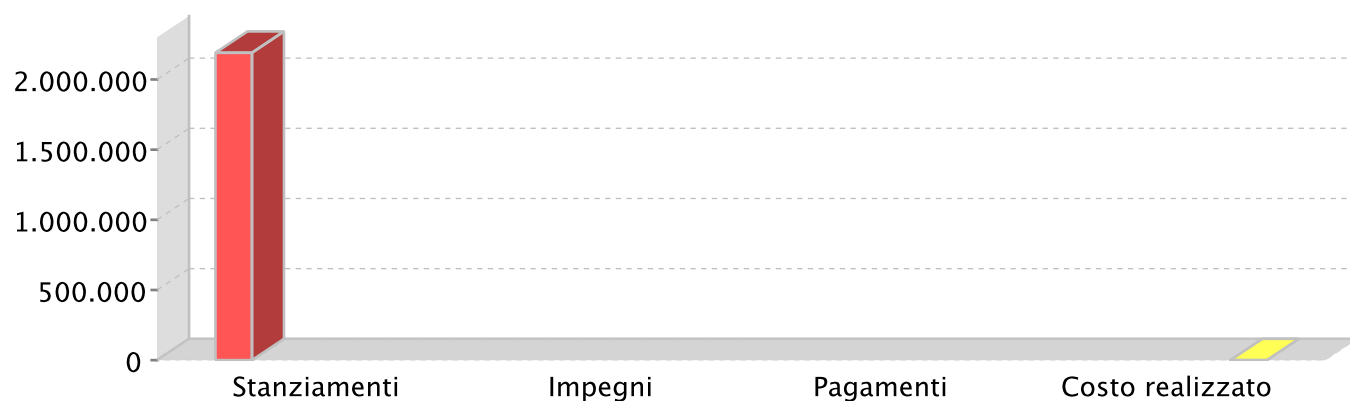

■ Stanziamenti=2.190.474,10 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 3 - NUORO_Percorso della letteratura

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

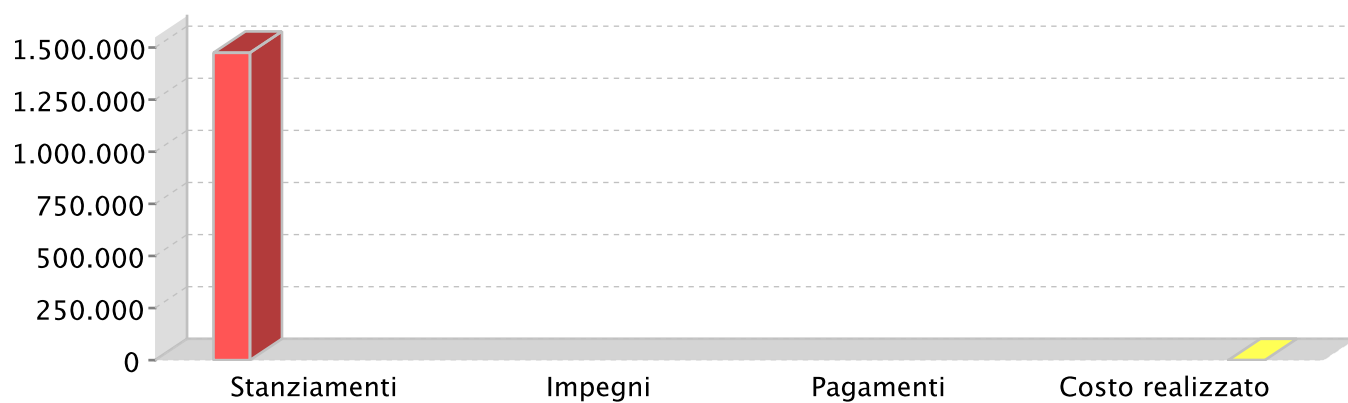

■ Stanziamenti=1.474.851,81 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 4 - NUORO_Percorso di pregio paesaggistico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Gaddeo - Geom. Salvatore Floris

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

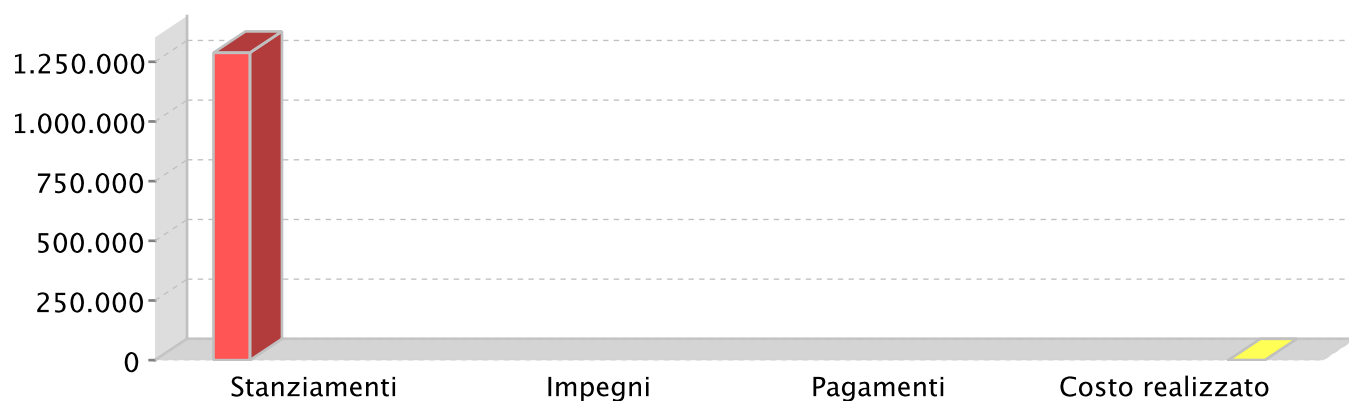

■ Stanziamenti=1.287.808,08 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 5 - OLBIA_Progetto Urban Center, qualita dei servizi, tempi della citta

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

Comune di Olbia (SS)

Responsabile dell'intervento


Dott. Giovanni Achenza

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

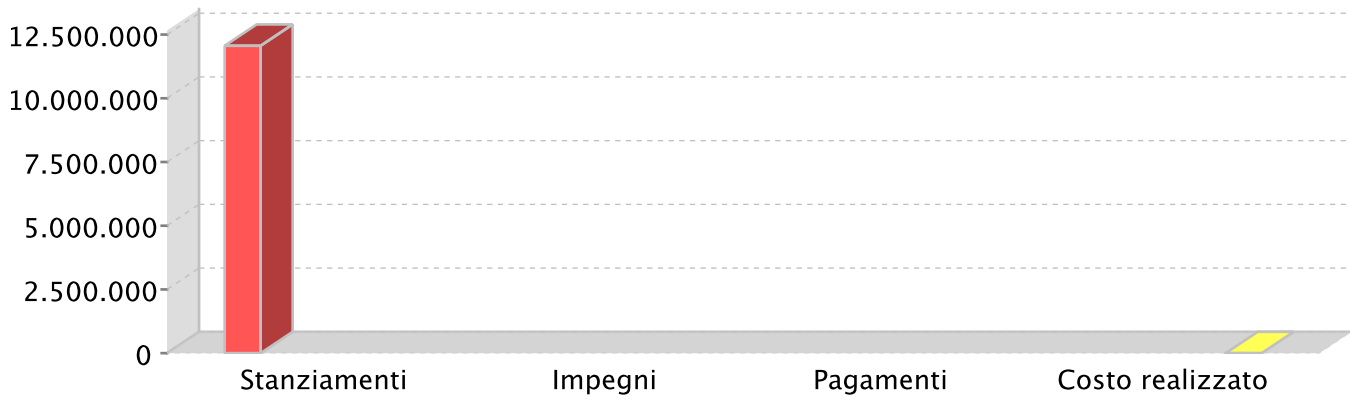

■ Stanziamenti=12.061.045,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €

■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 6 - SASSARI_Restauro conservativo e recupero funzionale dell'Ex-Mattatoio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Claudio Castagna - Ing. Salvatorica Sanna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

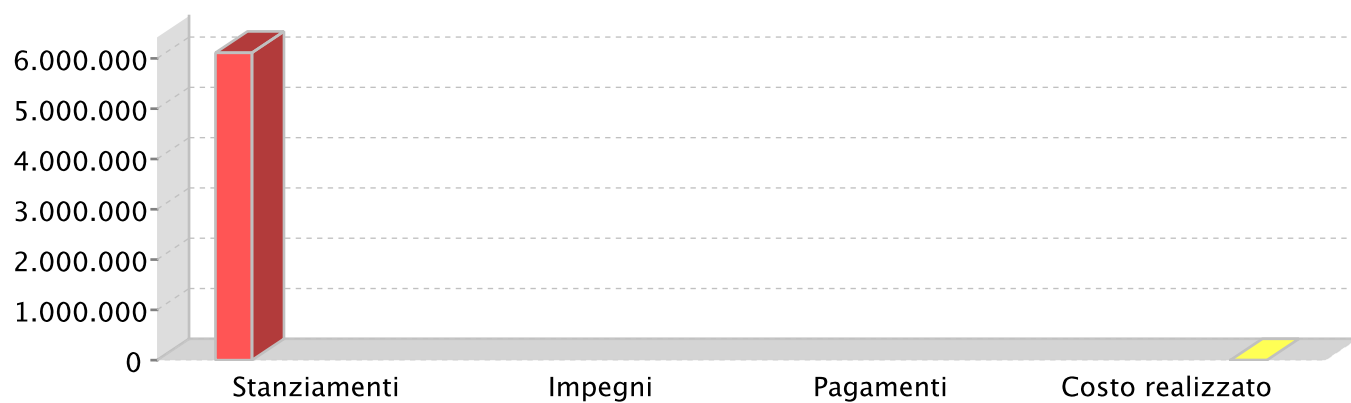

■ Stanziamenti=6.112.318,23 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 7 - SASSARI_Parcheggio interrato nell'area adiacente all'ex Mattatoio e Area Verde attrezzata

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Claudio Castagna - Ing. Salvatorica Sanna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

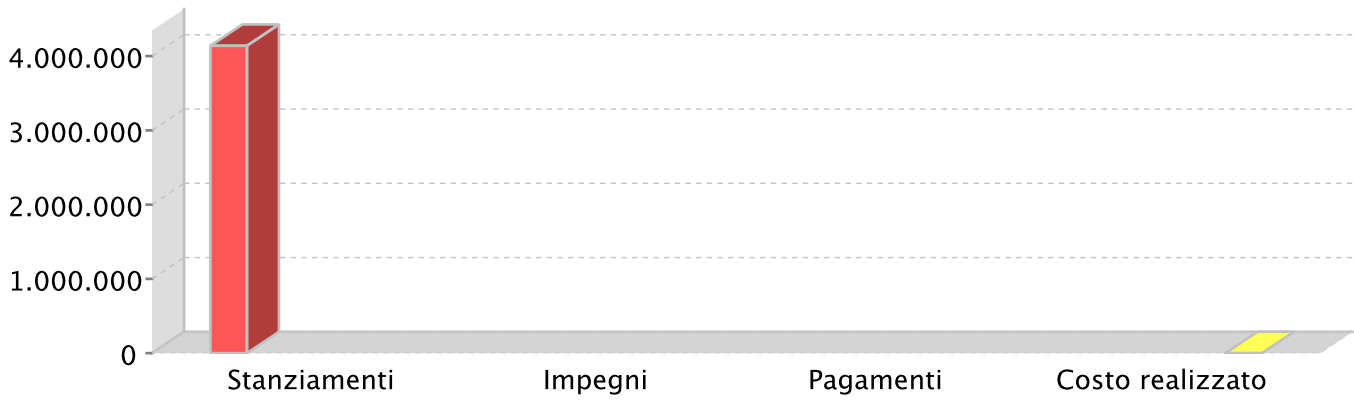

■ Stanziamenti=4.139.185,84 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 8 - SELARGIUS_Campus della Scienza della Tecnica e dell'Ambiente

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Selargius

Soggetto Attuatore

Comune di Selargius (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Massimiliano Schirru

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

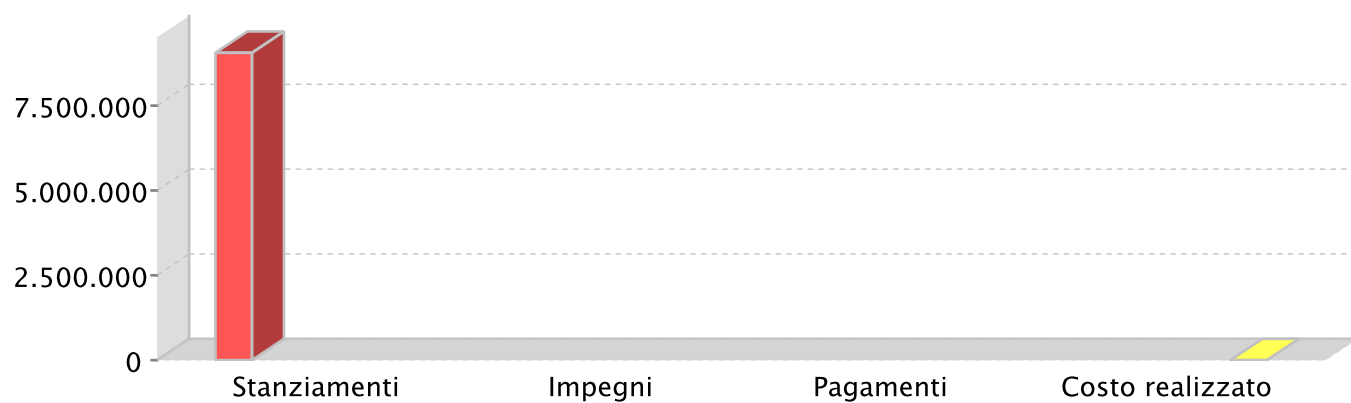

■ Stanziamenti=9.058.485,50 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 9 - SELARGIUS_Sistemazione spazi esterni del Campus

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Selargius

Soggetto Attuatore

Comune di Selargius (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Massimiliano Schirru

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

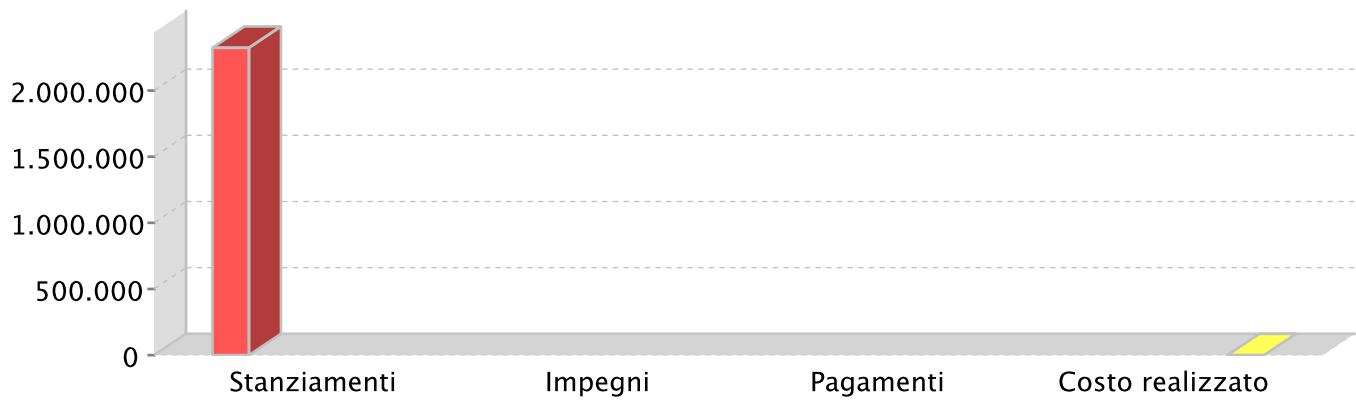

■ Stanziamenti=2.323.404,50 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 10 - SANLURI_Itinerario storico della citta-museo giudicale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Sanluri

Soggetto Attuatore

Comune di Sanluri (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Ignazio Pittiu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

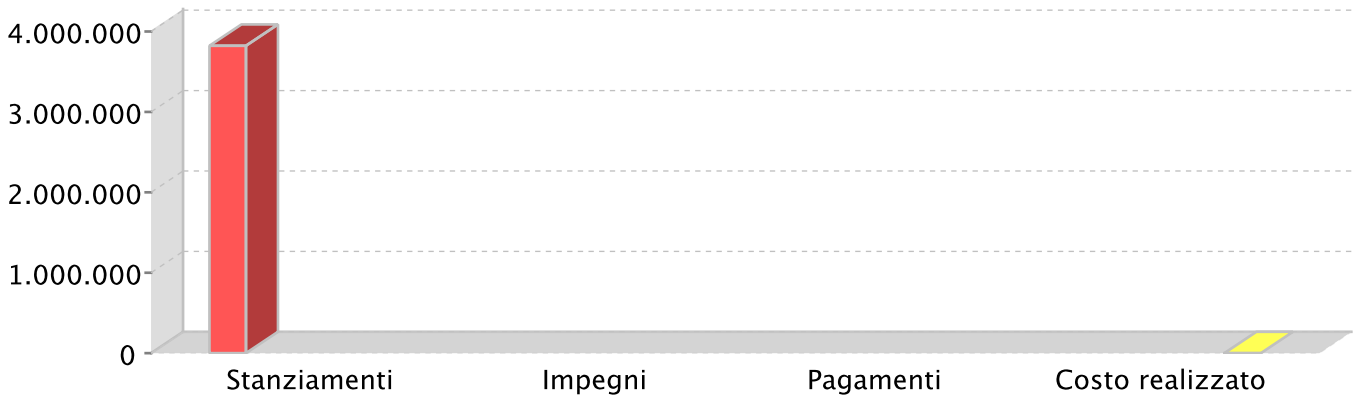

■ Stanziamenti=3.822.863,33 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 11 - SANLURI_Polo culturale integrato e dell'alta formazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Sanluri

Soggetto Attuatore

Comune di Sanluri (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Ignazio Pittiu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

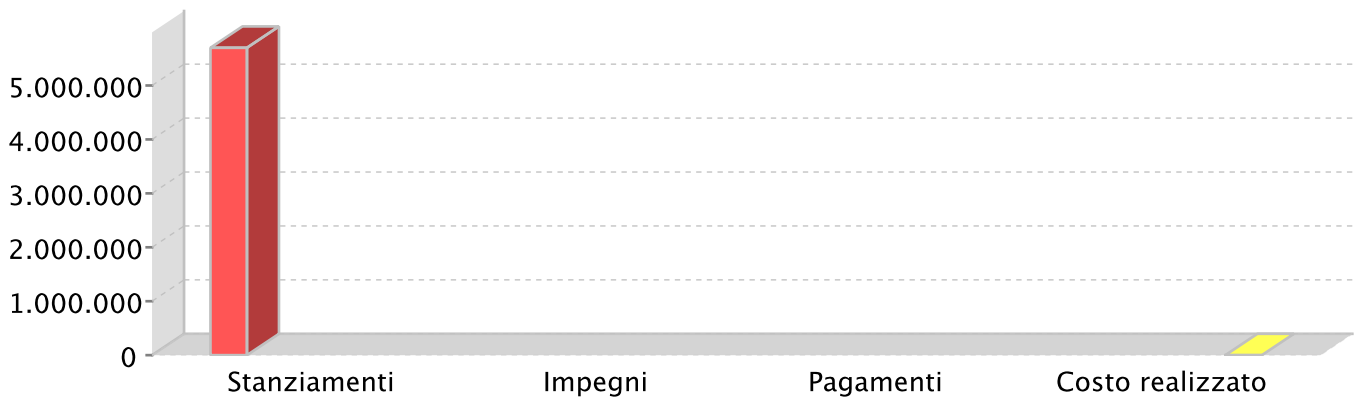

■ Stanziamenti=5.700.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 12 - VILLACIDRO_Rifunzionalizzazione del complesso dell'ex distilleria Murgia da destinare a Centro studi e

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Villacidro

Soggetto Attuatore

COMUNE DI VILLACIDRO (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Severino Porcedda

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

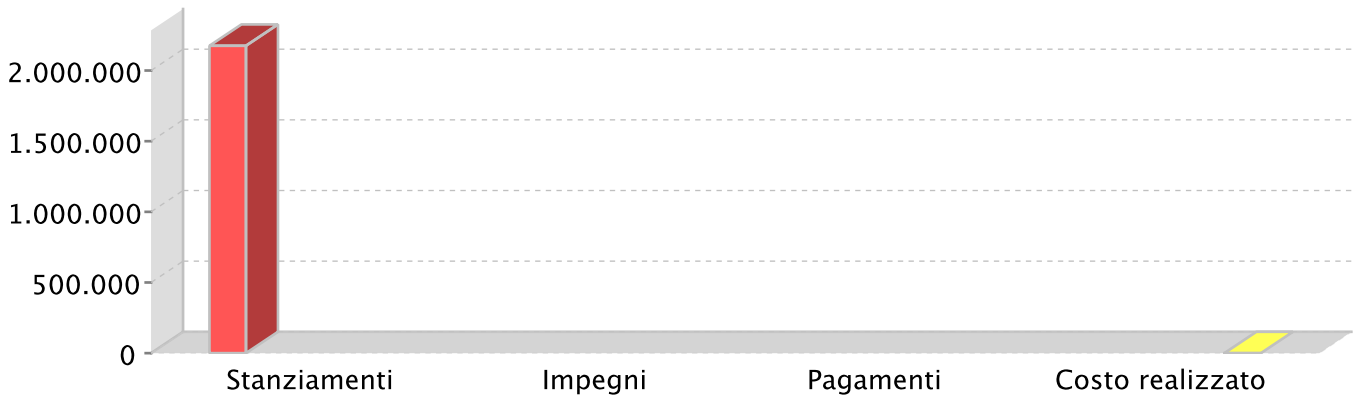

■ Stanziamenti=2.175.399,04 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: polis 13 - VILLACIDRO_Completamento degli itinerari culturali e storici villacidresi e sistema multimediale di

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Villacidro

Soggetto Attuatore

COMUNE DI VILLACIDRO (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Severino Porcedda

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

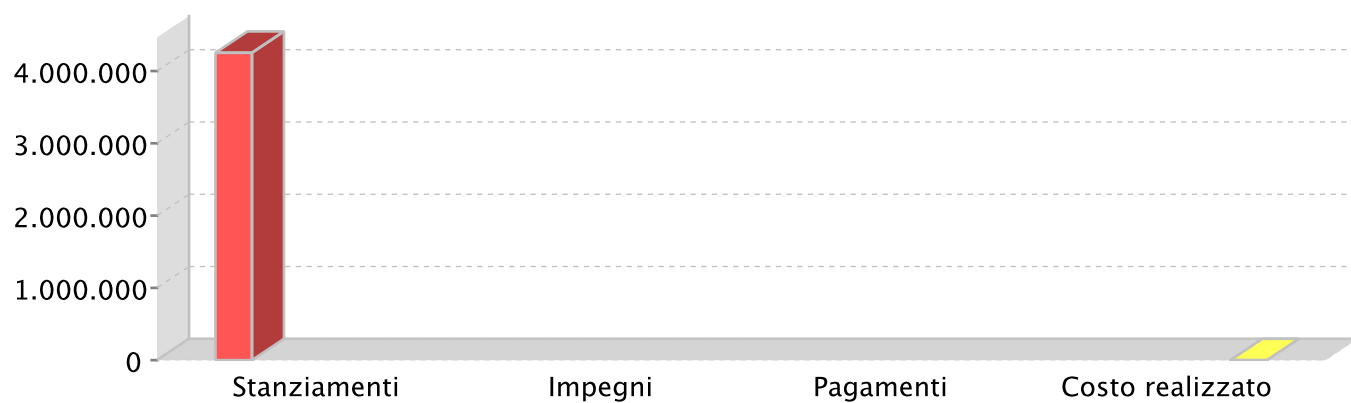

■ Stanziamenti=4.253.108,38 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_11 - Piani strategici di reti di piccoli comuni

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

DA DEFINIRE


Responsabile dell'intervento

Comune capofila della rete

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

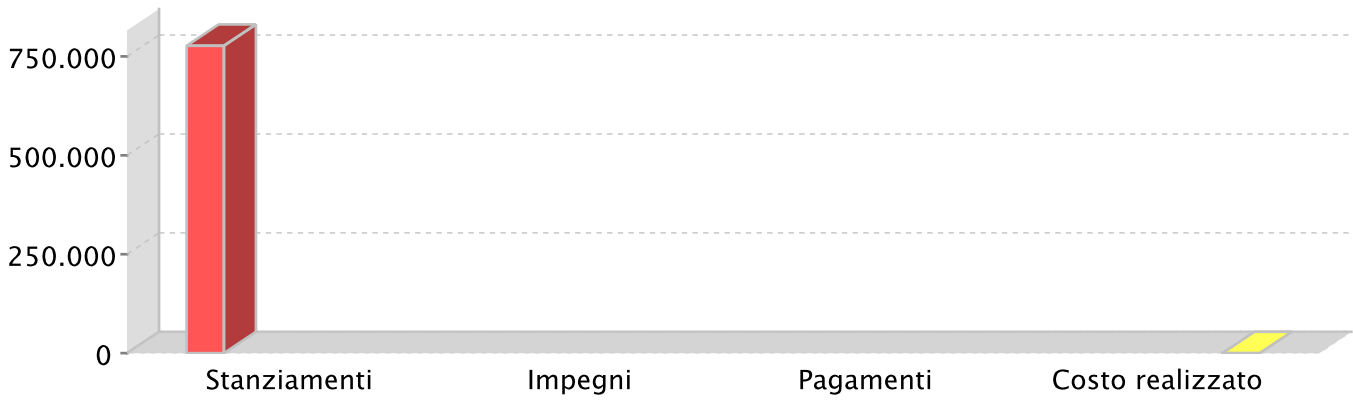

■ Stanziamenti=776.904,52 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
