



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Beni culturali

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

31

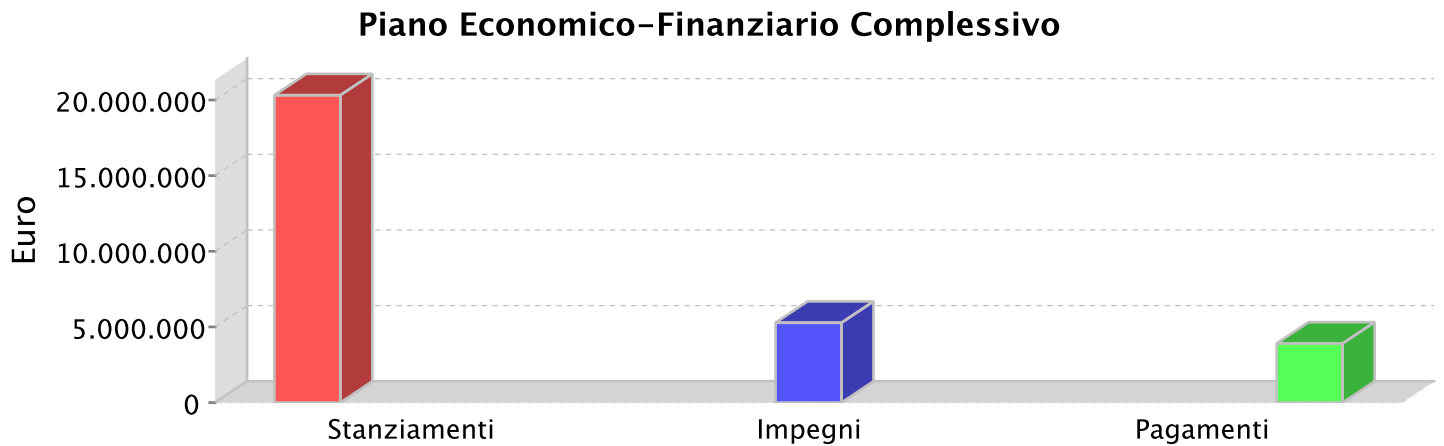


■ Stanziamenti=20.316.421,44 € ■ Impegni=5.278.110,37 €
■ Pagamenti =3.909.575,94 €

Avanzamento impegni: 25.98 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 19.25 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

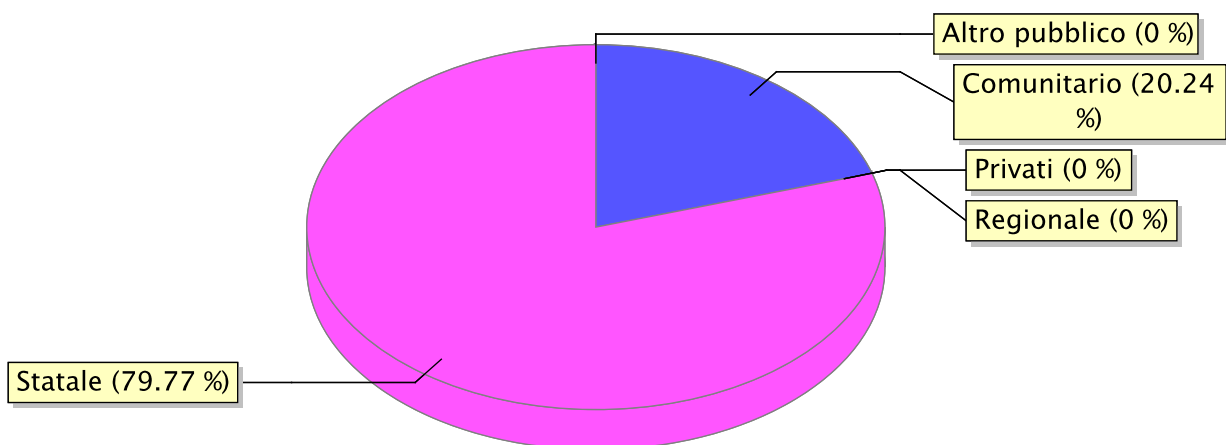

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 4.110.997,02 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 16.205.424,42

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

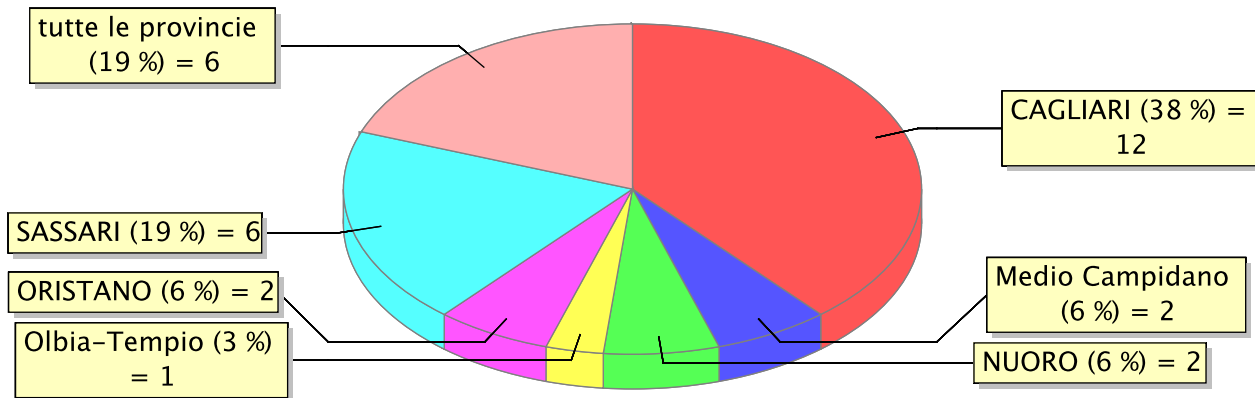

- CAGLIARI (38 %) = 12
- Medio Campidano (6 %) = 2
- NUORO (6 %) = 2
- Olbia-Tempio (3 %) = 1
- ORISTANO (6 %) = 2
- SASSARI (19 %) = 6
- tutte le province (19 %) = 6

Report del progetto: SarBC-SF1 - Studio di fattibilità per individuare la strategia di sviluppo dei Distretti Culturali per le politiche culturali

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Sonia Pistis

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

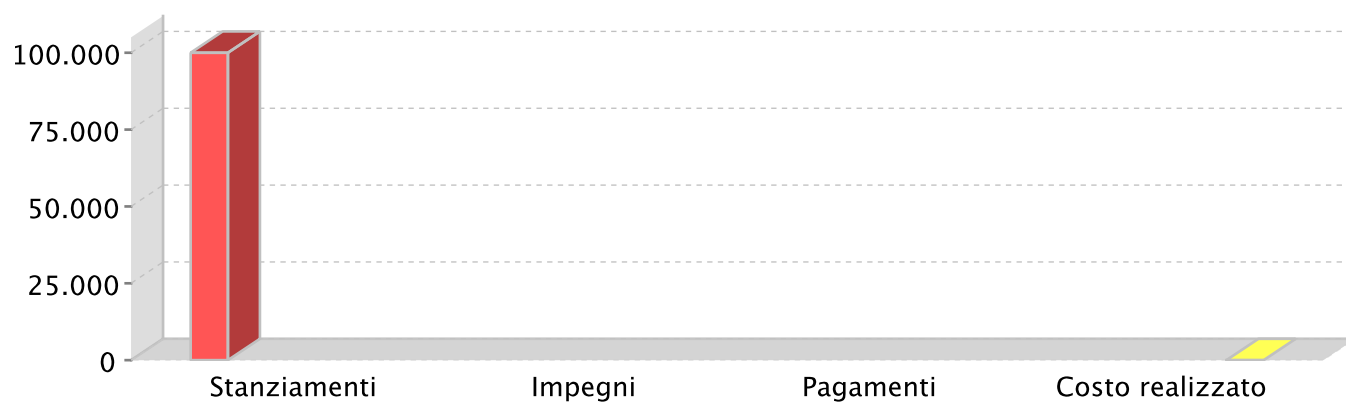

■ Stanziamenti=100.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-02 - Realizzazione e allestimento del Museo della Sardegna giudicale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) ORISTANO

Comune
Oristano

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Elisabetta Pisano

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

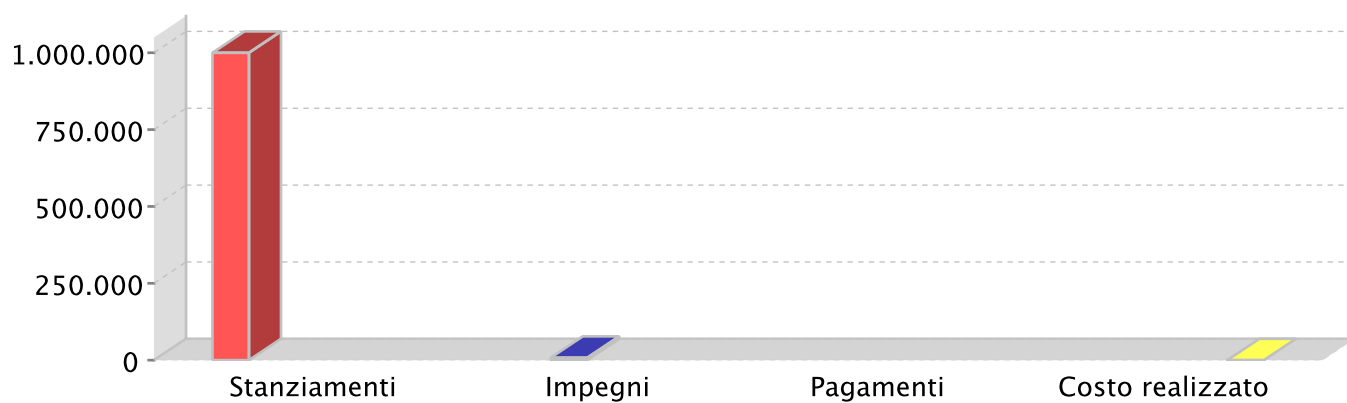

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=8.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.80 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-03 - Realizzazione e allestimento del Museo delle bonifiche e dell'elettificazione della Sardegna a Villa

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) ORISTANO

Comune
Arborea

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Maria Caterina Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

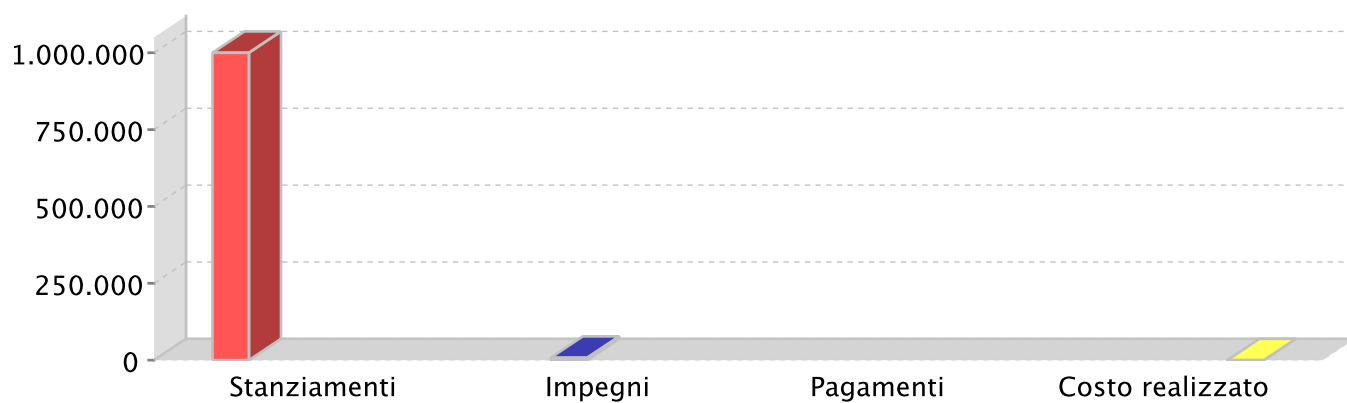

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=8.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.80 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-04 - Allestimento Museo del '900 e del contemporaneo (Carmelo)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Arch. Riccardo Cianchi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

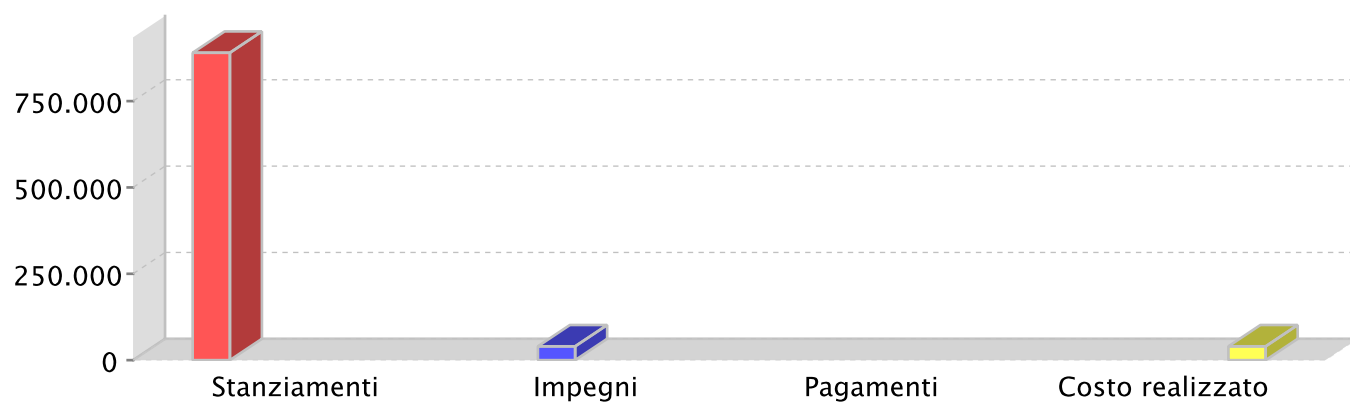

■ Stanziamenti=890.000,00 € ■ Impegni=40.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=40.000,00 €

Avanzamento impegni: 4.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.50 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-06 - Potenziamento e valorizzazione collezioni permanenti del Museo MAN di Nuoro

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Nuoro

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Responsabile dell'intervento


Dott.ssa Cristiana Collu

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

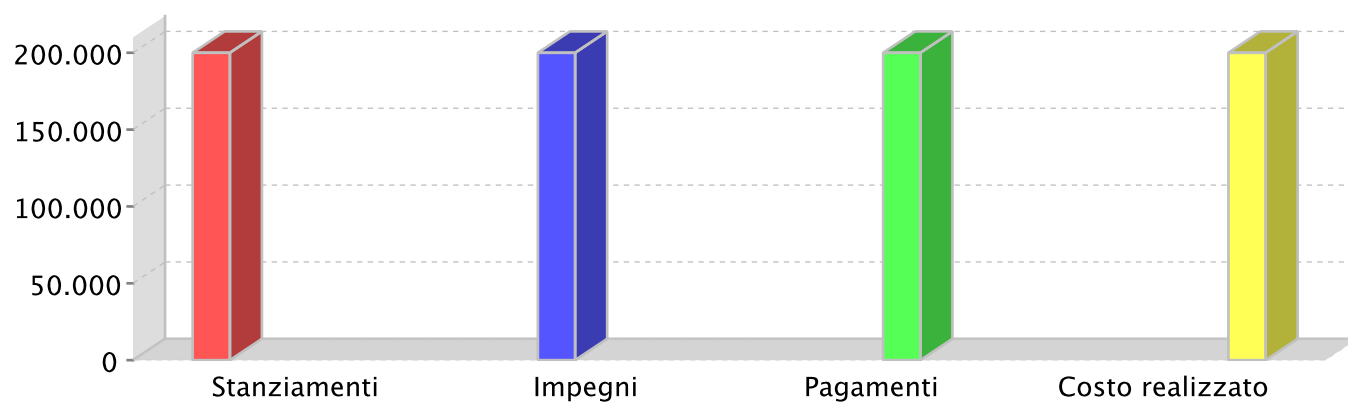

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=200.000,00 €
■ Pagamenti=200.000,00 € ■ Costo realizzato=200.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-13 - Recupero dell'edificio de "La Piccola" per il museo del porto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) SASSARI

Comune
Porto Torres

Soggetto Attuatore

Comune di Porto Torres (SS)

Responsabile dell'intervento


Ing. Maria Caterina Meloni

Stato del progetto

Realizzato



Piano Economico-Finanziario

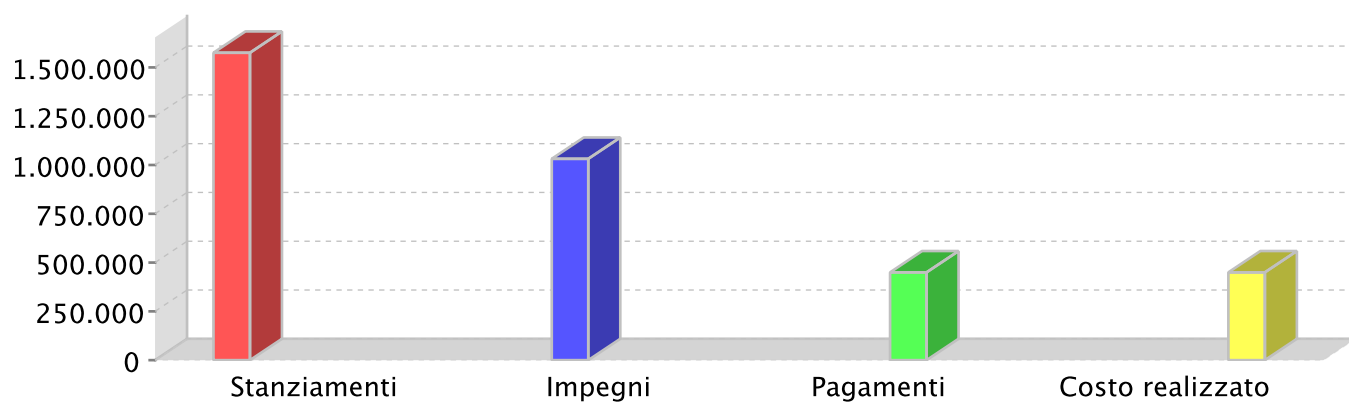

■ Stanziamenti=1.575.194,00 € ■ Impegni=1.031.698,97 €
■ Pagamenti=449.830,82 € ■ Costo realizzato=449.830,82 €

Avanzamento impegni: 65.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 28.56 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 28.56 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC3-18 - Centro di conservazione dei Beni Culturali - Laboratori aperti al pubblico - Sassari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Arch. Patrizia Luciana Tomassetti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

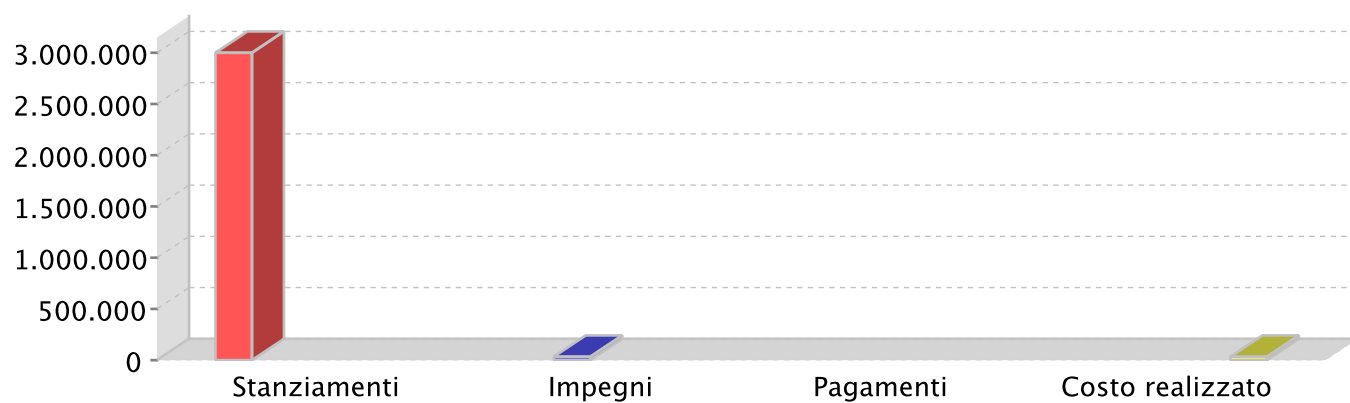

■ Stanziamenti=3.000.000,00 € ■ Impegni=33.403,36 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=33.403,36 €

Avanzamento impegni: 1.12 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.12 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-23 - Archivi-deposito archeologici, viale La Plaia - Cagliari. Progettazione ampliamento

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Gabriele Tola

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

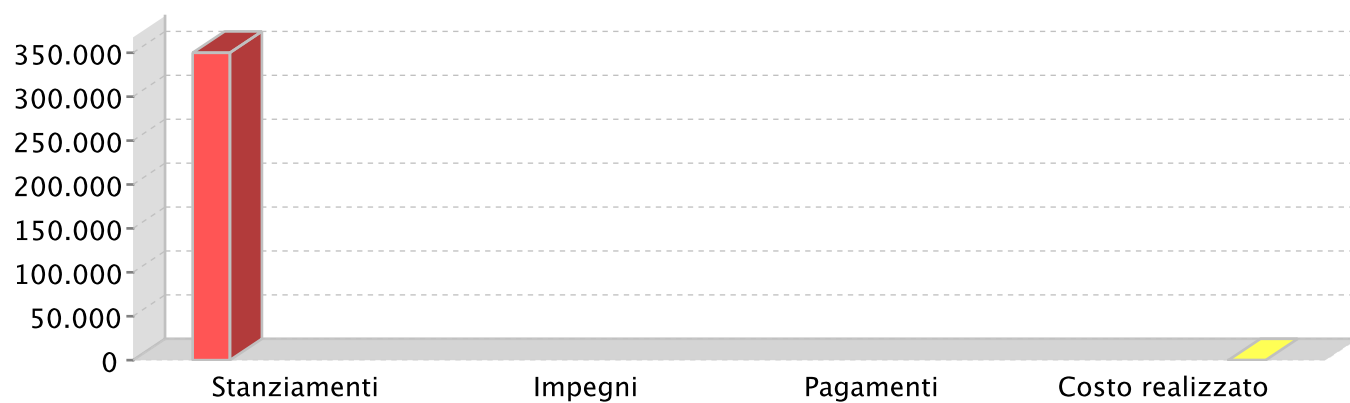

■ Stanziamenti=350.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-05 - Valorizzazione Convento Gesuiti - Convitto Canopoleno - Sassari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Stefano Gizzi

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

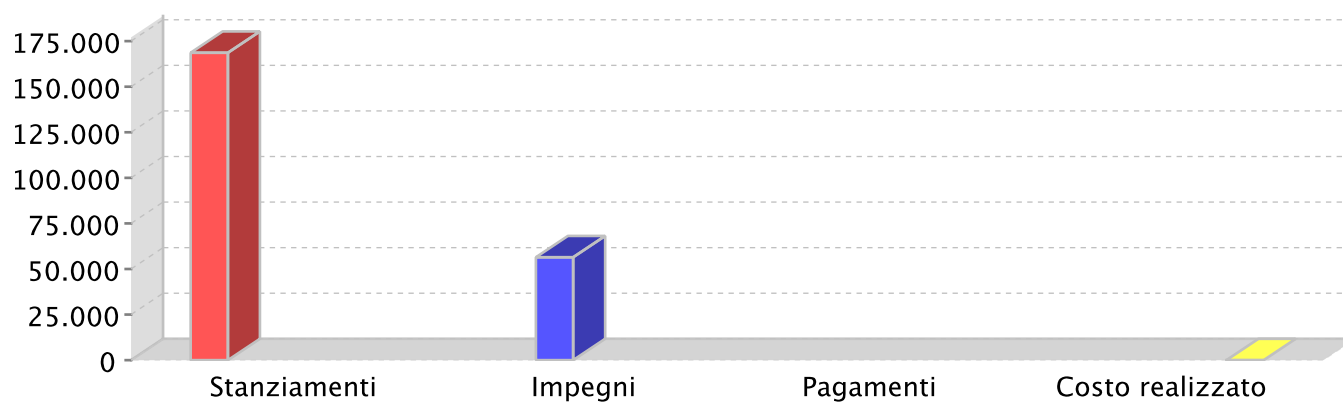

■ Stanziamenti=168.624,42 € ■ Impegni=56.442,70 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 33.48 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-14 - Valorizzazione museale di Montevecchio - Guspini

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Guspini

Soggetto Attuatore

Comune di Guspini (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Maria Caterina Meloni

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

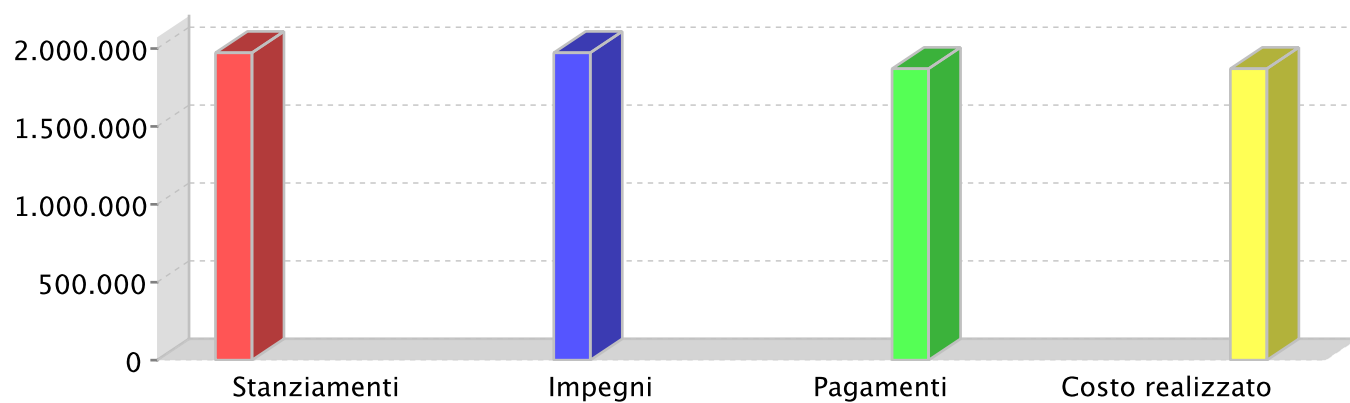

■ Stanziamenti=1.972.865,00 € ■ Impegni=1.972.865,00 €
■ Pagamenti=1.870.452,45 € ■ Costo realizzato=1.870.452,45 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 94.81 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 94.81 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-07 - Museo archeologico nazionale e Pinacoteca nazionale. Integrazione strutturale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Francesca Gallus

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

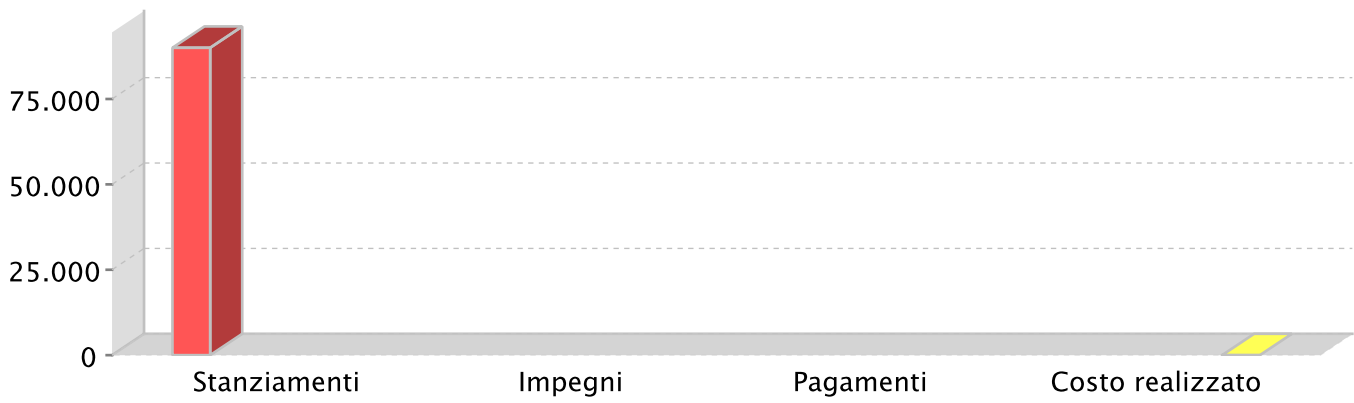

■ Stanziamenti=90.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €

■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-08 - Pinacoteca nazionale. Allestimento

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Gabriele Tola

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

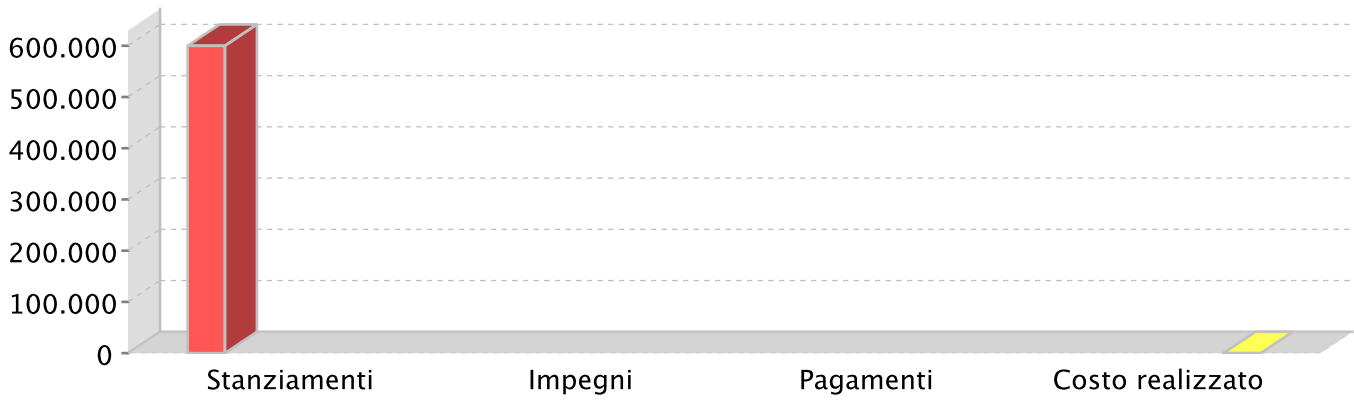

■ Stanziamenti=600.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-09 - Museo archeologico nazionale storico: restauro e fruizione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Elena Romoli

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

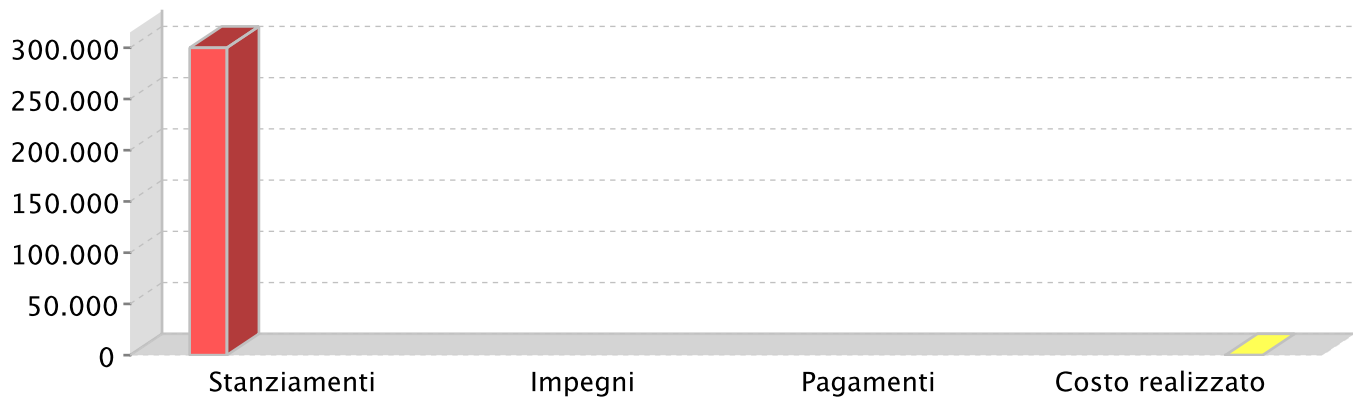

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-10 - Le statue nuragiche di Monte Prama di Cabras (OR). Conservazione e restauro

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Antonietta Boninu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

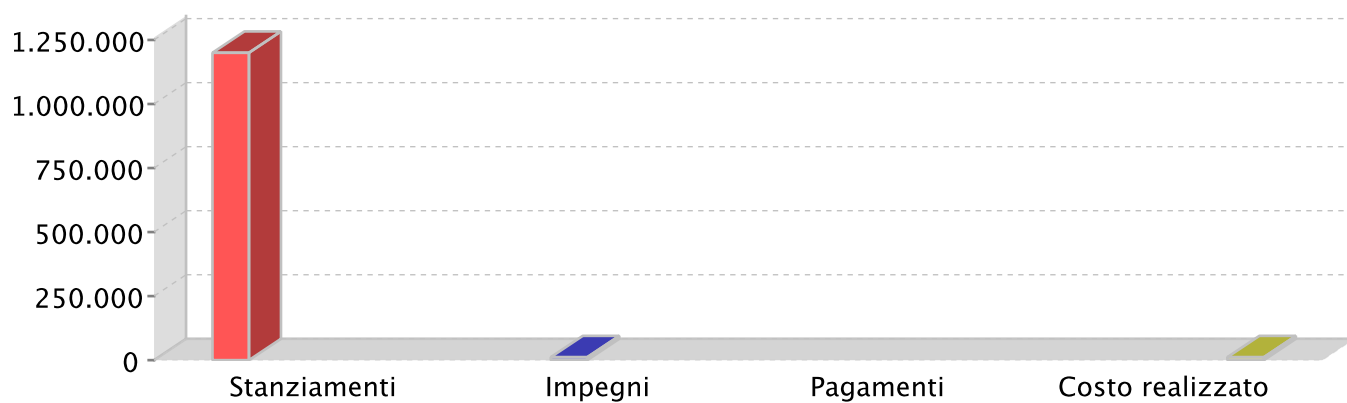

■ Stanziamenti=1.200.000,00 € ■ Impegni=11.588,40 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=11.588,40 €

Avanzamento impegni: 0.97 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.97 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-11 - Restauro di cinque relitti del porto di Olbia

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Responsabile dell'intervento


Rubens D'Oriano

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

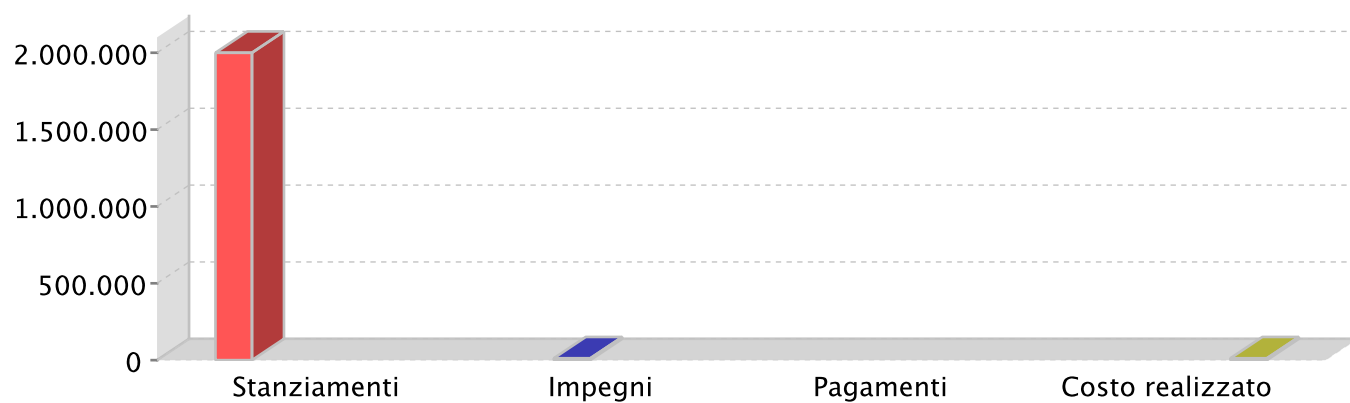

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=12.093,48 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=12.093,48 €

Avanzamento impegni: 0.61 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.61 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-15 - Restauro impianti minerari ex forge - Miniera di Guspini

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Guspini

Soggetto Attuatore

Comune di Guspini (CA)


Responsabile dell'intervento

Ingegnere Maria Catarina Meloni

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

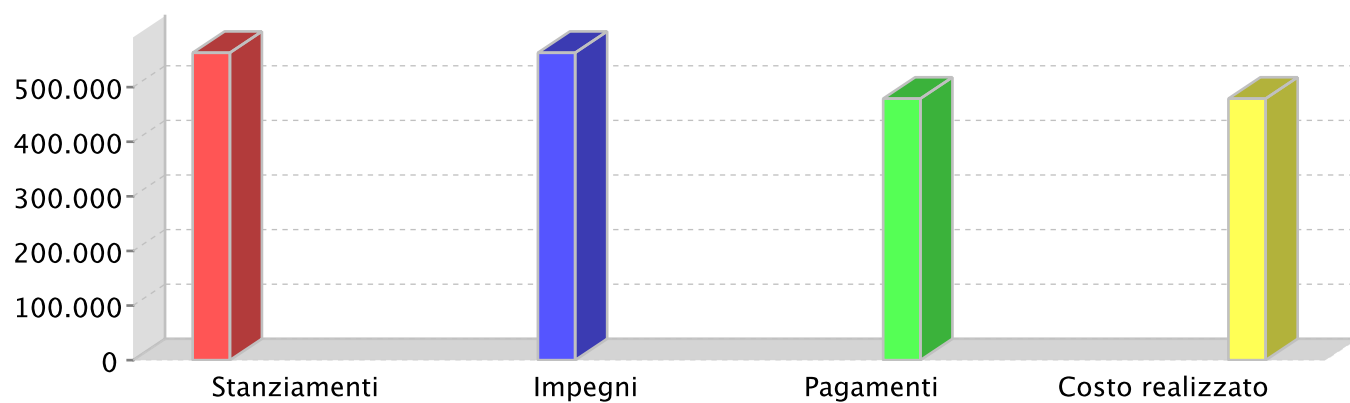

■ Stanziamenti=562.938,02 € ■ Impegni=562.938,02 €
■ Pagamenti=478.988,15 € ■ Costo realizzato=478.988,15 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 85.09 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 85.09 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-16 - Metodologie per la progettazione sostenibile del paesaggio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Responsabile dell'intervento


Daniela Serra

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

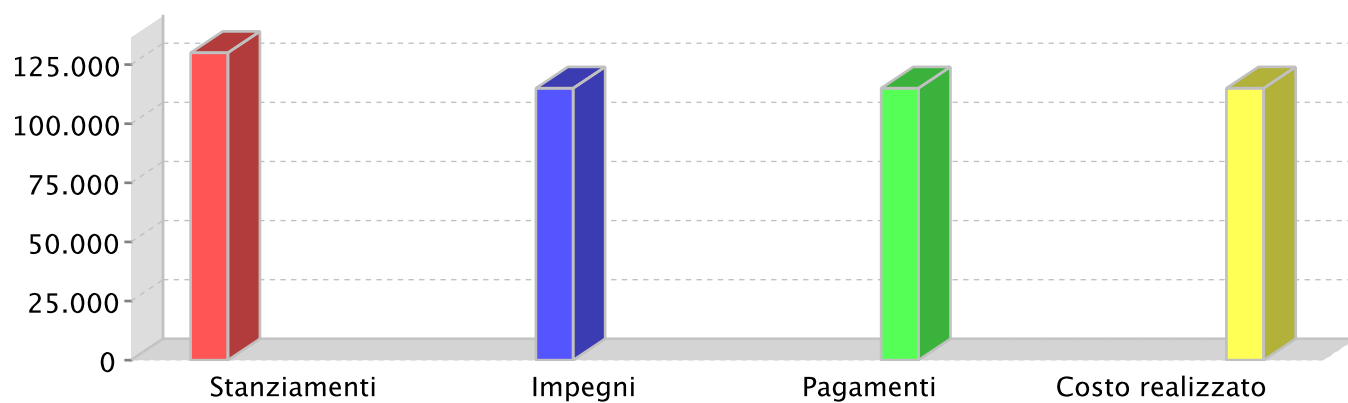

■ Stanziamenti=130.000,00 € ■ Impegni=115.000,00 €
■ Pagamenti=115.000,00 € ■ Costo realizzato=115.000,00 €

Avanzamento impegni: 88.47 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 88.47 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 88.47 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC2-17 - Concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ing. Giampaolo Visioli

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

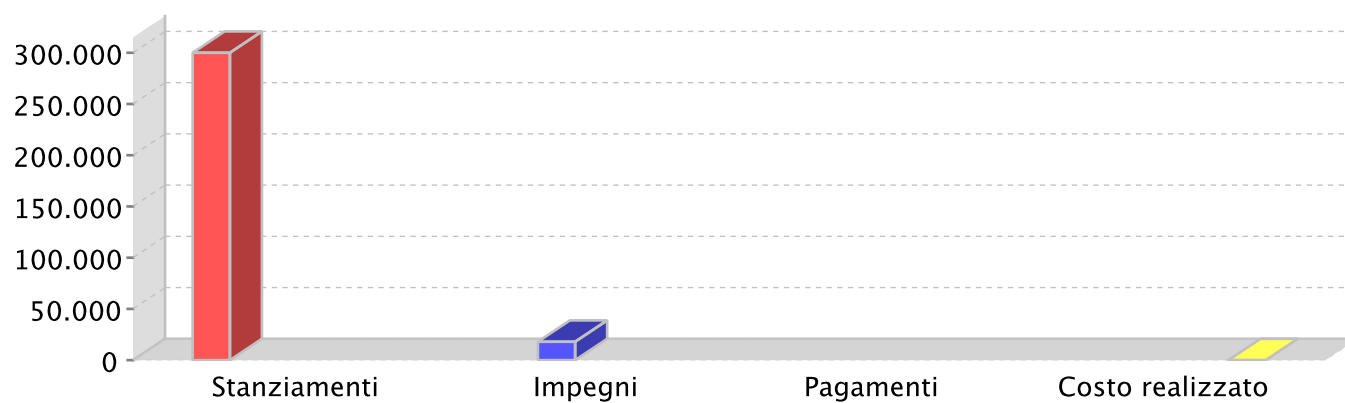

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=18.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 6.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC3-19 - Scuola di alta formazione per restauratori. Impianto strutturale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Responsabile dell'intervento


Arch. Patrizia Luciana Tomassetti

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

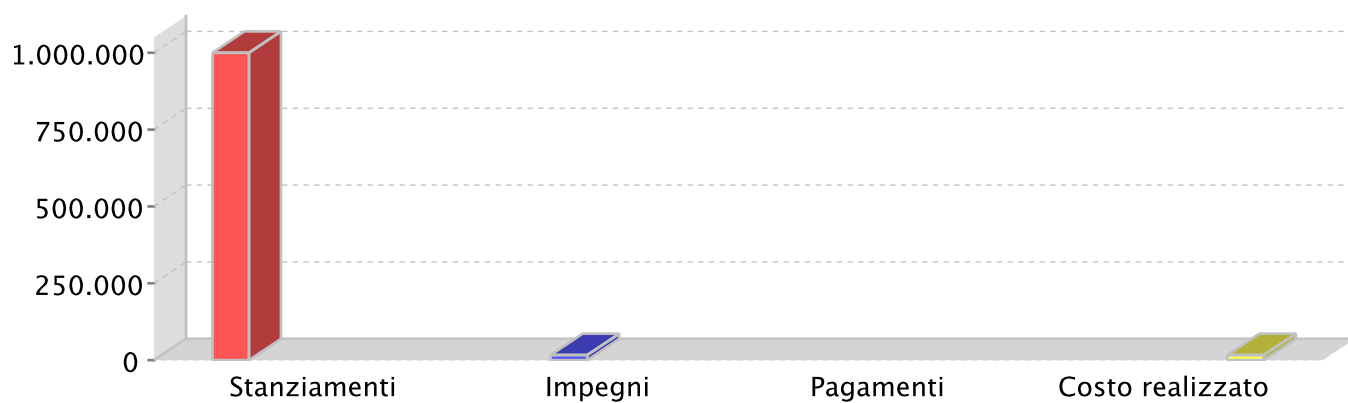

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=16.739,20 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=16.739,20 €

Avanzamento impegni: 1.68 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.68 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-21 - Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allestimento funzionale nuova sede

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Gabriele Tola

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

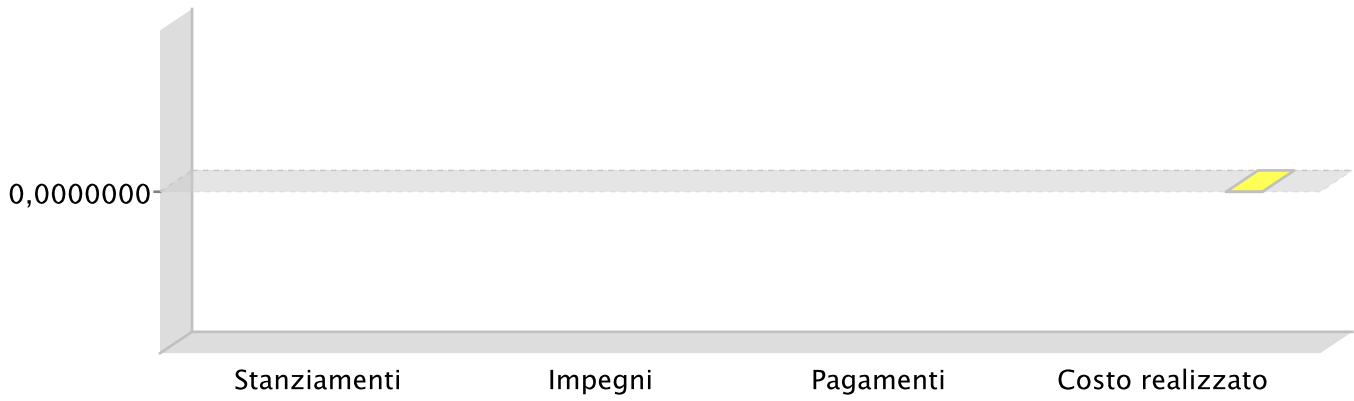

■ Stanziamenti=0,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: null % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-22 - Archivi - deposito archeologici - Viale La Plaia - Cagliari. Ristrutturazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Elena Romoli

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

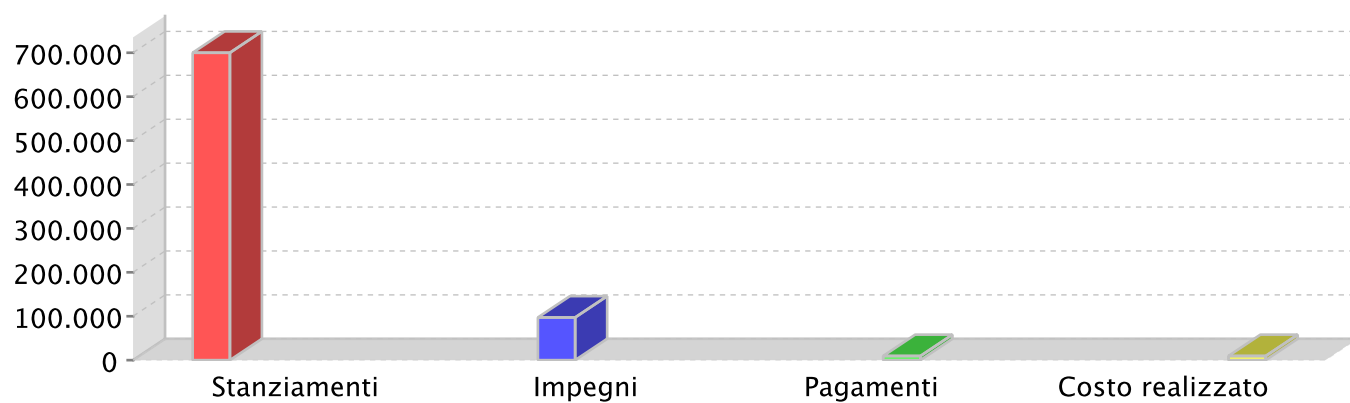

■ Stanziamenti=700.000,00 € ■ Impegni=97.188,97 € ■ Pagamenti=9.480,75 €
■ Costo realizzato=9.480,75 €

Avanzamento impegni: 13.89 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 1.36 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-24 - Recupero testimonianze storiche archivio audiovisivo RAI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia

1) CAGLIARI

Comune

Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Maria Paola Mascia

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

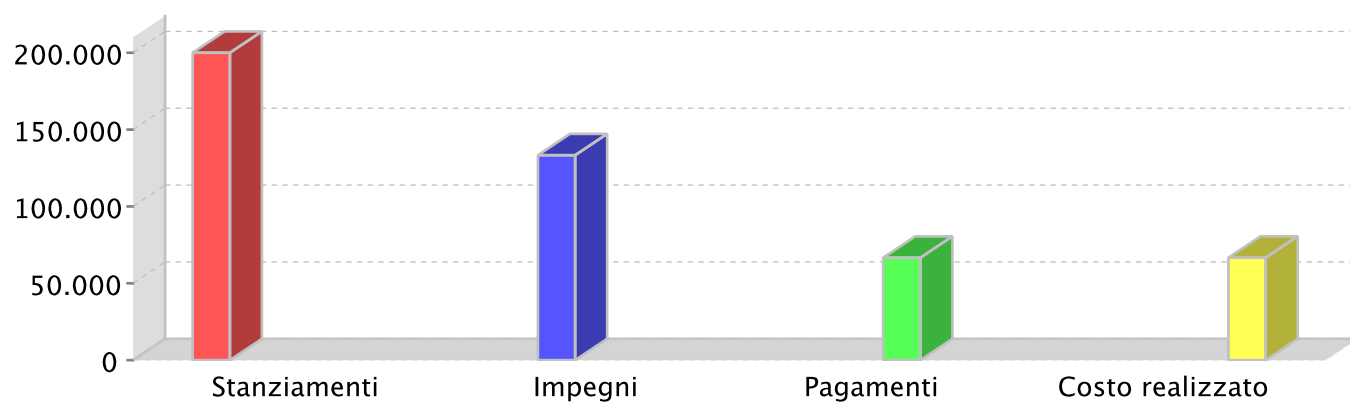

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=133.333,32 €
■ Pagamenti=66.666,66 € ■ Costo realizzato=66.666,66 €

Avanzamento impegni: 66.67 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 33.34 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 33.34 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-25 - Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Ester Gessa

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

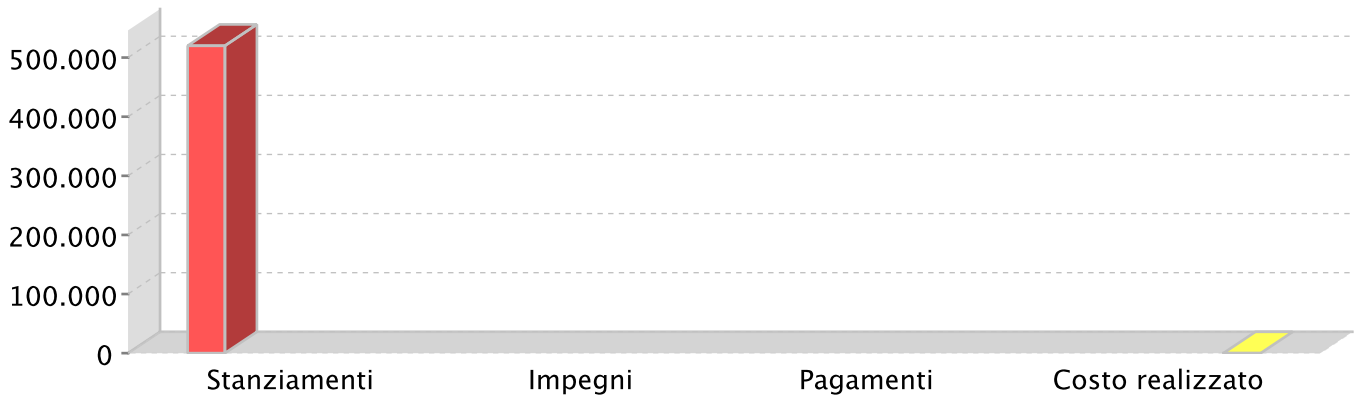

■ Stanziamenti=520.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-26 - Ricognizione delle banche dati del patrimonio culturale della Sardegna. Adeguamento delle banche dati

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Carla Palomba

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

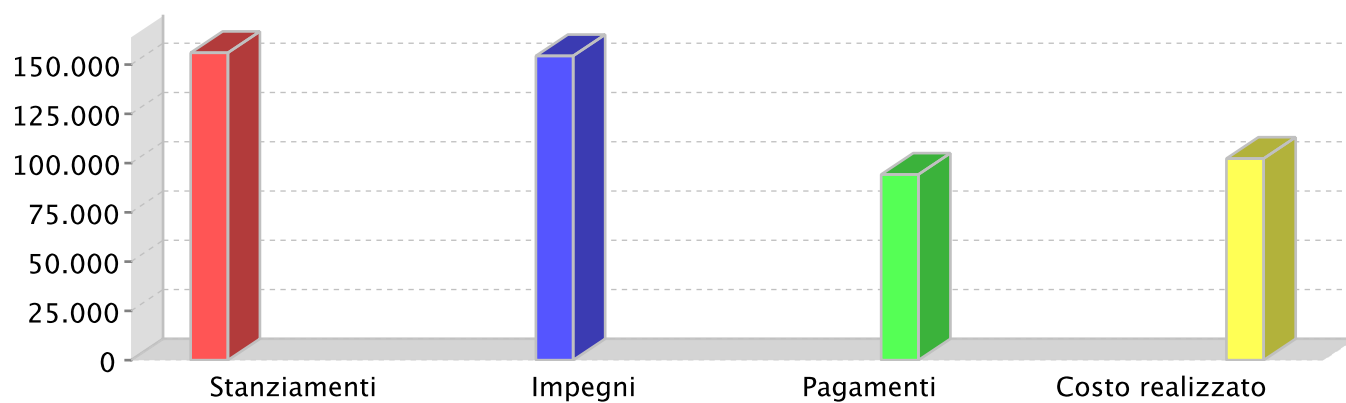

■ Stanziamenti=156.000,00 € ■ Impegni=154.400,00 €
■ Pagamenti=94.232,81 € ■ Costo realizzato=102.320,00 €

Avanzamento impegni: 98.98 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 65.59 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 60.41 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC-SF5 - Studio di fattibilità messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui Beni Culturali in Sardegna

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali


Responsabile dell'intervento

Luisanna Usai

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

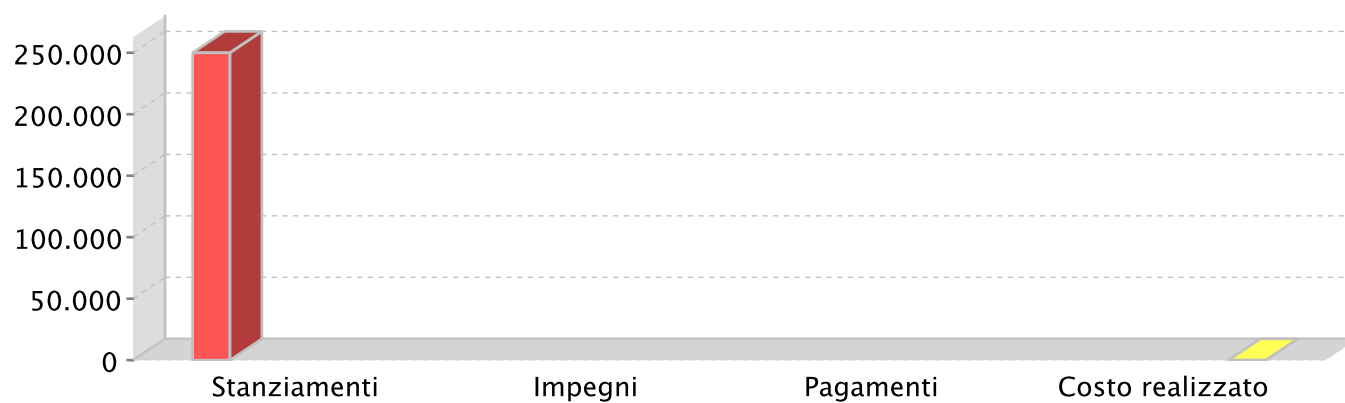

■ Stanziamenti=250.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-27 - Digitalizzazione della cartografia storica della Sardegna

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Alessandra Argiolas

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

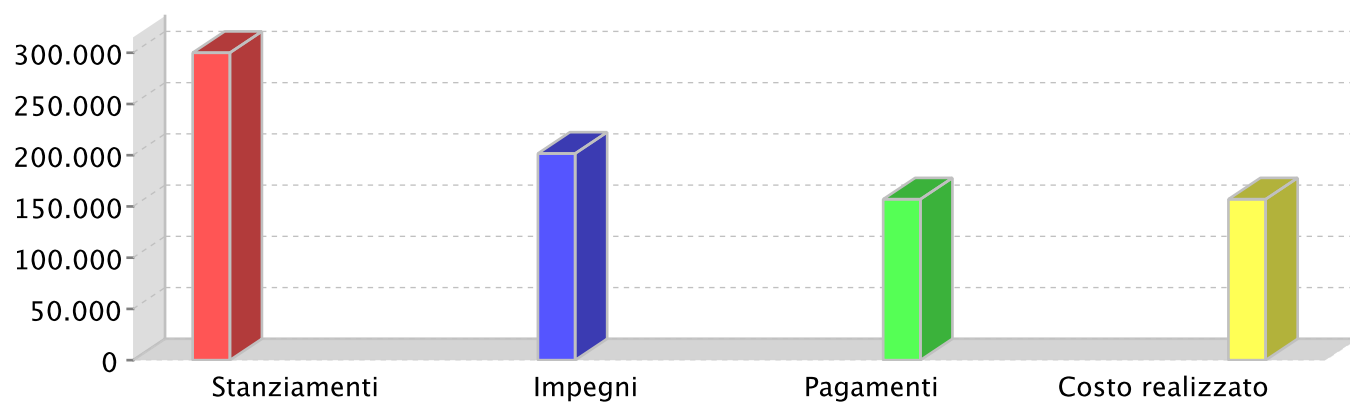

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=201.644,32 €
■ Pagamenti=157.067,87 € ■ Costo realizzato=157.067,87 €

Avanzamento impegni: 67.22 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 52.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 52.36 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-28 - Polo tecnologico per i beni culturali. Strutture e servizi

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali

Responsabile dell'intervento


Elena Romoli

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

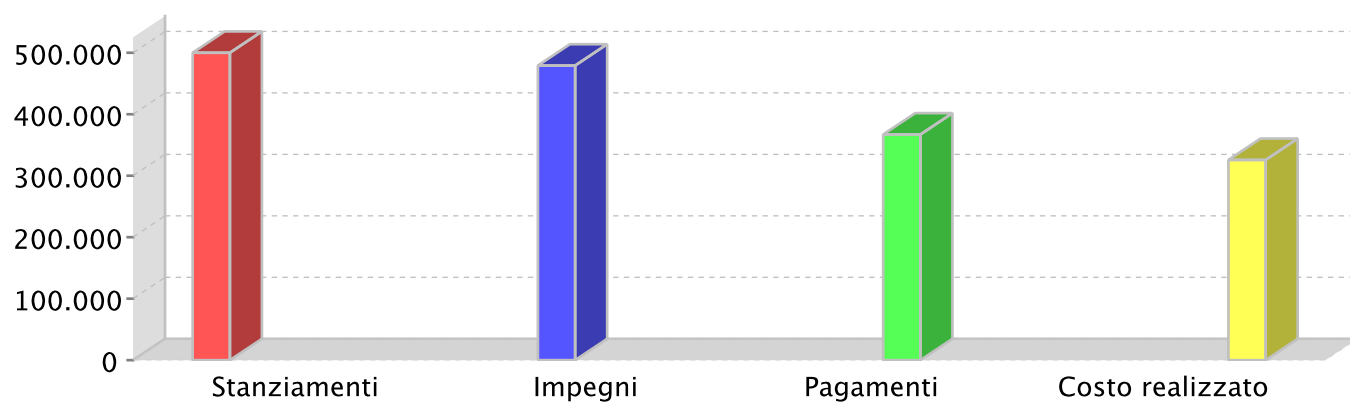

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=479.187,03 €
■ Pagamenti=367.056,43 € ■ Costo realizzato=325.656,43 €

Avanzamento impegni: 95.84 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 65.14 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 73.42 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC4-29 - Sistema informativo georeferenziato (GIS) dei beni culturali della Sardegna

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali


Responsabile dell'intervento

Elena Romoli

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

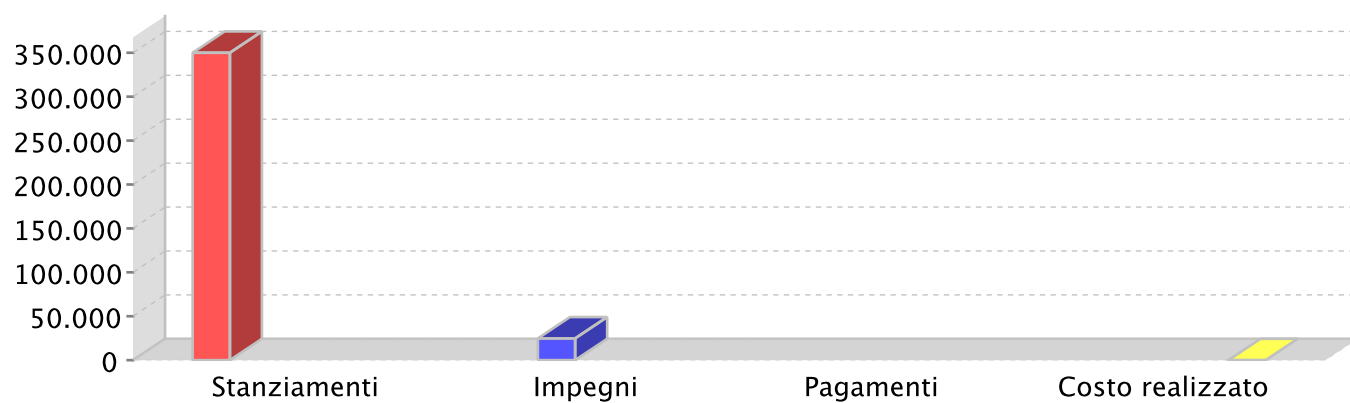

■ Stanziamenti=350.000,00 € ■ Impegni=24.787,60 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 7.09 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC-SF2b - Studio di fattibilità per il Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ing. Elisabetta Pisano

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

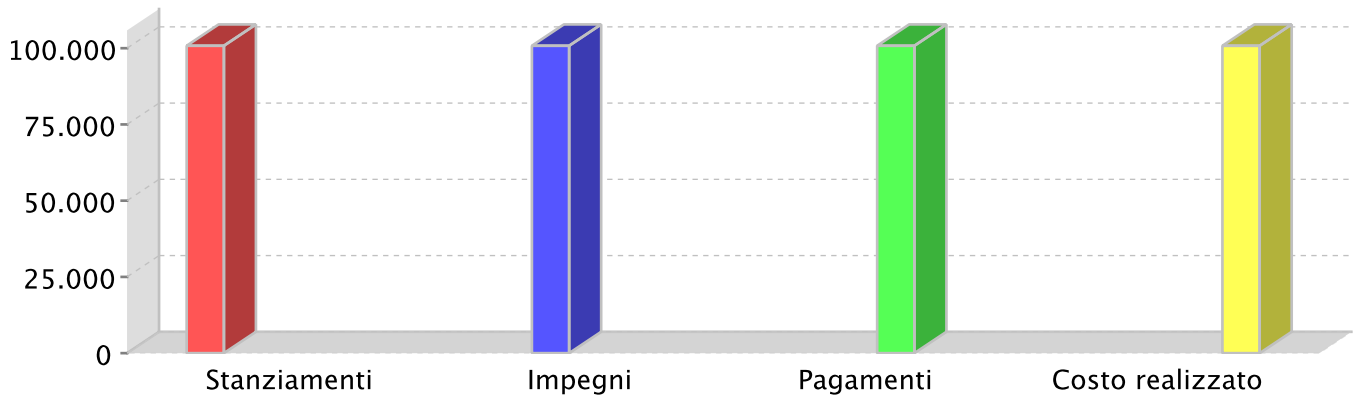

■ Stanziamenti=100.800,00 € ■ Impegni=100.800,00 €
■ Pagamenti=100.800,00 € ■ Costo realizzato=100.800,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC-SF3b - Studio di fattibilita, tramite concorso di idee del Museo delle Identita a Nuoro

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Nuoro

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Maria Caterina Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

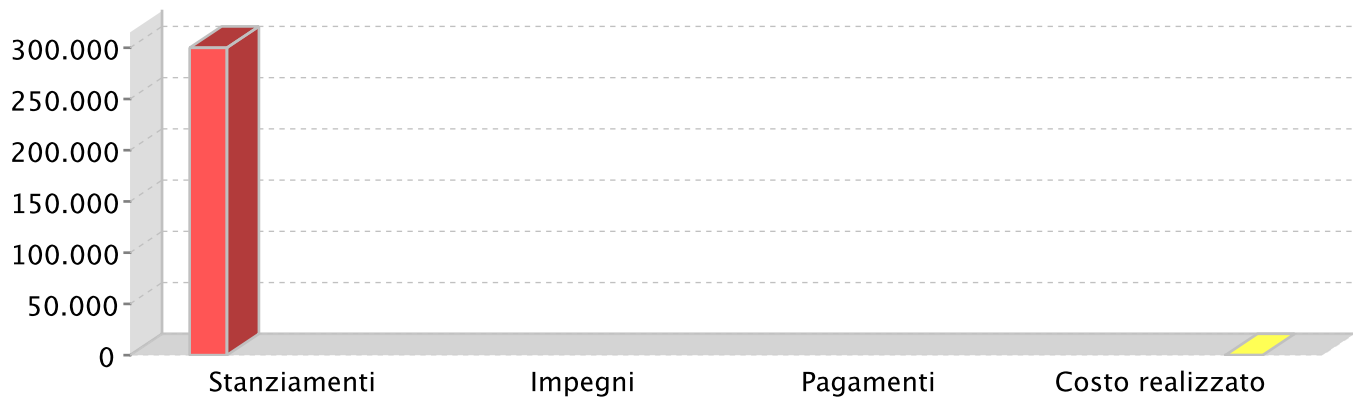

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBC-SF4b - Studio di fattibilità per la realizzazione della Fabbrica delle Arti e della Creatività del

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Farris Simona

Stato del progetto

In avvio



Piano Economico-Finanziario

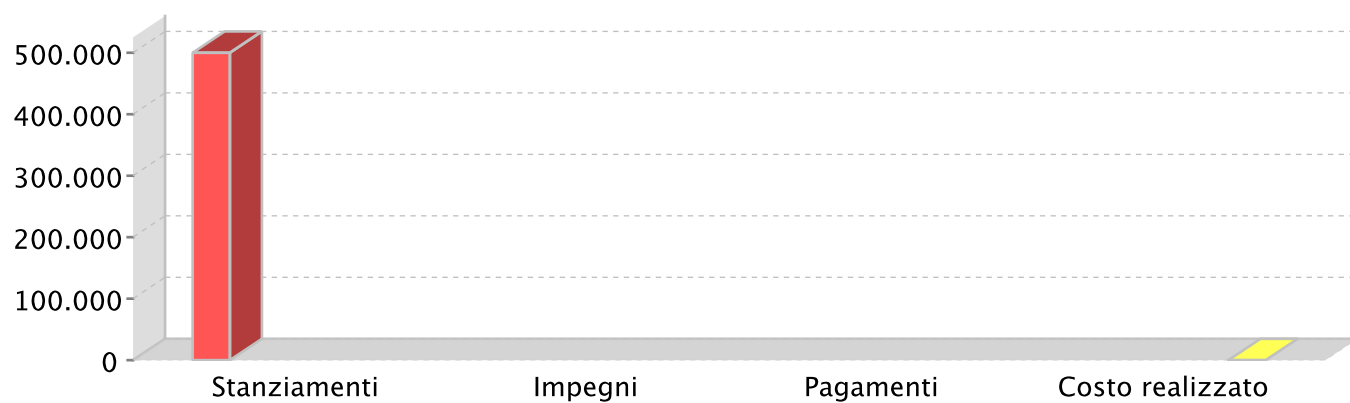

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
