



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO


Beni culturali - I Atto integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

10

Piano Economico-Finanziario Complessivo

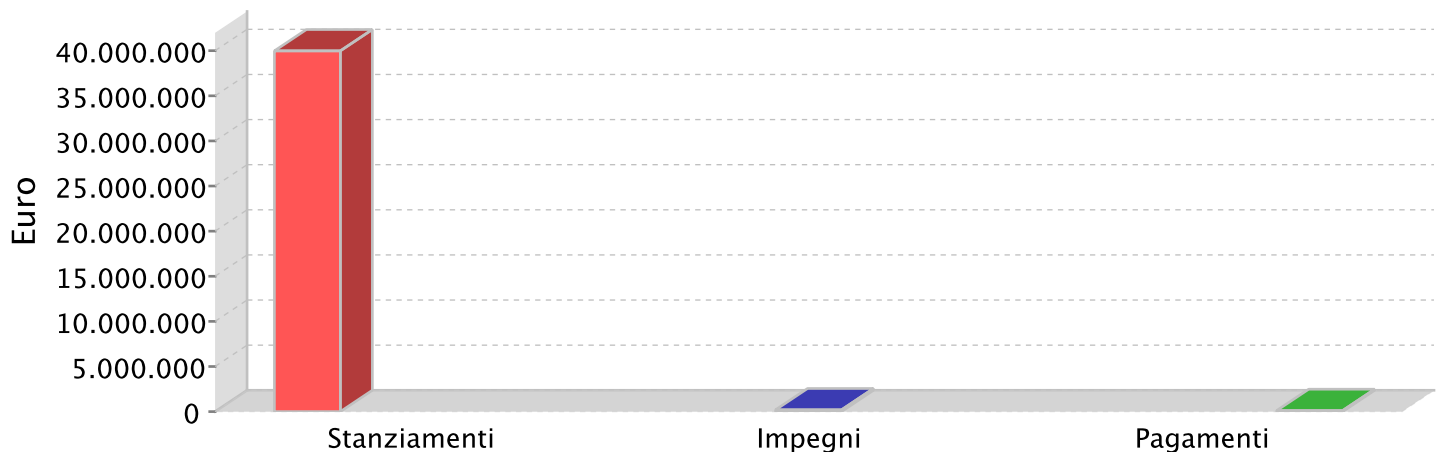


■ Stanziamenti=39.979.200,00 € ■ Impegni=199.368,48 € ■ Pagamenti =118.794,98 €

Avanzamento impegni: 0.50 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.30 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

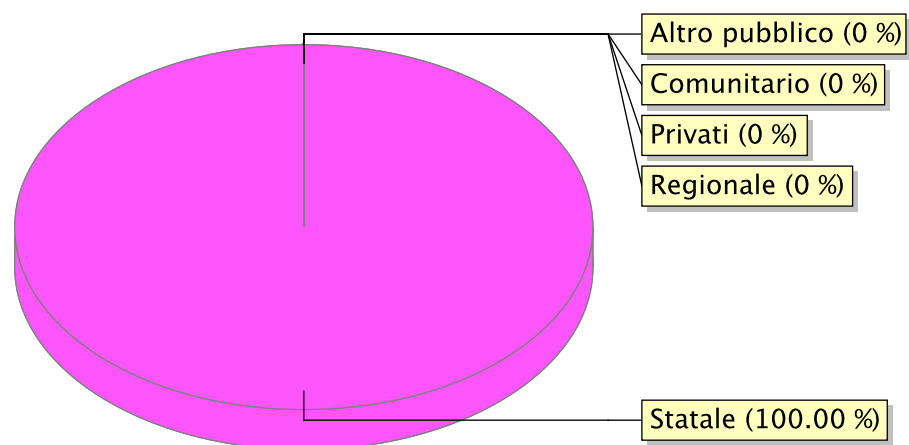

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 39.979.200

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

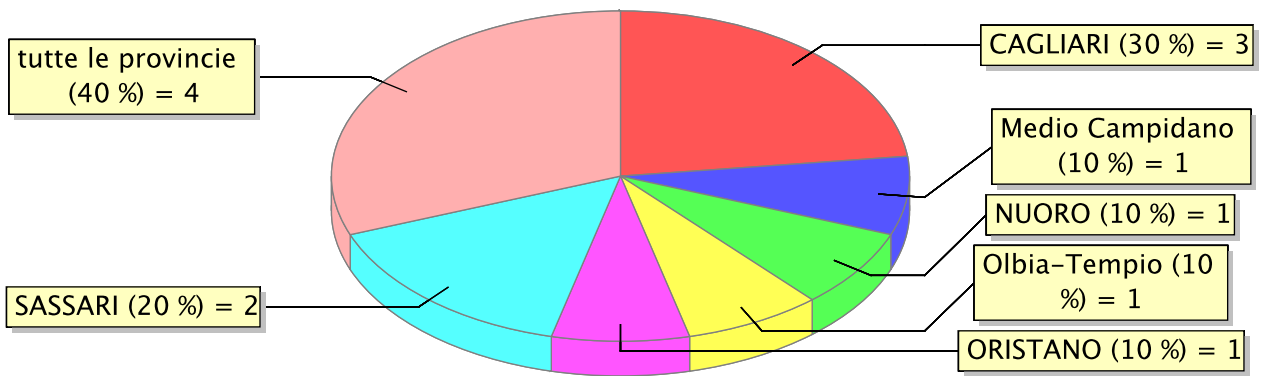

- CAGLIARI (30 %) = 3
- Medio Campidano (10 %) = 1
- NUORO (10 %) = 1
- Olbia-Tempio (10 %) = 1
- ORISTANO (10 %) = 1
- SASSARI (20 %) = 2
- tutte le provincie (40 %) = 4

Report del progetto: SarBD-SF1 - Studio di fattibilità per sistema bibliotecario urbano di Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Lino Cosimo Dossoni

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

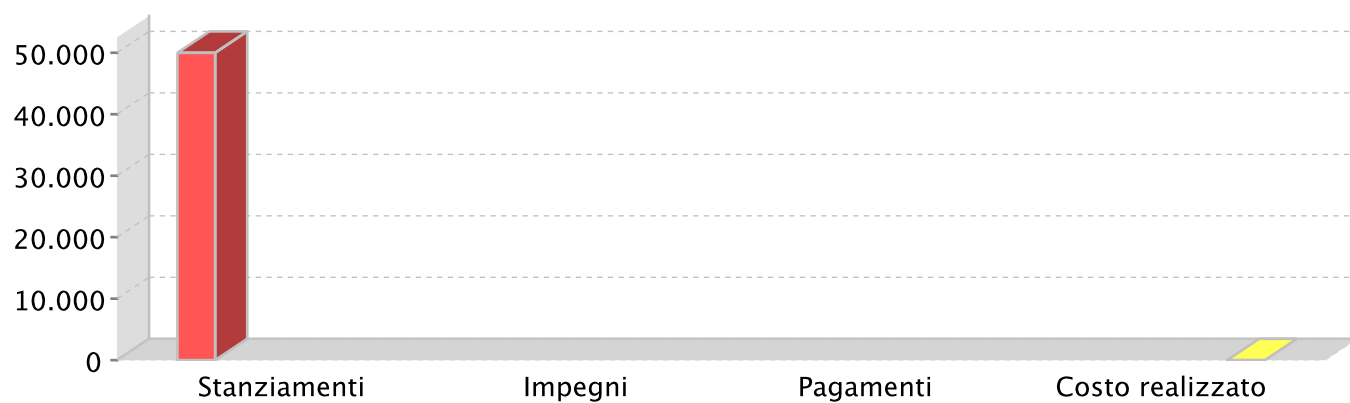

■ Stanziamenti=50.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-SF2 - Studio fattibilità per la realizzazione dell' Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Anna Maria Cherenti

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

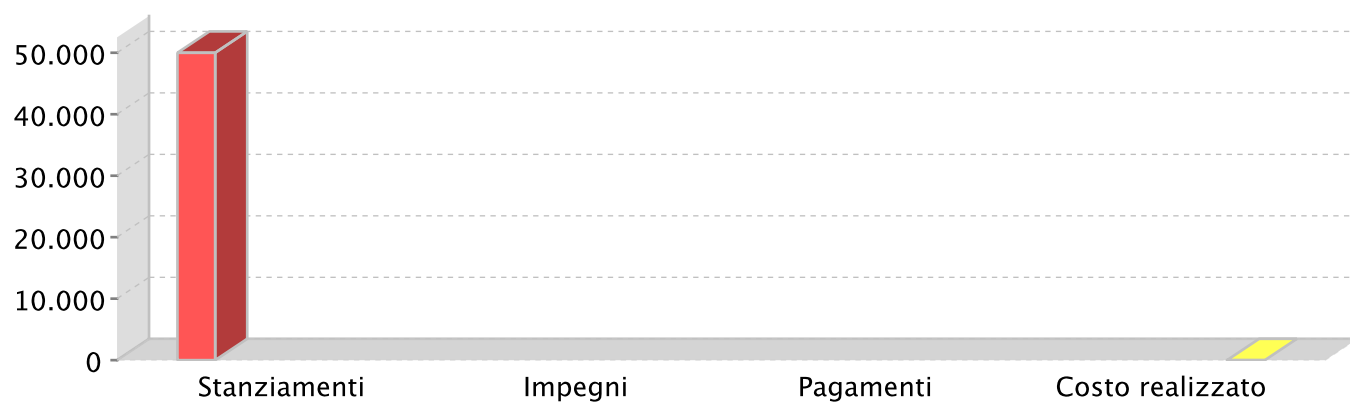

■ Stanziamenti=50.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-01 - Progettazione preliminare dell'intero intervento, progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del 1?

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

ing. Elisabetta Pisano

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

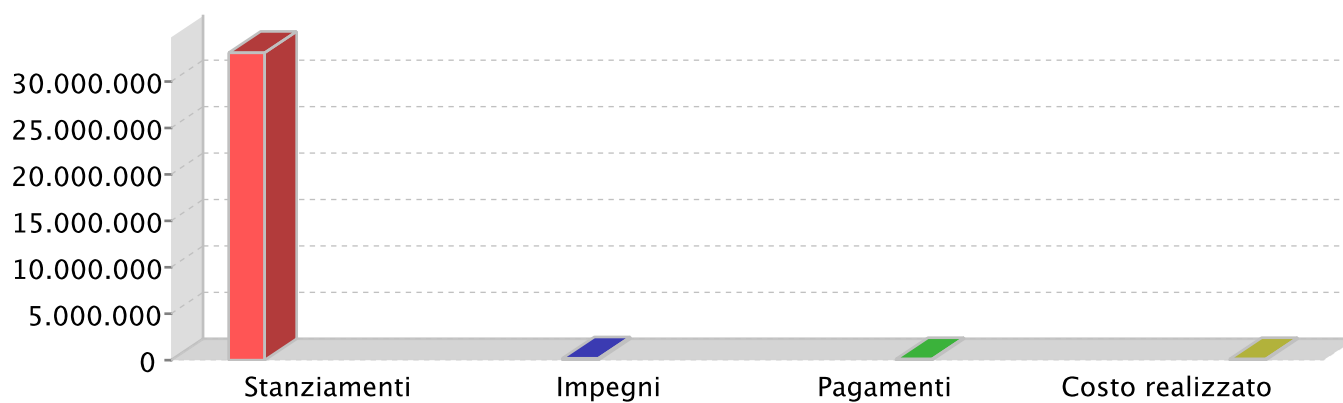

■ Stanziamenti=33.099.200,00 € ■ Impegni=199.368,48 €
■ Pagamenti=118.794,98 € ■ Costo realizzato=118.794,98 €

Avanzamento impegni: 0.61 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.36 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-02 - Museo e laboratori delle Identita

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Nuoro

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Maria Caterina Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

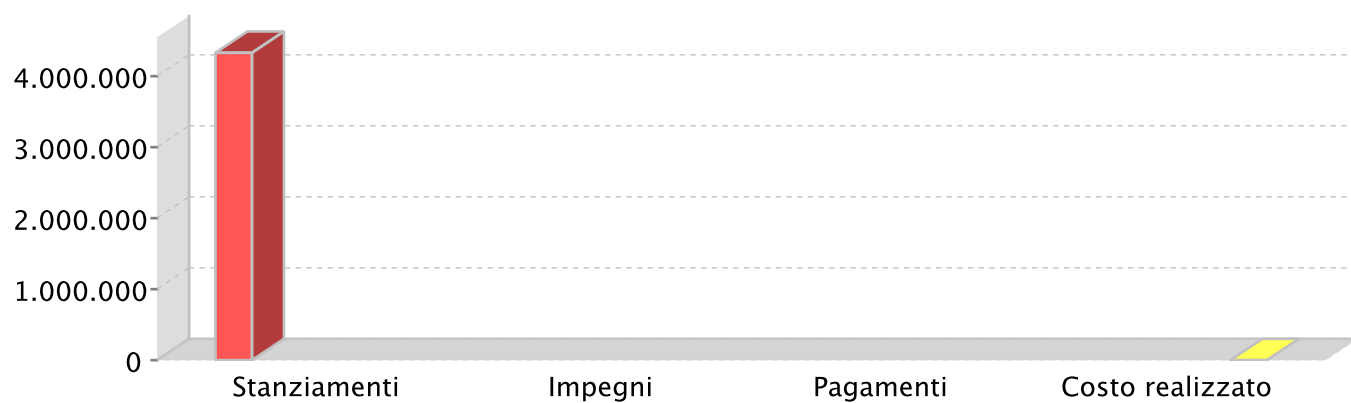

■ Stanziamenti=4.330.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-03 - Rete museale dei Fenici

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Oristano

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

ing. Elisabetta Pisano

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

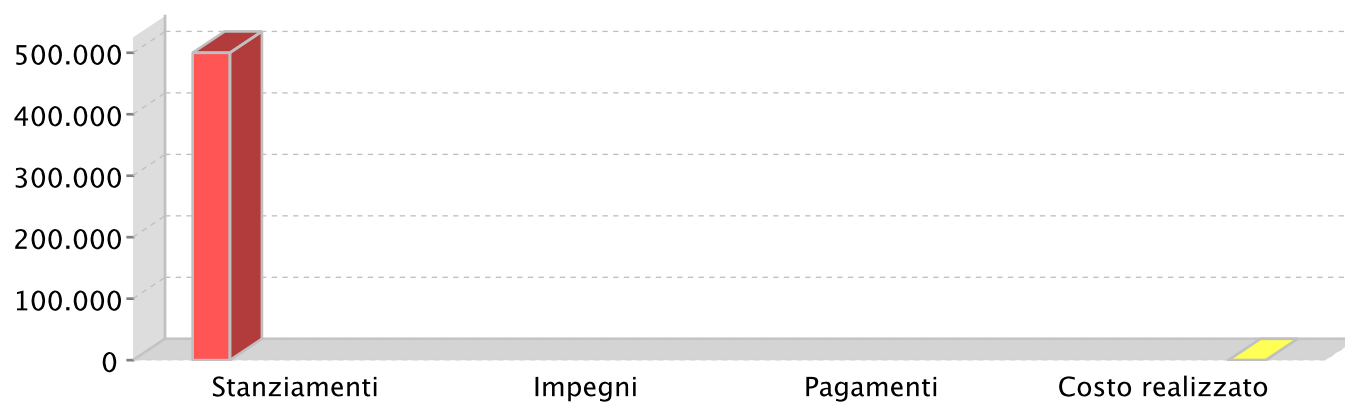

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-04 - Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras. Documentazione, restauro e musealizzazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Responsabile dell'intervento

Antonietta Boninu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

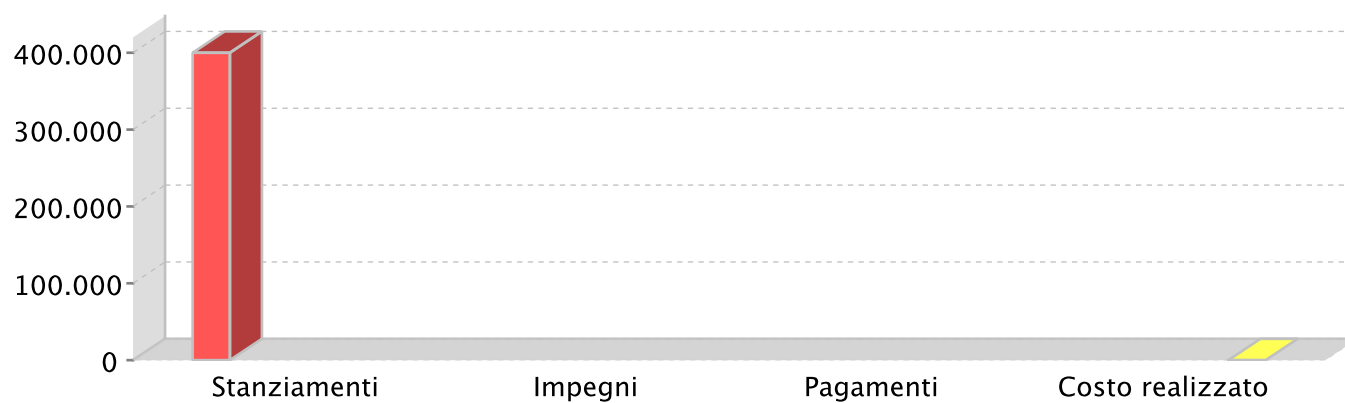

■ Stanziamenti=400.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-05 - Navi romane nel porto di Olbia

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Responsabile dell'intervento

Rubens D'Oriano

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

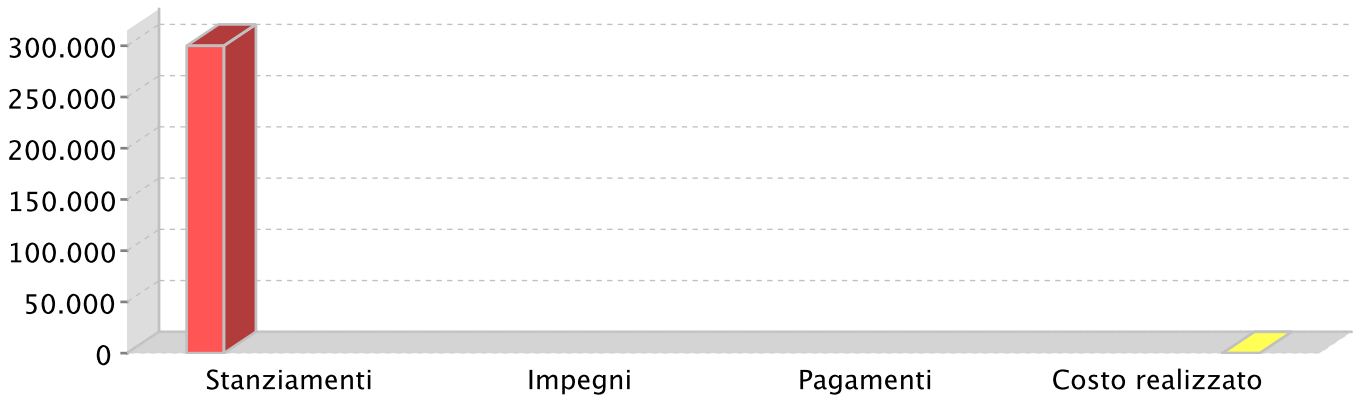

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-06 - Scuola regionale di alta formazione per restauro e conservazione del patrimonio culturale - istituzionale - Li

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) SASSARI	tutti i comuni
3) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Responsabile dell'intervento

Antonietta Boninu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

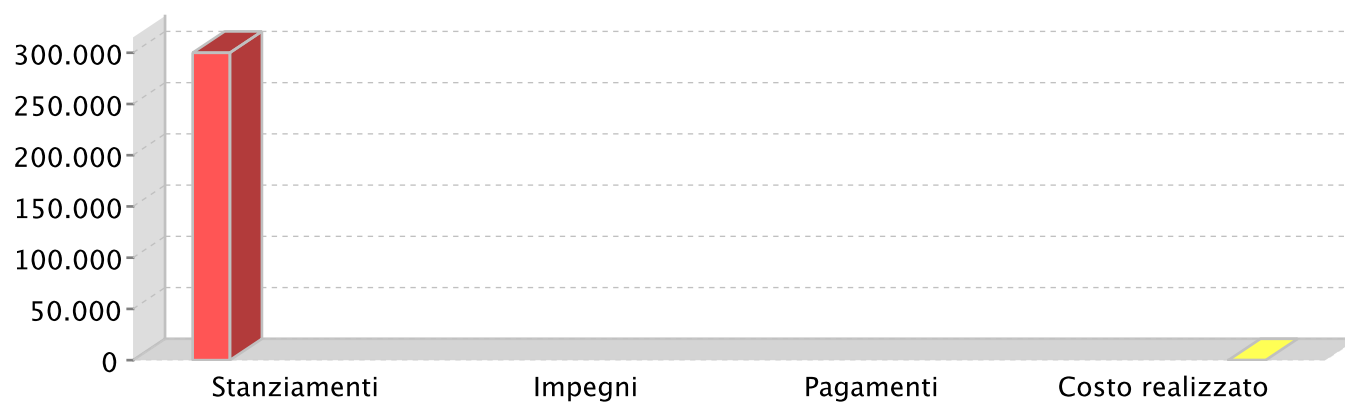

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-07 - Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di un galeone storico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Arbus

Soggetto Attuatore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile dell'intervento


Antonietta Boninu

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

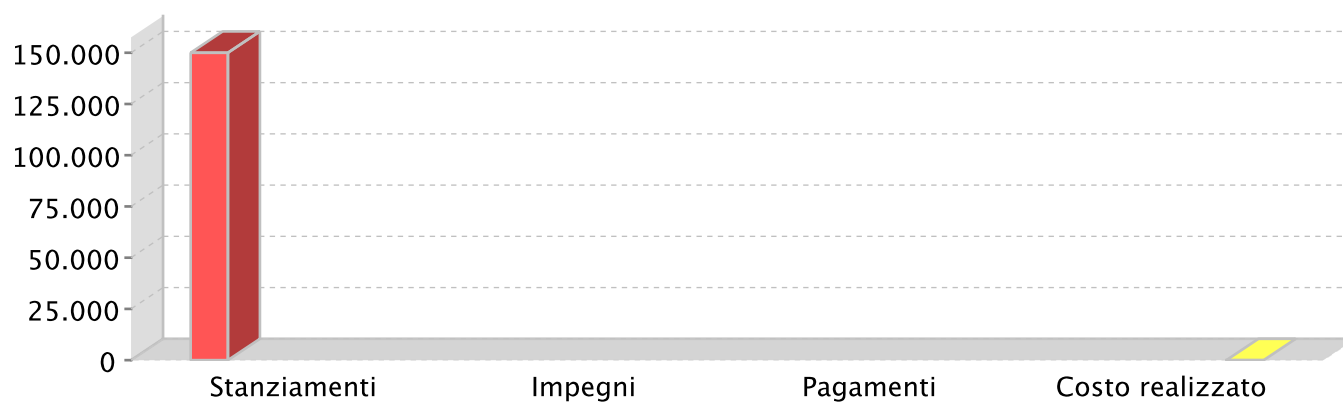

■ Stanziamenti=150.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarBD-08 - Manifatture. Fabbrica delle creativita; Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Beni culturali - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ing. Simona Farris

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

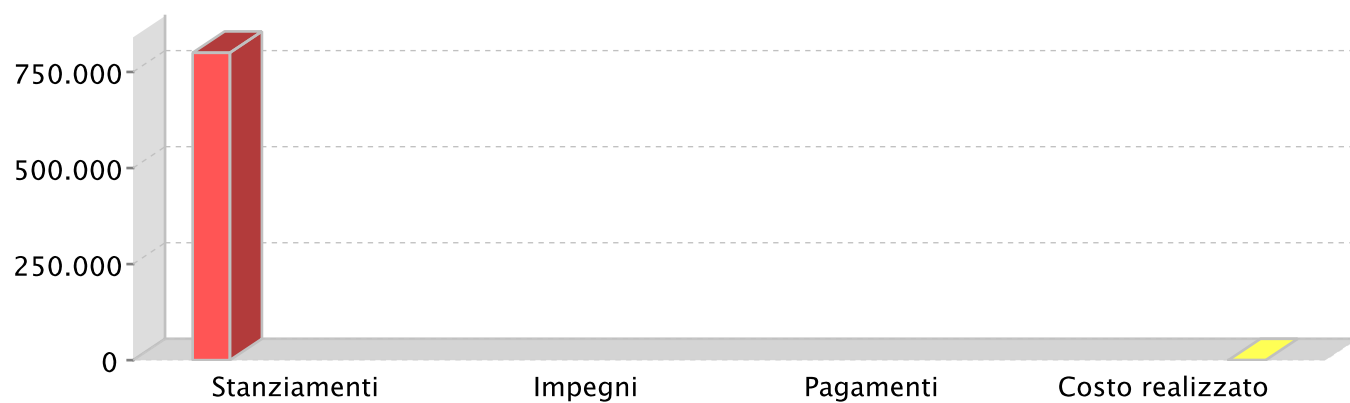

■ Stanziamenti=800.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
