



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO


Difesa del Suolo III Atto Integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

14

Piano Economico-Finanziario Complessivo

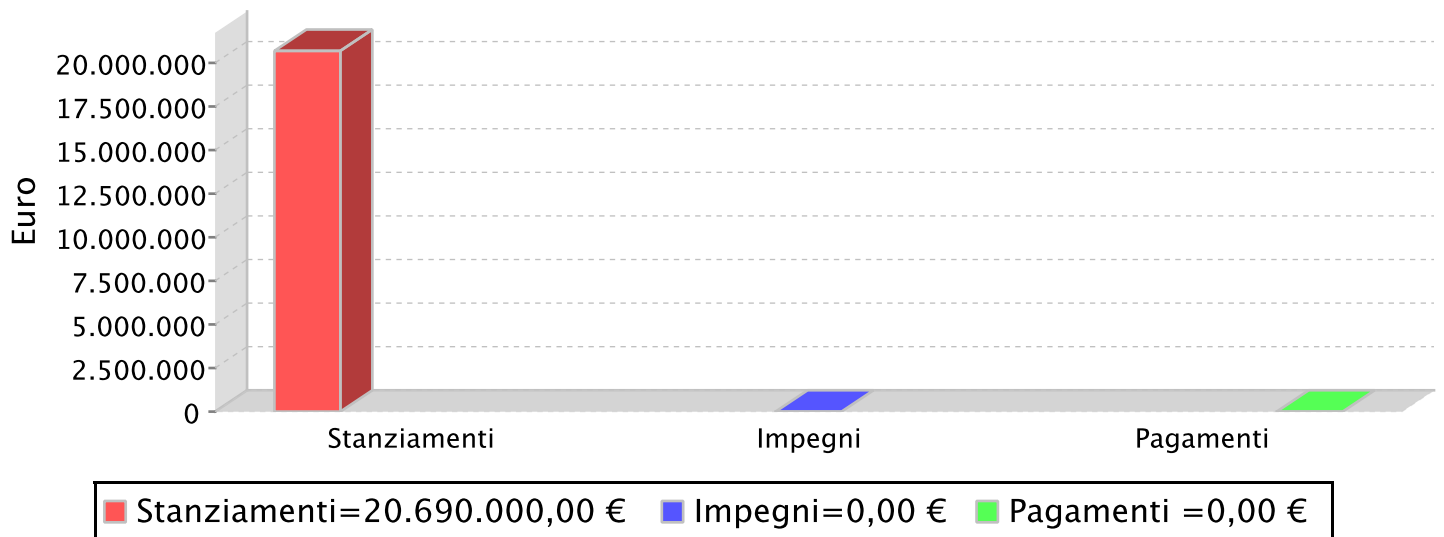


Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

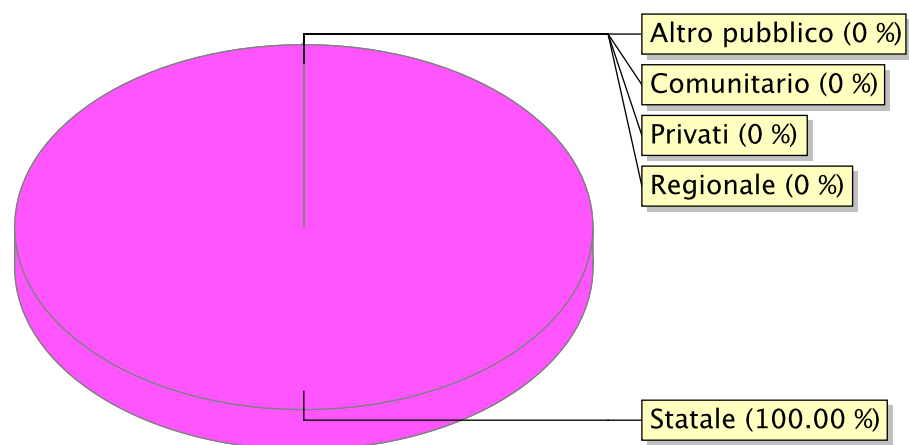

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 20.690.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

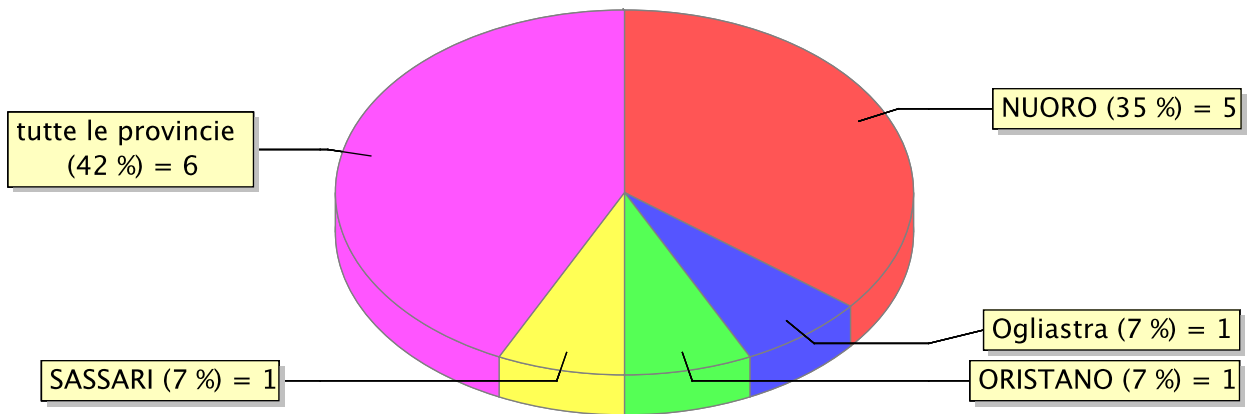

● NUORO (35 %) = 5 ● Ogliastro (7 %) = 1 ● ORISTANO (7 %) = 1 ● SASSARI (7 %) = 1
● tutte le provincie (42 %) = 6

Report del progetto: DF51 - Rio Posada - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Maccheronis - 2? Stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Posada
2) NUORO	Torpe'

Soggetto Attuatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE


Responsabile dell'intervento

Direttore del Servizio Difesa del Suolo . Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

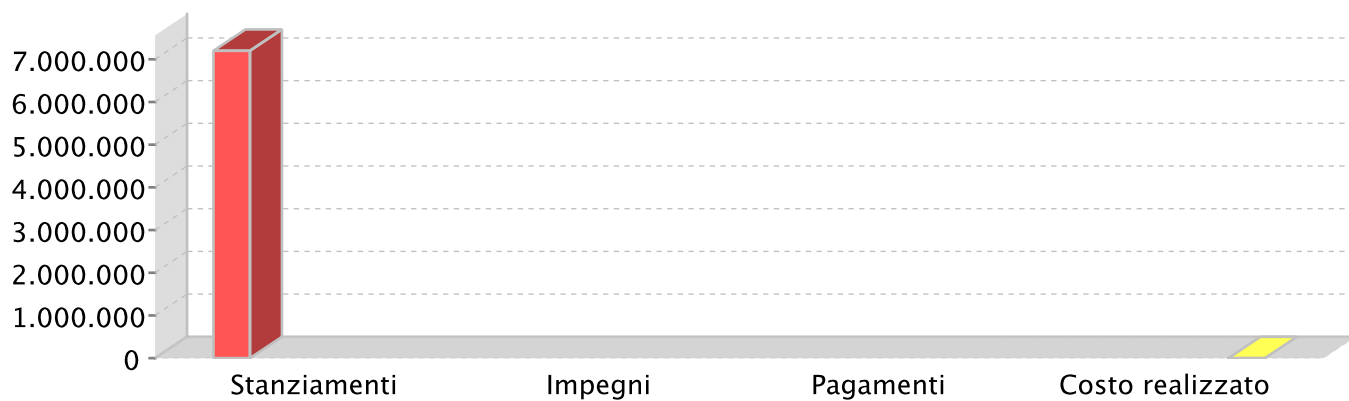

■ Stanziamenti=7.200.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF52 - Rio Cedrino - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e'Othoni - 2?

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Galtelli
2) NUORO	Irgoli
3) NUORO	Loculi
4) NUORO	Onifai
5) NUORO	Orosei

Soggetto Attuatore

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE


Responsabile dell'intervento

Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

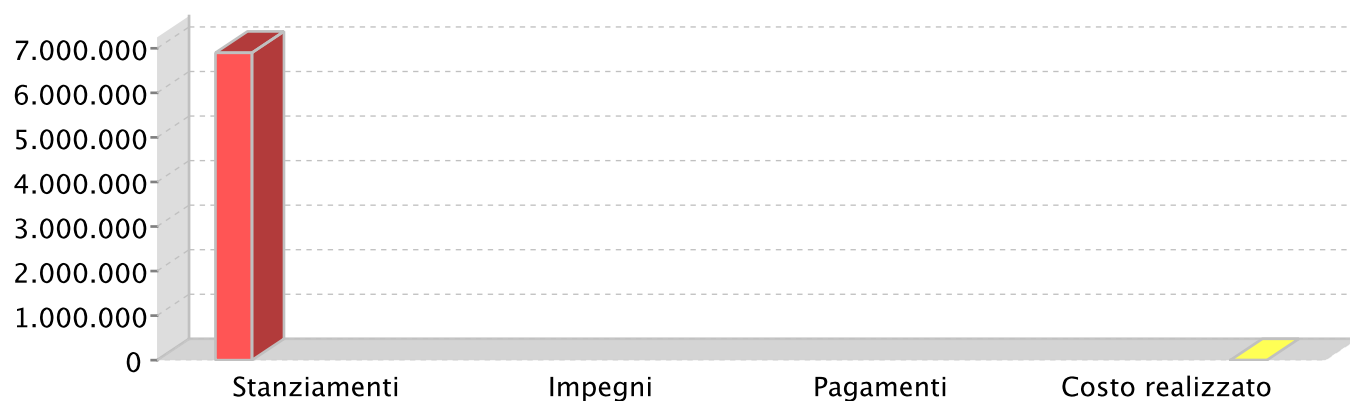

■ Stanziamenti=6.900.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF53 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Bosa

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento


Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

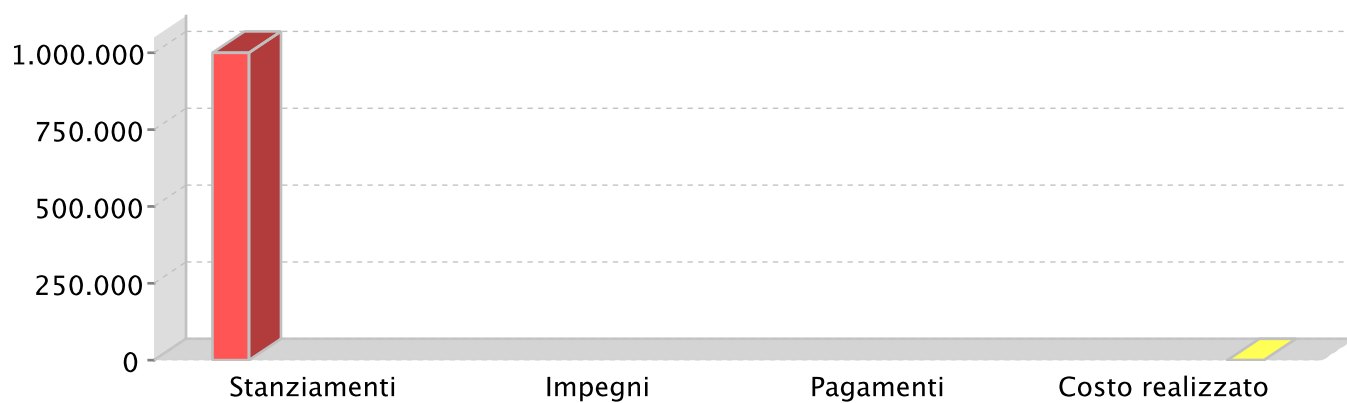

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF54 - Interventi di sistemazione idraulica del rio Siniscola

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Siniscola

Soggetto Attuatore

Comune di Siniscola (NU)

Responsabile dell'intervento


Responsabile del settore tecnico del Comune di Siniscola

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

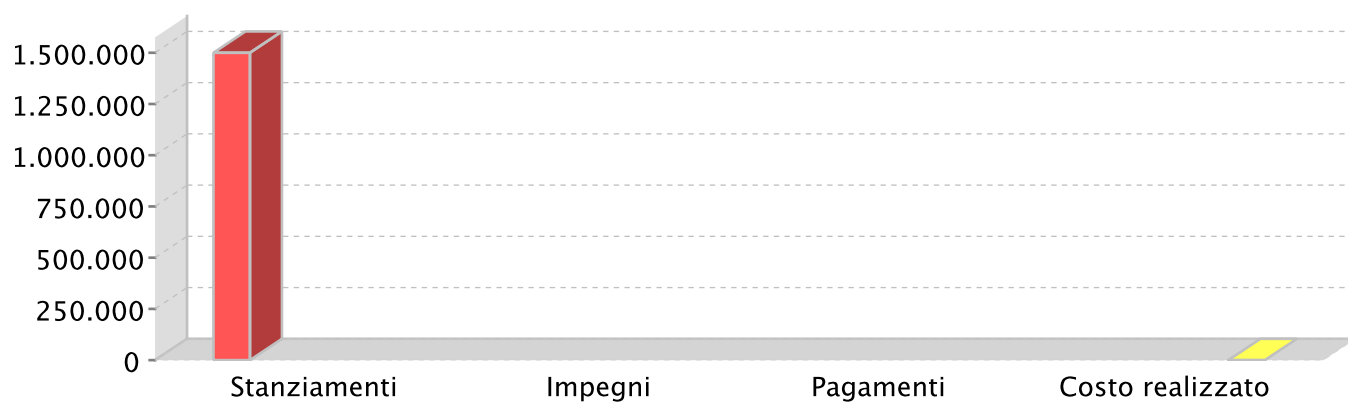

■ Stanziamenti=1.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF55 - Rio Pramaera. Interventi di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica a valle del

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Lotzorai

Soggetto Attuatore

Comune di Lotzorai (NU)


Responsabile dell'intervento

Responsabile settore tecnico del Comune di Lotzorai

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

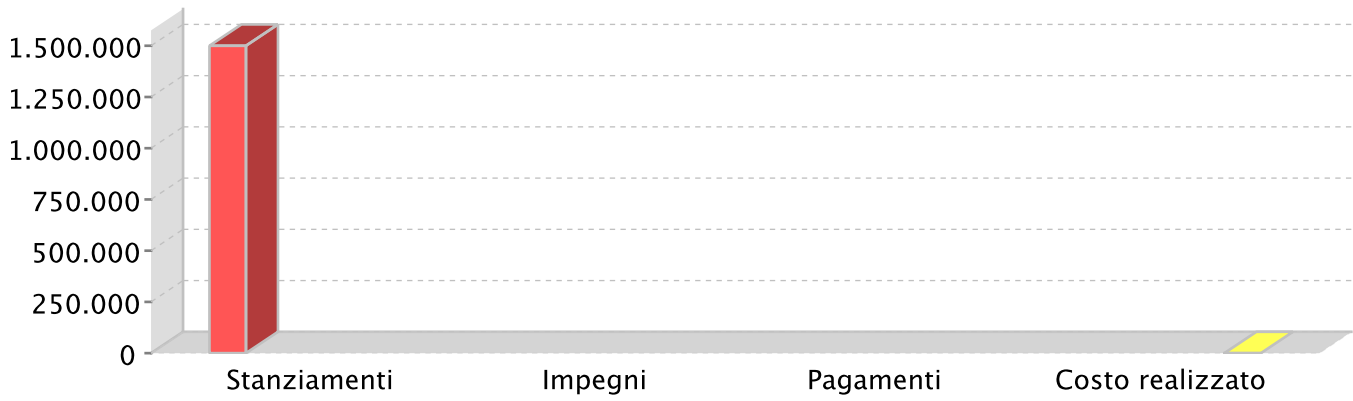

■ Stanziamenti=1.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF56 - Completamento opere di consolidamento in ambito urbano

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)

Responsabile dell'intervento


responsabile del settore tecnico del Comune di Nuoro

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

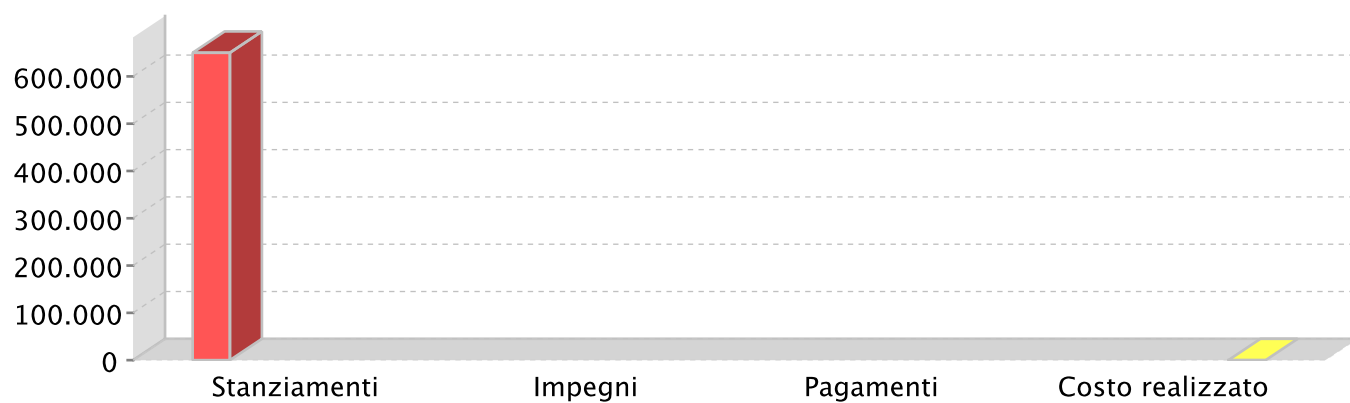

■ Stanziamenti=650.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF59 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=34.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF57 - Opere di consolidamento dei versanti strada Donnortei - Bruncu Spina

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Fonni

Soggetto Attuatore

Comune di Fonni (NU)


Responsabile dell'intervento

responsabile del settore tecnico del Comune di Fonni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

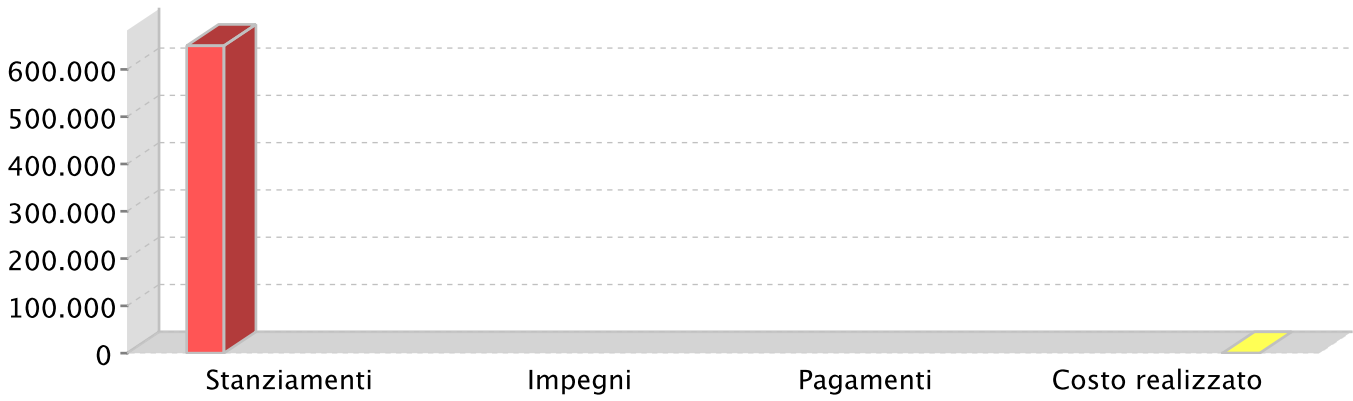

■ Stanziamenti=650.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF58 - Consolidamento versanti prospicienti la SP n? 112 tra il Km 3+000 e il Km 4+000

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Illorai

Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari


Responsabile dell'intervento

responsabile del settore tecnico della Provincia di Sassari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

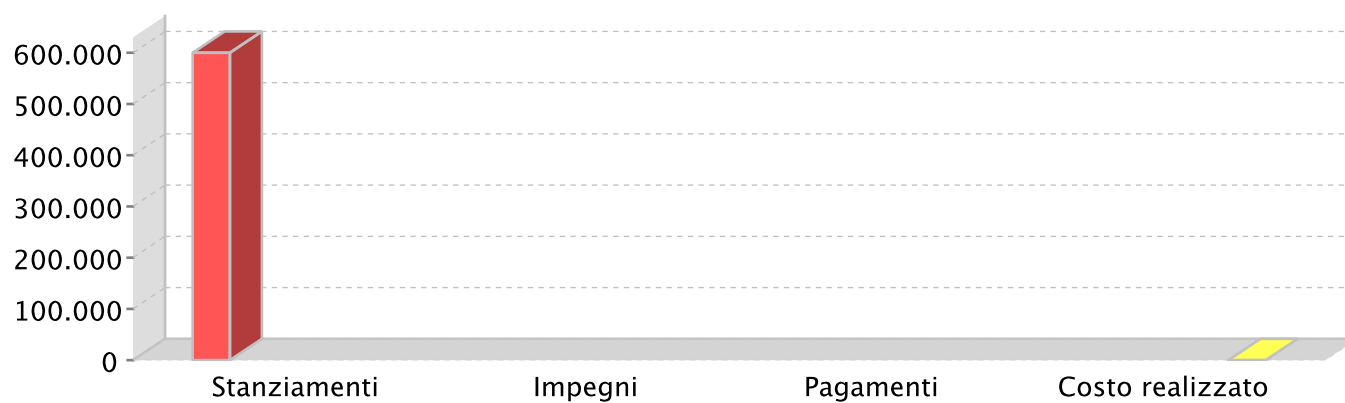

■ Stanziamenti=600.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF60 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento


Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

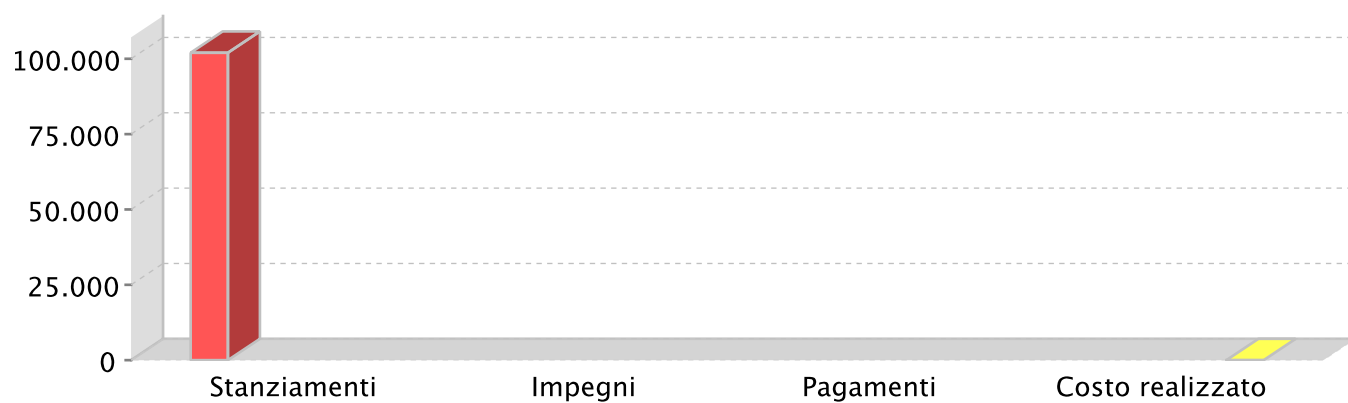

■ Stanziamenti=102.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF61 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento


Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

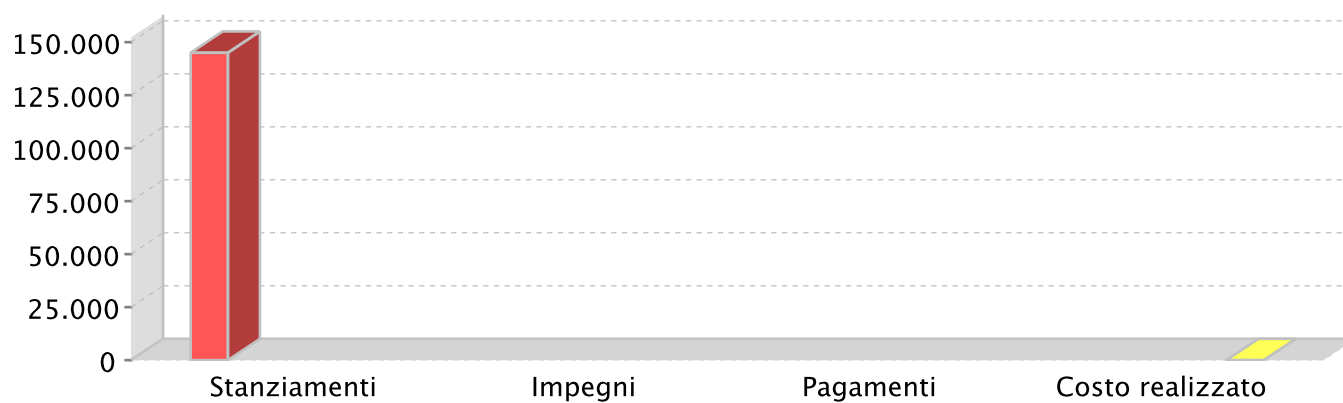

■ Stanziamenti=145.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF62 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

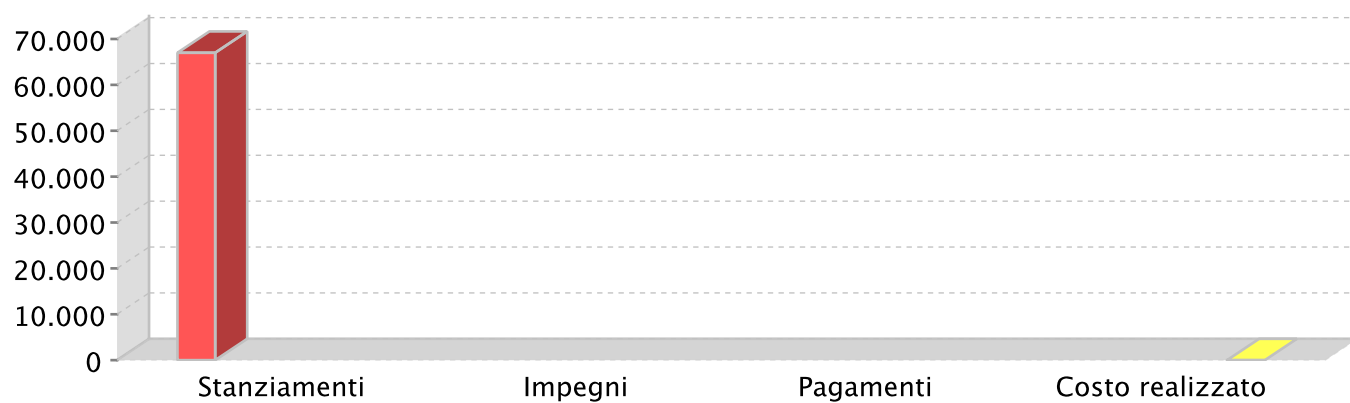

■ Stanziamenti=67.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF63 - Predisposizione della progettazione preliminare, previa analisi e ricognizione delle esigenze residue, degli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

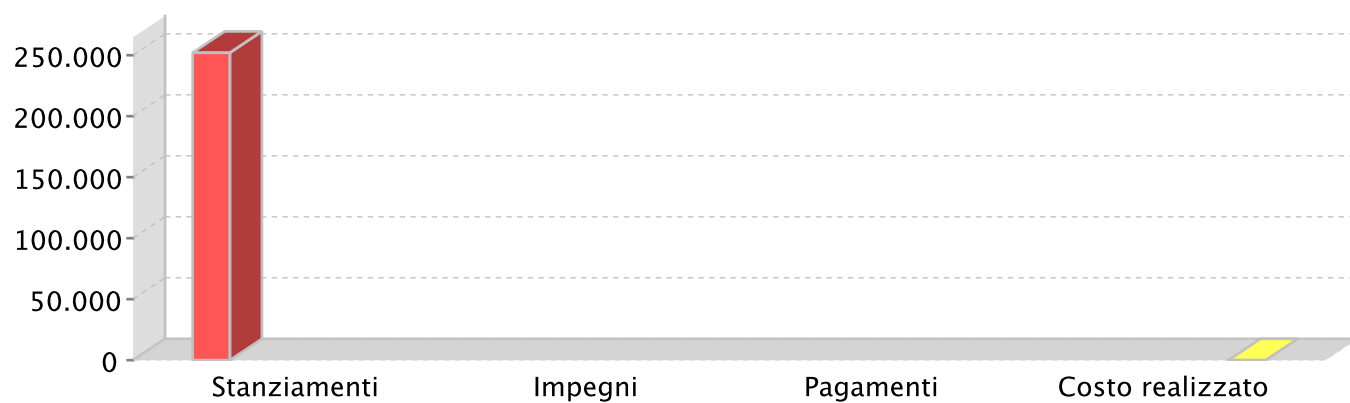

■ Stanziamenti=252.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF65 - Attività preparatorie e di approfondimento delle conoscenze ed esperienze in materia di difesa dei litorali

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo III Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Direttore Servizio Difesa del Suolo - Assessorato dei LL.PP.

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

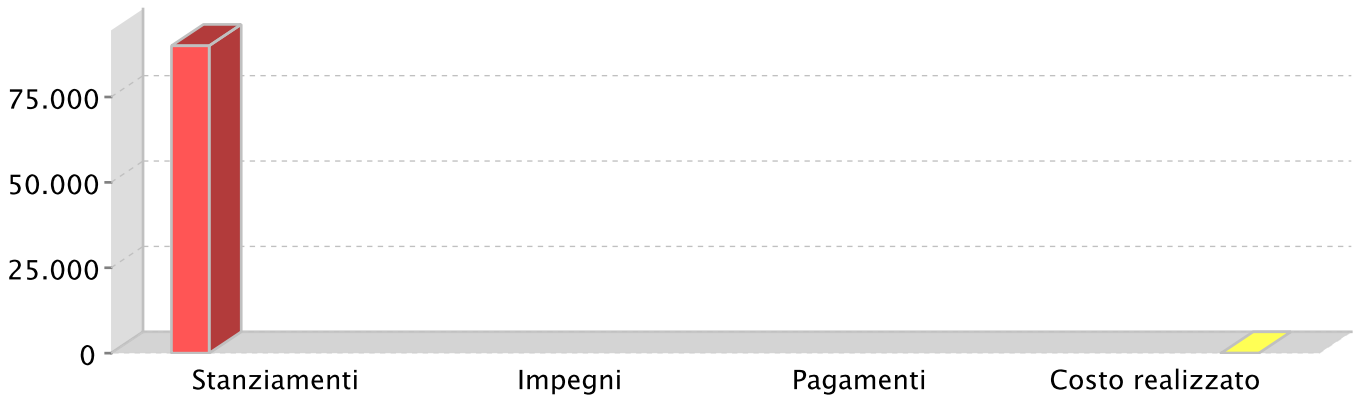

■ Stanziamenti=90.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
