



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Mobilità - III Atto integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

23

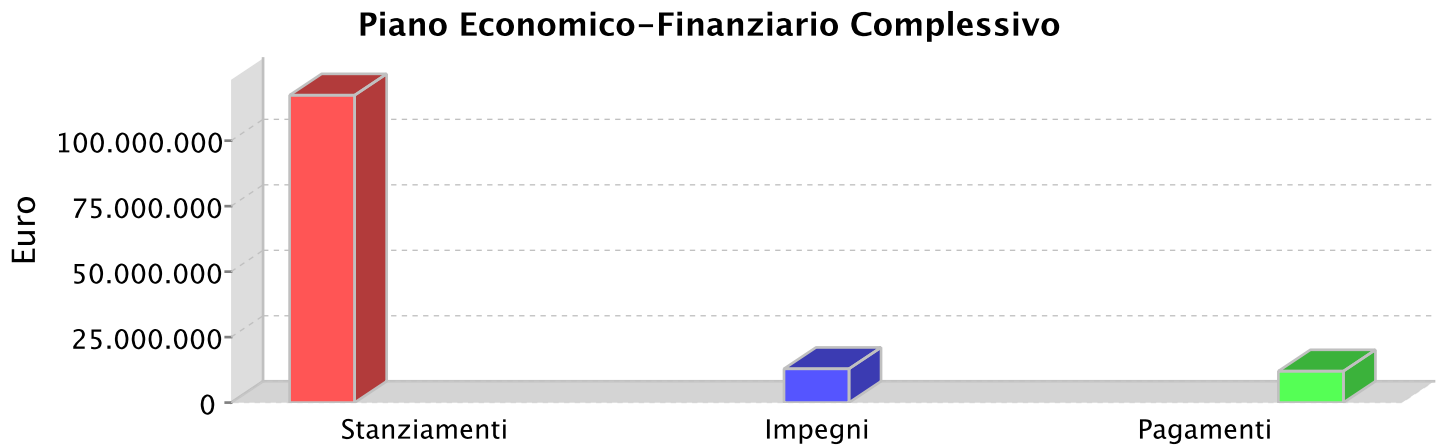


■ Stanziamenti=117.365.613,98 € ■ Impegni=12.915.804,00 €
■ Pagamenti =12.011.763,00 €

Avanzamento impegni: 11.01 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 10.24 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

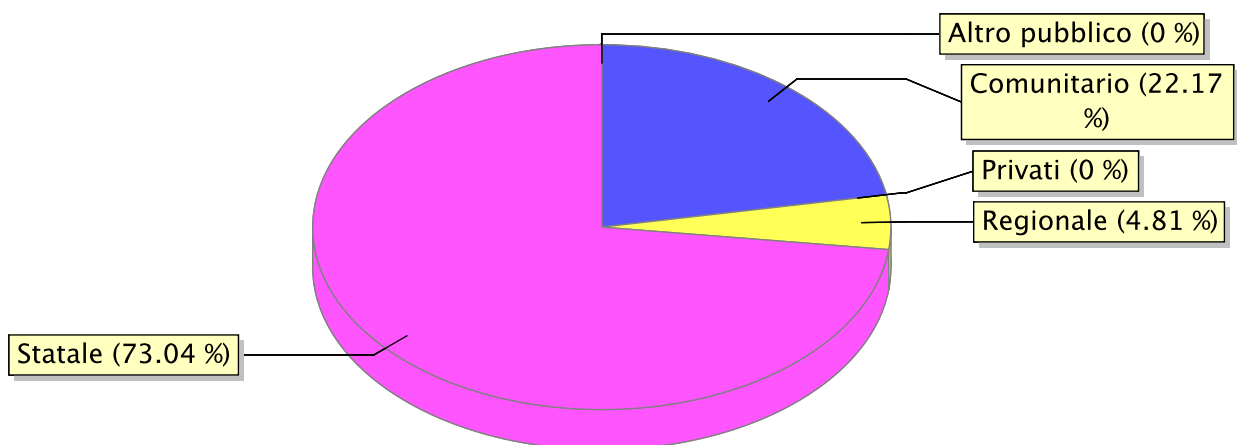

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 26.012.230 ● Privati = 0
● Regionale = 5.633.663,98 ● Statale = 85.719.720

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

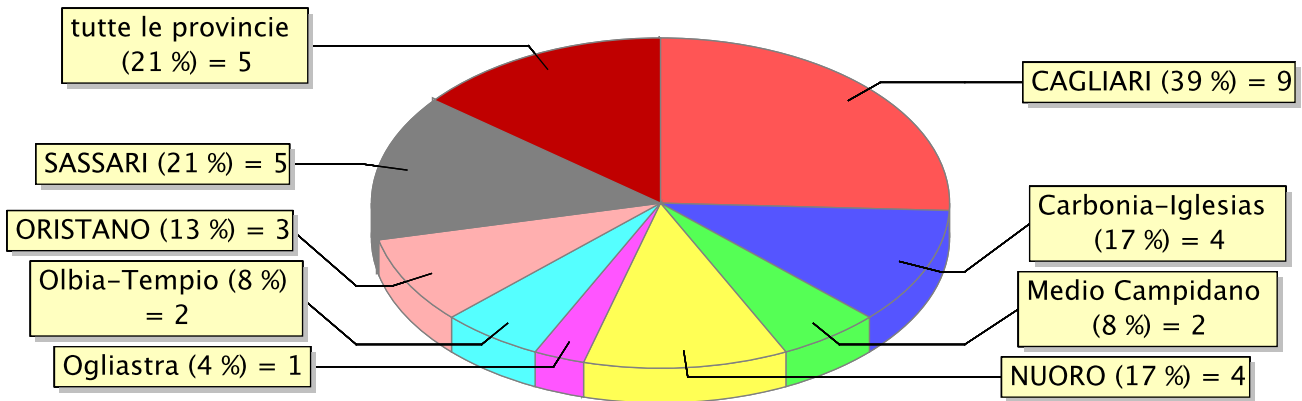

● CAGLIARI (39 %) = 9 ● Carbonia-Iglesias (17 %) = 4 ● Medio Campidano (8 %) = 2
● NUORO (17 %) = 4 ● Ogliastro (4 %) = 1 ● Olbia-Tempio (8 %) = 2
● ORISTANO (13 %) = 3 ● SASSARI (21 %) = 5 ● tutte le provincie (21 %) = 5

Report del progetto: RAS 10 - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - acquisto materiale rotabile - tipo "Minuetto"

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

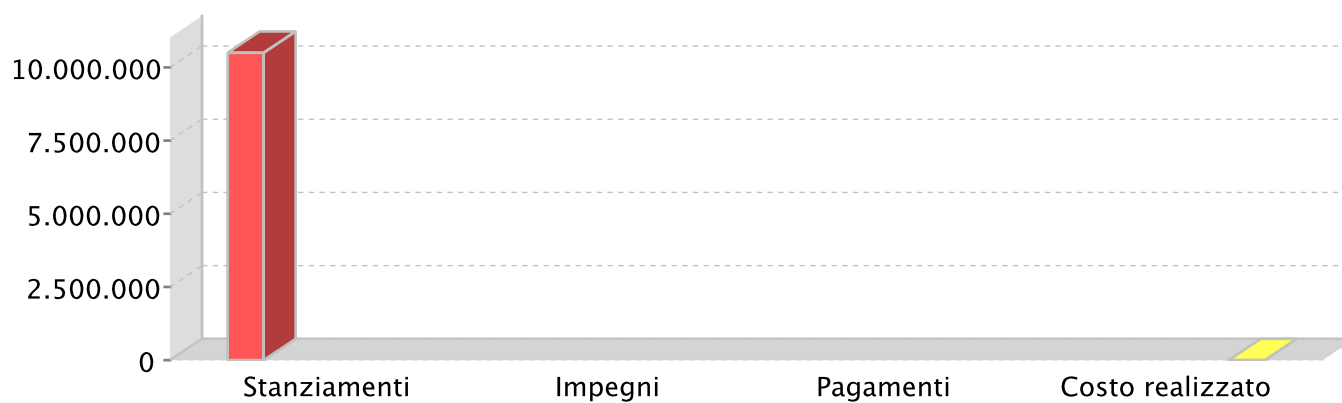

■ Stanziamenti=10.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/02 - Oristano - Centro Intermodale passeggeri + Stazione interscambio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	tutti i comuni
2) ORISTANO	Oristano

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

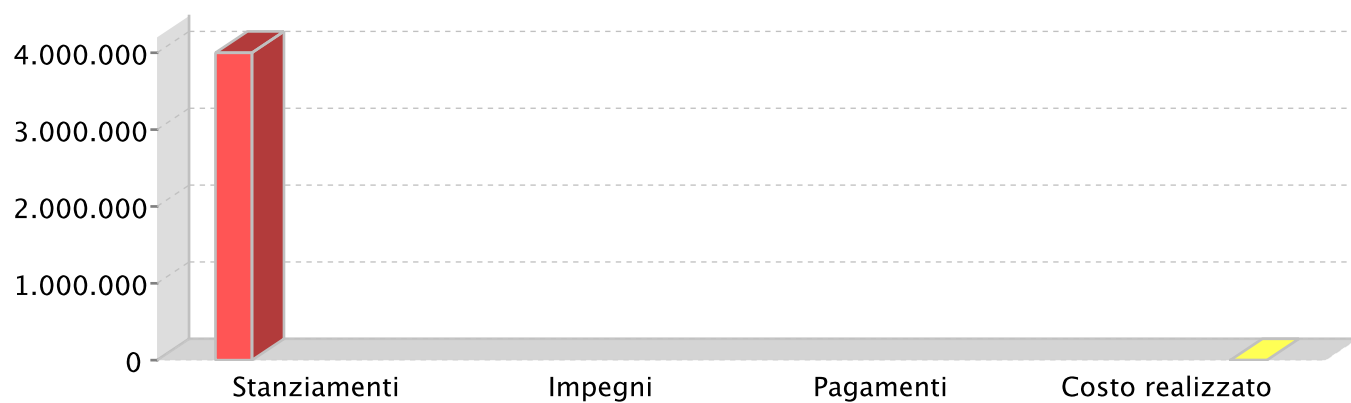

■ Stanziamenti=4.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/03 - Centro intermodale passeggeri - Macomer

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) NUORO	Macomer

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

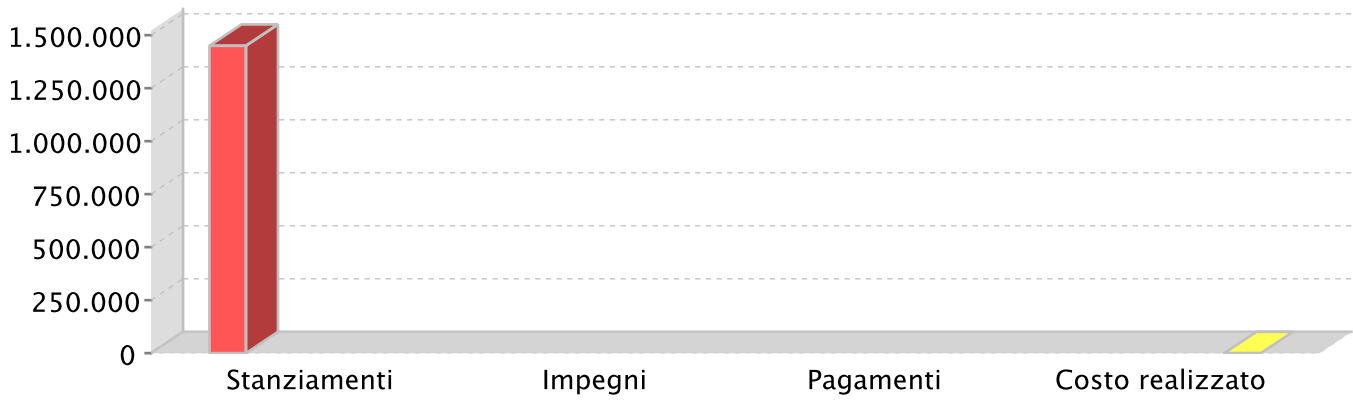

■ Stanziamenti=1.450.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/04 - Centro intermodale passeggeri Nuoro

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

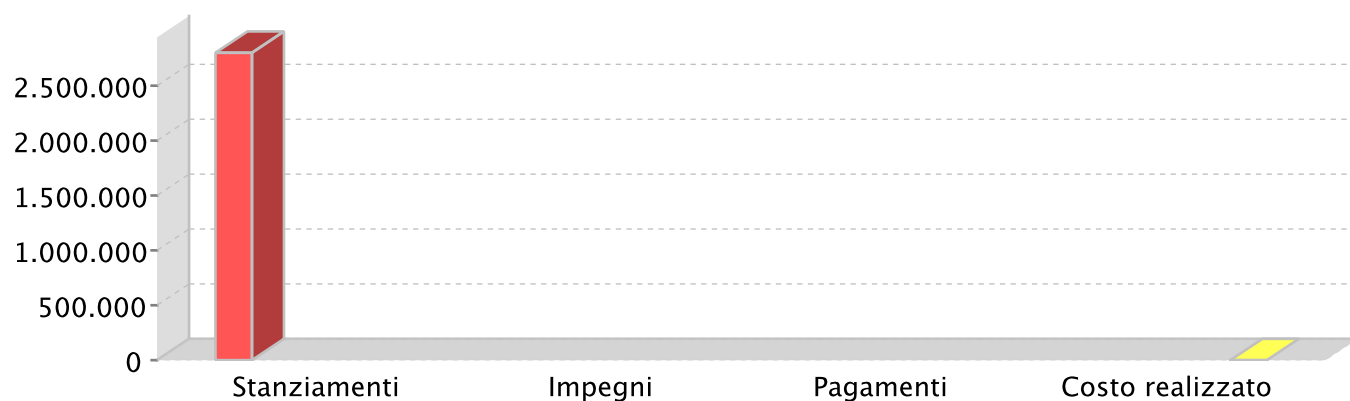

■ Stanziamenti=2.800.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/05 - Stazione di interscambio San Gavino Sanluri - Recupero e adeguamento stazione d'interscambio FdS

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) Medio Campidano	Sanluri

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

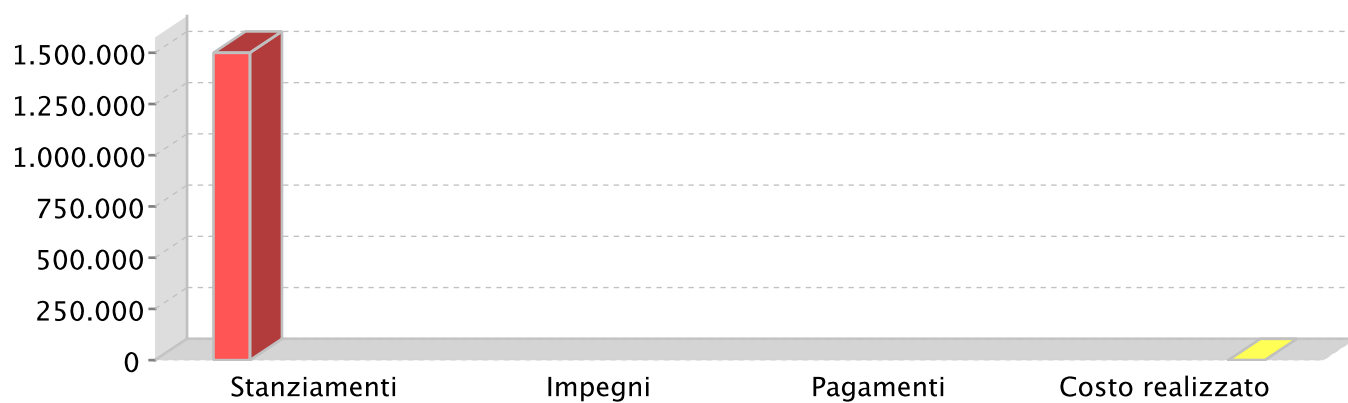

■ Stanziamenti=1.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/06 - Iglesias - Centro intermodale Passeggeri - 1? Lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) Carbonia-Iglesias	Iglesias

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

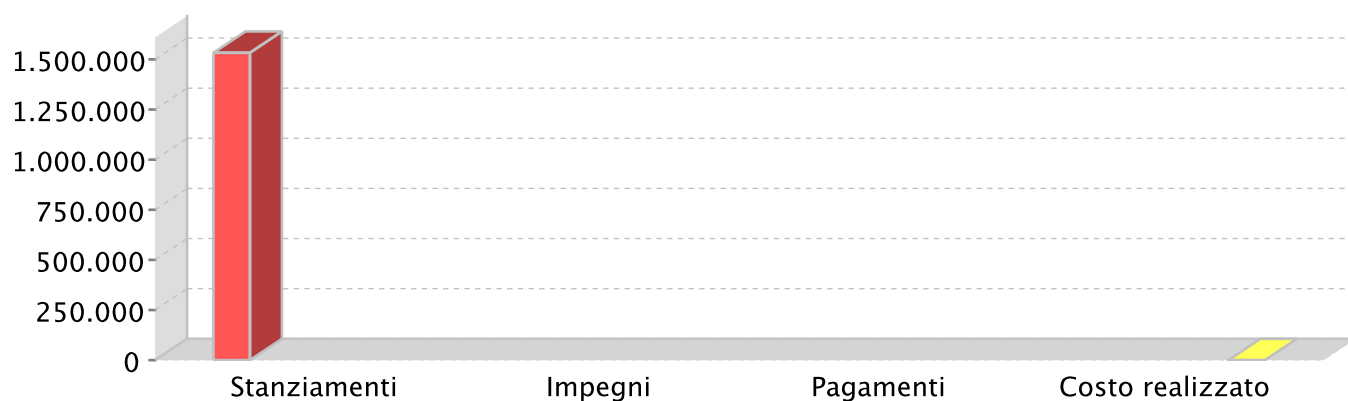

■ Stanziamenti=1.533.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/08 - Circonvallazione ferroviaria di Olbia - collegamento area industriale - Studio di fattibilita e adeguamento

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

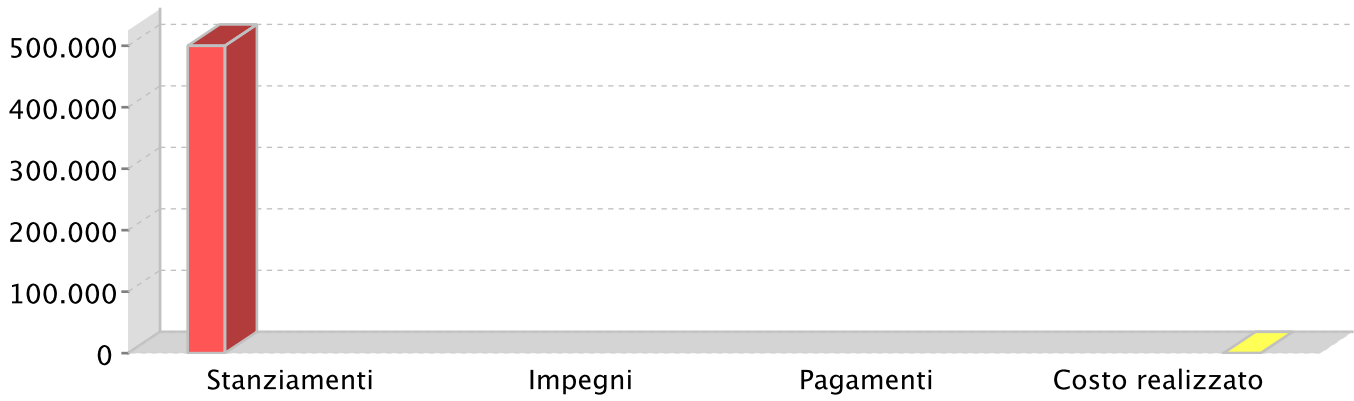

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/09a - Cagliari Elmas - Collegamento fermata RFI con Aeroporto - parte SO.G.AER S.p.A.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Elmas

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

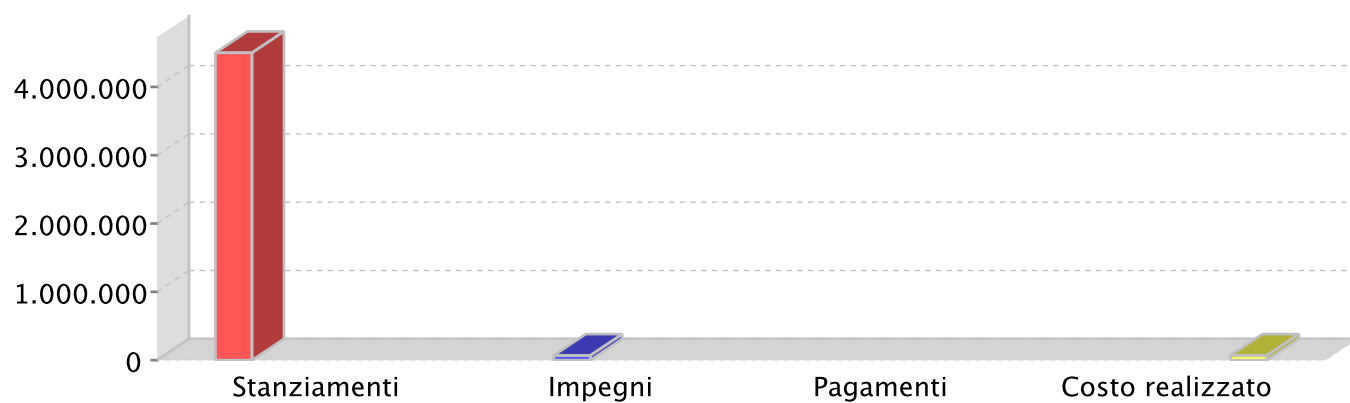

■ Stanziamenti=4.500.000,00 € ■ Impegni=69.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=69.000,00 €

Avanzamento impegni: 1.54 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.54 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/10 - Servizio metropolitana leggera su area vasta di Cagliari - Studio di fattibilita

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

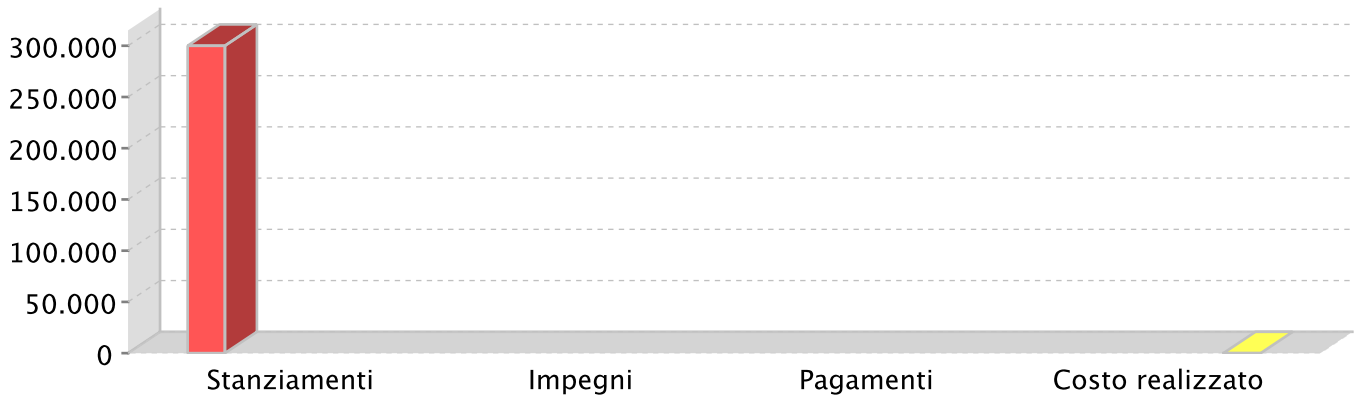

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/01 - Realizzazione del banchinamento per il secondo attracco per navi traghetto a ridosso del molo di levante del

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) Ogliastra	Tortoli'

Soggetto Attuatore

Consorzio Industriale Tortoli - Arbatax


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

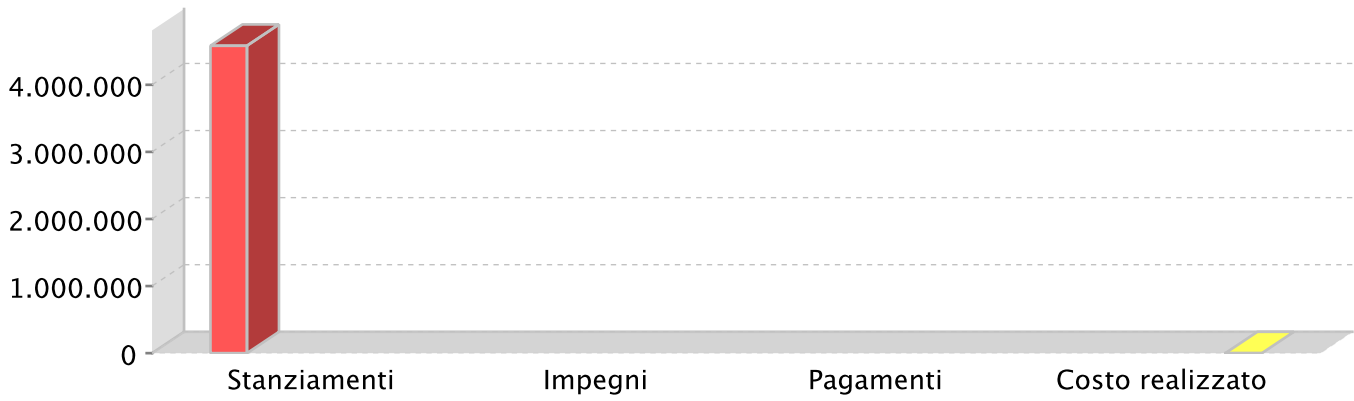

■ Stanziamenti=4.582.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/02 - Lavori di completamento del porto turistico di Porto Torres

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilità - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

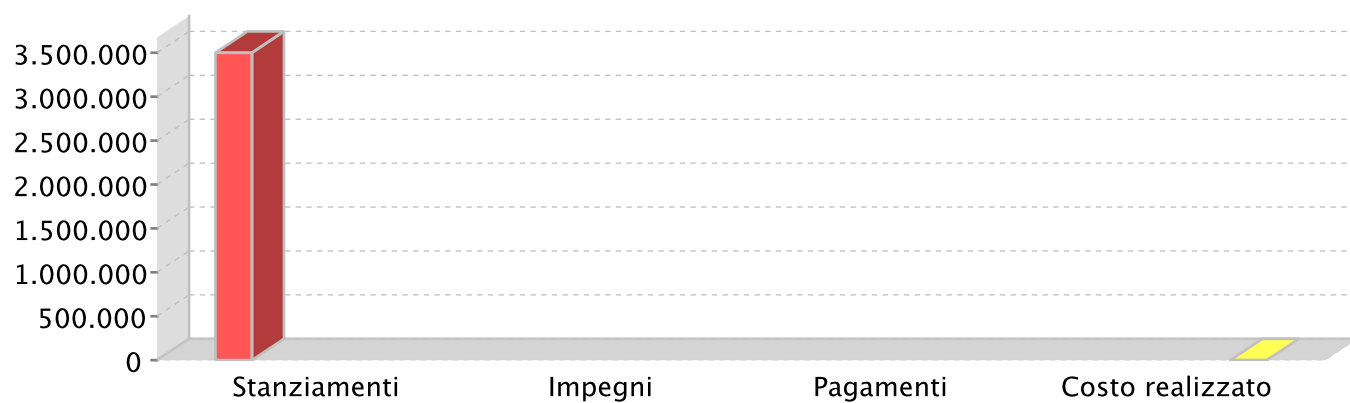

■ Stanziamenti=3.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/03 - Lavori di completamento dei banchinamenti interni del porto di Carloforte

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) Carbonia-Iglesias	Carloforte

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

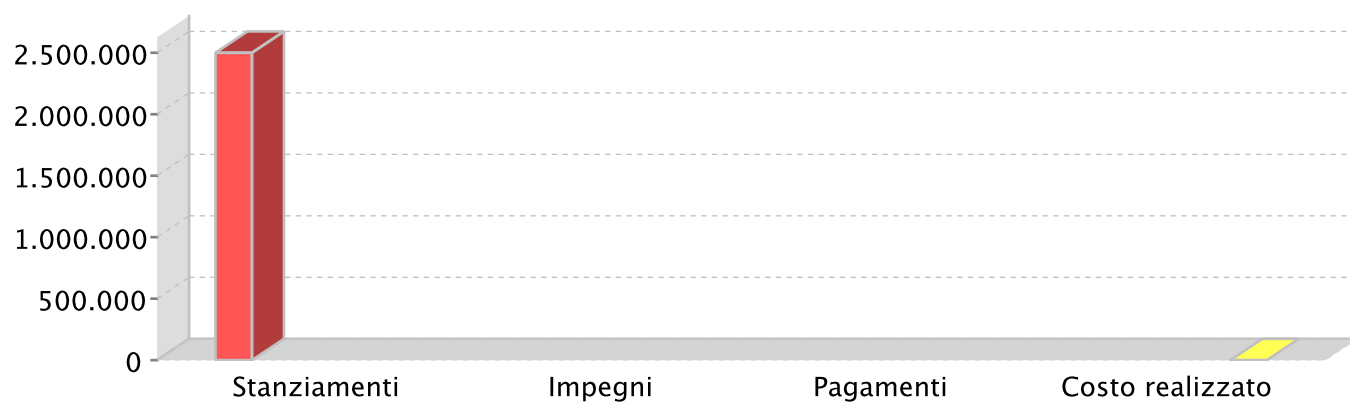

■ Stanziamenti=2.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/04 - Dragaggio sistema portuale del Basso Sulcis porti di S. Antioco - Portovesme - Carloforte - Calasetta Sarroch-

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) Carbonia-Iglesias	Carloforte
3) Carbonia-Iglesias	Portoscuso
4) Carbonia-Iglesias	Sant'Antioco

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

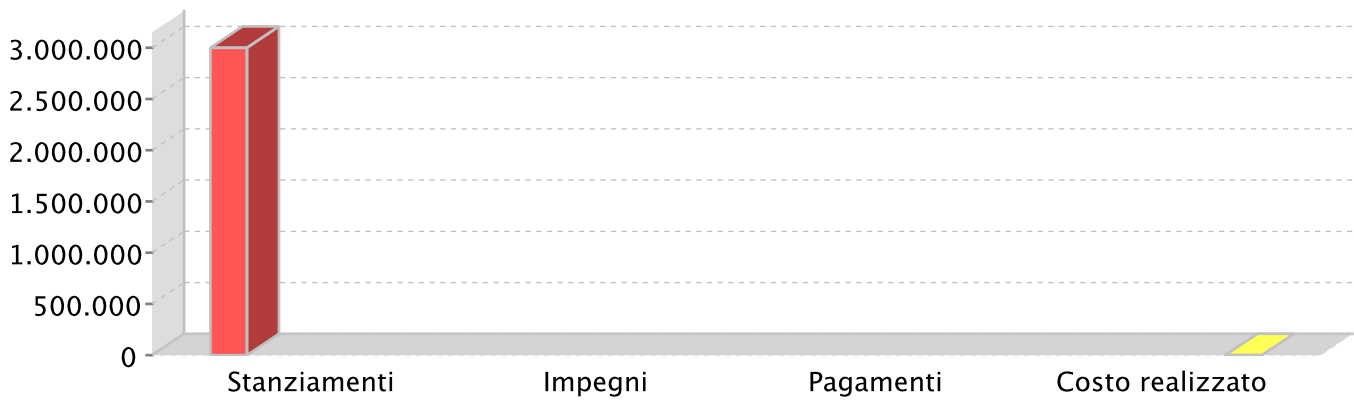

■ Stanziamenti=3.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/05 - Interventi per la messa in sicurezza secondo i parametri ISPS dei porti di Carloforte - Calasetta e

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) Carbonia-Iglesias	Calasetta
3) Carbonia-Iglesias	Carloforte
4) Carbonia-Iglesias	Portoscuso

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

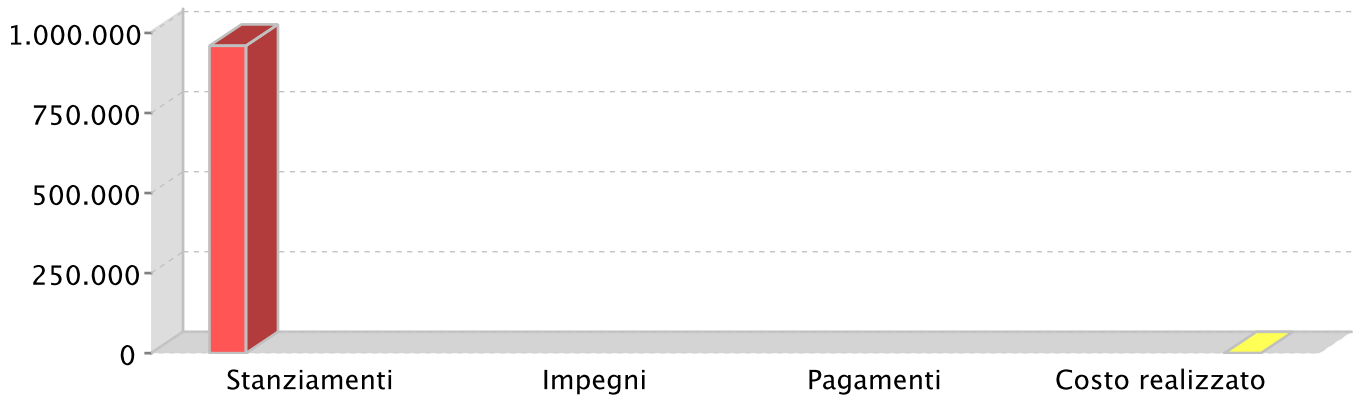

■ Stanziamenti=960.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/06 - Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala Mangiavolpe a La Maddalena

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) Olbia-Tempio	La Maddalena

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

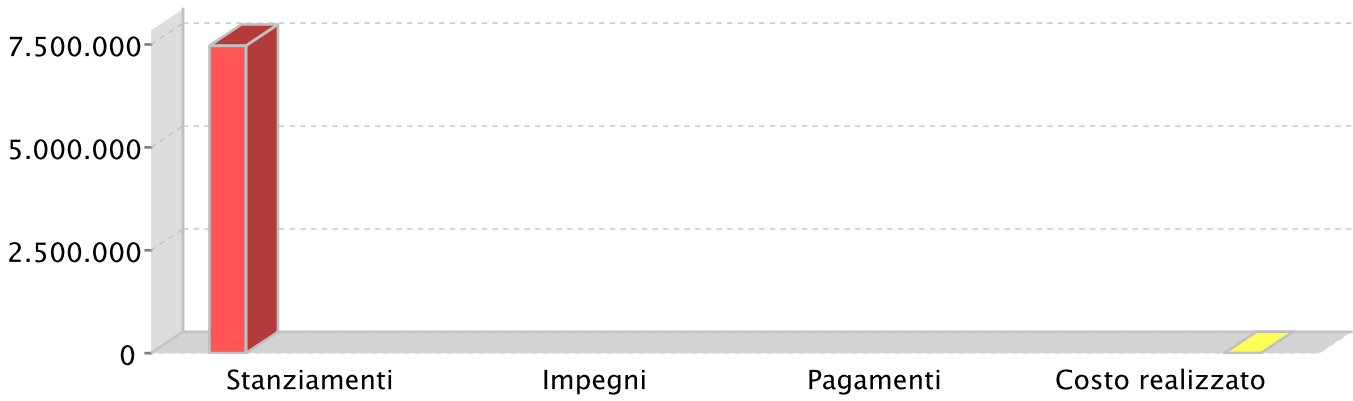

■ Stanziamenti=7.468.663,98 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: LLPP/07 - Studio di fattibilita sul completamento della rete portuale turistica isolana con riferimento ai quadranti Nord-

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

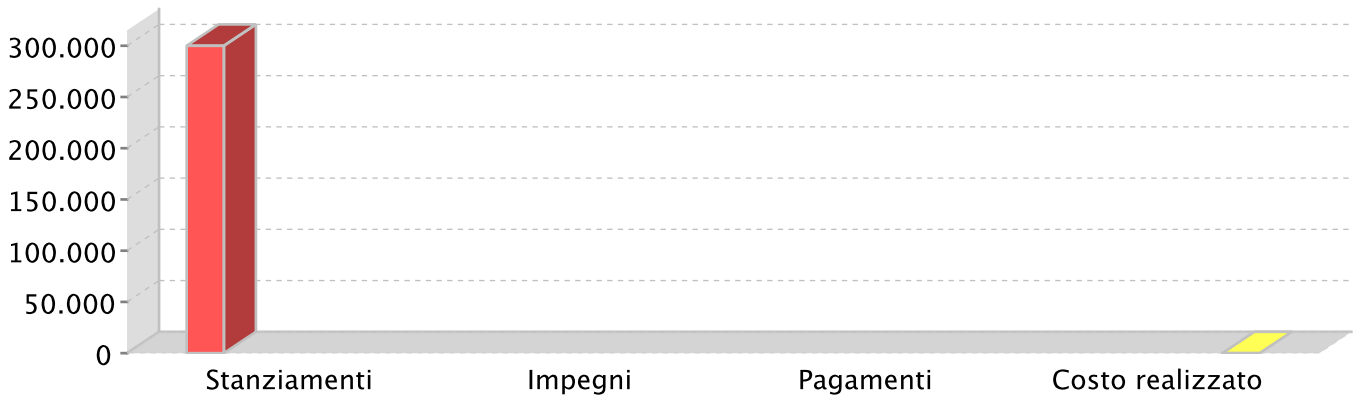

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/01b - Miglioramento dell'accessibilita alle localita di servizio nella tratta ferroviaria Sassari e Porto Torres

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) SASSARI	Porto Torres
3) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

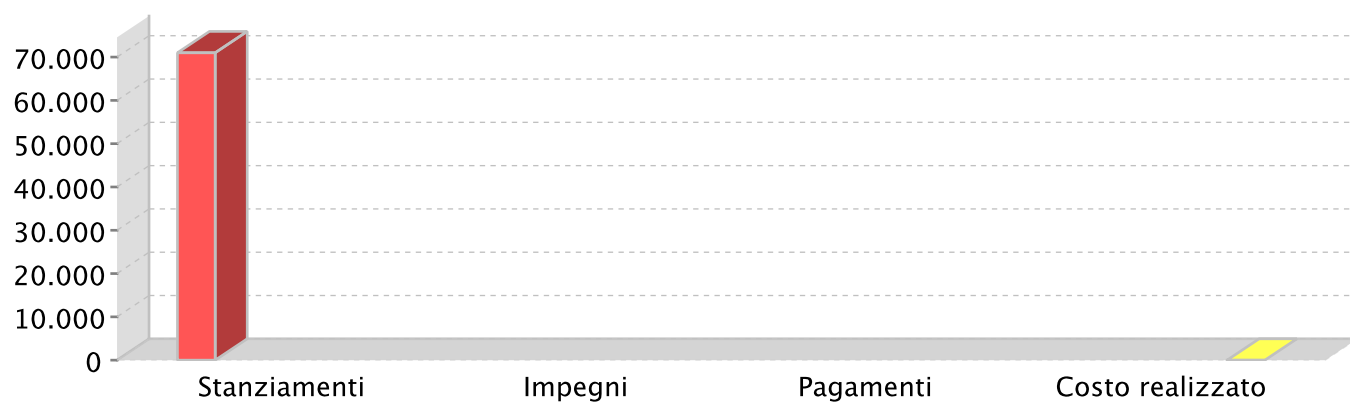

■ Stanziamenti=71.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/09b - Realizzazione fermata RFI - Aeroporto di Elmas - parte R.F.I.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Elmas

Soggetto Attuatore

RFI S.p.a.


Responsabile dell'intervento

RFI S.p.A.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

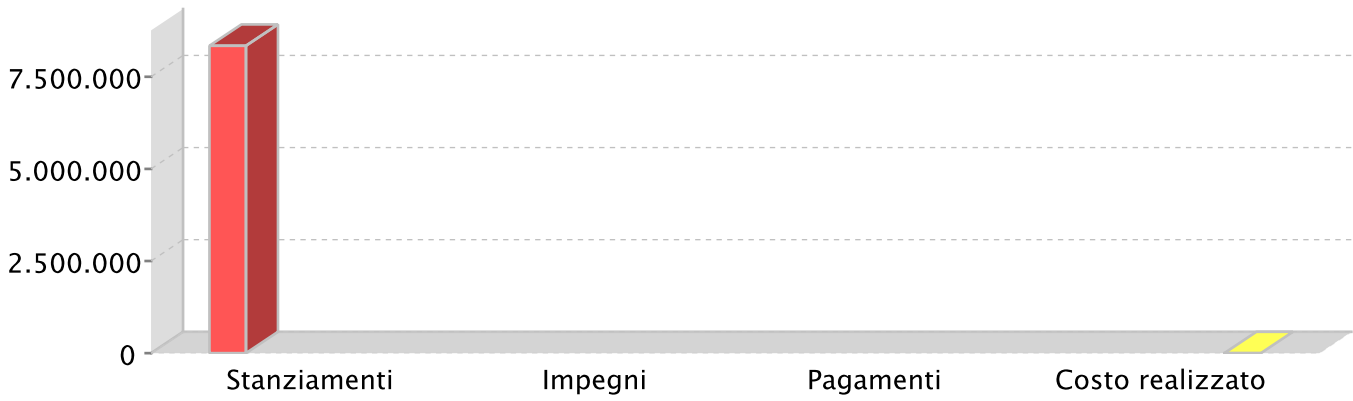

■ Stanziamenti=8.341.804,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI-06 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Trenitalia S.p.A.


Responsabile dell'intervento

Trenitalia S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

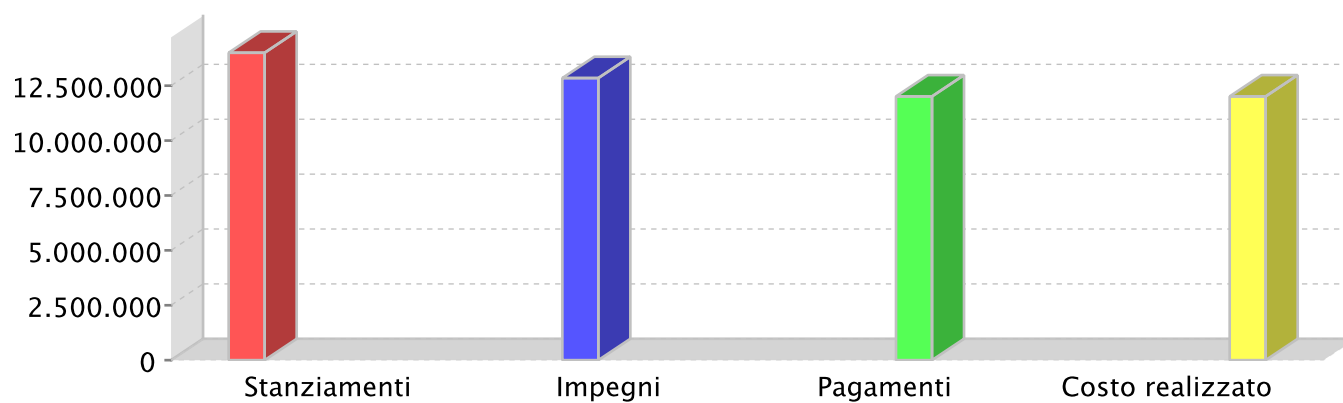

■ Stanziamenti=14.000.000,00 € ■ Impegni=12.846.804,00 €
■ Pagamenti=12.011.763,00 € ■ Costo realizzato=12.011.763,00 €

Avanzamento impegni: 91.77 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 85.80 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 85.80 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI-07 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura di Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Trenitalia S.p.A.


Responsabile dell'intervento

Trenitalia S.p.A.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

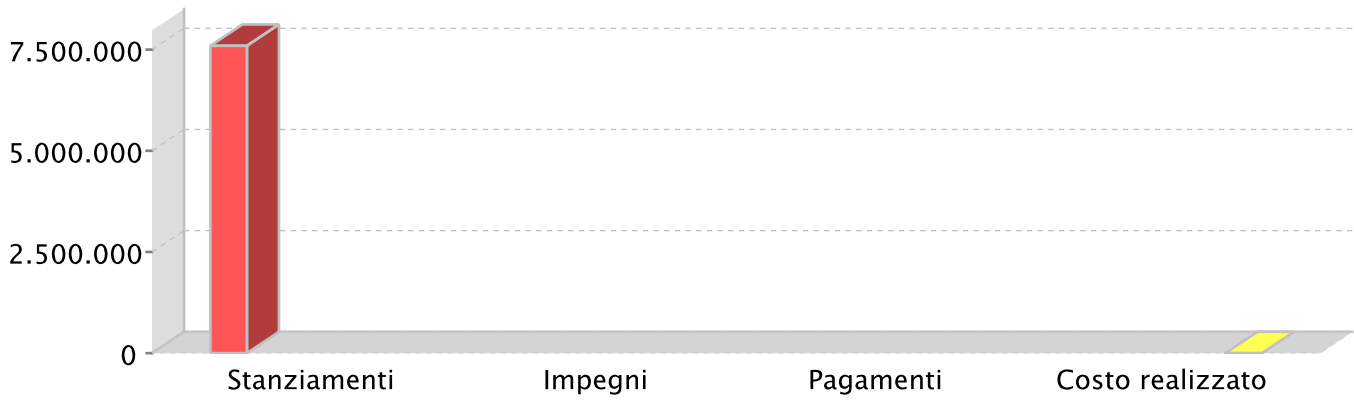

■ Stanziamenti=7.595.488,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI-08 - Soppressione passaggi a livello

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) SASSARI	Torralba
3) NUORO	Borore
4) ORISTANO	Bauladu
5) ORISTANO	Norbello
6) ORISTANO	Solarussa

Soggetto Attuatore

RFI S.p.a.


Responsabile dell'intervento

RFI S.p.A.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

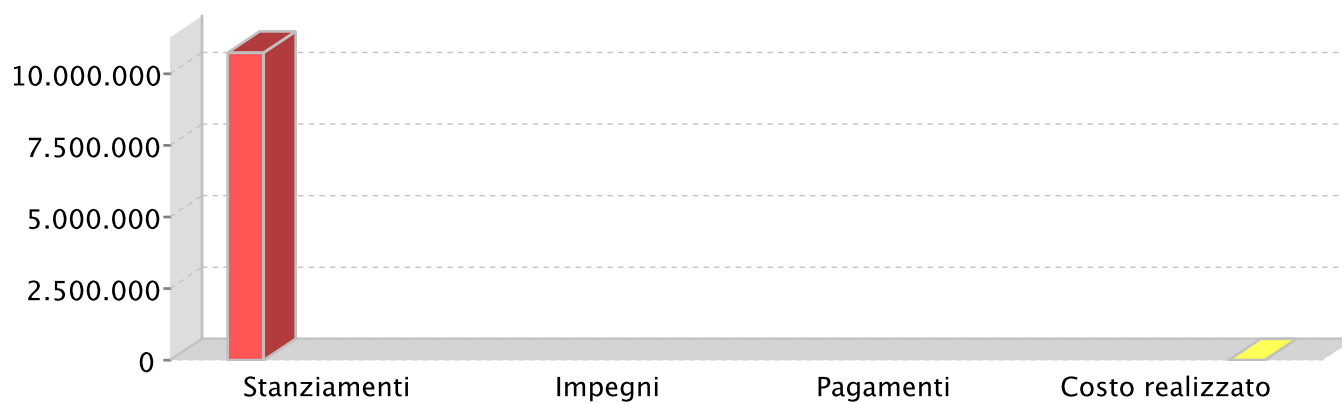

■ Stanziamenti=10.735.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI-09 - Ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria (FF.S.) Cagliari - Oristano

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni
2) ORISTANO	Marrubiu
3) ORISTANO	Oristano
4) ORISTANO	Uras
5) Medio Campidano	Pabillonis
6) Medio Campidano	San Gavino Monreale

Soggetto Attuatore

RFI S.p.a.


Responsabile dell'intervento

RFI S.p.A.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

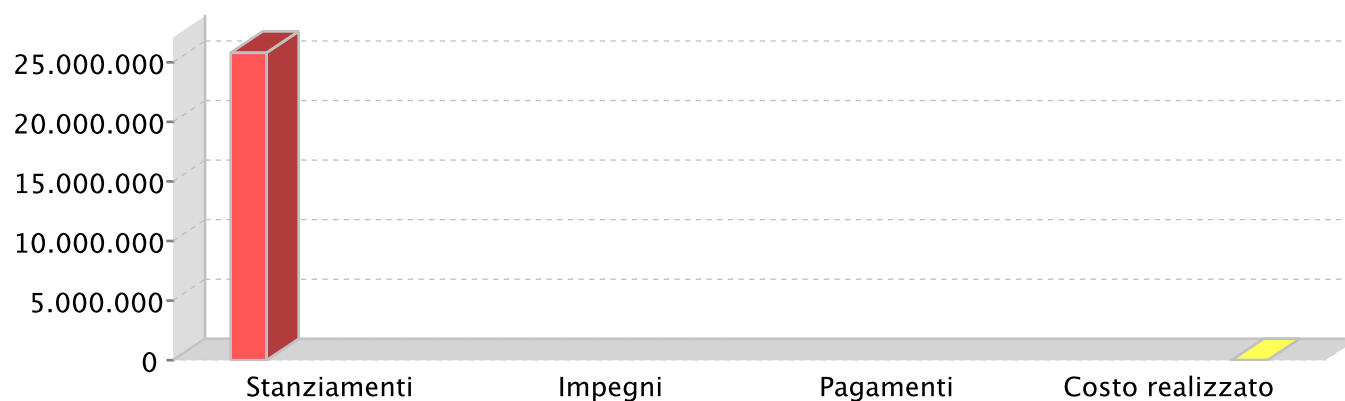

■ Stanziamenti=25.800.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: CIPE35/07a - Collegamento aeroporto di Alghero linea Fds Alghero-Sassari - progettazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita - III Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero
2) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

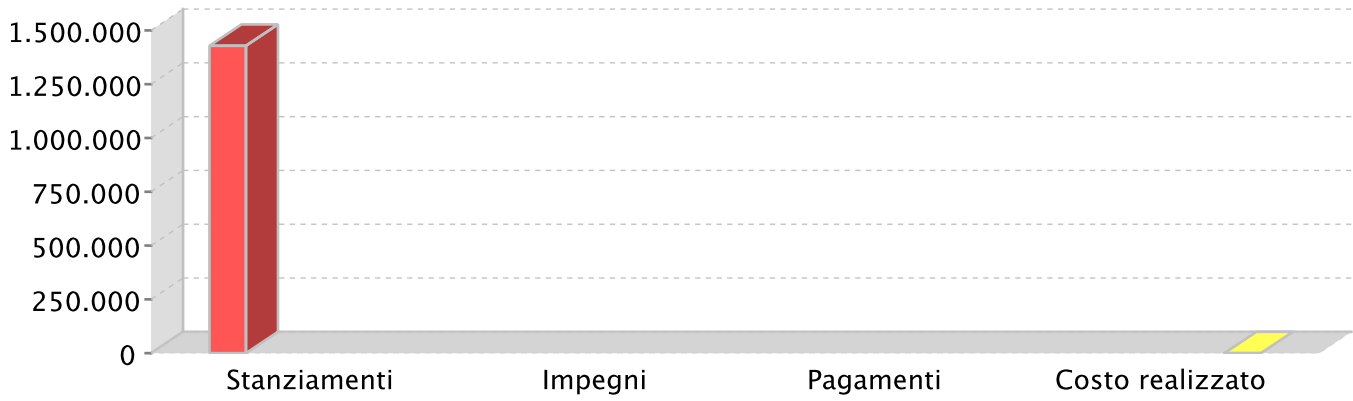

■ Stanziamenti=1.428.658,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
