



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **10 - APQ Sviluppo Locale**

**Presidenza della Regione**

**Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006**



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

10 - Sviluppo Locale

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	<b>APQ Originario</b>
1	1 - PTCA02 - Strade di lottizzazione complete di rete idrica nella zona industriale di Macchiareddu – Assemini, Uta
2	2 - PTCA03 - Prolungamento della via 1° maggio - collegamento campo da golf - Settimo San Pietro
3	3 - PTCA04-a - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" centro servizi per le imprese - 1° lotto – Sinnai
4	4 - PTCA04-b - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" centro servizi per le imprese - 2° lotto – Sopraelevazione - Sinnai
5	5 - PTCA04-c - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" - 3° lotto realizzazione tappeto d'usura sovrastruttura stradale – Sinnai
6	6 - PTCA06 - Opere di urbanizzazione primaria - Località Is Trincas – Cagliari
7	7 - PTGAV01 - Recupero e riutilizzo ad uso industriale delle acque depurate dell'impianto di depurazione consortile – Villacidro
8	8 - PTGAV02 - Realizzazione di un rustico industriale all'interno dell'agglomerato consortile – Villacidro
9	9 - PTGAV03 - Infrastrutturazione di un comparto per insediamenti commerciali a servizio degli insediamenti produttivi esistenti – Villacidro
10	10 - PTGAV04 - Realizzazione e completamento opere urbanizzazione Montevecchio – Guspini
11	11 - PTGAV05 - Completamento opere urbanizzazione PIP – Guspini
12	12 - PTGAV06new - Adeguamento e allestimento del Sistema Museale di Archeologia Mineraria di Montevecchio - Guspini
13	13 - PTGAV07 - Realizzazione centro artigianato artistico nel cantiere Sciria dell'ex miniera di Montevecchio - Guspini
14	14 - PTMC01 - Urbanizzazione area per insediamenti produttivi - Senorbì
15	15 - PTMC02 - Ampliamento, adeguamento e completamento della rete stradale a servizio dell'area industriale dei Comuni di Nuraminis e Samatzai
16	16 - PTMC03 - Realizzazione opere di riqualificazione urbana nel centro storico – Suelli
17	17 - PTMC04-a - Opere di urbanizzazione primaria e centro servizi – Ortacesus
18	18 - PTMC04-b - Completamento centro turistico sportivo e copertura canale - Ortacesus
19	19 - PTMC04-c - Arredi centro sportivo localizzazione – Ortacesus
20	20 - PTMC04-d - Arredi e apparecchiature centro servizi - Ortacesus
21	21 - PTMC05 - Strada di circonvallazione – Segariu



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
22	22 - PTMC06 - Centro polivalente sportivo ricreativo e turistico nel parco geobotanico – Lunamatrona
23	23 - PTMC07 - Realizzazione di un centro polifunzionale organizzativo d'impresa – Sanluri
24	24 - PTMC08 - Oasi turistico naturalistica - Collinas, Ussaramanna
25	25 - PTSG1-a - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di collegamento - 1° lotto – Silius
26	26 - PTSG1-b - Completamento opere di urbanizzazione e viabilità di collegamento del piano PIP - 2° lotto – Silius
27	27 - PTTA01new - Sistemazione strada comunale di collegamento tra l'abitato urbano di Masullas e la SS 442 Uras Sirirs – Masullas
28	28 - PVBS01 - Miglioramento e potenziamento viabilità rurale e manutenzione strada comunale Tanca Manna – Teulada
29	29 - PVBS02 - Interventi di riqualificazione urbana a fini turistici – 2° lotto funzionale – Masainas
30	30 - PVBS03 - Sistemazione Strada Magai Lago Di Montepranu - Villaperuccio
31	31 - PVBS04 - Sistemazione strada comunale incrocio 195 Chiesa Santa Maria di Palmas – San Giovanni Suergiu
32	32 - PVBS05 - Sistemazione strada vicinale Matzaccara San Giovanni Suergiu
33	33 - PVBS06 - Realizzazione di un sistema di front-office e servizi di e-government con funzione di sportello unico territoriale - Sant'Antioco
34	34 - PVBS07 - Realizzazione approdo di sicurezza e di servizi per i pescatori in località "Il Disco" – Calasetta
35	35 - PVBS08 - Sistemazione strada vicinale S'Ergoi – Masainas
36	36 - PVBS09 - Realizzazione approdo pescherecci lungomare De Pompeis – Sant'Antioco
37	37 - PVBS10 - Condotta di irrigazione per i terreni limitrofi al Rio Cannedu - Narcao
38	38 - PVBS12 - Salvaguardia, riqualificazione e recupero canale località Porto Pino – 1° intervento funzionale – Sant'Anna Arresi
39	39 - PVG01 new - Lavori di ricondizionamento tratti di viabilità rurale - Mores
40	40 - PVG02-a - Centro servizi per l'agricoltura – 1° lotto "Ristrutturazione quartiere fieristico per l'agricoltura e la zootecnia" – Ozieri
41	41 - PVG02-b - Centro servizi per l'agricoltura – 2° lotto "Realizzazione di un centro" – Ozieri
42	42 - PVG03 - Sistemazione strada rurale Sa Serra - Nughedu di San Nicolò
43	43 - PVG04 - Ricerche sulla valorizzazione delle attività agrozootecniche nelle aree collinari del Goceano – Illorai
44	44 - PVG05 - Miglioramento sistema viario rurale - Ozieri
45	45 - PVG06 - Miglioramento sistema viario rurale accesso località "Binzana" – Ardara



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
46	46 - PVMC01-a - a - Ricostruzione strade extraurbane (strada comunale Mori Santu Aingiu) - Villasor
47	47 - PVMC01-b - b - Ricostruzione strade extraurbane (strada vicinale Mori De Is Cannas) – Villasor
48	48 - PVMC01-c - c - Ricostruzione strade extraurbane (strada vicinale Bau Sa Moba) – Villasor
49	49 - PVMC02 - Manutenzione straordinaria strade di campagna - Realizzazione centro di scambio – Serramanna
50	50 - PVMC03 - Ricostruzione strade rurali – Samassi
51	51 - PVMC04 - Lavori di miglioramento viabilità rurale - Villacidro
52	52 - PVMC05 - Realizzazione di un centro di conferimento, selezione e smistamento dei prodotti ortofrutticoli del Medio Campidano - San Giovanni Suergiu
53	53 - 01 - Progetto strategico per l'approfondimento dei fattori di competitività e di innovazione a più alto potenziale
54	54 - 02-a - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: a) Creazione e implementazione del sistema di qualità regionale dell'agriturismo e del turismo rurale
55	55 - 02-b - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: b) Progetto per la ridefinizione dell'offerta di design contemporaneo e dell'artigianato artistico sardo
56	56 - 02-c - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: c) Valorizzazione delle filiere agroalimentari tipiche mediante azioni di promozione istituzionale
57	57 - 05 - Realizzazione del centro espositivo e laboratorio di tecniche e materiali costruttivi tradizionali della Sardegna - Segariu
58	58 - 06 - Realizzazione manuali operativi per individuazione, progettazione, realizzazione e recupero delle tipologie edilizie dei centri storici dei paesi e del paesaggio rurale della Sardegna
59	59 - 07 - Manutenzione dorsale consortile dalla sezione di Santu Inesu - Recinzione sud Enichem - fino allo svincolo pedemontana – Assemini
60	60 - 08-PIT - Opere di urbanizzazione in zona "Sa Illetta" (Polo Telematico) – Cagliari
61	61 - 09-PIT - Manutenzione straordinaria – Completamento adeguamento – delle opere di infrastrutturazione primaria - Agglomerato industriale – Suni
62	62 - 10-PIT - Ampliamento infrastrutturazione primaria - Agglomerato di Suni
63	63 - 11 - Impianto di pretrattamento a Truncu Reale e condotta di vettoriamento reflui a depuratore di Porto Torres – Sassari
64	64 - 12 - Progetto per la realizzazione di una nuova condotta di scarico sottomarina del depuratore a servizio dell'agglomerato industriale di Olbia
65	65 - 13-PIT - Infrastrutturazione primaria corpo nord - Agglomerato Industriale di Oristano
66	66 - 14-PIT - Acquedotto potabile a servizio del corpo nord - Agglomerato Industriale di Oristano



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
67	67 - 15-PIT - Completamento infrastrutture primarie corpo nord agglomerato industriale di Oristano. Realizzazione impianto di illuminazione pubblica al servizio degli insediamenti produttivi (PMI) – Oristano
68	68 - 16-PIT - Completamento Parco Ferroviario corpo nord agglomerato Industriale di Oristano: Sistemazione piazzale ferroviario – Oristano
69	69 - 17 - Progetto per la realizzazione della banchina di raccordo tra la banchina lato est e la banchina Euroallumina – Portoscuso
70	70 - 18-PIT - Infrastrutture primarie ZIR di Iglesias - Comparto B - 3° lotto – Iglesias
71	71 - 19-PIT - Realizzazione infrastrutture primarie comparto ovest settore nord agglomerato industriale di Tossilo – Macomer
72	72 - 20-PIT - Realizzazione infrastrutture primarie settore sud agglomerato industriale di Tossilo - 2° lotto – Macomer
73	73 - 21 - Lavori completamento SS 131 - Mercato ortofrutticolo - Li Punti - ZIR Predda Niedda – Sassari
74	74 - 22 - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione delle nuove aree di espansione dell'agglomerato industriale di Pratosardo – Nuoro
75	75 - 23 - Completamento schema idrico agglomerato industriale di Tempio Pausania - Lavori di derivazione dal serbatoio sul Rio Paghiolu – 1° lotto - Completamento funzionale – Tempio Pausania
76	76 - 24 - Collegamento vario comparto D3 con la strada comunale di Muntangia e completamento dei sottoservizi - ZIR di Villacidro
77	77 - 25-PIT - Ristrutturazione ed adeguamento infrastrutture primarie comparto consortile D1 - sub comparto SNIA - ZIR di Villacidro
78	78 - 26-30 PIT - Sede centrale del Parco Scientifico e Tecnologico: Strada di collegamento SS 195 - Ingresso Parco – Pula
79	79 - 27-PIT - Realizzazione opere di completamento delle opere PIP di urbanizzazione primaria del PIP – Marrubiu
80	80 - 28-PIT - Completamento PIP - 2° lotto funzionale – Musei
81	81 - 29-PIT - Completamento PIP Is Arenas - 4° lotto – Donori
82	82 - 31-PIT - Lavori di urbanizzazione dell'area PIP - 4° lotto esecutivo – Orani
83	83 - 32-PIT - Lavori di completamento interventi di urbanizzazione primaria nella zona PIP (2^ fase) – Gavoi
84	84 - 33-PIT - Realizzazione viabilità di connessione esterna e dei collettori fognari principali delle acque nere a servizio dei comparti comunali destinati ad attività produttive – Comune di Ottana
85	85 - 34-PIT - Realizzazione impianto di depurazione ad uso PIP e realizzazione collettore fognario annesso - Comune di Orotelli
86	86 - 35-PIT - Realizzazione dell'impianto di depurazione della zona PIP di Oniferi
87	87 - 36-PIT - Completamento PIP di Terralba
88	88 - 37-PIT - Realizzazione collettore fognario per l'evacuazione dei reflui del PIP di Marrubiu



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

---

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
89	89 - 38 - Ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento impianto depurazione consortile di Macomer ed annessi collettori fognari di Tossilo – Macomer
90	90 - 39 - Cooperazione internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del territorio della Sardegna
91	91 - 40 - Risanamento e recupero del quartiere di S. Elia – Cagliari
92	92 - 41 - Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle strutture minerarie di Monteponi, Masua e Funtanamare – Iglesias
93	93 - 42 - Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle strutture minerarie dell'Argentiera - Sassari
94	<b>I Atto Integrativo</b>
94	1 - II01 - Sistema depurativo - Agglomerato industriale di Ottana
95	2 - II02 - Lavori di razionalizzazione ed adeguamento strutturale della strada di accesso all'agglomerato industriale – Località Prato Sardo – Nuoro
96	3 - II03 - Razionalizzazione e monitoraggio delle condotte e dell'impianto di accumulo e distribuzione dell'acqua – Zona Industriale di Villacidro
97	4 - II04 - Realizzazione nuova sezione di produzione di acqua industriale mediante riutilizzo di acque reflue nell'impianto di depurazione di Macomer



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 1 - PTCA02 - Strade di lottizzazione complete di rete idrica nella zona industriale di Macchiareddu – Assemini, Uta

Somma stanziata: € 795.860,08

Somma impegnata: € 781.290,87

% impegnato su stanziato: 98,17%


Costo realizzato: € 781.290,87

% realizzato su stanziato: 98,17%

Pagamenti: € 781.290,87

% pagato su stanziato: 98,17%

Stato di attuazione: Concluso

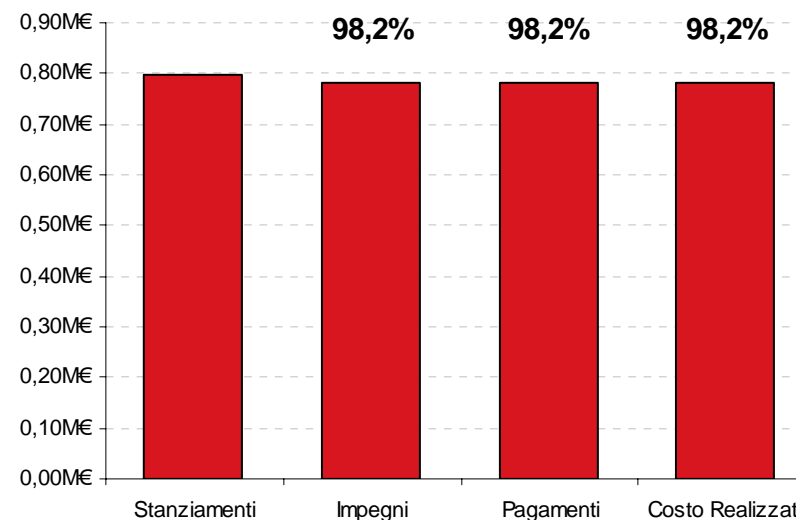

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 2 - PTCA03 - Prolungamento della via 1° maggio - collegamento campo da golf - Settimo San Pietro

**Somma stanziata:** € 351.190,70

**Somma impegnata:** € 351.190,70

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 351.190,70

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 330.218,16

% pagato su stanziato: 94,03%

**Stato di attuazione:** Concluso

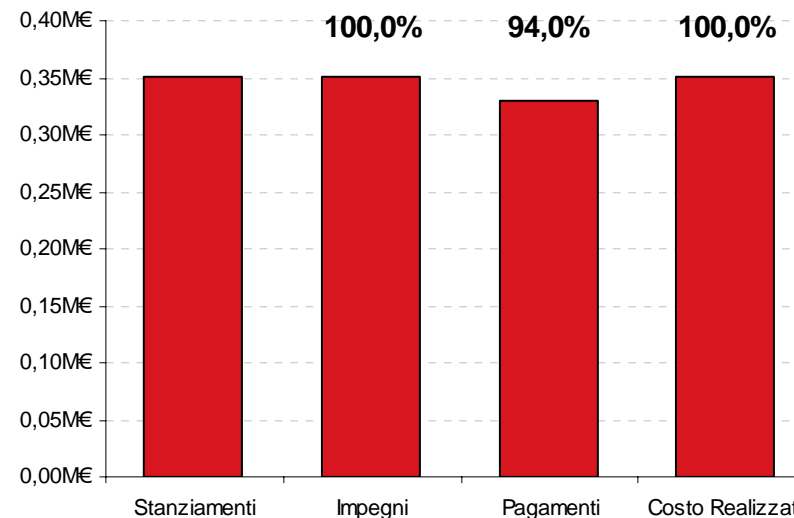



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 3 - PTCA04-a - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" centro servizi per le imprese - 1° lotto - Sinnai

**Somma stanziata:** € 955.445,26

**Somma impegnata:** € 911.077,74

% impegnato su stanziato: 95,36%


**Costo realizzato:** € 909.677,96

% realizzato su stanziato: 95,21%

**Pagamenti:** € 909.677,96

% pagato su stanziato: 95,21%

**Stato di attuazione:** Concluso

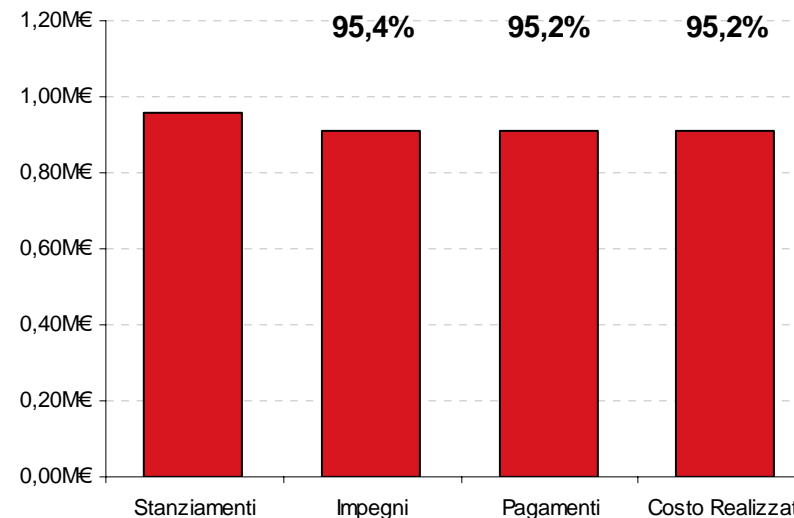

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 4 - PTCA04-b - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" centro servizi per le imprese - 2° lotto – Sopraelevazione - Sinnai

Somma stanziata: € 1.001.744,39

Somma impegnata: € 547.166,27

% impegnato su stanziato: 54,62%


Costo realizzato: € 246.116,66

% realizzato su stanziato: 24,57%

Pagamenti: € 246.116,66

% pagato su stanziato: 24,57%

Stato di attuazione: 24,57% dei lavori

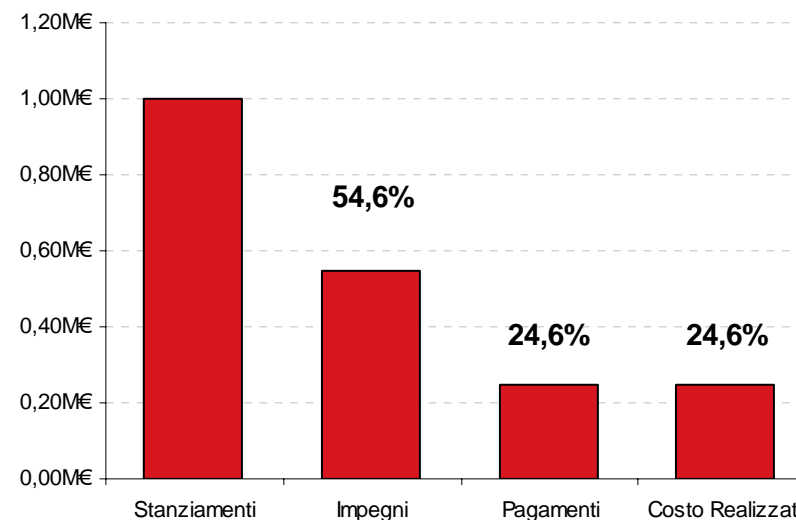

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 5 - PTCA04-c - Piano delle attività produttive nel PIP "Luceri" - 3° lotto realizzazione tappeto d'usura sovrastruttura stradale – Sinnai

Somma stanziata: € 120.000,00

Somma impegnata: € 102.182,07

% impegnato su stanziato: 85,15%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto concluso

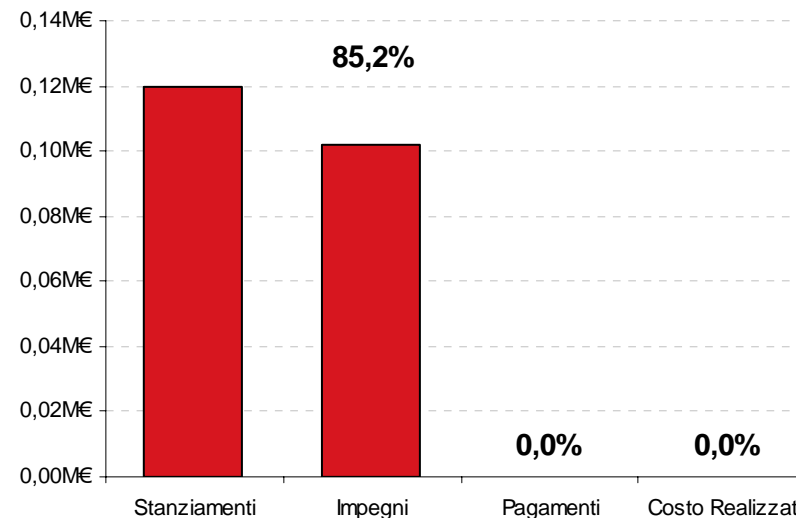

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 6 - PTCA06 - Opere di urbanizzazione primaria - Località Is Trincas - Cagliari

**Somma stanziata:** € 1.875.978,67

**Somma impegnata:** € 1.875.978,67

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.875.978,67

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 1.581.229,68

% pagato su stanziato: 84,29%

**Stato di attuazione:** Concluso

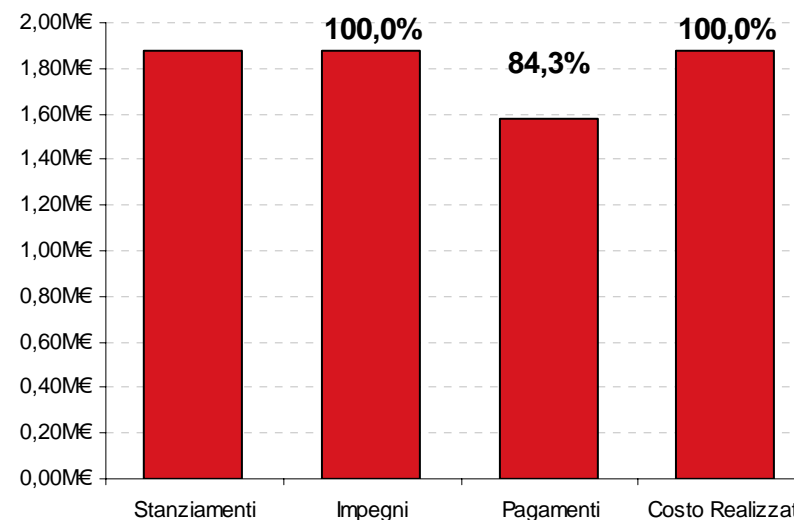

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 7 - PTGAV01 - Recupero e riutilizzo ad uso industriale delle acque depurate dell'impianto di depurazione consortile - Villacidro

**Somma stanziata:** € 2.984.087,96

**Somma impegnata:** € 2.104.462,49

% impegnato su stanziato: 70,52%


**Costo realizzato:** € 163.601,10

% realizzato su stanziato: 5,48%

**Pagamenti:** € 163.601,10

% pagato su stanziato: 5,48%

**Stato di attuazione:** Appalto concluso

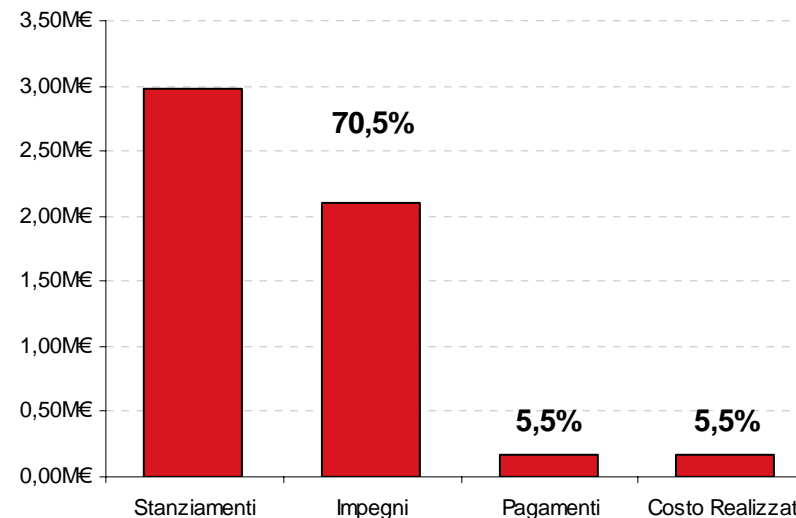

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 8 - PTGAV02 - Realizzazione di un rustico industriale all'interno dell'agglomerato consortile - Villacidro

**Somma stanziata:** € 501.479,64

**Somma impegnata:** € 452.241,77

% impegnato su stanziato: 90,18%


**Costo realizzato:** € 185.324,78

% realizzato su stanziato: 36,96%

**Pagamenti:** € 185.324,78

% pagato su stanziato: 36,96%

**Stato di attuazione:** 36,96% dei lavori

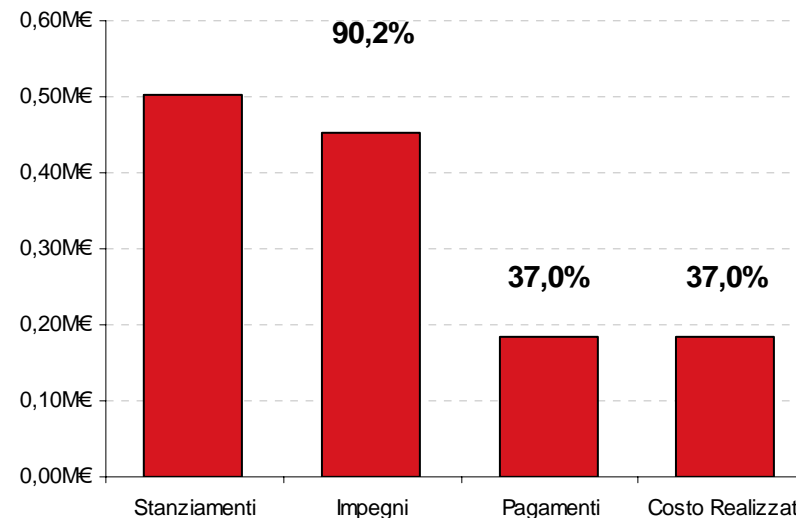

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 9 - PTGAV03 - Infrastrutturazione di un comparto per insediamenti commerciali a servizio degli insediamenti produttivi esistenti – Villacidro

**Somma stanziata:** € 6.197.482,79

**Somma impegnata:** € 2.881.985,54

% impegnato su stanziato: 46,5%


**Costo realizzato:** € 1.174.067,52

% realizzato su stanziato: 18,94%

**Pagamenti:** € 1.174.067,52

% pagato su stanziato: 18,94%

**Stato di attuazione:** 18,94% dei lavori

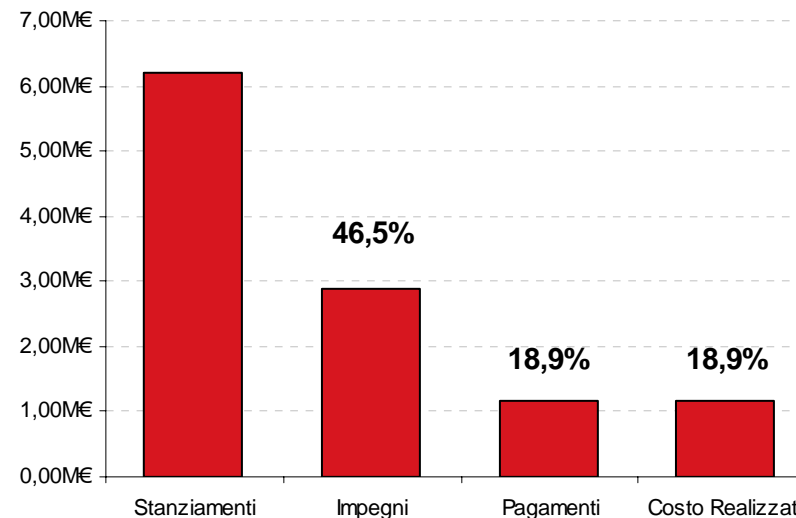

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 10 - PTGAV04 - Realizzazione e completamento opere urbanizzazione Monteverchio - Guspini

**Somma stanziata:** € 2.097.847,92

**Somma impegnata:** € 1.763.427,67

% impegnato su stanziato: 84,06%


**Costo realizzato:** € 129.319,56

% realizzato su stanziato: 6,16%

**Pagamenti:** € 129.319,56

% pagato su stanziato: 6,16%

**Stato di attuazione:** 6,16% dei lavori

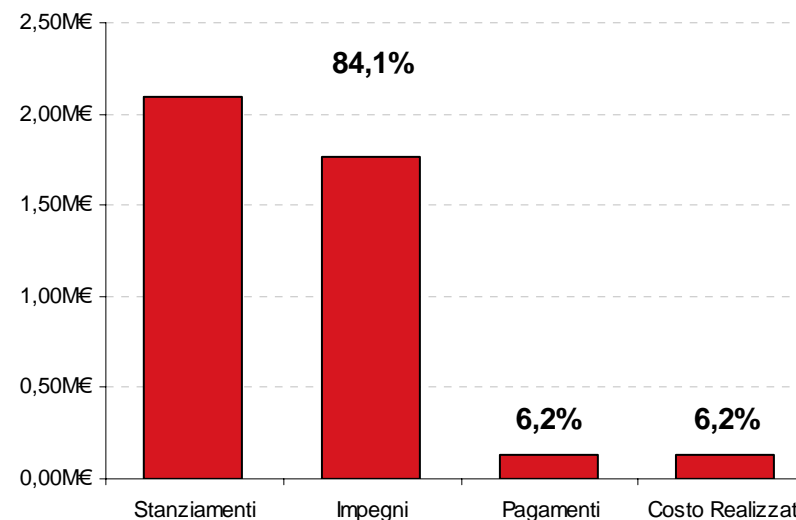



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 11 - PTGAV05 - Completamento opere urbanizzazione PIP - Guspini

**Somma stanziata:** € 1.336.900,33

**Somma impegnata:** € 1.137.504,28

% impegnato su stanziato: 85,09%


**Costo realizzato:** € 11.946,10

% realizzato su stanziato: 0,89%

**Pagamenti:** € 11.946,10

% pagato su stanziato: 0,89%

**Stato di attuazione:** Primo SAL

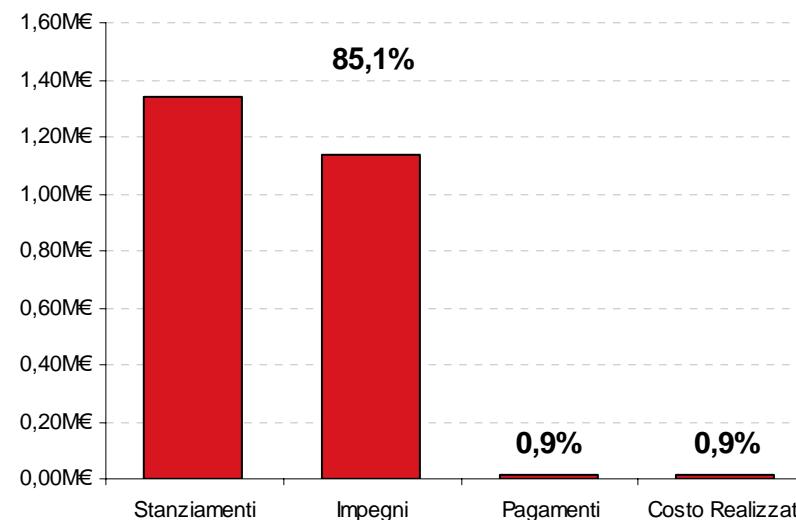

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

## 12 - PTGAV06new - Adeguamento e allestimento del Sistema Museale di Archeologia Mineraria di Montevecchio - Guspini

**Somma stanziata:** € 1.923.698,66

**Somma impegnata:** € 1.885.157,64

% impegnato su stanziato: 98%


**Costo realizzato:** € 1.306.227,00

% realizzato su stanziato: 67,9%

**Pagamenti:** € 1.346.589,20

% pagato su stanziato: 70%

**Stato di attuazione:** 67,90% dei lavori

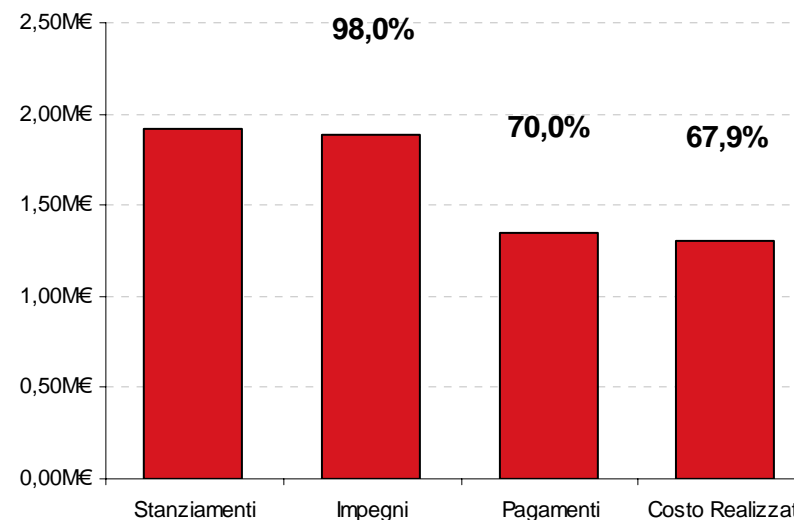

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 13 - PTGAV07 - Realizzazione centro artigianato artistico nel cantiere Sciria dell'ex miniera di Montevecchio - Guspini

Somma stanziata: € 931.481,66

Somma impegnata: € 816.272,38

% impegnato su stanziato: 87,63%


Costo realizzato: € 161.978,68

% realizzato su stanziato: 17,39%

Pagamenti: € 161.976,68

% pagato su stanziato: 17,39%

Stato di attuazione: 17,39% dei lavori

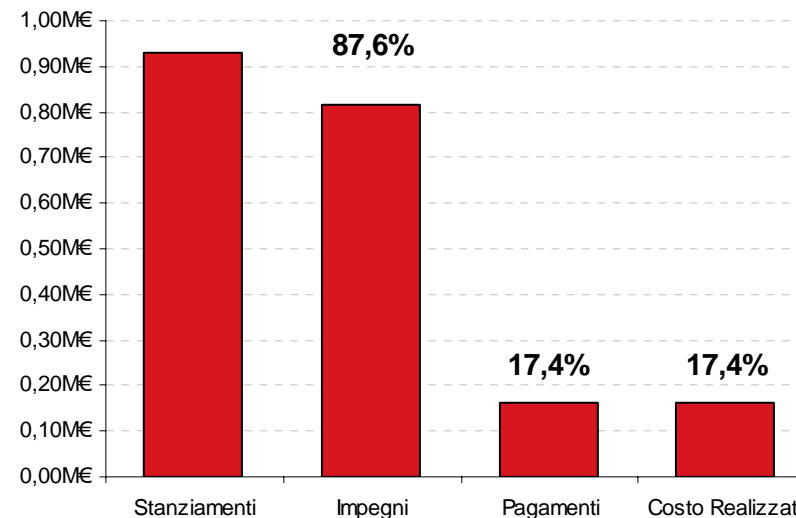

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 14 - PTMC01 - Urbanizzazione area per insediamenti produttivi - Senorbì

**Somma stanziata:** € 2.065.827,60

**Somma impegnata:** € 1.886.566,18

% impegnato su stanziato: 91,32%


**Costo realizzato:** € 1.886.565,91

% realizzato su stanziato: 91,32%

**Pagamenti:** € 1.886.566,18

% pagato su stanziato: 91,32%

**Stato di attuazione:** 91,32% dei lavori

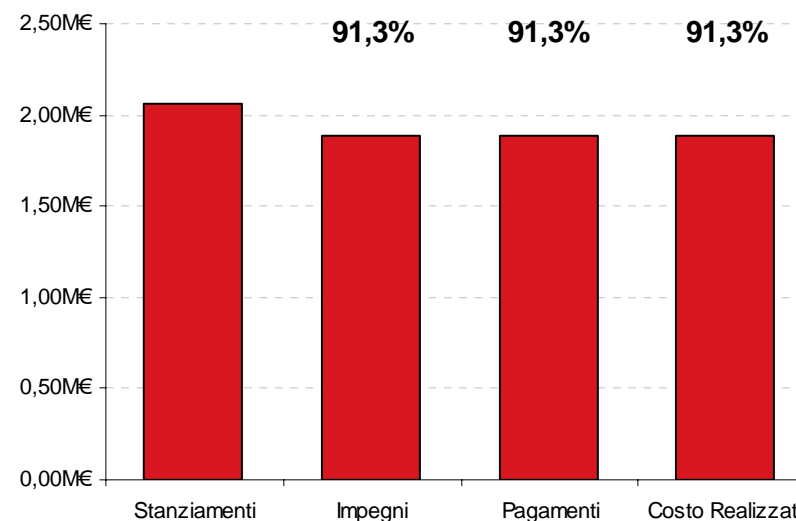

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 15 - PTMC02 - Ampliamento, adeguamento e completamento della rete stradale a servizio dell'area industriale dei Comuni di Nuraminis e Samatzai

Somma stanziata: € 1.316.965,09

Somma impegnata: € 1.316.965,09

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.270.256,11

% realizzato su stanziato: 96,45%

Pagamenti: € 1.270.256,11

% pagato su stanziato: 96,45%

Stato di attuazione: Concluso

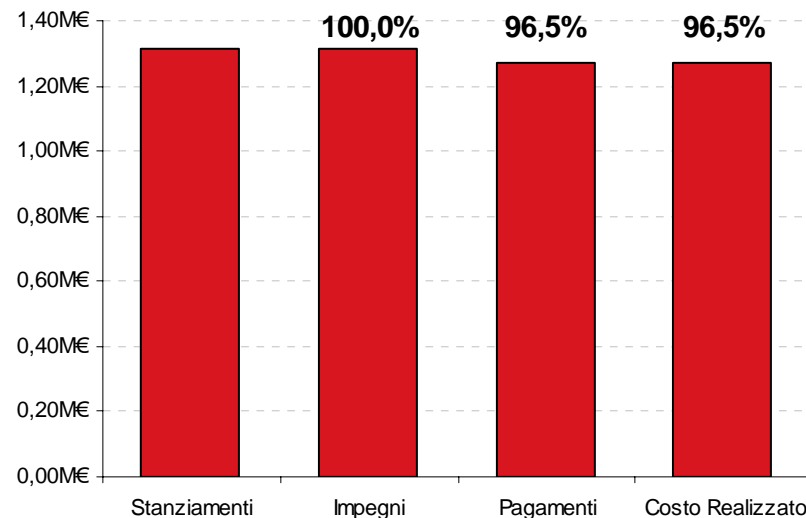

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 16 - PTMC03 - Realizzazione opere di riqualificazione urbana nel centro storico – Suelli

**Somma stanziata:** € 1.032.913,80

**Somma impegnata:** € 1.032.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 1.032.913,80

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 766.709,20

% pagato su stanziato: 74,23%

**Stato di attuazione:** Concluso

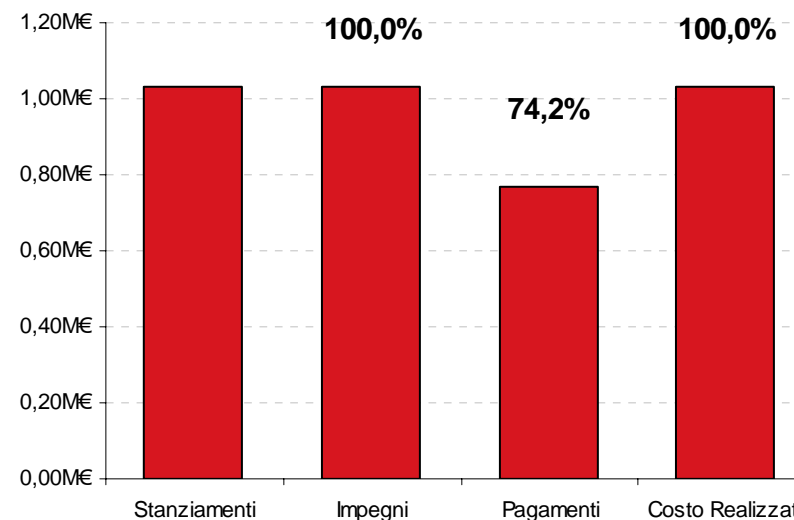

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 17 - PTMC04-a - Opere di urbanizzazione primaria e centro servizi - Ortacesus

**Somma stanziata:** € 615.000,00

**Somma impegnata:** € 614.716,13

% impegnato su stanziato: 99,95%


**Costo realizzato:** € 614.716,13

% realizzato su stanziato: 99,95%

**Pagamenti:** € 614.716,13

% pagato su stanziato: 99,95%

**Stato di attuazione:** Concluso

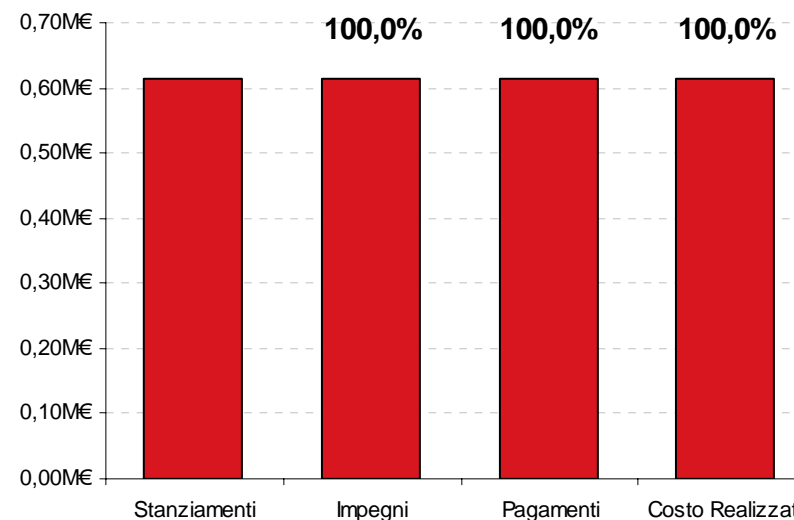

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 18 - PTMC04-b - Completamento centro turistico sportivo e copertura canale - Ortacesus

**Somma stanziata:** € 406.196,23

**Somma impegnata:** € 406.196,23

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 406.196,23

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 405.760,63

% pagato su stanziato: 99,89%

**Stato di attuazione:** Concluso

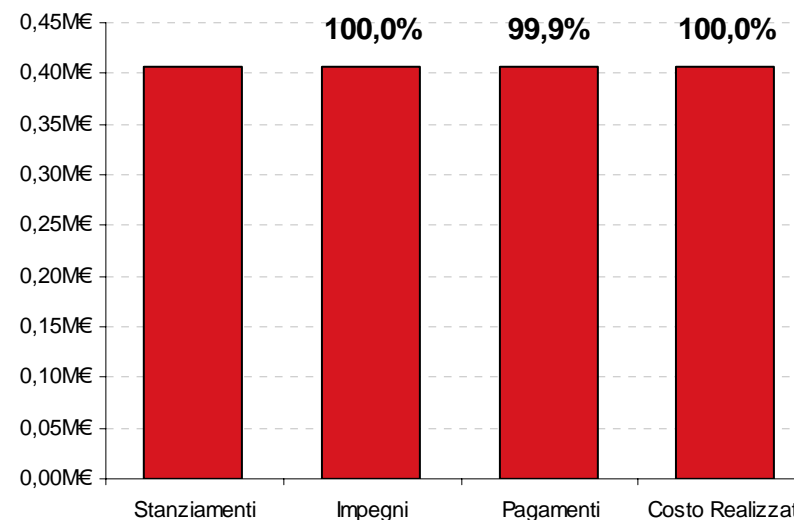



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 19 - PTMC04-c - Arredi centro sportivo localizzazione – Ortacesus

**Somma stanziata:** € 128.445,63

**Somma impegnata:** € 128.371,01

% impegnato su stanziato: 99,94%


**Costo realizzato:** € 128.371,01

% realizzato su stanziato: 99,94%

**Pagamenti:** € 128.371,01

% pagato su stanziato: 99,94%

**Stato di attuazione:** Concluso

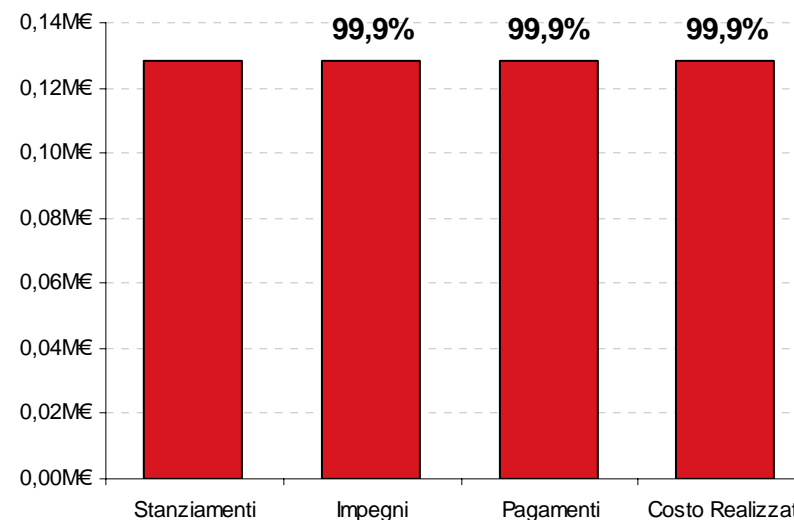

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 20 - PTMC04-d - Arredi e apparecchiature centro servizi - Ortacesus

**Somma stanziata:** € 141.500,29

**Somma impegnata:** € 136.908,26

% impegnato su stanziato: 96,75%


**Costo realizzato:** € 136.908,26

% realizzato su stanziato: 96,75%

**Pagamenti:** € 136.908,26

% pagato su stanziato: 96,75%

**Stato di attuazione:** Concluso

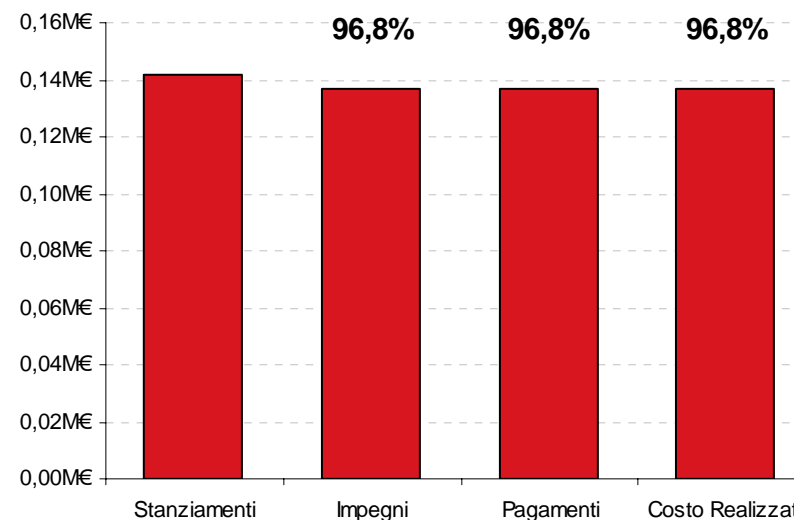

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 21 - PTMC05 - Strada di circonvallazione – Segariu

**Somma stanziata:** € 1.805.016,86

**Somma impegnata:** € 1.765.196,01

% impegnato su stanziato: 97,79%


**Costo realizzato:** € 1.252.681,19

% realizzato su stanziato: 69,4%

**Pagamenti:** € 1.252.681,19

% pagato su stanziato: 69,4%

**Stato di attuazione:** 69% dei lavori

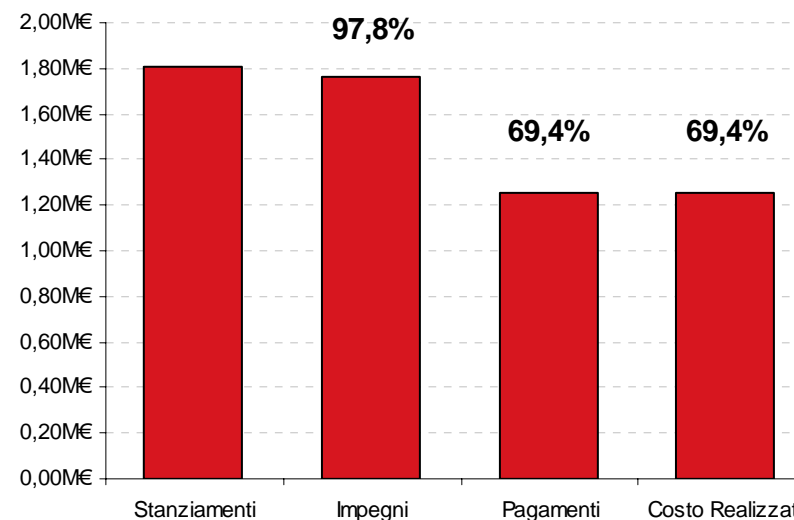

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 22 - PTMC06 - Centro polivalente sportivo ricreativo e turistico nel parco geobotanico - Lunamatrona

**Somma stanziata:** € 3.129.728,81

**Somma impegnata:** € 2.638.892,16

% impegnato su stanziato: 84,32%


**Costo realizzato:** € 1.407.069,56

% realizzato su stanziato: 44,96%

**Pagamenti:** € 1.407.069,56

% pagato su stanziato: 44,96%

**Stato di attuazione:** 44,96% dei lavori

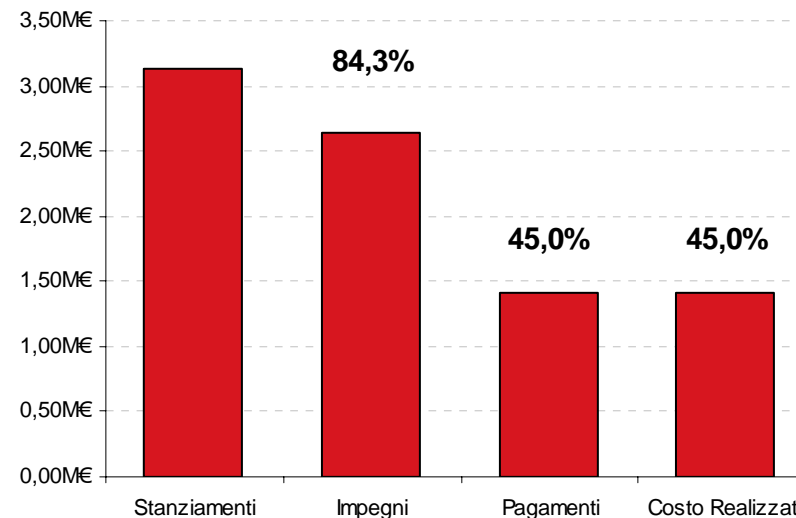

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 23 - PTMC07 - Realizzazione di un centro polifunzionale organizzativo d'impresa – Sanluri

**Somma stanziata:** € 2.840.512,94

**Somma impegnata:** € 2.677.319,55

% impegnato su stanziato: 94,25%


**Costo realizzato:** € 1.565.805,87

% realizzato su stanziato: 55,12%

**Pagamenti:** € 1.565.805,87

% pagato su stanziato: 55,12%

**Stato di attuazione:** 55,12% dei lavori

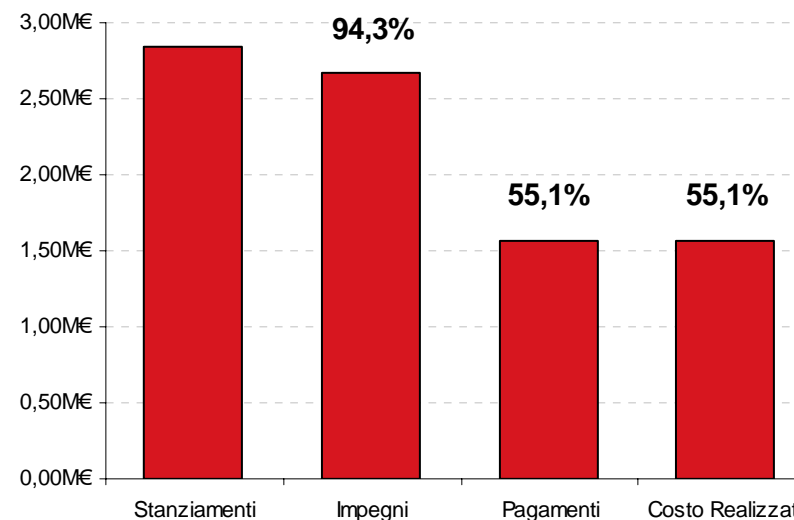

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 24 - PTMC08 - Oasi turistico naturalistica - Collinas, Ussaramanna

**Somma stanziata:** € 1.988.875,51

**Somma impegnata:** € 648.346,46

% impegnato su stanziato: 32,6%


**Costo realizzato:** € 441.709,55

% realizzato su stanziato: 22,21%

**Pagamenti:** € 441.709,55

% pagato su stanziato: 22,21%

**Stato di attuazione:** 22,21% dei lavori

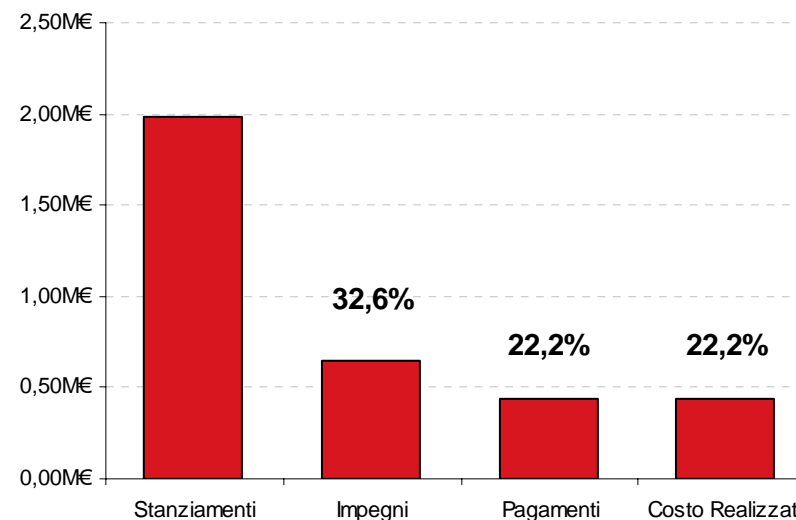

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

## 25 - PTSG1-a - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di collegamento - 1° lotto - Silius

Somma stanziata: € 774.685,35

Somma impegnata: € 774.685,35

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 774.685,35

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 690.485,37

% pagato su stanziato: 89,13%

Stato di attuazione: Concluso

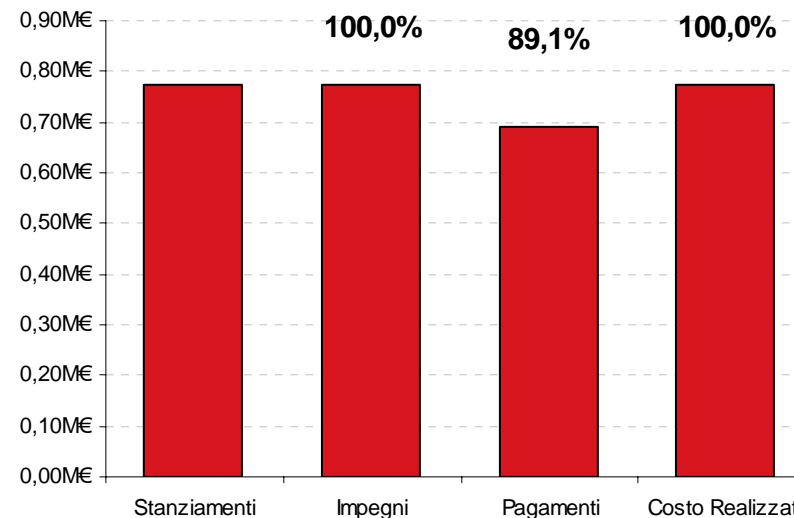

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

## 26 - PTSG1-b - Completamento opere di urbanizzazione e viabilità di collegamento del piano PIP - 2° lotto - Silius

Somma stanziata: € 774.685,35

Somma impegnata: € 297.449,91

% impegnato su stanziato: 38,4%


Costo realizzato: € 222.838,56

% realizzato su stanziato: 28,77%

Pagamenti: € 222.838,56

% pagato su stanziato: 28,77%

Stato di attuazione: 28,77% dei lavori

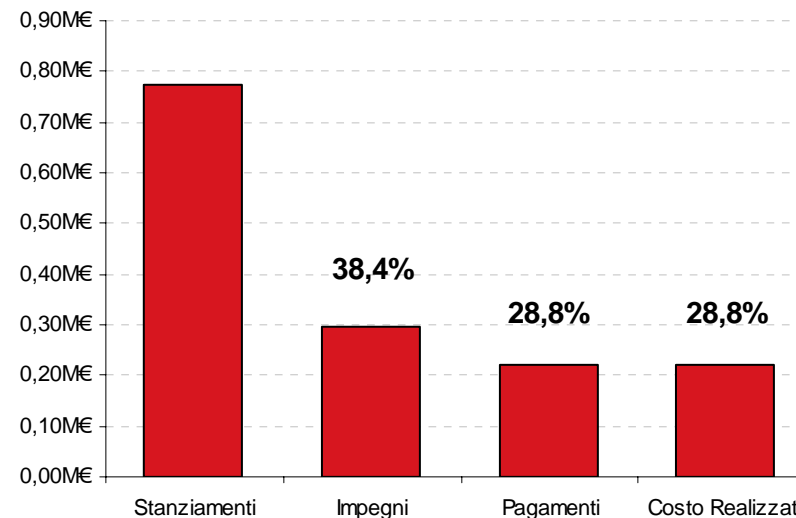



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 27 - PTTA01new - Sistemazione strada comunale di collegamento tra l'abitato urbano di Masullas e la SS 442 Uras Sirirs – Masullas

**Somma stanziata:** € 103.291,38

**Somma impegnata:** € 103.291,38

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 103.291,38

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 103.291,38

% pagato su stanziato: 100%

**Stato di attuazione:** Concluso

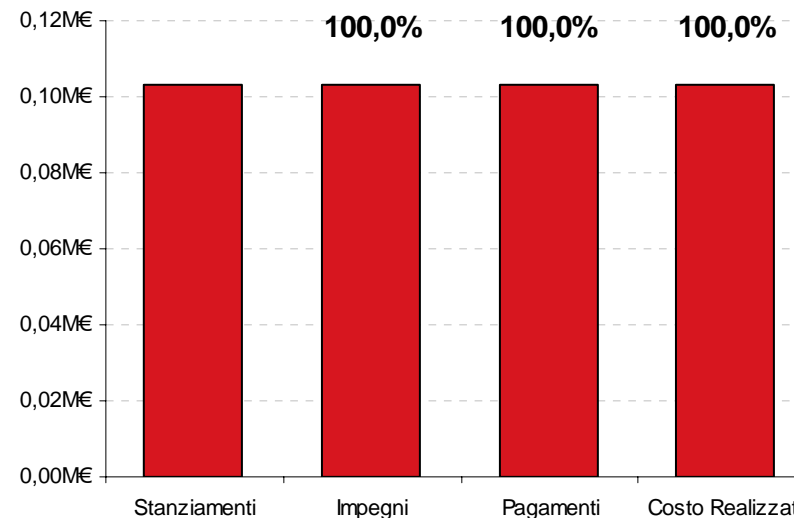

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 28 - PVBS01 - Miglioramento e potenziamento viabilità rurale e manutenzione strada comunale Tanca Manna - Teulada

**Somma stanziata:** € 723.039,66

**Somma impegnata:** € 721.640,22

% impegnato su stanziato: 99,81%


**Costo realizzato:** € 664.975,42

% realizzato su stanziato: 91,97%

**Pagamenti:** € 664.975,42

% pagato su stanziato: 91,97%

**Stato di attuazione:** 91,97% dei lavori

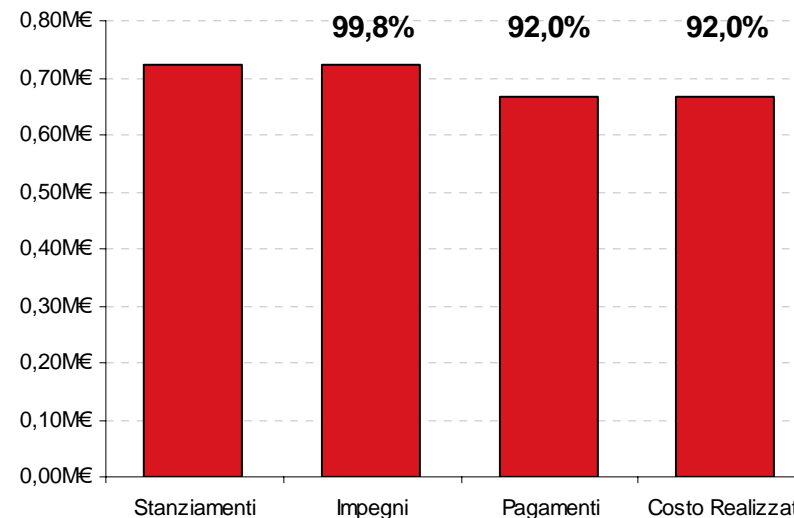

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 29 - PVBS02 - Interventi di riqualificazione urbana a fini turistici – 2° lotto funzionale – Masainas

**Somma stanziata:** € 826.331,04

**Somma impegnata:** € 59.216,10

% impegnato su stanziato: 7,17%


**Costo realizzato:** € 59.216,10

% realizzato su stanziato: 7,17%

**Pagamenti:** € 59.216,10

% pagato su stanziato: 7,17%

**Stato di attuazione:** 7,17% dei lavori

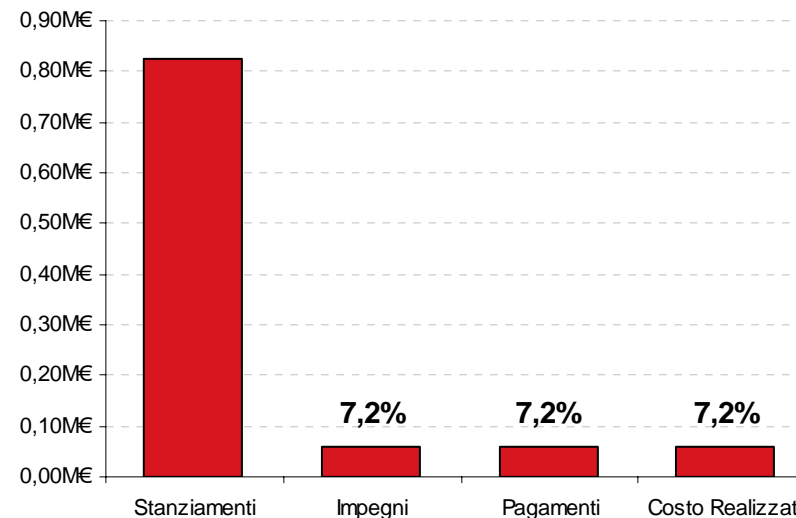

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 30 - PVBS03 - Sistemazione Strada Magai Lago Di Montepранu - Villaperuccio

**Somma stanziata:** € 512.325,24

**Somma impegnata:** € 508.069,10

% impegnato su stanziato: 99,17%


**Costo realizzato:** € 500.795,70

% realizzato su stanziato: 97,75%

**Pagamenti:** € 500.795,71

% pagato su stanziato: 97,75%

**Stato di attuazione:** Concluso

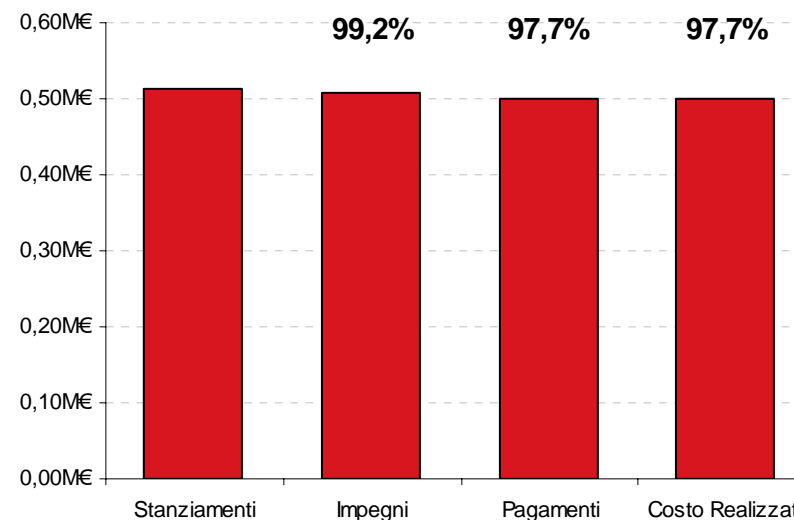

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 31 - PVBS04 - Sistemazione strada comunale incrocio 195 Chiesa Santa Maria di Palmas – San Giovanni Suergiu

**Somma stanziata:** € 103.291,38

**Somma impegnata:** € 103.291,38

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 103.291,38

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 91.361,23

% pagato su stanziato: 88,45%

**Stato di attuazione:** Concluso

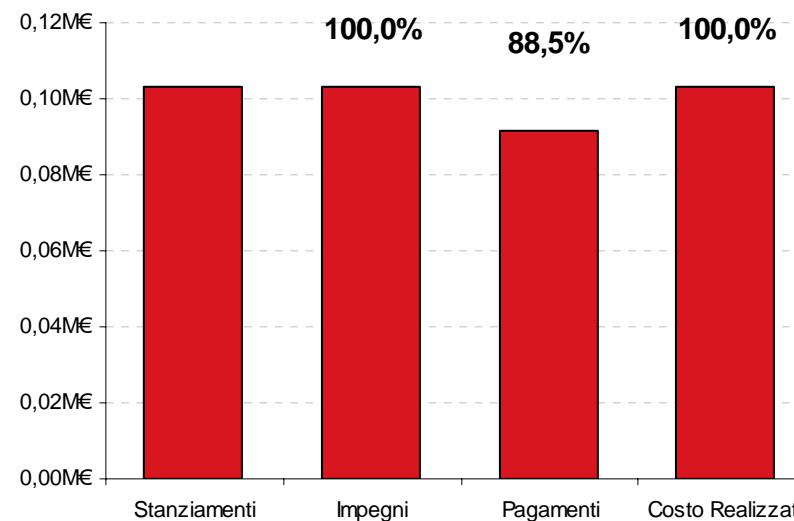

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 32 - PVBS05 - Sistemazione strada vicinale Matzaccara San Giovanni Suergiu

**Somma stanziata:** € 131.696,51

**Somma impegnata:** € 131.080,94

% impegnato su stanziato: 99,53%


**Costo realizzato:** € 130.167,37

% realizzato su stanziato: 98,84%

**Pagamenti:** € 130.167,37

% pagato su stanziato: 98,84%

**Stato di attuazione:** Concluso

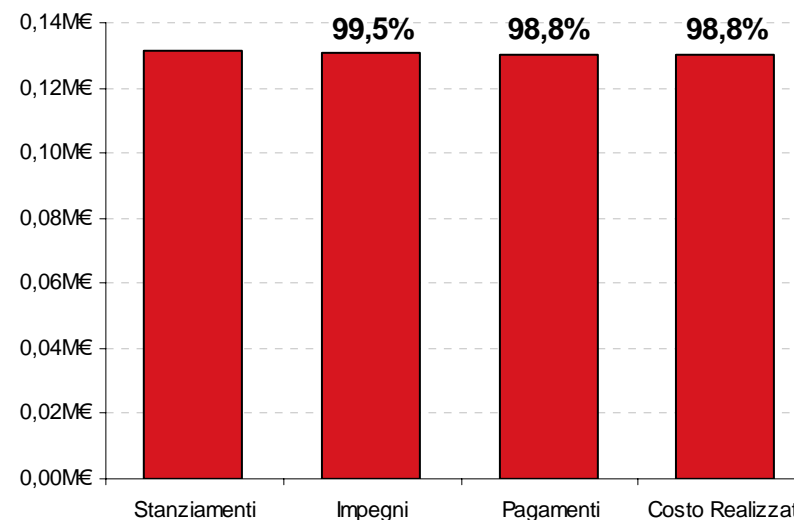

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 33 - PVBS06 - Realizzazione di un sistema di front-office e servizi di e-government con funzione di sportello unico territoriale - Sant'Antioco

Somma stanziata: € 387.342,67

Somma impegnata: € 370.792,37

% impegnato su stanziato: 95,73%


Costo realizzato: € 336.052,51

% realizzato su stanziato: 86,76%

Pagamenti: € 336.052,51

% pagato su stanziato: 86,76%

Stato di attuazione: Concluso

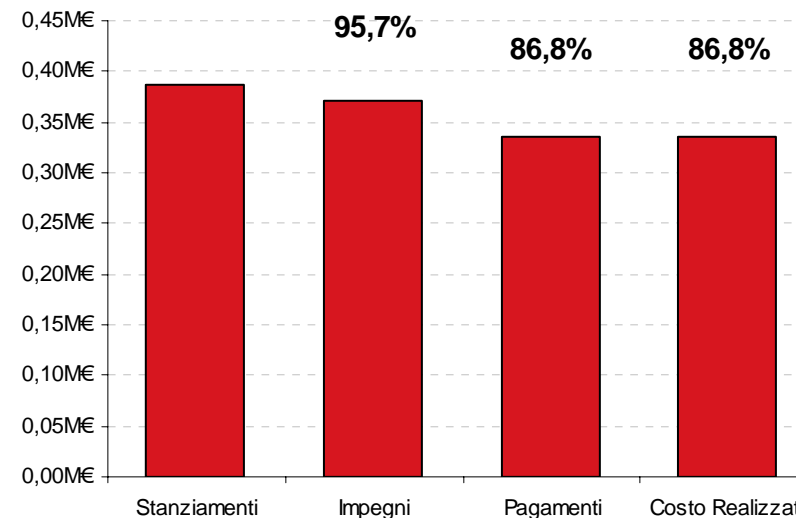

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 34 - PVBS07 - Realizzazione approdo di sicurezza e di servizi per i pescatori in località "Il Disco" - Calasetta

Somma stanziata: € 774.685,35

Somma impegnata: € 536.893,58

% impegnato su stanziato: 69,3%


Costo realizzato: € 468.265,65

% realizzato su stanziato: 60,45%

Pagamenti: € 468.265,65

% pagato su stanziato: 60,45%

Stato di attuazione: 60,45% dei lavori

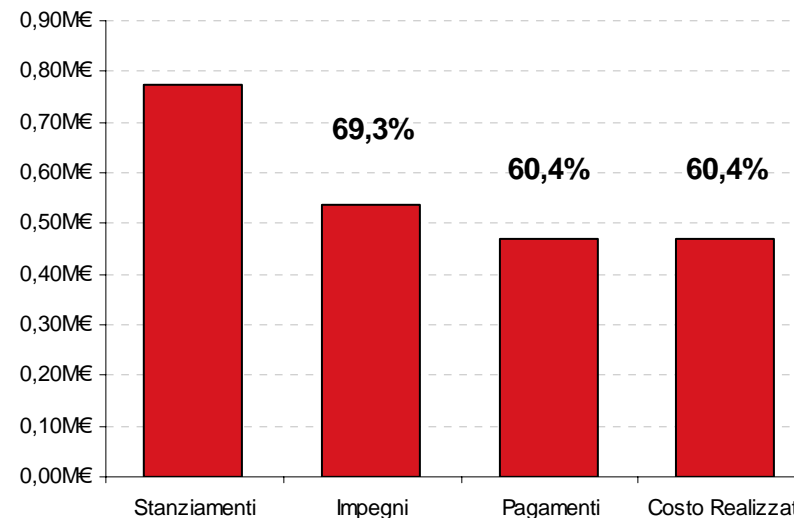



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 35 - PVBS08 - Sistemazione strada vicinale S'Ergoi – Masainas

**Somma stanziata:** € 51.645,69

**Somma impegnata:** € 46.212,21

% impegnato su stanziato: 89,48%


**Costo realizzato:** € 46.212,21

% realizzato su stanziato: 89,48%

**Pagamenti:** € 46.212,21

% pagato su stanziato: 89,48%

**Stato di attuazione:** Concluso

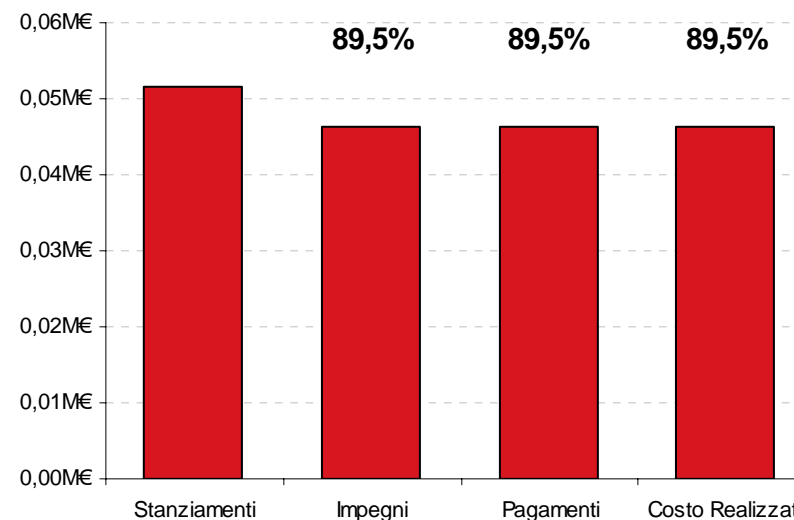

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 36 - PVBS09 - Realizzazione approdo pescherecci lungomare De Pompeis – Sant'Antioco

**Somma stanziata:** € 506.127,76

**Somma impegnata:** € 466.003,08

% impegnato su stanziato: 92,07%


**Costo realizzato:** € 283.468,16

% realizzato su stanziato: 56,01%

**Pagamenti:** € 283.468,16

% pagato su stanziato: 56,01%

**Stato di attuazione:** appalto da aggiudicare  
(forniture effettuate)

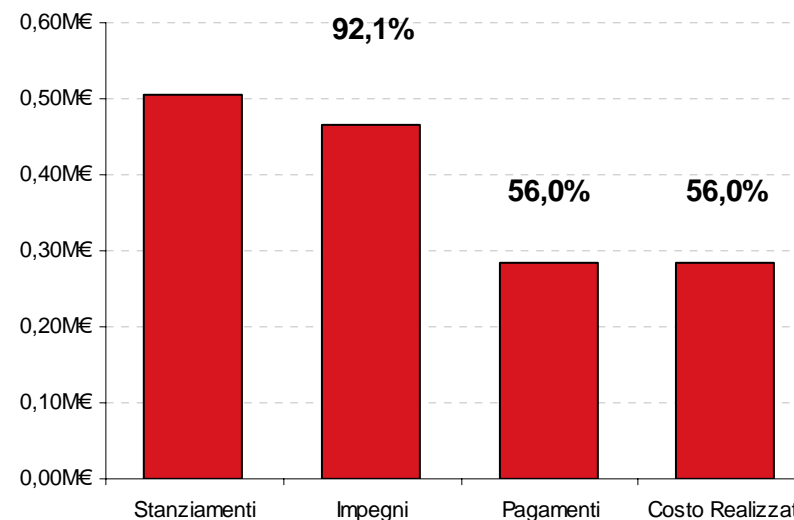

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 37 - PVBS10 - Condotta di irrigazione per i terreni limitrofi al Rio Cannedu - Narcao

**Somma stanziata:** € 1.120.711,48

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva

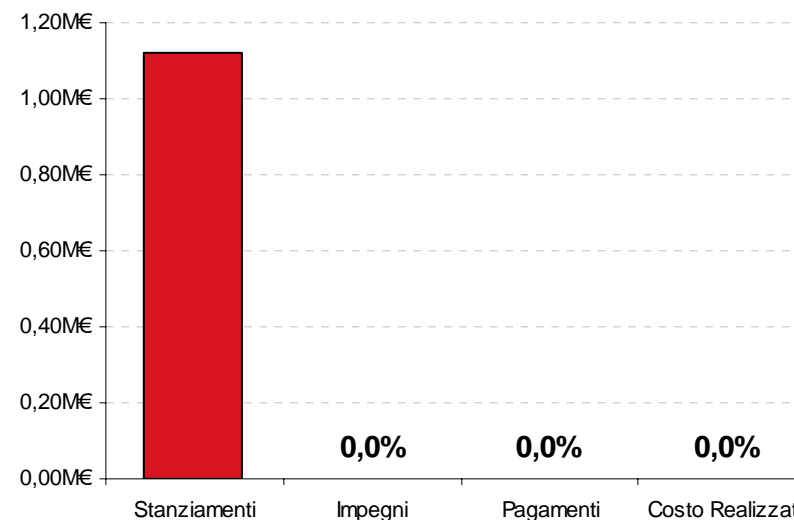

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 38 - PVBS12 - Salvaguardia, riqualificazione e recupero canale località Porto Pino - 1° intervento funzionale - Sant'Anna Arresi

**Somma stanziata:** € 1.032.913,80

**Somma impegnata:** € 1.029.519,31

% impegnato su stanziato: 99,67%


**Costo realizzato:** € 1.029.519,31

% realizzato su stanziato: 99,67%

**Pagamenti:** € 1.029.519,31

% pagato su stanziato: 99,67%

**Stato di attuazione:** Concluso

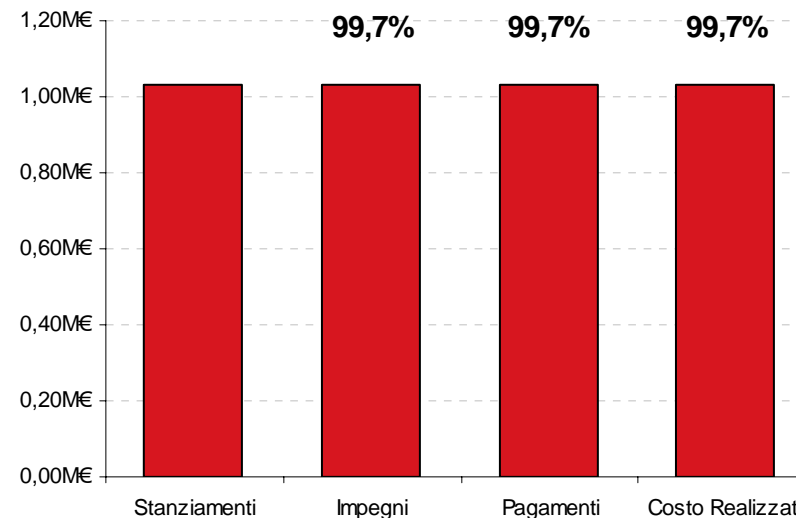

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 39 - PVG01 new - Lavori di ricondizionamento tratti di viabilità rurale - Mores

**Somma stanziata:** € 723.039,66

**Somma impegnata:** € 723.039,66

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 474.010,43

% realizzato su stanziato: 65,56%

**Pagamenti:** € 474.010,43

% pagato su stanziato: 65,56%

**Stato di attuazione:** 65,56% dei lavori

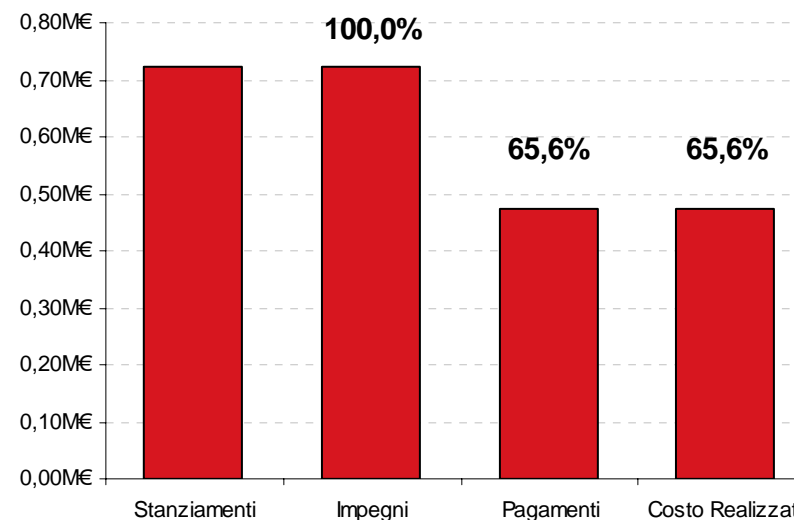

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 40 - PVG02-a - Centro servizi per l'agricoltura - 1° lotto "Ristrutturazione quartiere fieristico per l'agricoltura e la zootecnia" - Ozieri

**Somma stanziata:** € 506.127,76

**Somma impegnata:** € 432.657,88

% impegnato su stanziato: 85,48%


**Costo realizzato:** € 269.852,55

% realizzato su stanziato: 53,32%

**Pagamenti:** € 269.852,55

% pagato su stanziato: 53,32%

**Stato di attuazione:** 53,32% dei lavori

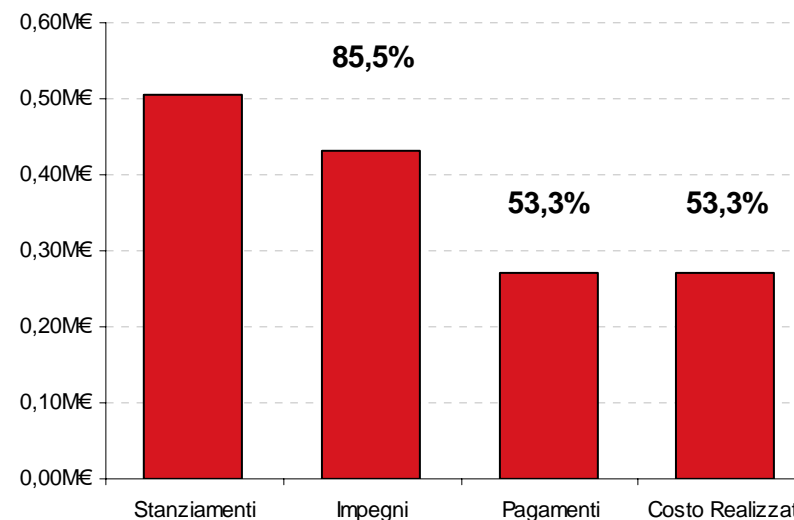

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 41 - PVG02-b - Centro servizi per l'agricoltura - 2° lotto "Realizzazione di un centro" - Ozieri

**Somma stanziata:** € 1.162.028,02

**Somma impegnata:** € 956.653,28

% impegnato su stanziato: 82,33%


**Costo realizzato:** € 290.507,00

% realizzato su stanziato: 25%

**Pagamenti:** € 290.507,00

% pagato su stanziato: 25%

**Stato di attuazione:** 25,00% dei lavori

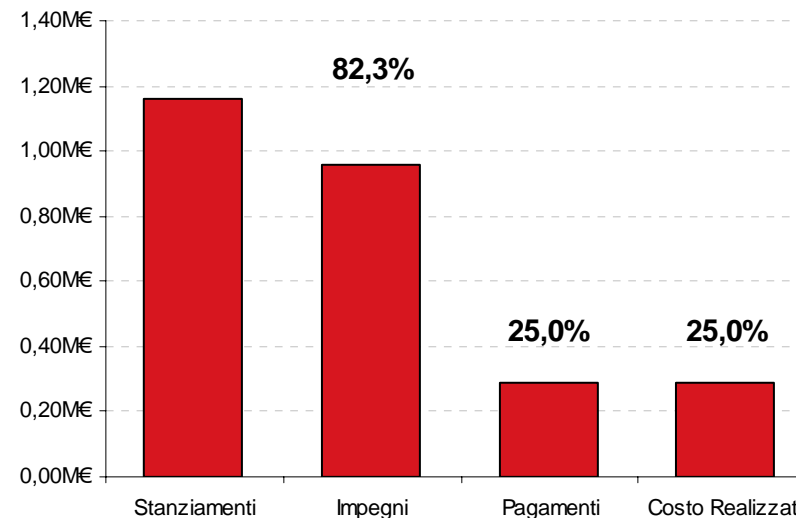

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 42 - PVG03 - Sistemazione strada rurale Sa Serra - Nughedu di San Nicolò

**Somma stanziata:** € 413.165,52

**Somma impegnata:** € 394.667,60

% impegnato su stanziato: 95,52%


**Costo realizzato:** € 305.557,75

% realizzato su stanziato: 73,96%

**Pagamenti:** € 305.557,75

% pagato su stanziato: 73,96%

**Stato di attuazione:** 77,42% dei lavori

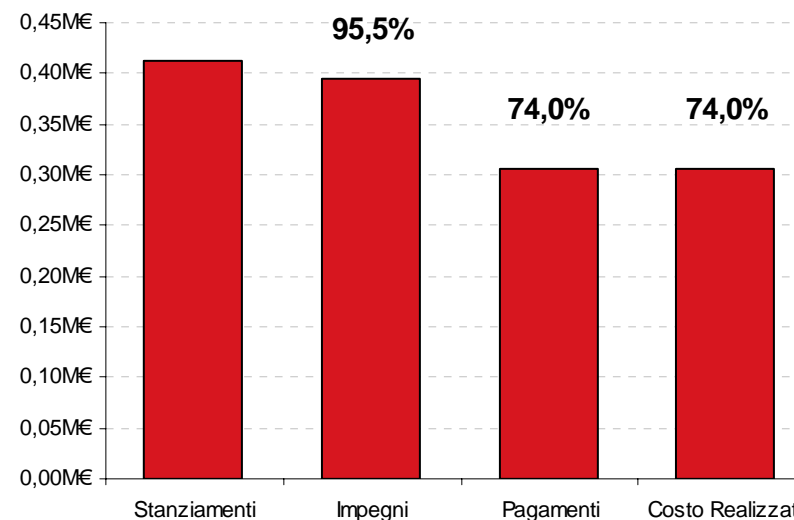



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 43 - PVG04 - Ricerche sulla valorizzazione delle attività agrozootecniche nelle aree collinari del Goceano – Illorai

Somma stanziata: € 920.326,19

Somma impegnata: € 801.093,11

% impegnato su stanziato: 87,04%


Costo realizzato: € 365.006,58

% realizzato su stanziato: 39,66%

Pagamenti: € 365.006,58

% pagato su stanziato: 39,66%

Stato di attuazione: 45,56% dei lavori

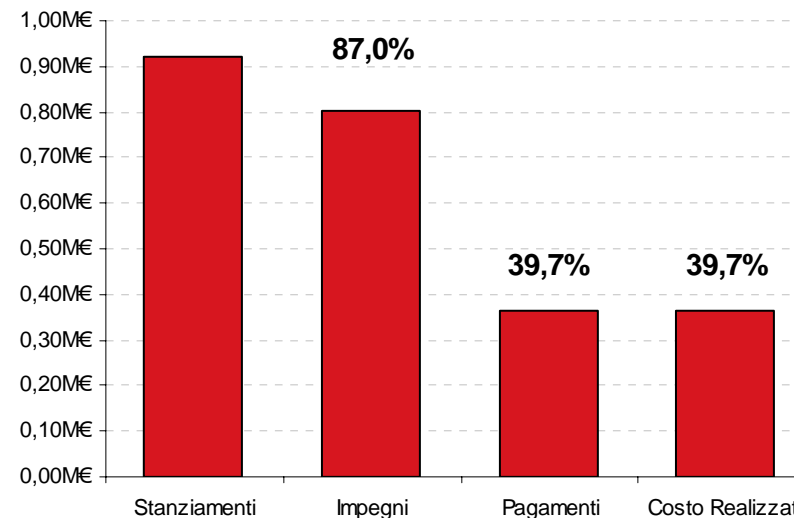

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 44 - PVG05 - Miglioramento sistema viario rurale - Ozieri

**Somma stanziata:** € 103.291,38

**Somma impegnata:** € 93.981,38

% impegnato su stanziato: 90,99%


**Costo realizzato:** € 93.981,05

% realizzato su stanziato: 90,99%

**Pagamenti:** € 66.810,26

% pagato su stanziato: 64,68%

**Stato di attuazione:** Concluso

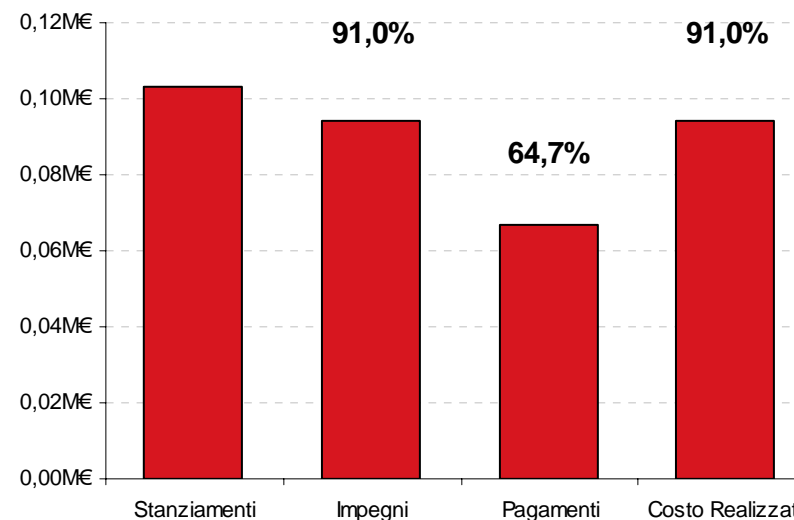

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 45 - PVG06 - Miglioramento sistema viario rurale accesso località "Binzana" – Ardara

**Somma stanziata:** € 361.519,83

**Somma impegnata:** € 361.519,83

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 107.710,64

% realizzato su stanziato: 29,79%

**Pagamenti:** € 107.710,64

% pagato su stanziato: 29,79%

**Stato di attuazione:** 29,79% dei lavori

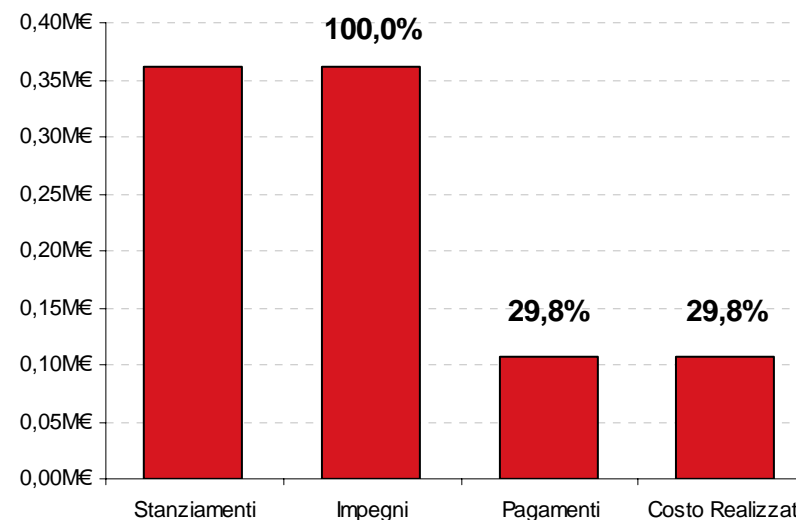

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 46 - PVMC01-a - a - Ricostruzione strade extraurbane (strada comunale Mori Santu Aingiu) - Villasor

Somma stanziata: € 144.670,12

Somma impegnata: € 144.670,12

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 105.455,15

% realizzato su stanziato: 72,89%

Pagamenti: € 105.455,15

% pagato su stanziato: 72,89%

Stato di attuazione: 72,89% dei lavori

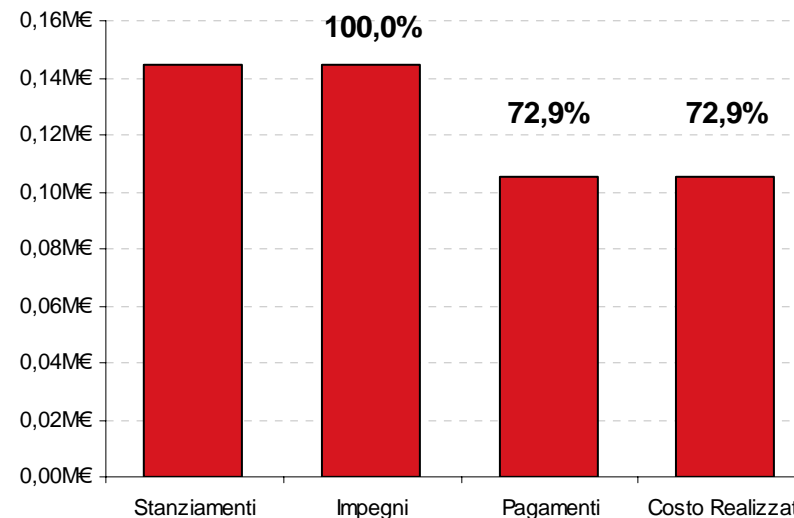

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 47 - PVMC01-b - b - Ricostruzione strade extraurbane (strada vicinale Mori De Is Cannas) - Villasor

Somma stanziata: € 157.861,78

Somma impegnata: € 157.861,78

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 107.941,03

% realizzato su stanziato: 68,38%

Pagamenti: € 107.941,03

% pagato su stanziato: 68,38%

Stato di attuazione: 68,38% dei lavori

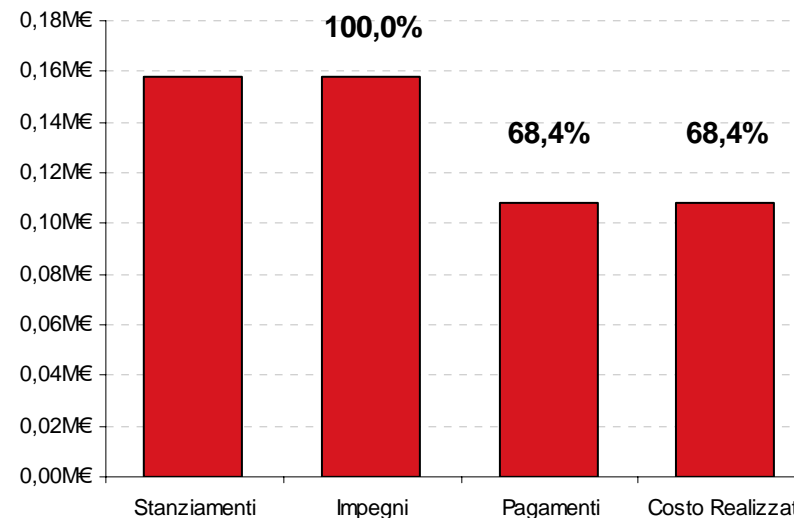

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 48 - PVMC01-c - c - Ricostruzione strade extraurbane (strada vicinale Bau Sa Moba) – Villasor

Somma stanziata: € 131.291,90

Somma impegnata: € 131.291,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 95.394,20

% realizzato su stanziato: 72,66%

Pagamenti: € 95.394,20

% pagato su stanziato: 72,66%

Stato di attuazione: 72,66% dei lavori

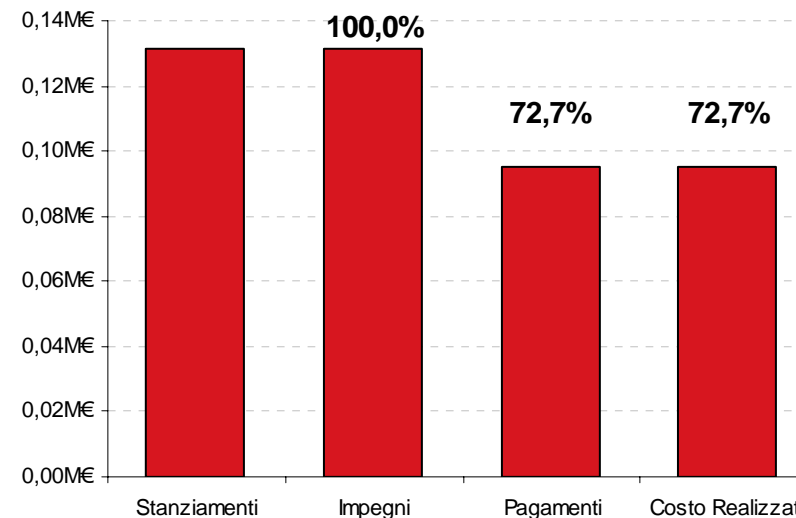

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 49 - PVMC02 - Manutenzione straordinaria strade di campagna - Realizzazione centro di scambio - Serramanna

Somma stanziata: € 607.353,42

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

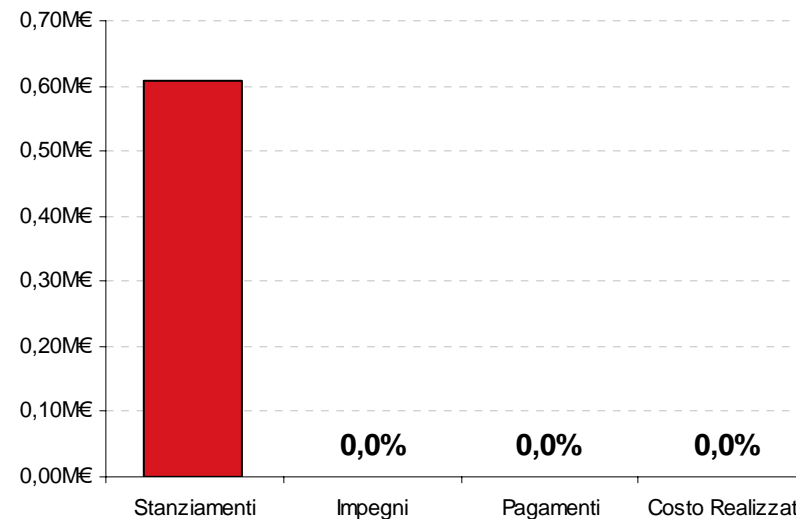

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 50 - PVMC03 - Ricostruzione strade rurali – Samassi

**Somma stanziata:** € 492.699,88

**Somma impegnata:** € 418.636,19

% impegnato su stanziato: 84,97%


**Costo realizzato:** € 204.240,55

% realizzato su stanziato: 41,45%

**Pagamenti:** € 204.240,55

% pagato su stanziato: 41,45%

**Stato di attuazione:** 41,45% dei lavori

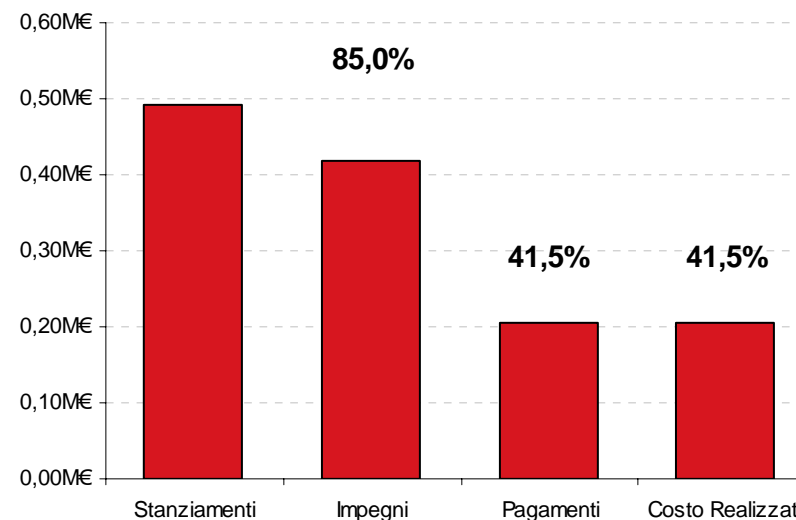



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 51 - PVMC04 - Lavori di miglioramento viabilità rurale - Villacidro

**Somma stanziata:** € 723.039,66

**Somma impegnata:** € 651.614,57

% impegnato su stanziato: 90,12%


**Costo realizzato:** € 546.306,46

% realizzato su stanziato: 75,56%

**Pagamenti:** € 546.306,46

% pagato su stanziato: 75,56%

**Stato di attuazione:** 75,56% dei lavori

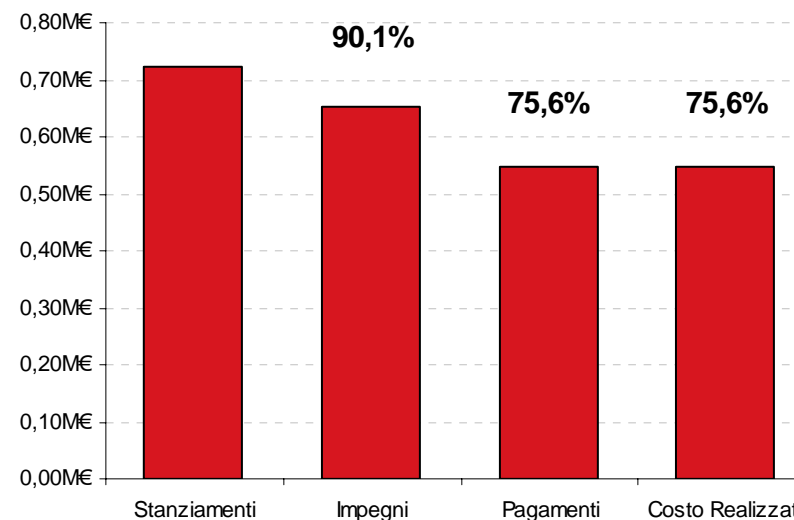

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 52 - PVMC05 - Realizzazione di un centro di conferimento, selezione e smistamento dei prodotti ortofrutticoli del Medio Campidano - San Giovanni Suergiu

Somma stanziata: € 3.098.741,39

Somma impegnata: € 2.985.230,62

% impegnato su stanziato: 96,34%


Costo realizzato: € 2.943.804,32

% realizzato su stanziato: 95%

Pagamenti: € 2.677.206,87

% pagato su stanziato: 86,4%

Stato di attuazione: Concluso

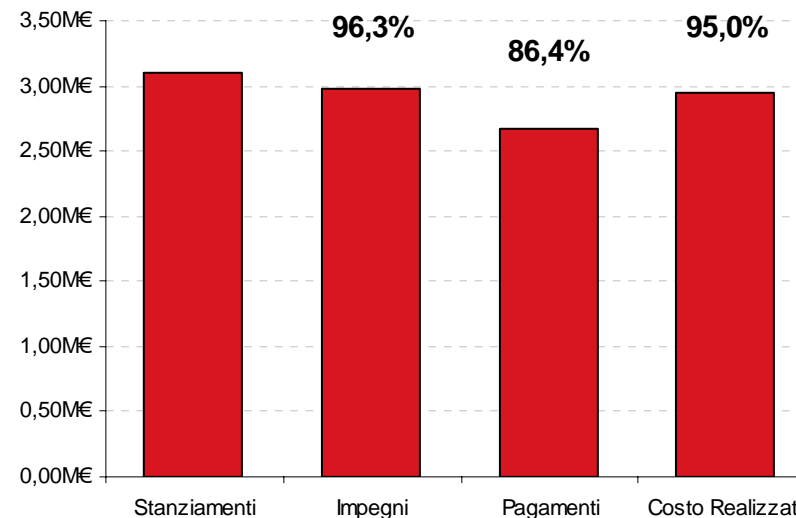

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 53 - 01 - Progetto strategico per l'approfondimento dei fattori di competitività e di innovazione a più alto potenziale

**Somma stanziata:** € 300.000,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Sospeso

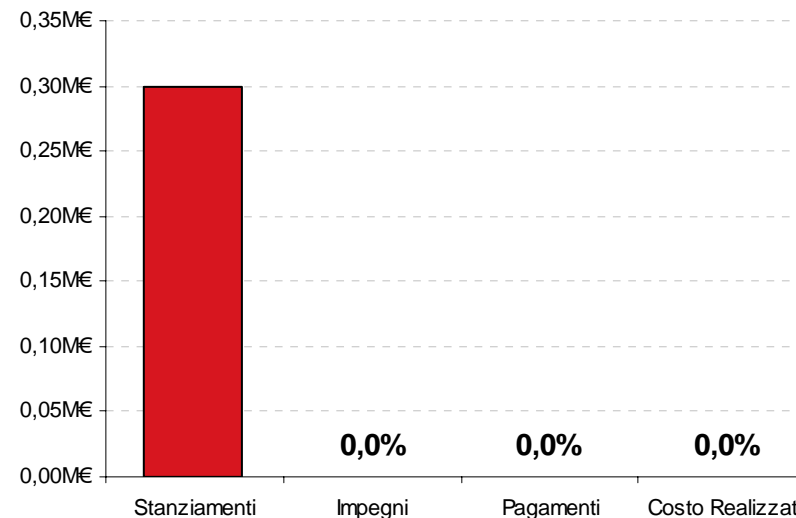

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 54 - 02-a - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: a) Creazione e implementazione del sistema di qualità regionale dell'agriturismo e del turismo rurale

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

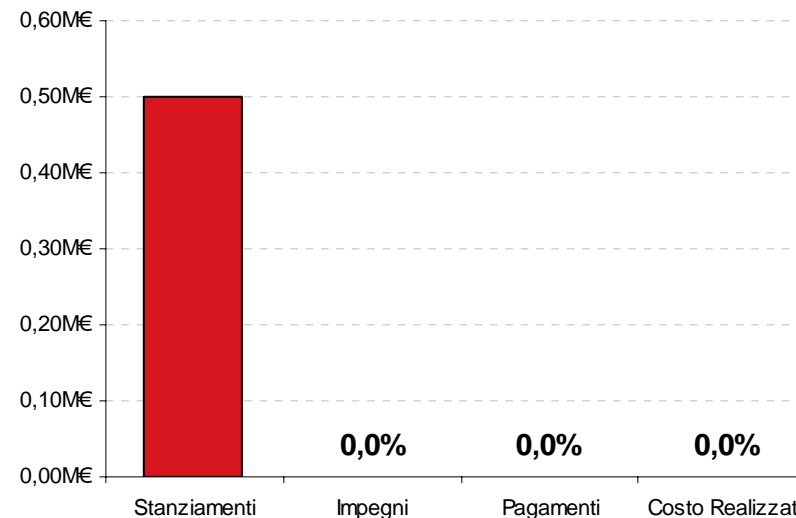

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 55 - 02-b - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: b) Progetto per la ridefinizione dell'offerta di design contemporaneo e dell'artigianato artistico sardo

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** In corso attività per definire le procedure di realizzazione

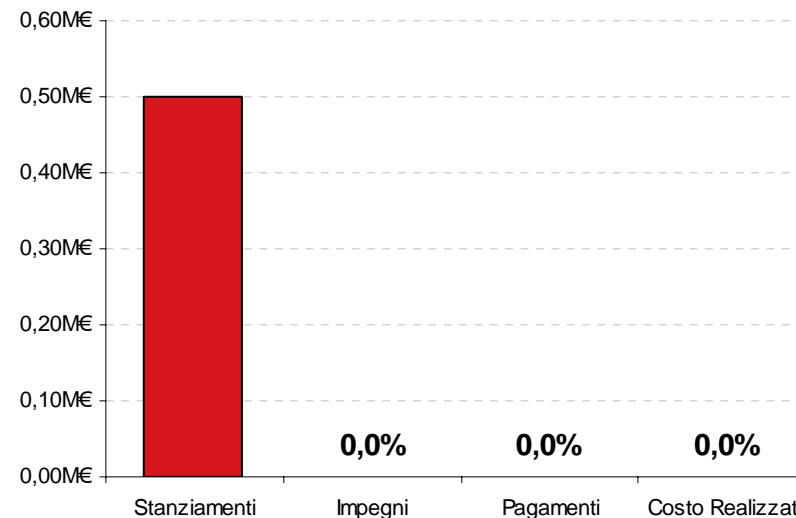

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 56 - 02-c - Valorizzazione produzioni tipiche regionali: c) Valorizzazione delle filiere agroalimentari tipiche mediante azioni di promozione istituzionale

Somma stanziata: € 488.867,26

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

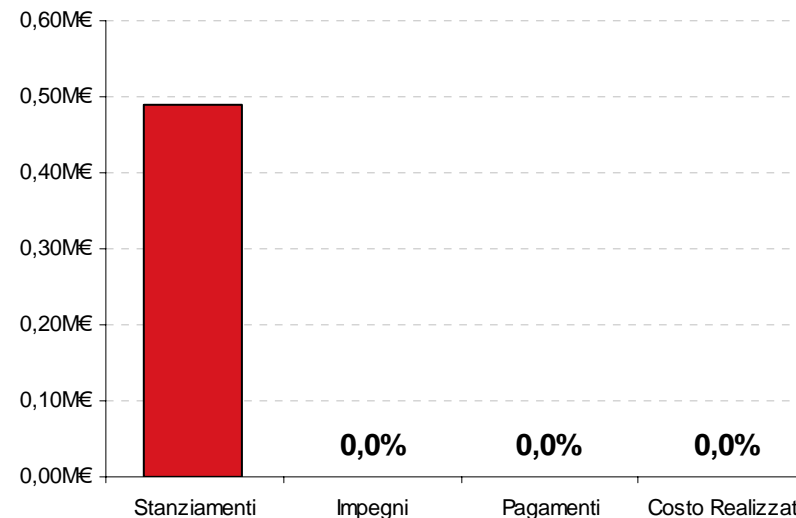

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 57 - 05 - Realizzazione del centro espositivo e laboratorio di tecniche e materiali costruttivi tradizionali della Sardegna - Segariu

Somma stanziata: € 600.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

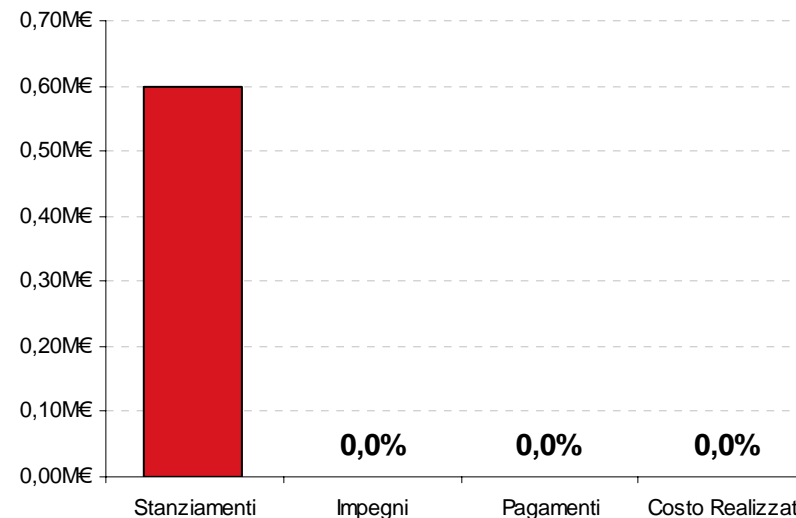

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 58 - 06 - Realizzazione manuali operativi per individuazione, progettazione, realizzazione e recupero delle tipologie edilizie dei centri storici dei paesi e del paesaggio rurale della Sardegna

Somma stanziata: € 750.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Assistenza tecnica per redazione manuali in corso

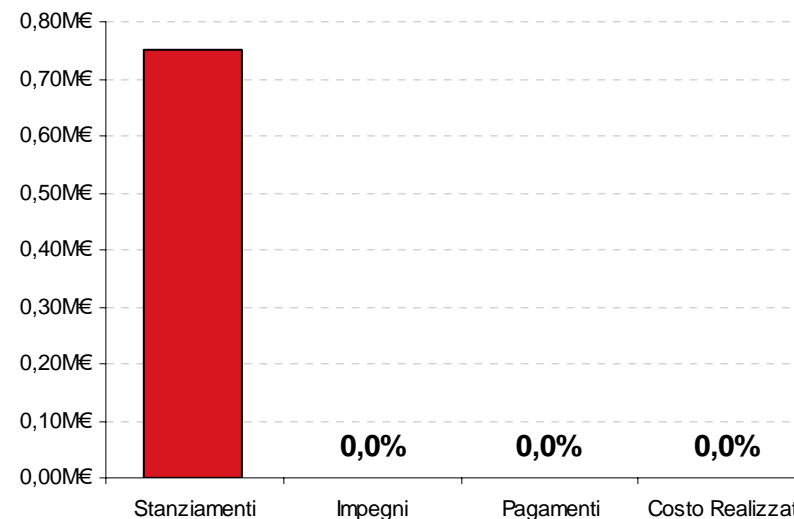



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 59 - 07 - Manutenzione dorsale consortile dalla sezione di Santu Inesu - Recinzione sud Enichem - fino allo svincolo pedemontana - Assemmini

Somma stanziata: € 2.600.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

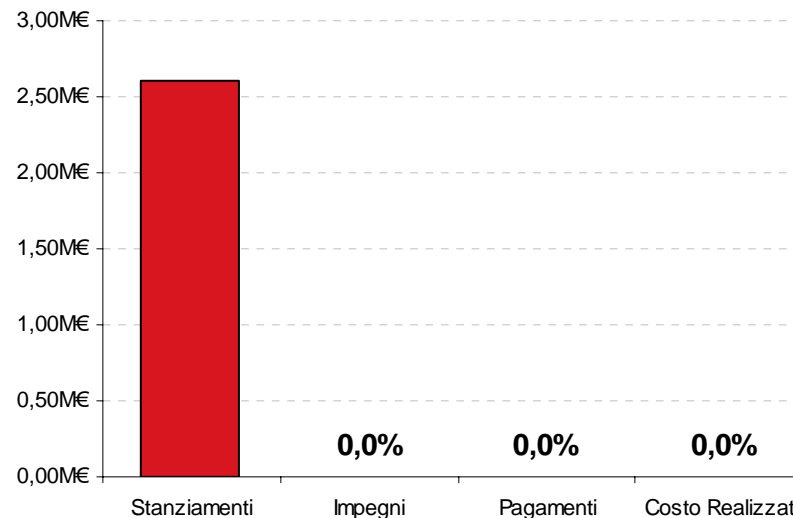

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 60 - 08-PIT - Opere di urbanizzazione in zona "Sa Illetta" (Polo Telematico) – Cagliari

Somma stanziata: € 2.300.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

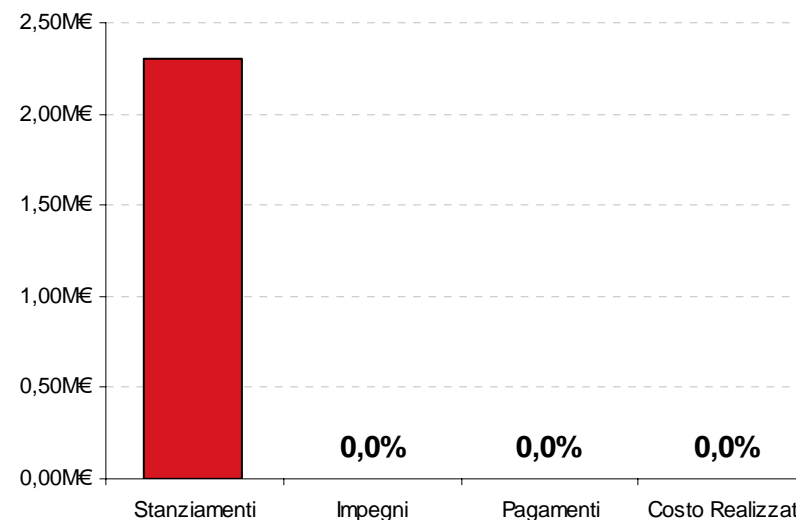

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 61 - 09-PIT - Manutenzione straordinaria - Completamento adeguamento - delle opere di infrastrutturazione primaria - Agglomerato industriale - Suni

Somma stanziata: € 1.525.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione preliminare

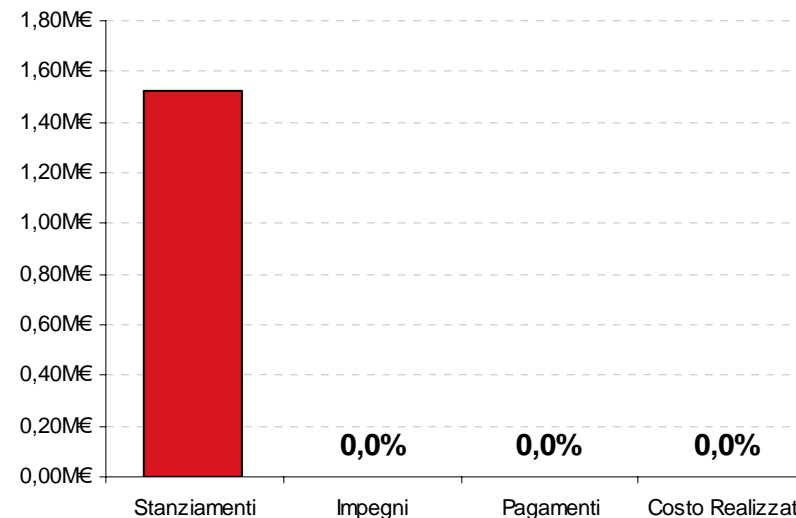

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 62 - 10-PIT - Ampliamento infrastrutturazione primaria - Agglomerato di Suni

Somma stanziata: € 1.975.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

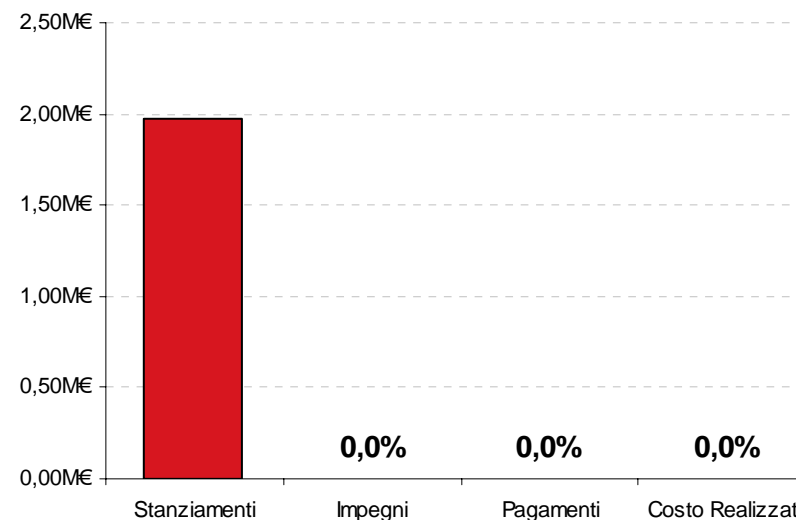

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 63 - 11 - Impianto di pretrattamento a Truncu Reale e condotta di vettoriamento reflui a depuratore di Porto Torres – Sassari

Somma stanziata: € 4.998.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

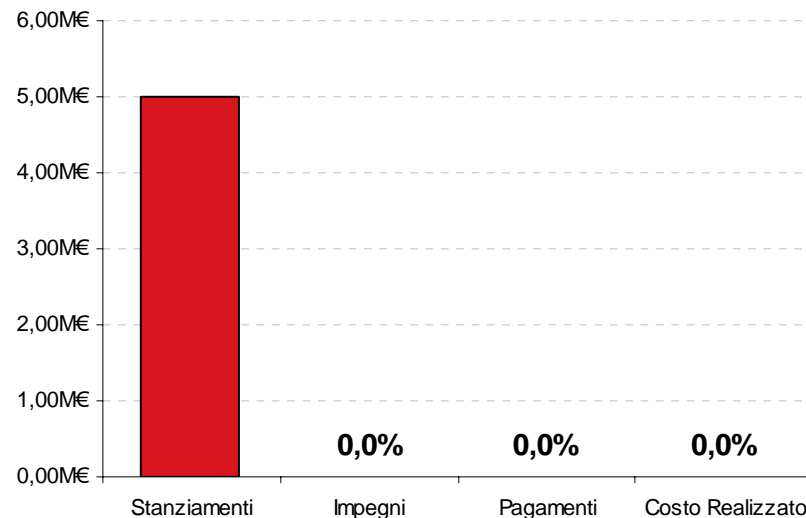

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 64 - 12 - Progetto per la realizzazione di una nuova condotta di scarico sottomarina del depuratore a servizio dell'agglomerato industriale di Olbia

Somma stanziata: € 1.100.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

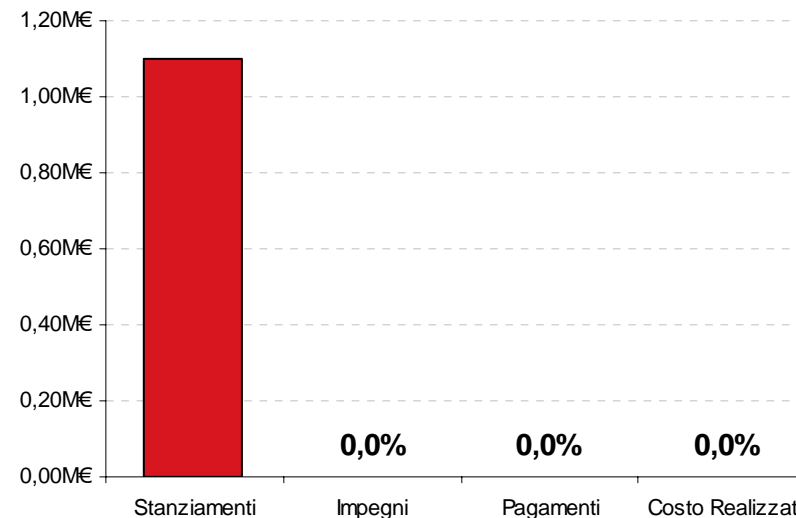

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 65 - 13-PIT - Infrastrutturazione primaria corpo nord - Agglomerato Industriale di Oristano

Somma stanziata: € 3.098.741,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

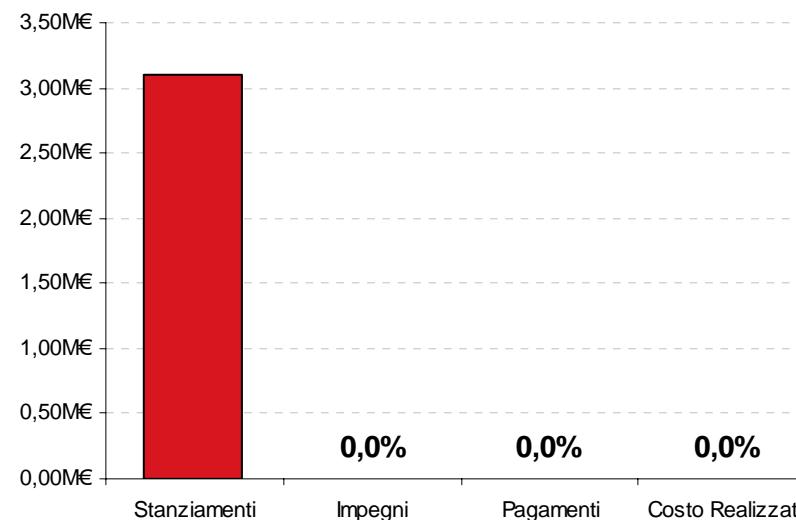

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 66 - 14-PIT - Acquedotto potabile a servizio del corpo nord - Agglomerato Industriale di Oristano

Somma stanziata: € 3.460.261,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

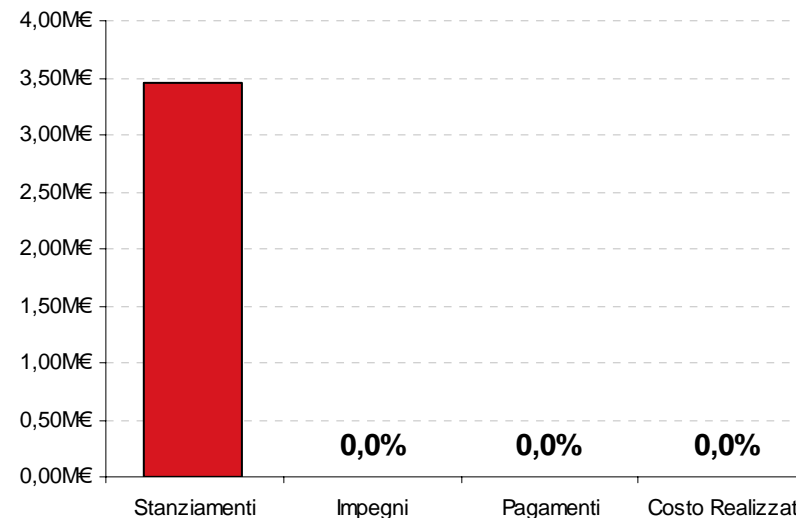



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 67 - 15-PIT - Completamento infrastrutture primarie corpo nord agglomerato industriale di Oristano. Realizzazione impianto di illuminazione pubblica al servizio degli insediamenti produttivi (PMI) – Oristano

Somma stanziata: € 850.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

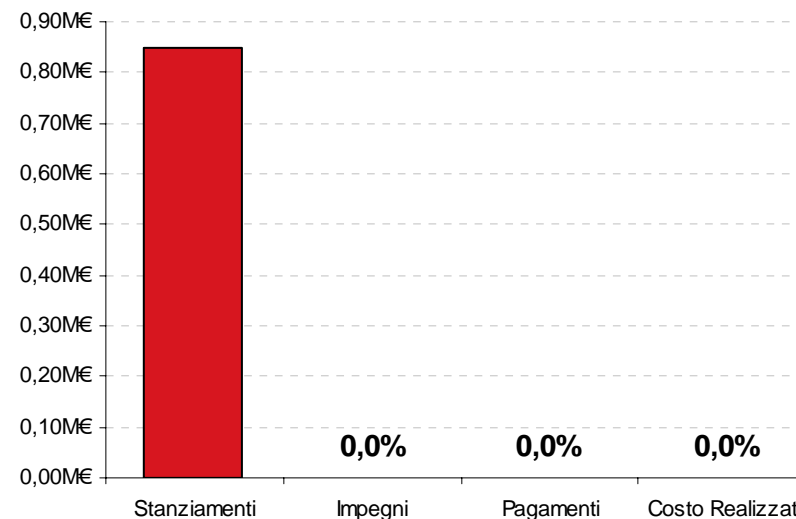

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 68 - 16-PIT - Completamento Parco Ferroviario corpo nord agglomerato Industriale di Oristano: Sistemazione piazzale ferroviario – Oristano

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

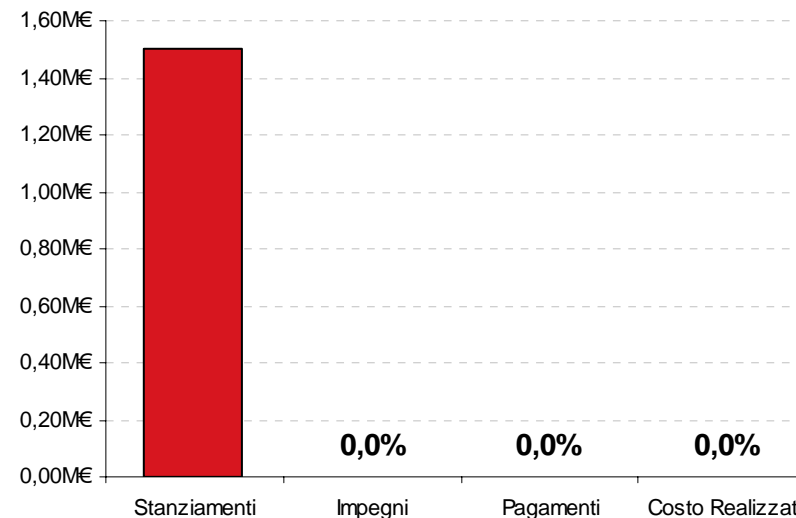

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 69 - 17 - Progetto per la realizzazione della banchina di raccordo tra la banchina lato est e la banchina Euroallumina – Portoscuso

Somma stanziata: € 4.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

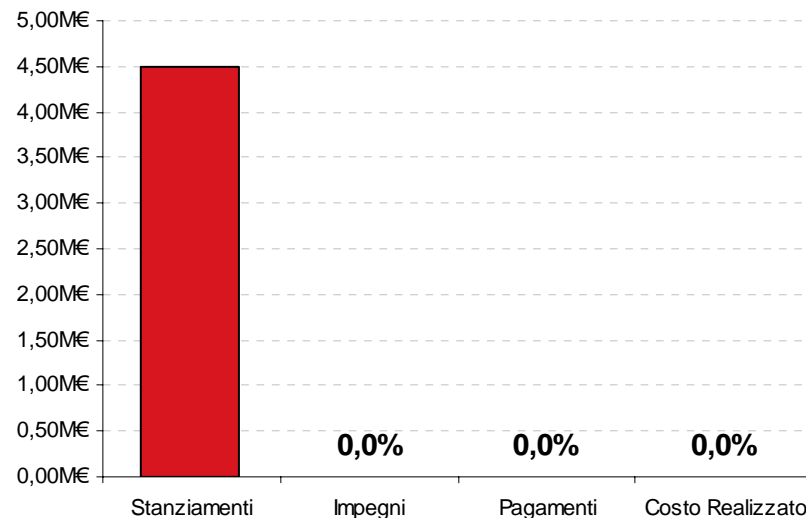

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 70 - 18-PIT - Infrastrutture primarie ZIR di Iglesias - Comparto B - 3° lotto - Iglesias

**Somma stanziata:** € 2.731.292,53

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva

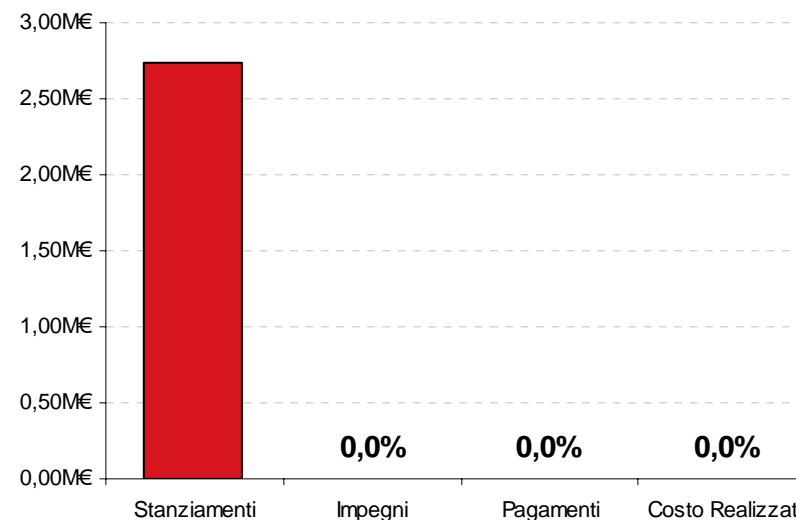

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 71 - 19-PIT - Realizzazione infrastrutture primarie comparto ovest settore nord agglomerato industriale di Tossilo – Macomer

Somma stanziata: € 3.925.072,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

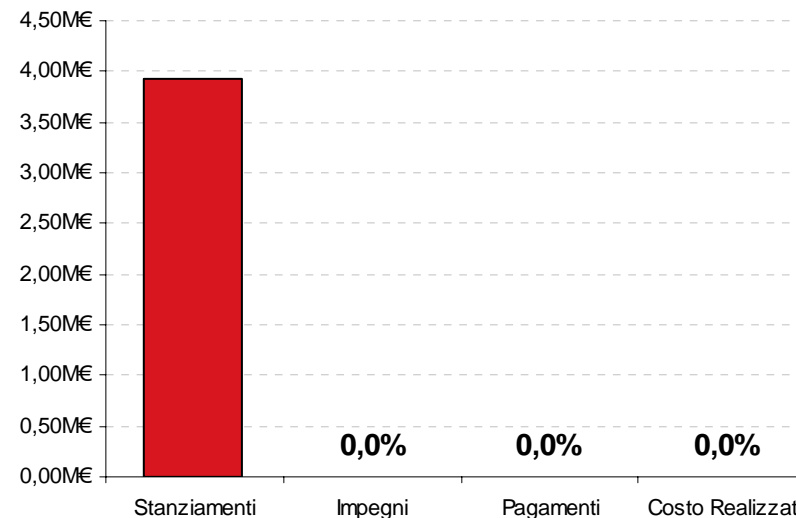

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

## 72 - 20-PIT - Realizzazione infrastrutture primarie settore sud agglomerato industriale di Tossilo - 2° lotto - Macomer

Somma stanziata: € 1.507.581,67

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

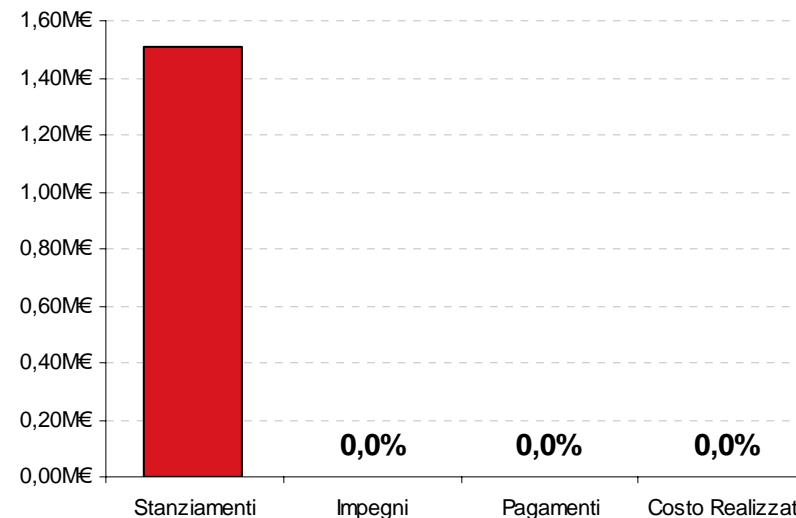

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 73 - 21 - Lavori completamento SS 131 - Mercato ortofrutticolo - Li Punti - ZIR Predda Niedda - Sassari

Somma stanziata: € 600.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

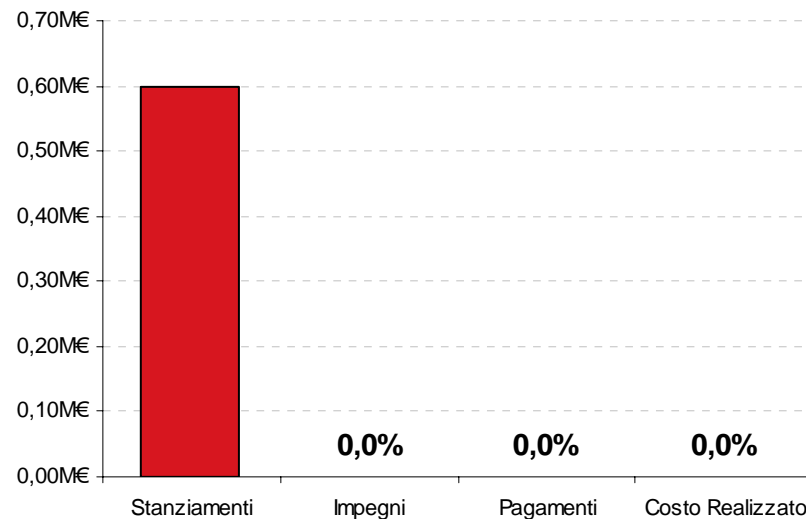

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 74 - 22 - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione delle nuove aree di espansione dell'agglomerato industriale di Pratosardo – Nuoro

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

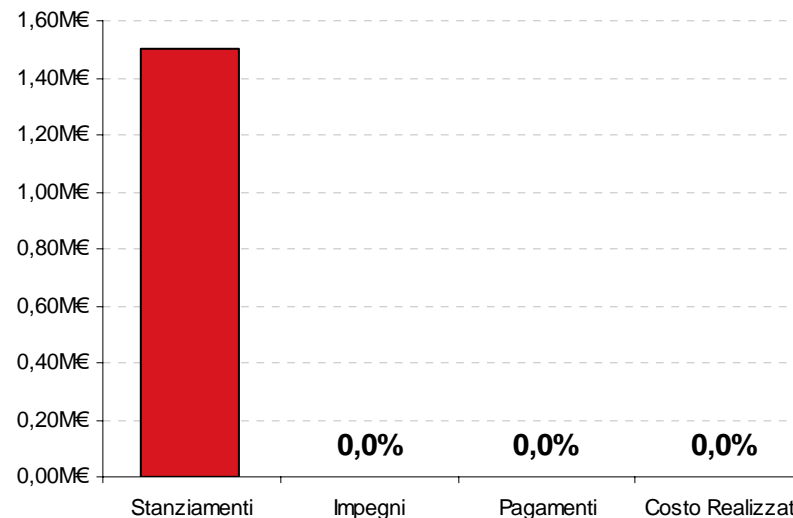



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 75 - 23 - Completamento schema idrico agglomerato industriale di Tempio Pausania - Lavori di derivazione dal serbatoio sul Rio Paghiolu - 1° lotto - Completamento funzionale - Tempio Pausania

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione:

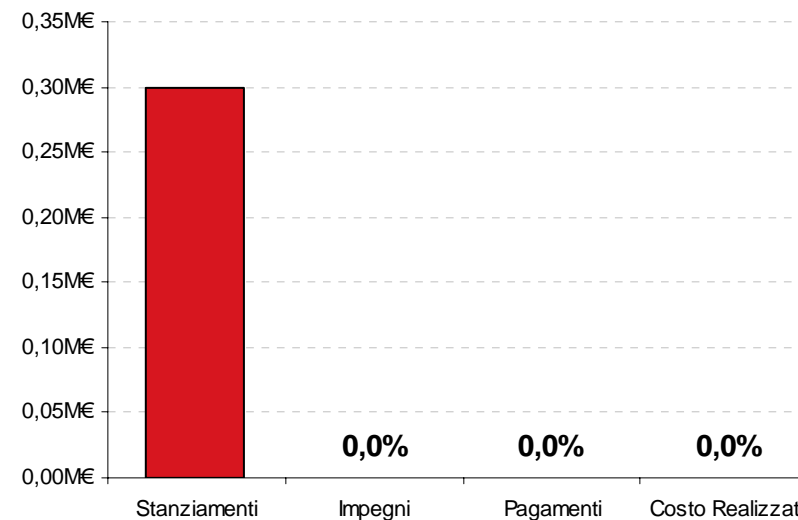

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 76 - 24 - Collegamento vario comparto D3 con la strada comunale di Muntangia e completamento dei sottoservizi - ZIR di Villacidro

Somma stanziata: € 306.313,27

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

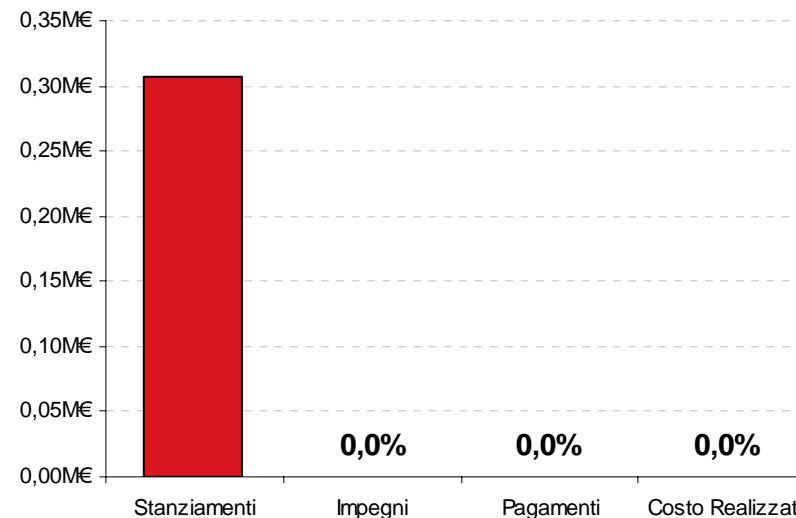

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 77 - 25-PIT - Ristrutturazione ed adeguamento infrastrutture primarie comparto consortile D1 - sub comparto SNIA - ZIR di Villacidro

Somma stanziata: € 1.562.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

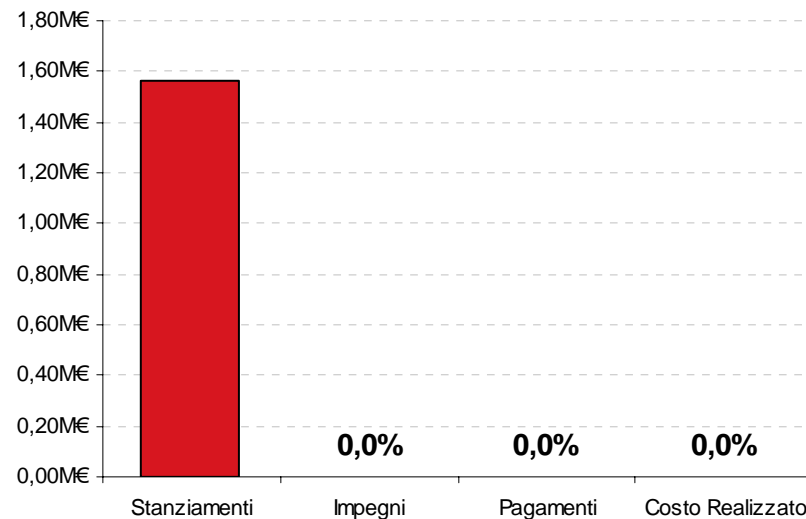

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 78 - 26-30 PIT - Sede centrale del Parco Scientifico e Tecnologico: Strada di collegamento SS 195 - Ingresso Parco - Pula

**Somma stanziata:** € 3.140.721,78

**Somma impegnata:** € 174.687,66

% impegnato su stanziato: 5,56%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 13.000,00

% pagato su stanziato: 0,41%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva

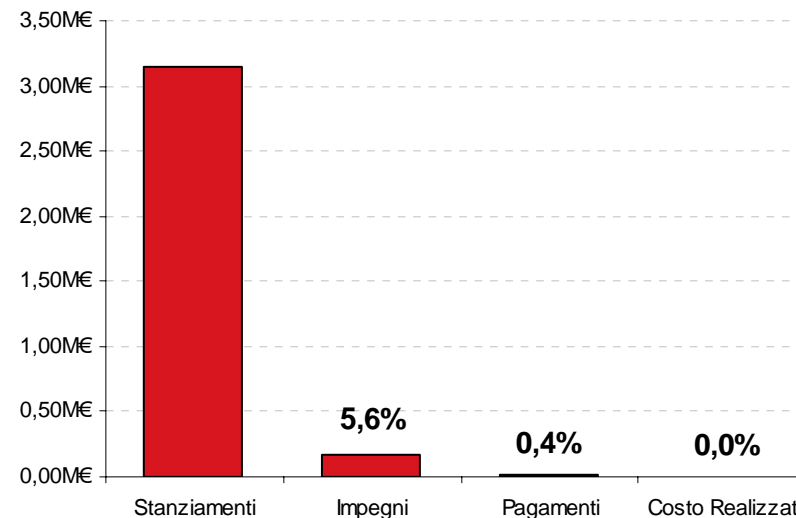

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 79 - 27-PIT - Realizzazione opere di completamento delle opere PIP di urbanizzazione primaria del PIP – Marrubiu

**Somma stanziata:** € 3.057.424,00

**Somma impegnata:** € 79.124,99

% impegnato su stanziato: 2,59%


**Costo realizzato:** € 79.124,99

% realizzato su stanziato: 2,59%

**Pagamenti:** € 79.124,99

% pagato su stanziato: 2,59%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva conclusa

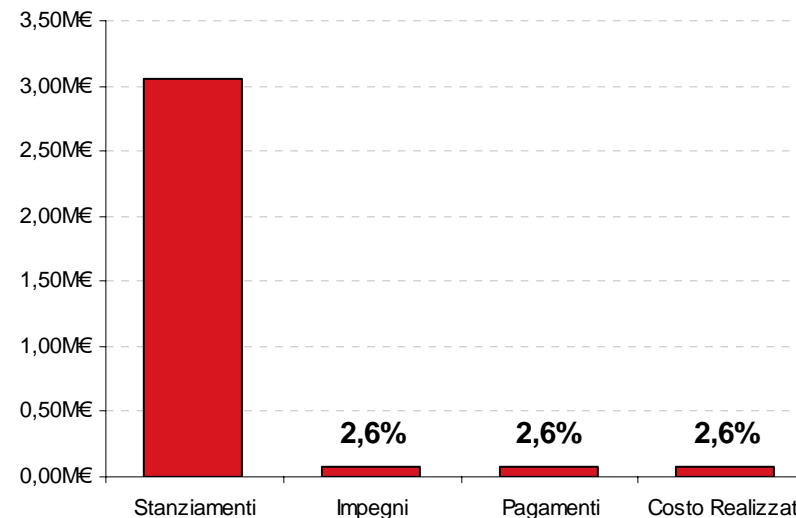

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 80 - 28-PIT - Completamento PIP - 2° lotto funzionale - Musei

**Somma stanziata:** € 570.000,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva conclusa

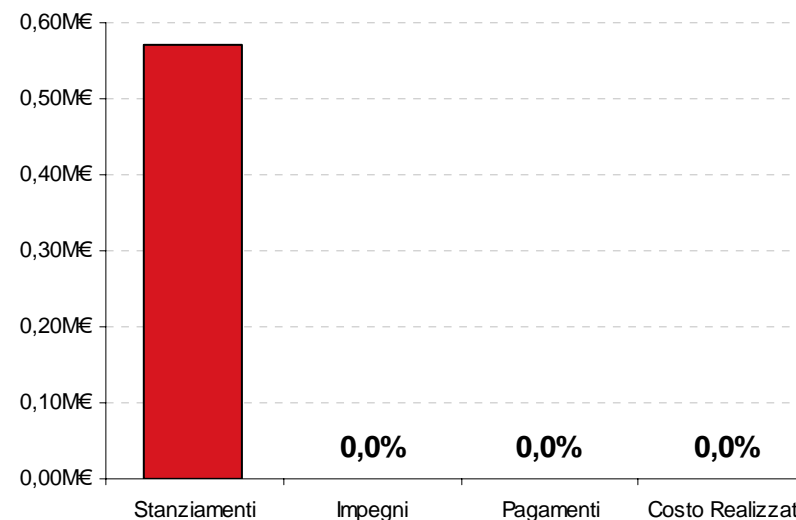

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 81 - 29-PIT - Completamento PIP Is Arenas - 4° lotto - Donori

**Somma stanziata:** € 249.966,31

**Somma impegnata:** € 236.778,15

% impegnato su stanziato: 94,72%


**Costo realizzato:** € 236.778,15

% realizzato su stanziato: 94,72%

**Pagamenti:** € 236.778,15

% pagato su stanziato: 94,72%

**Stato di attuazione:** Concluso

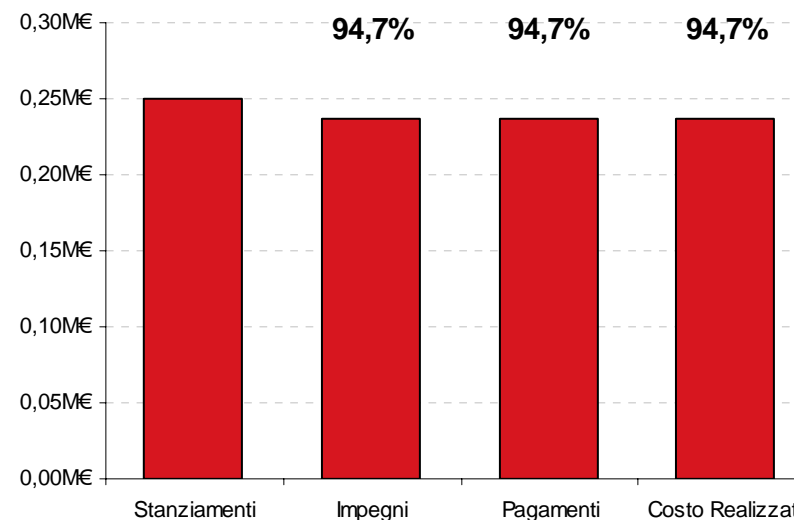

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 82 - 31-PIT - Lavori di urbanizzazione dell'area PIP - 4° lotto esecutivo – Orani

**Somma stanziata:** € 1.057.275,00

**Somma impegnata:** € 27.331,03

% impegnato su stanziato: 2,59%


**Costo realizzato:** € 5.312,28

% realizzato su stanziato: 0,5%

**Pagamenti:** € 5.312,28

% pagato su stanziato: 0,5%

**Stato di attuazione:** Appalto

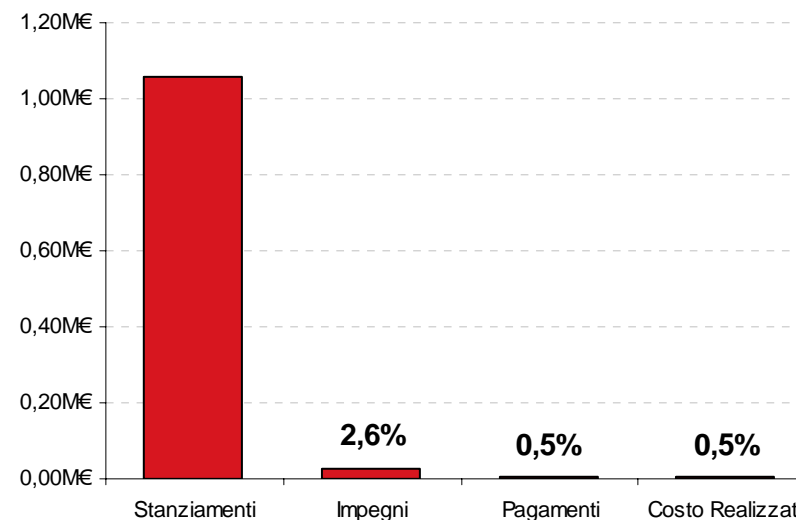



## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 83 - 32-PIT - Lavori di completamento interventi di urbanizzazione primaria nella zona PIP (2^ fase) – Gavoi

Somma stanziata: € 925.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

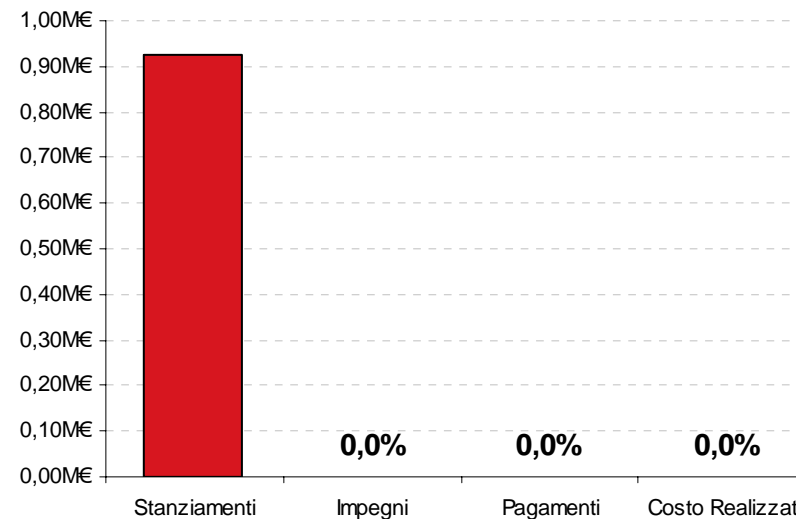

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 84 - 33-PIT - Realizzazione viabilità di connessione esterna e dei collettori fognari principali delle acque nere a servizio dei comparti comunali destinati ad attività produttive - Comune di Ottana

Somma stanziata: € 1.031.275,00

Somma impegnata: € 98.409,90

% impegnato su stanziato: 9,54%


Costo realizzato: € 63.898,06

% realizzato su stanziato: 6,2%

Pagamenti: € 63.898,06

% pagato su stanziato: 6,2%

Stato di attuazione: Appalto

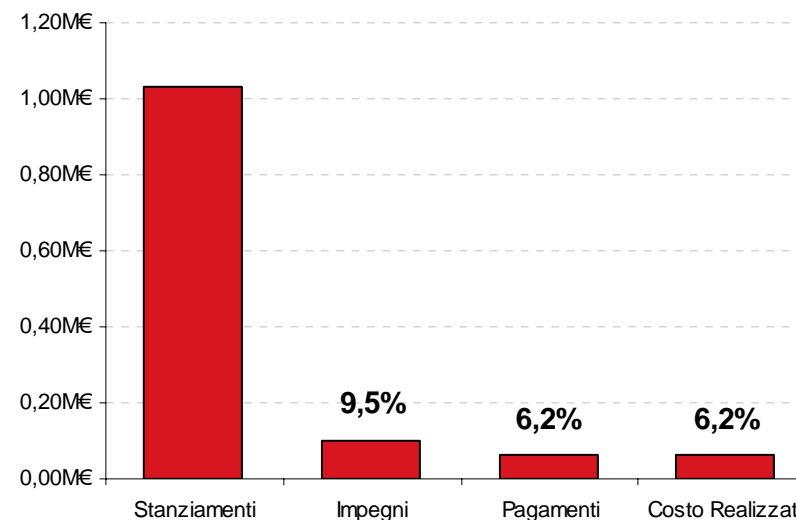

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 85 - 34-PIT - Realizzazione impianto di depurazione ad uso PIP e realizzazione collettore fognario annesso - Comune di Orotelli

Somma stanziata: € 610.000,00

Somma impegnata: € 15.000,00

% impegnato su stanziato: 2,46%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

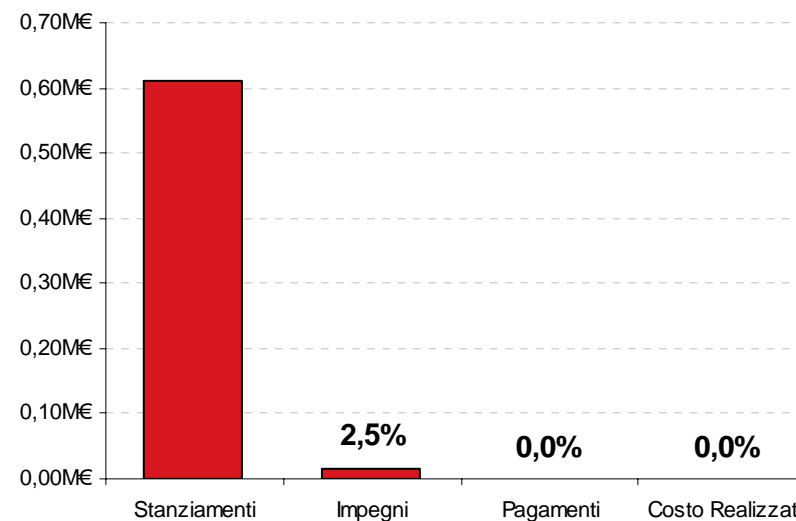

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 86 - 35-PIT - Realizzazione dell'impianto di depurazione della zona PIP di Oniferi

**Somma stanziata:** € 522.222,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Appalto concluso

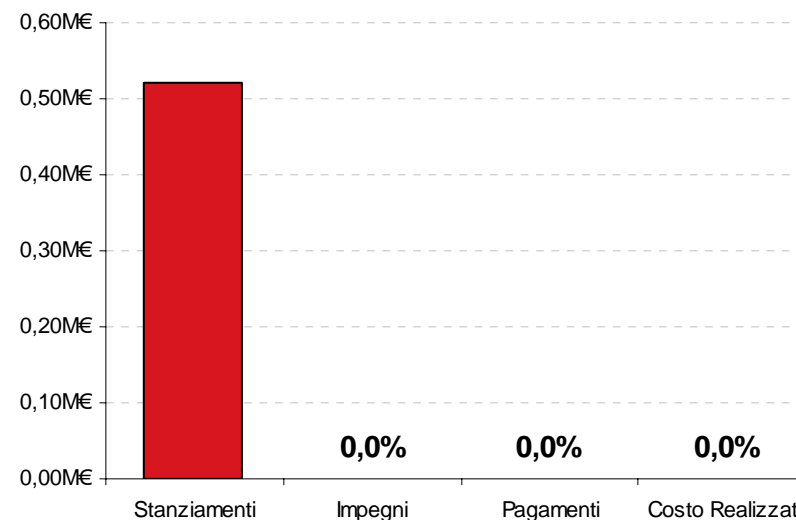

# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 87 - 36-PIT - Completamento PIP di Terralba

**Somma stanziata:** € 603.622,97

**Somma impegnata:** € 85.772,07

% impegnato su stanziato: 14,21%


**Costo realizzato:** € 44.799,06

% realizzato su stanziato: 7,42%

**Pagamenti:** € 44.799,06

% pagato su stanziato: 7,42%

**Stato di attuazione:** Progettazione esecutiva conclusa

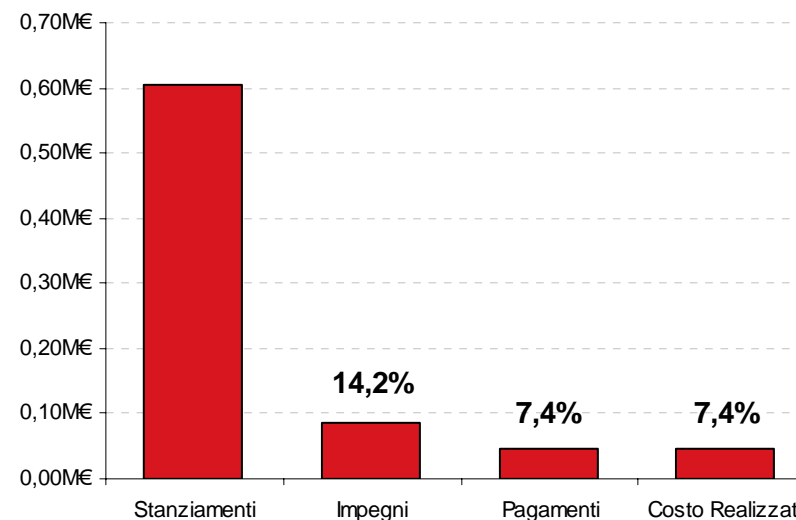

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 88 - 37-PIT - Realizzazione collettore fognario per l'evacuazione dei reflui del PIP di Marrubiu

Somma stanziata: € 980.000,00

Somma impegnata: € 102.354,22

% impegnato su stanziato: 10,44%


Costo realizzato: € 55.500,38

% realizzato su stanziato: 5,66%

Pagamenti: € 55.500,38

% pagato su stanziato: 5,66%

Stato di attuazione: Appalto concluso

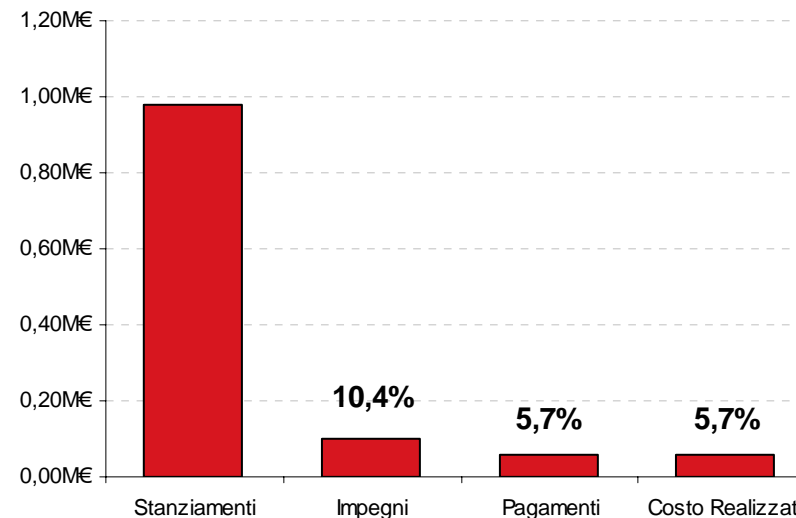

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

#### 89 - 38 - Ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento impianto depurazione consortile di Macomer ed annessi collettori fognari di Tossilo – Macomer

Somma stanziata: € 3.000.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

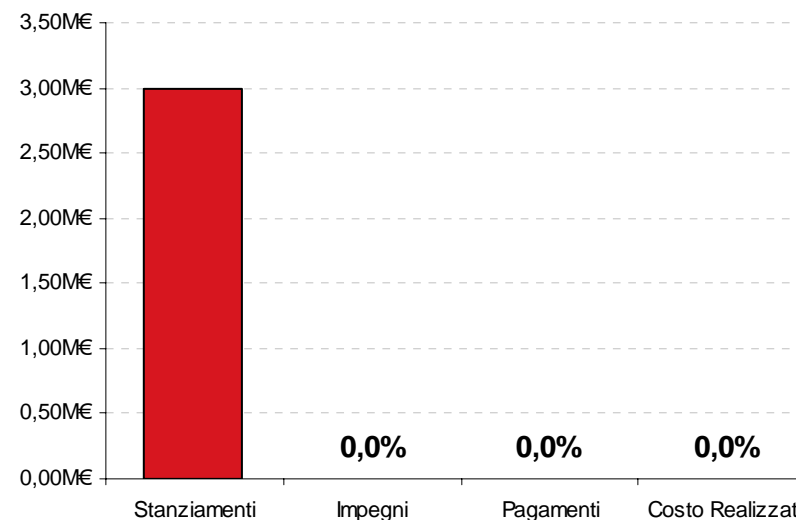

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 90 - 39 - Cooperazione internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del territorio della Sardegna

Somma stanziata: € 5.590.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

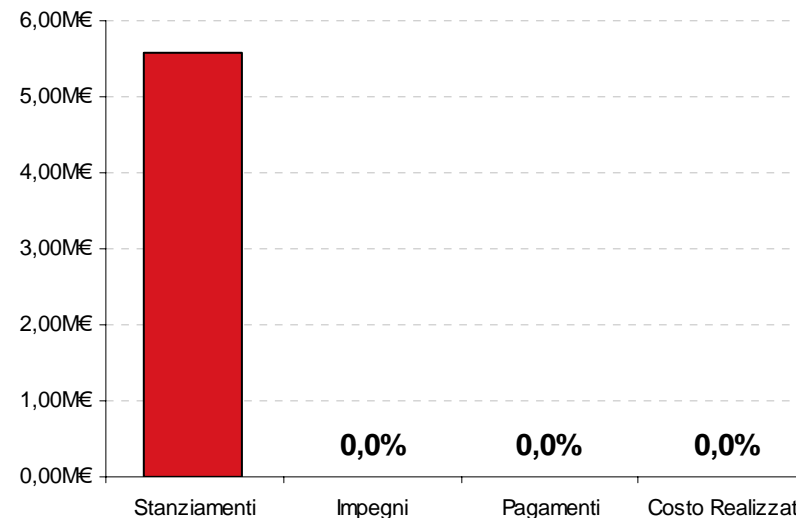



# 10 SVILUPPO LOCALE

## APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 91 - 40 - Risanamento e recupero del quartiere di S. Elia – Cagliari

**Somma stanziata:** € 800.000,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Studio di fattibilità in corso

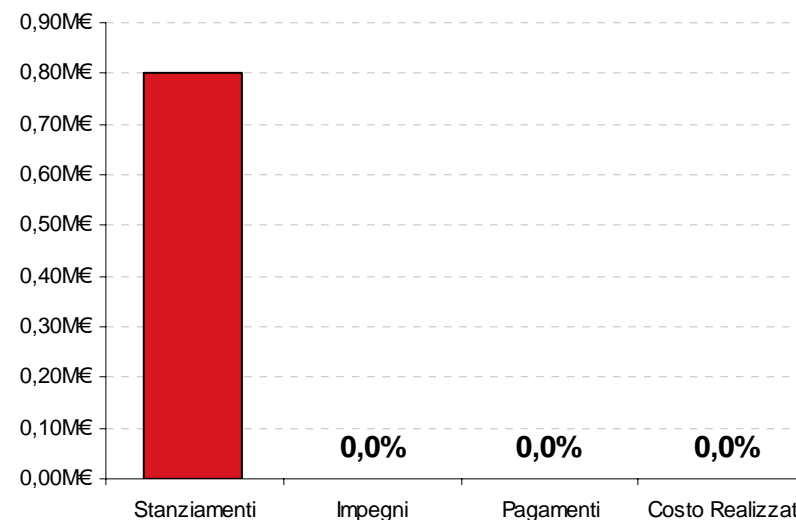

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

## 92 - 41 - Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle strutture minerarie di Monteponi, Masua e Funtanamare – Iglesias

Somma stanziata: € 1.300.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Sospeso. Risorse destinate Museo di Tavolara

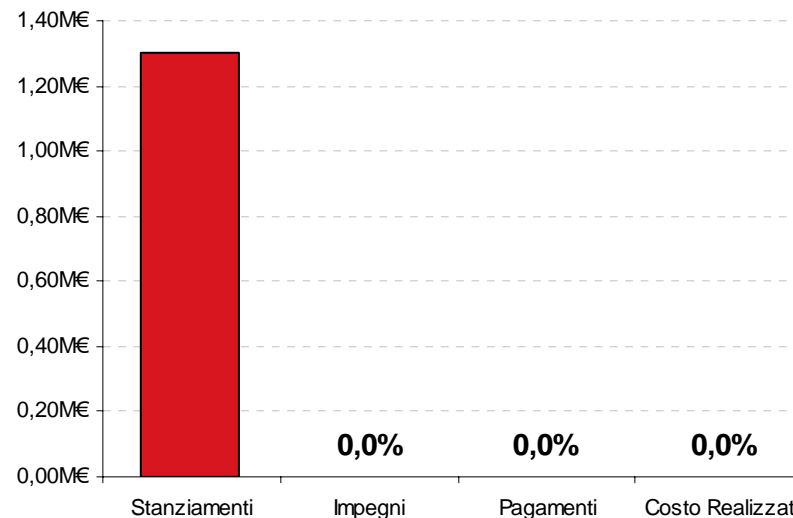

## 10 SVILUPPO LOCALE

### APQ ORIGINARIO 29-APR-05

### 93 - 42 - Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle strutture minerarie dell'Argentiera - Sassari

**Somma stanziata:** € 595.000,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Sospeso. Risorse destinate Museo di Tavolara

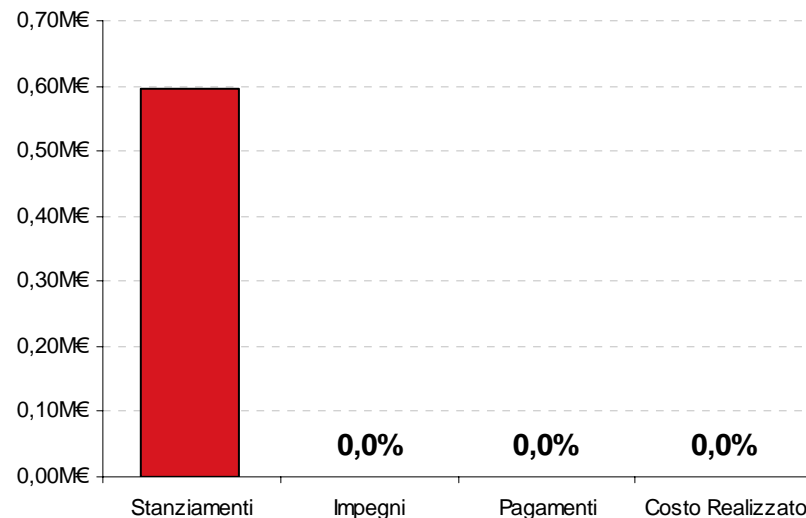

# 10,1 SVILUPPO LOCALE

## I ATTO INTEGRATIVO 22-DIC-06

### 1 - II01 - Sistema depurativo - Agglomerato industriale di Ottana

**Somma stanziata:** € 2.000.000,00

**Somma impegnata:** € 0

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progetto preliminare concluso

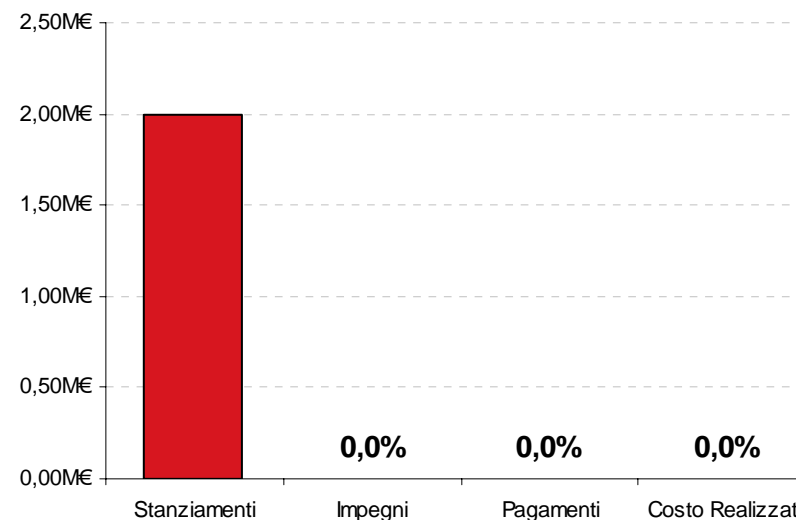

# 10,1 SVILUPPO LOCALE

## I ATTO INTEGRATIVO 22-DIC-06

### 2 - II02 - Lavori di razionalizzazione ed adeguamento strutturale della strada di accesso all'agglomerato industriale – Località Prato Sardo – Nuoro

Somma stanziata: € 1.324.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto preliminare approvato

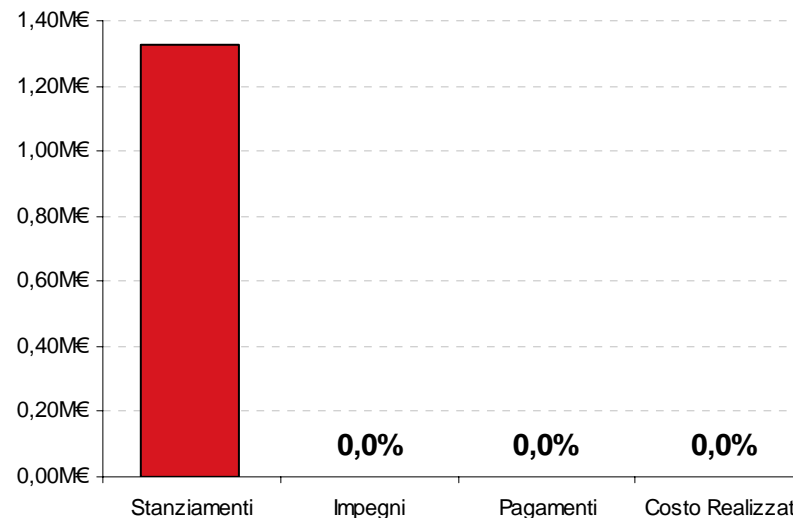

## 10,1 SVILUPPO LOCALE

### I ATTO INTEGRATIVO 22-DIC-06

### 3 - II03 - Razionalizzazione e monitoraggio delle condotte e dell'impianto di accumulo e distribuzione dell'acqua - Zona Industriale di Villacidro

Somma stanziata: € 476.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto preliminare concluso

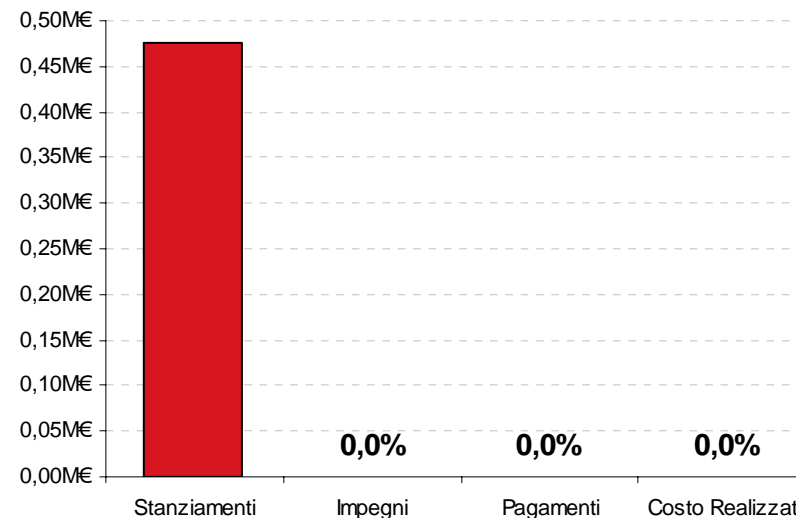

## 10,1 SVILUPPO LOCALE

### I ATTO INTEGRATIVO 22-DIC-06

#### 4 - II04 - Realizzazione nuova sezione di produzione di acqua industriale mediante riutilizzo di acque reflue nell'impianto di depurazione di Macomer

Somma stanziata: € 1.200.000,00

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità approvato

