



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

32

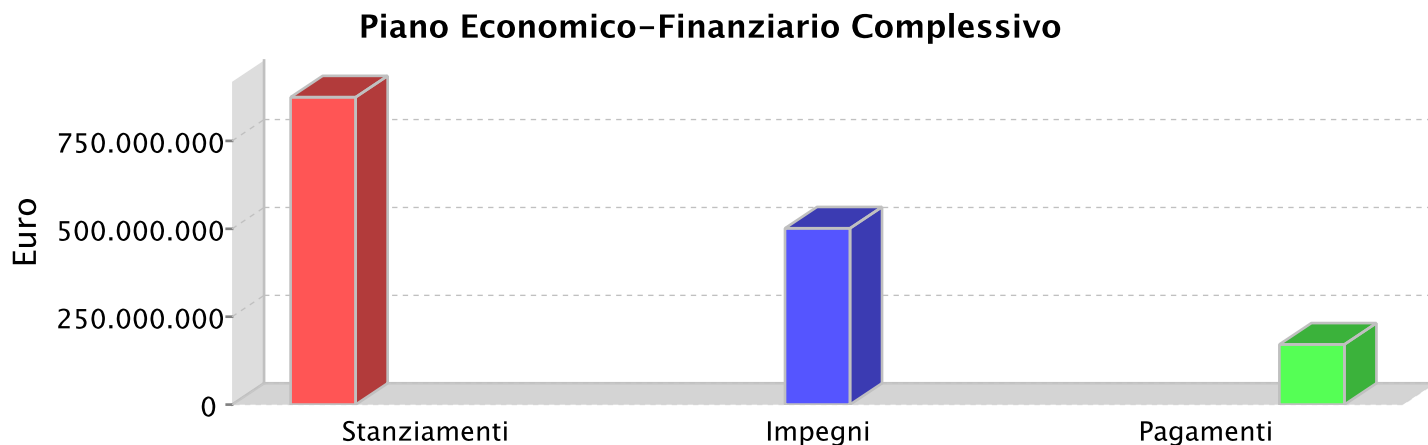


■ Stanziamenti=874.290.963,99 € ■ Impegni=501.501.549,92 €
■ Pagamenti =171.161.946,44 €

Avanzamento impegni: 57.37 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 19.58 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

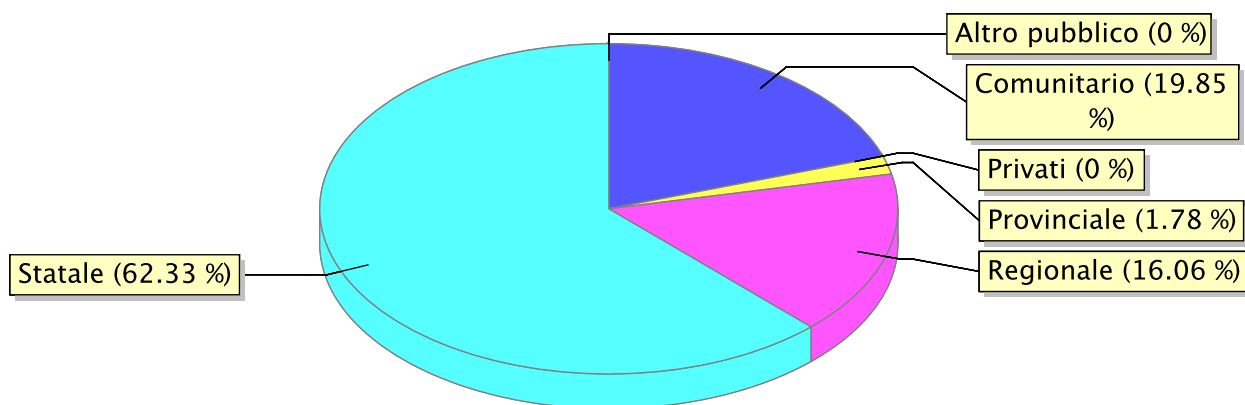

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 173.511.728,37 ● Privati = 0
● Provinciale = 15.494.000 ● Regionale = 140.405.019,23
● Statale = 544.880.216,39

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

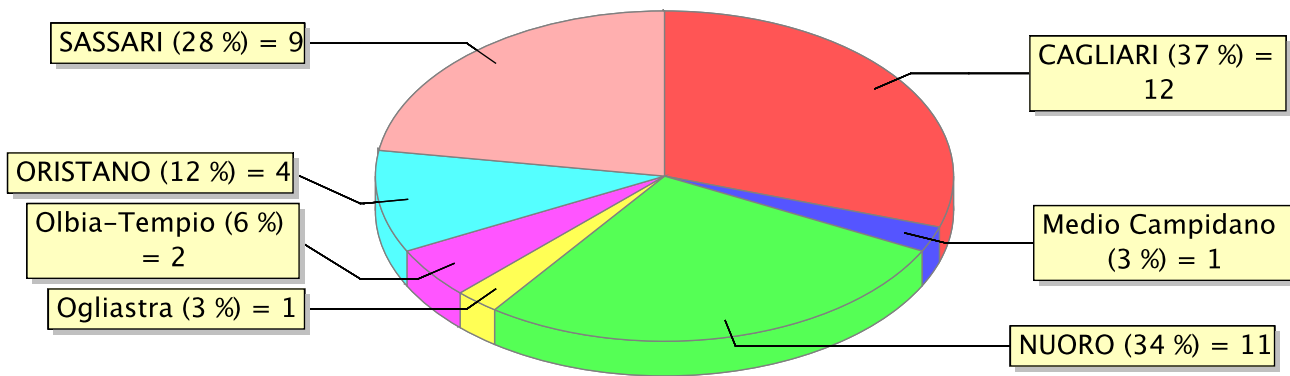

● CAGLIARI (37 %) = 12 ● Medio Campidano (3 %) = 1 ● NUORO (34 %) = 11
● Ogliastra (3 %) = 1 ● Olbia-Tempio (6 %) = 2 ● ORISTANO (12 %) = 4
● SASSARI (28 %) = 9

Report del progetto: 003 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 47+600 (Variante Sanluri)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Sanluri

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

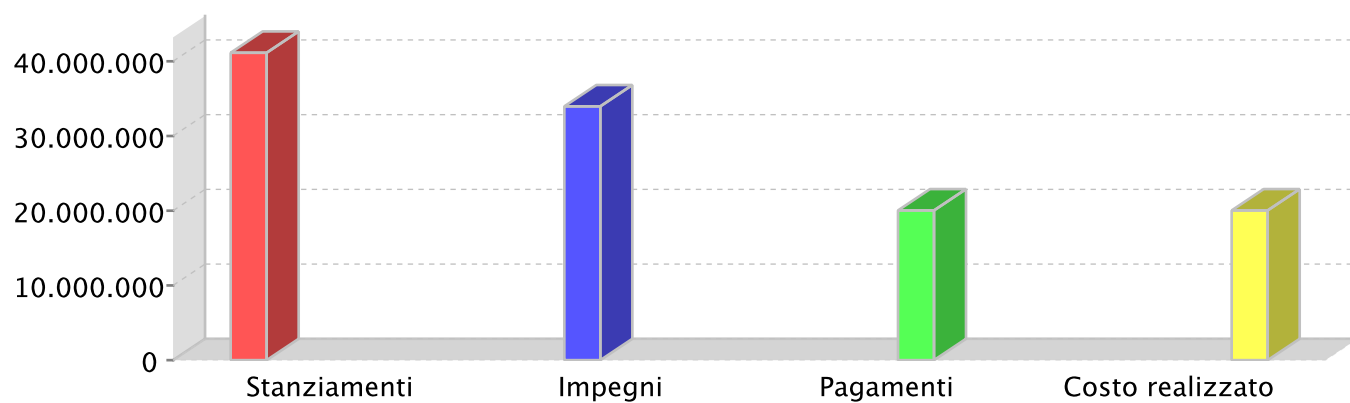

■ Stanziamenti=41.140.000,00 € ■ Impegni=33.969.261,91 €
■ Pagamenti=20.036.653,40 € ■ Costo realizzato=20.036.653,40 €

Avanzamento impegni: 82.57 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 48.71 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 48.71 % sullo stanziato

Report del progetto: 011 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al Km.99+500 Uras Macomer 3 Lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

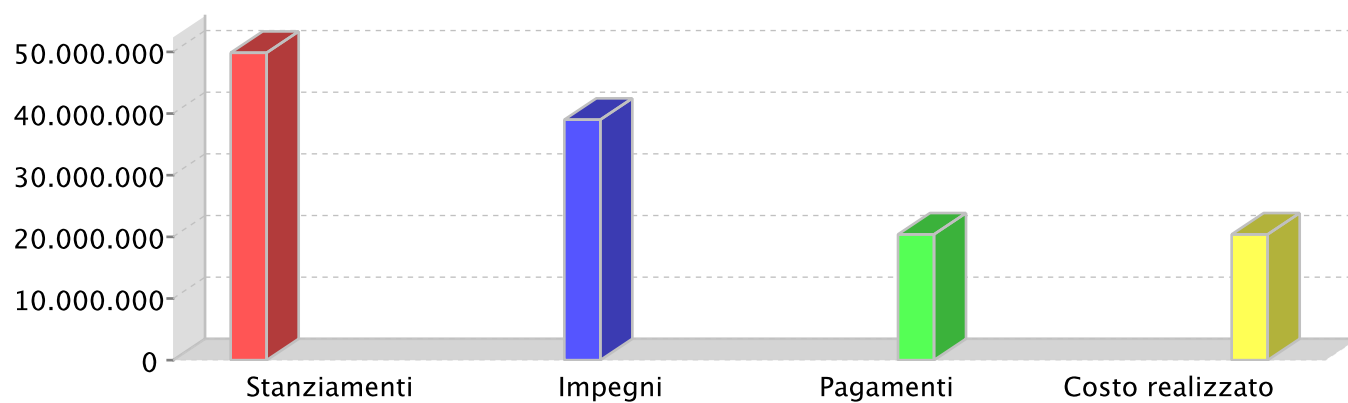

■ Stanziamenti=49.860.000,00 € ■ Impegni=39.005.753,51 €
■ Pagamenti=20.399.857,35 € ■ Costo realizzato=20.399.857,35 €

Avanzamento impegni: 78.24 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.92 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 40.92 % sullo stanziato

Report del progetto: 012 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al Km.108+300 Uras Macomer 4

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

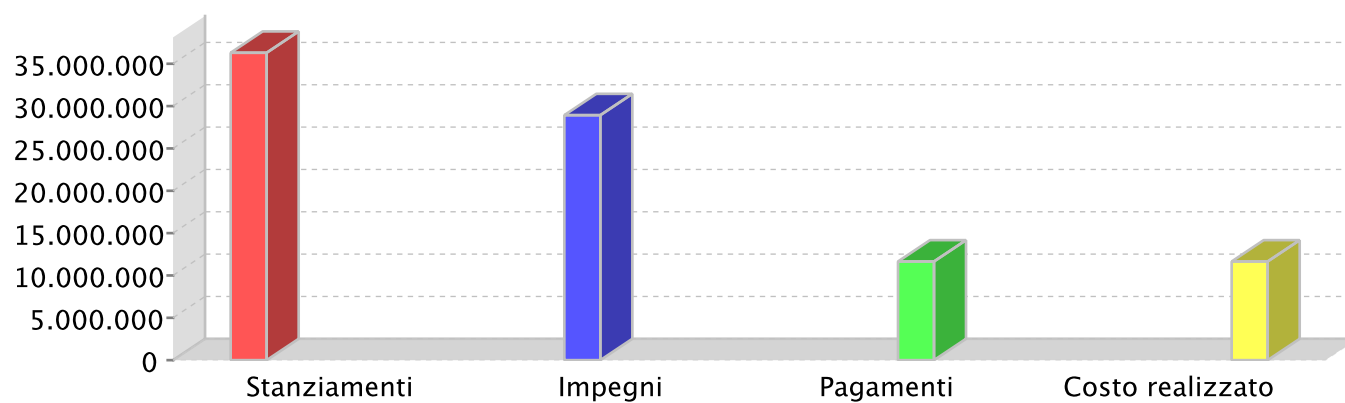

■ Stanziamenti=36.300.000,00 € ■ Impegni=28.929.839,94 €
■ Pagamenti=11.650.461,61 € ■ Costo realizzato=11.650.461,61 €

Avanzamento impegni: 79.70 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 32.10 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 32.10 % sullo stanziato

Report del progetto: 034 - Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

CONSORZIO A.S.I.


Responsabile dell'intervento

Ing. Mirella Becciu

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

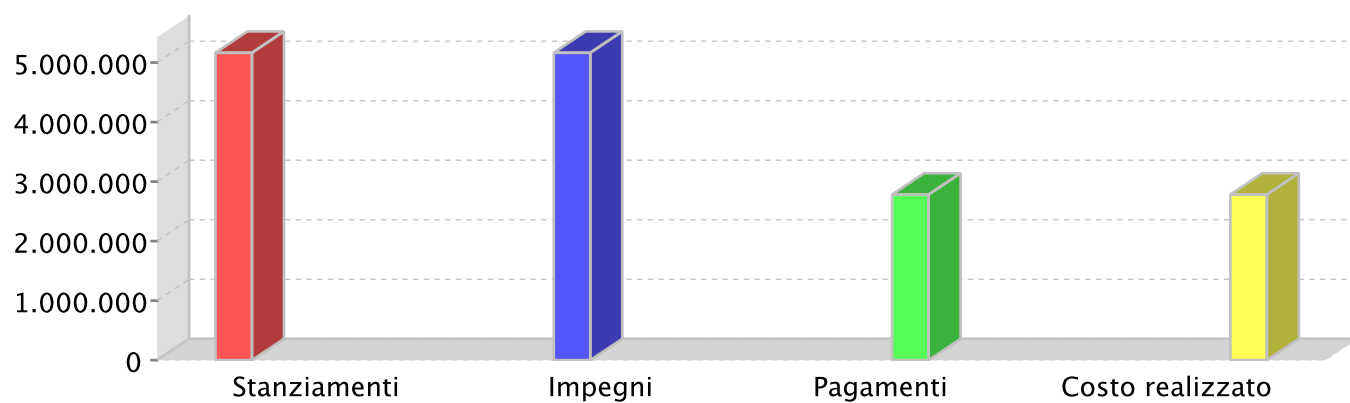

■ Stanziamenti=5.164.600,00 € ■ Impegni=5.164.600,00 €
■ Pagamenti=2.782.268,67 € ■ Costo realizzato=2.782.268,67 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 53.88 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 53.88 % sullo stanziato

Report del progetto: 009 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 88+357 Uras Macomer 2

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

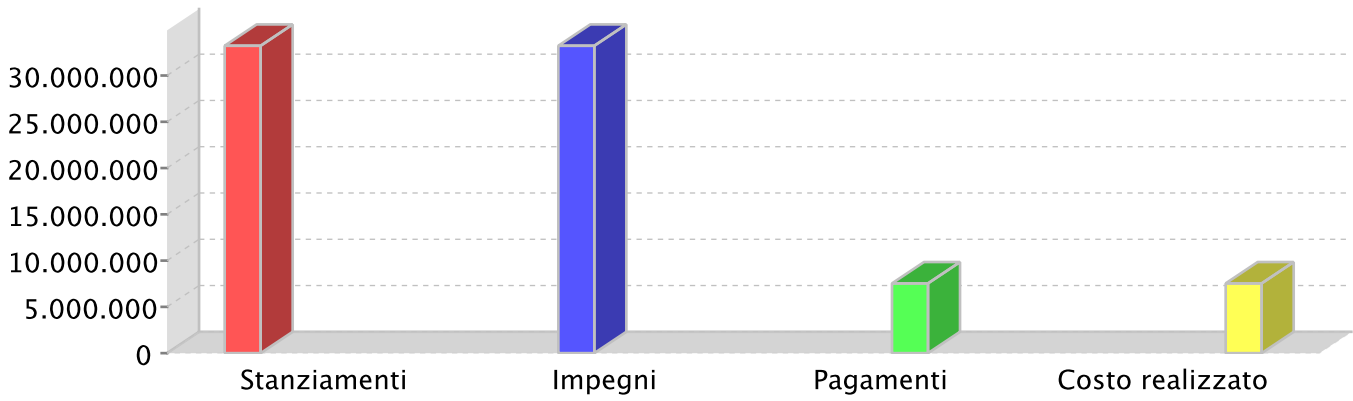

■ Stanziamenti=33.215.613,24 € ■ Impegni=33.215.613,24 €
■ Pagamenti=7.539.064,46 € ■ Costo realizzato=7.539.064,46 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 22.70 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 22.70 % sullo stanziato

Report del progetto: 010 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras Macomer 3 Lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

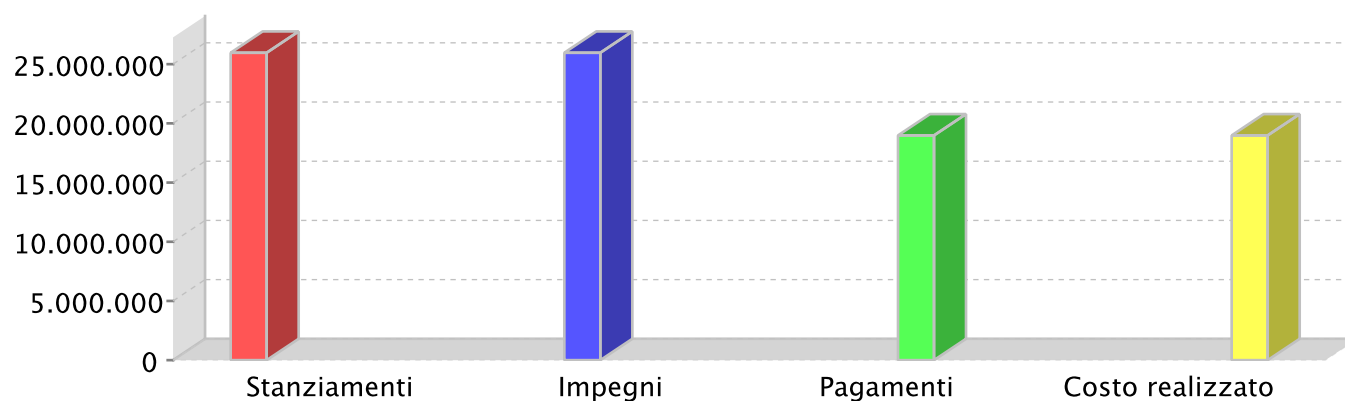

■ Stanziamenti=25.964.498,96 € ■ Impegni=25.964.498,96 €
■ Pagamenti=18.981.480,15 € ■ Costo realizzato=18.981.480,15 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 73.11 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 73.11 % sullo stanziato

Report del progetto: 039 - S.S. 131 d.c.n. - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il porto industriale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

CONSORZIO INDUSTRIALE DI OLBIA


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Ferdinando Catgiu - Dirigente Ufficio Tecnico

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

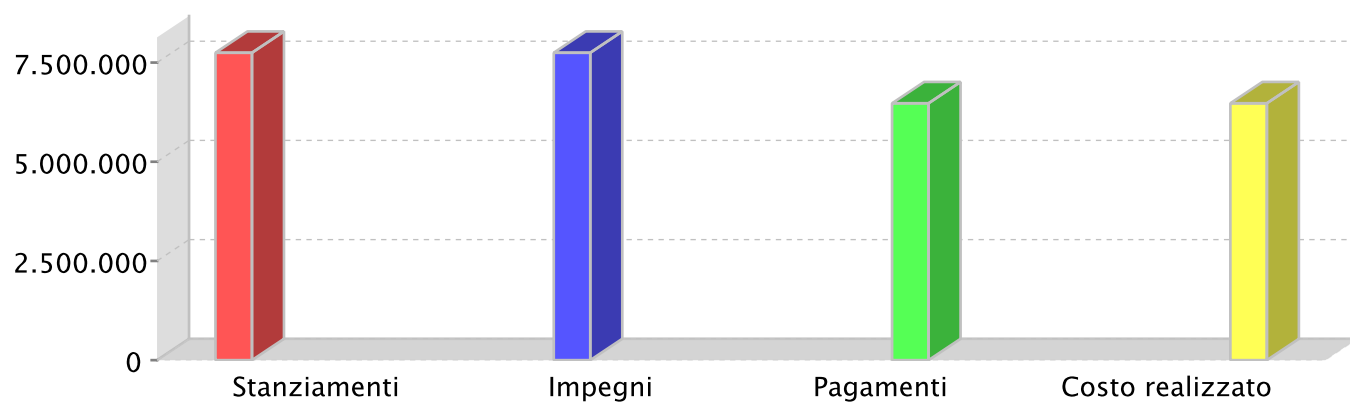

■ Stanziamenti=7.747.000,00 € ■ Impegni=7.747.000,00 €
■ Pagamenti=6.473.701,32 € ■ Costo realizzato=6.473.701,32 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 83.57 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 83.57 % sullo stanziato

Report del progetto: 041 - S.S. 131 d.c.n. - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di Galtelli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Galtelli

Soggetto Attuatore

Comunita Montana n. 10


Responsabile dell'intervento

Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Antonio Ortu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

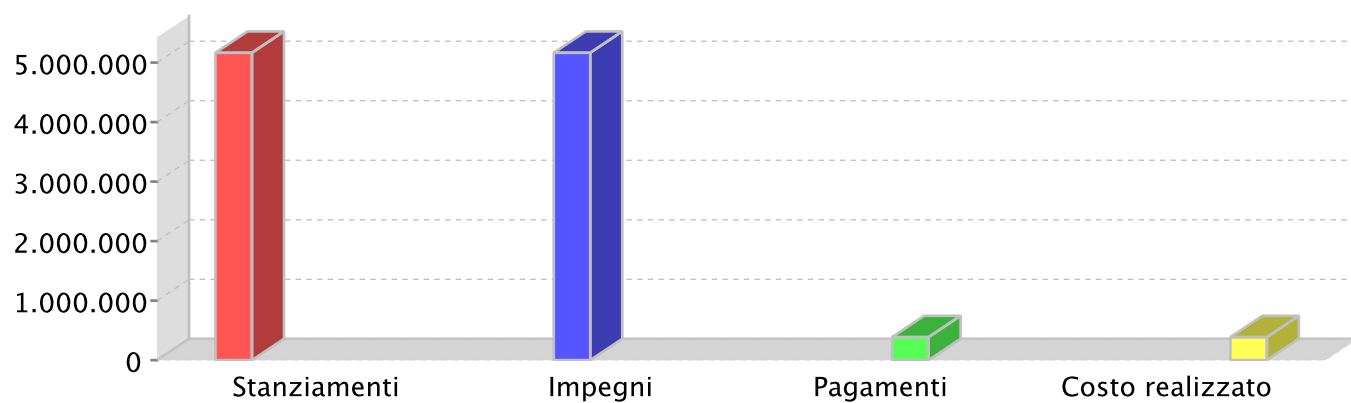

■ Stanziamenti=5.165.000,00 € ■ Impegni=5.165.000,00 €
■ Pagamenti=386.699,11 € ■ Costo realizzato=386.699,11 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 7.49 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 7.49 % sullo stanziato

Report del progetto: 044 - S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Responsabile dell'intervento


Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

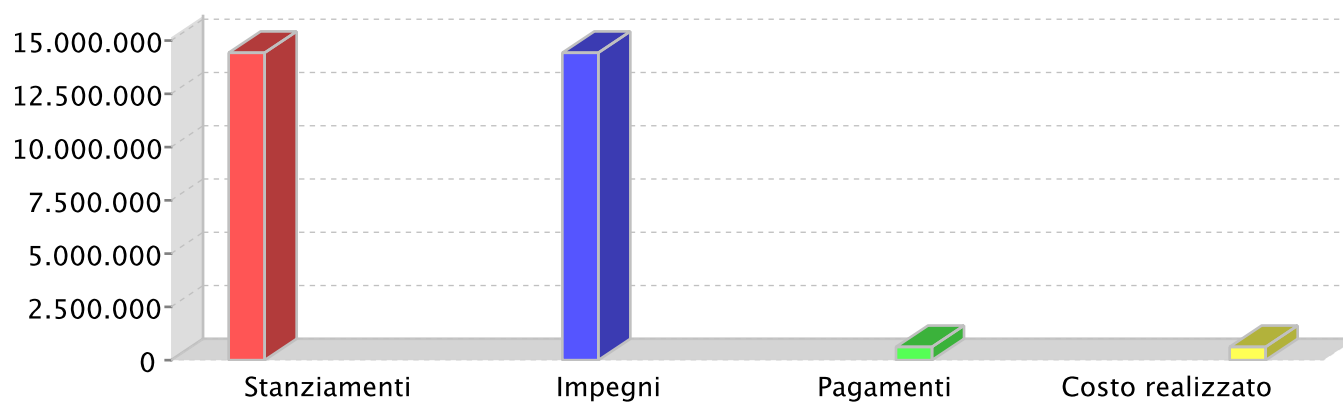

■ Stanziamenti=14.427.538,00 € ■ Impegni=14.427.538,00 €

■ Pagamenti=622.046,85 € ■ Costo realizzato=622.046,85 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.32 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.32 % sullo stanziato

Report del progetto: 045 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 1 lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

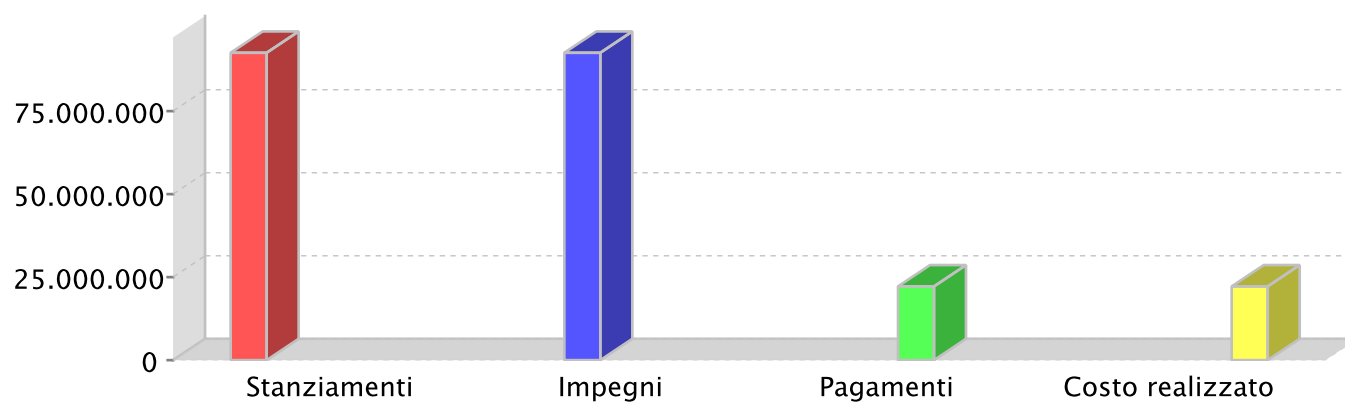

■ Stanziamenti=92.580.000,00 € ■ Impegni=92.580.000,00 €
■ Pagamenti=22.209.825,43 € ■ Costo realizzato=22.209.825,43 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 23.99 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 23.99 % sullo stanziato

Report del progetto: 046 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 2 lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Geol. Salvatore Papale

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

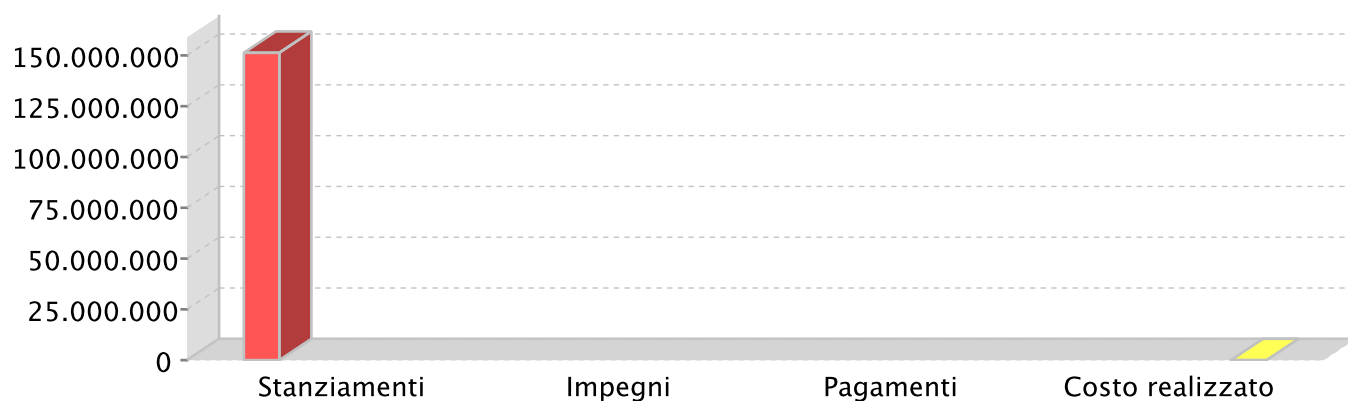

■ Stanziamenti=151.303.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 058 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-San Priamo - 4 lotto 1 stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

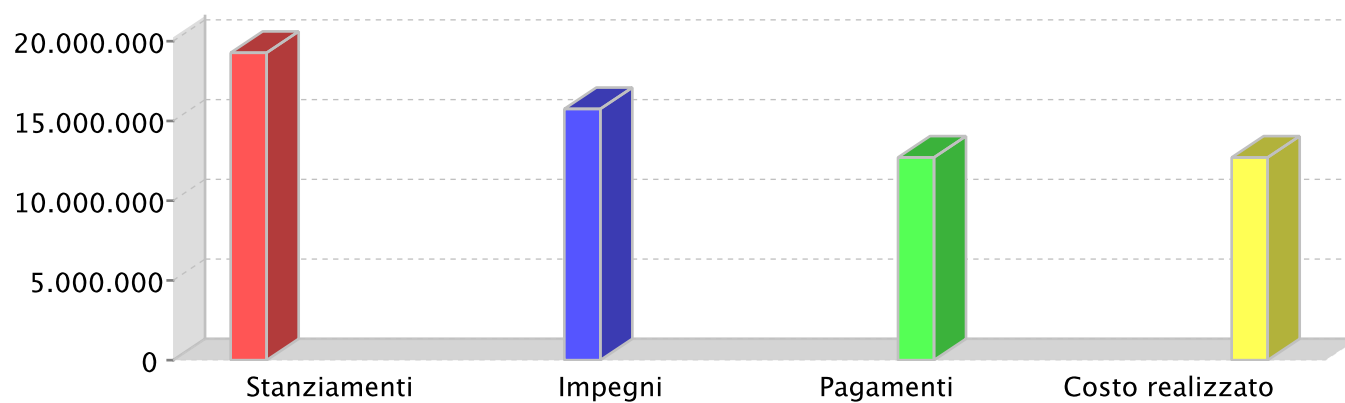

■ Stanziamenti=19.276.000,00 € ■ Impegni=15.755.585,79 €
■ Pagamenti=12.711.271,37 € ■ Costo realizzato=12.711.271,37 €

Avanzamento impegni: 81.74 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 65.95 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 65.95 % sullo stanziato

Report del progetto: 067 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

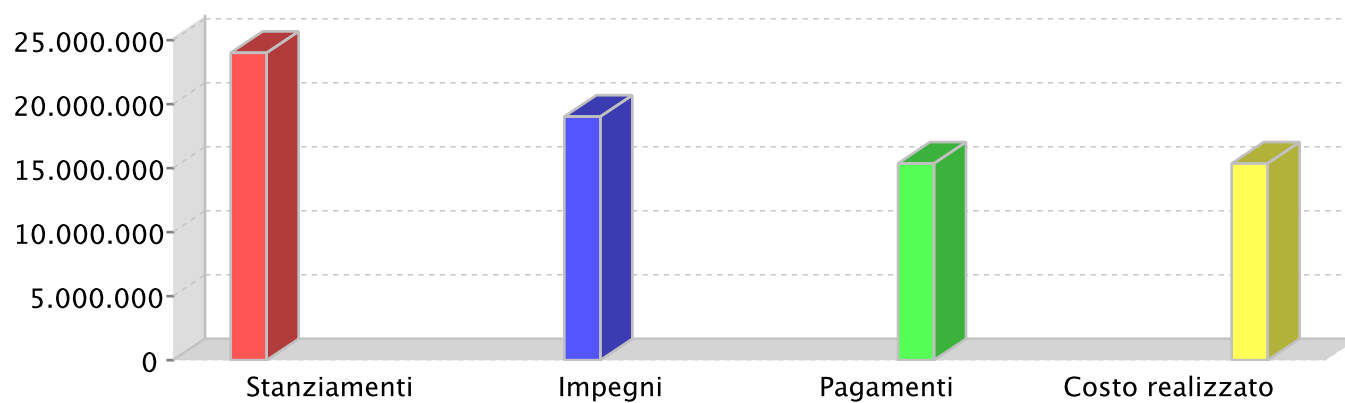

■ Stanziamenti=24.015.245,81 € ■ Impegni=19.031.809,21 €
■ Pagamenti=15.371.806,11 € ■ Costo realizzato=15.371.806,11 €

Avanzamento impegni: 79.25 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 64.01 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 64.01 % sullo stanziato

Report del progetto: 068 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

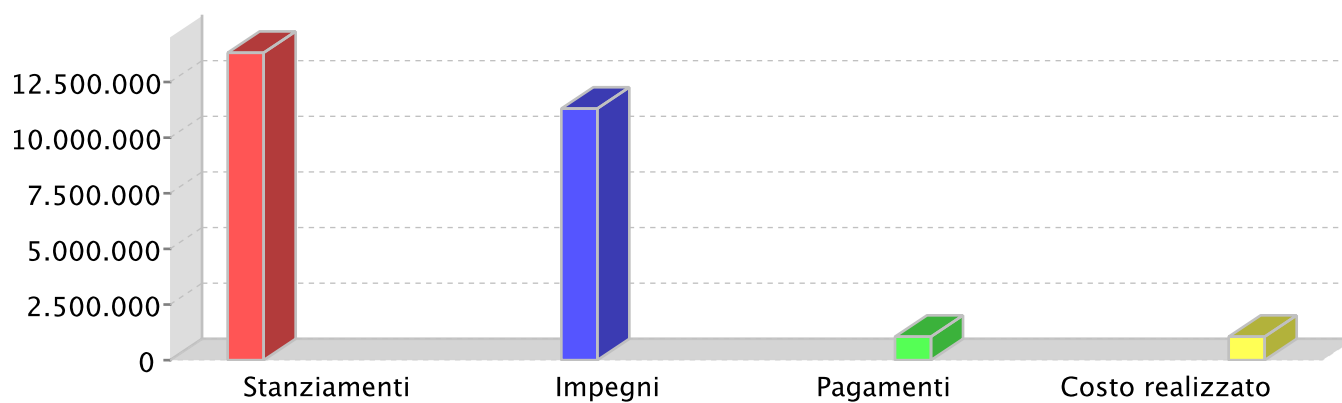

■ Stanziamenti=13.815.222,05 €	■ Impegni=11.305.971,16 €
■ Pagamenti=1.055.134,00 €	■ Costo realizzato=1.055.134,00 €

Avanzamento impegni: 81.84 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 7.64 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 7.64 % sullo stanziato

Report del progetto: 069 - Connessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di Arbatax

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Tortoli'

Soggetto Attuatore

Consorzio Industriale Tortoli - Arbatax


Responsabile dell'intervento

Responsabile del Procedimento:Ing. Roberto Miliddi

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

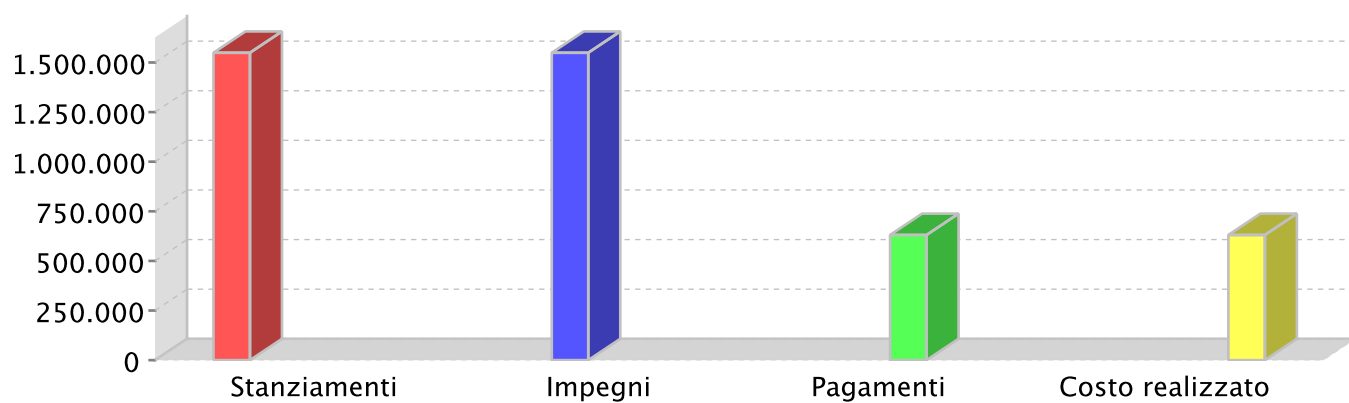

■ Stanziamenti=1.549.000,00 € ■ Impegni=1.549.000,00 €
■ Pagamenti=630.767,41 € ■ Costo realizzato=630.767,41 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.73 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 40.73 % sullo stanziato

Report del progetto: 073 - S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-Casagliana (tipo B)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

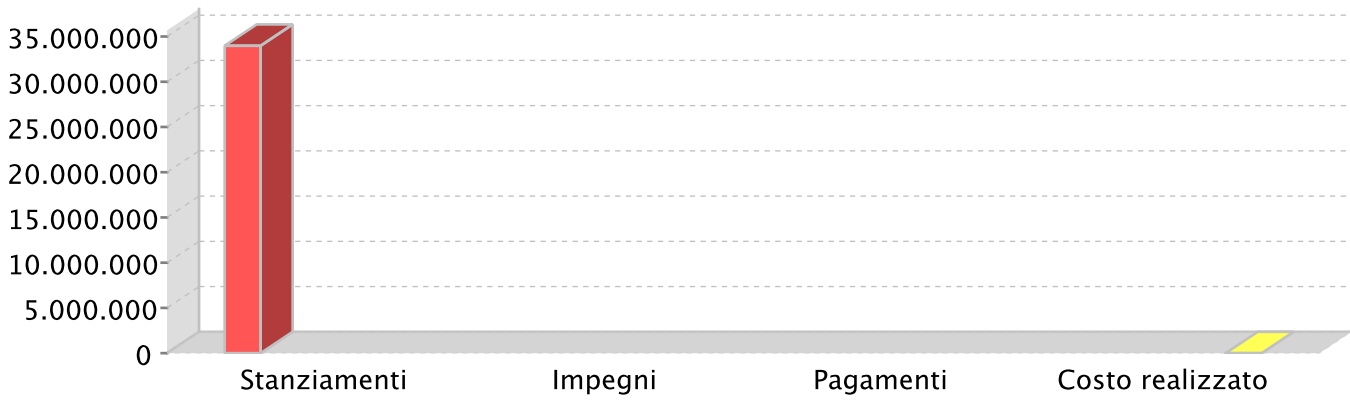

■ Stanziamenti=33.979.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €

■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 080 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia - Tratto bivio Rudas -

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

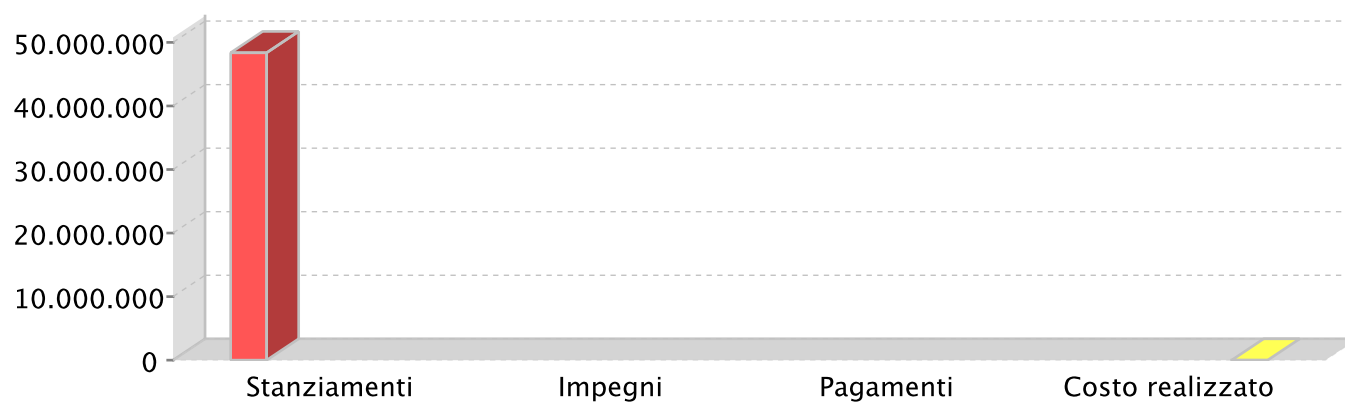

■ Stanziamenti=48.372.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 089 - S.S. 128 - Lavori di costruzione della S.S. 128 bivio Monastir-bivio Serri 1 lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni
2) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Sergio Cocciu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

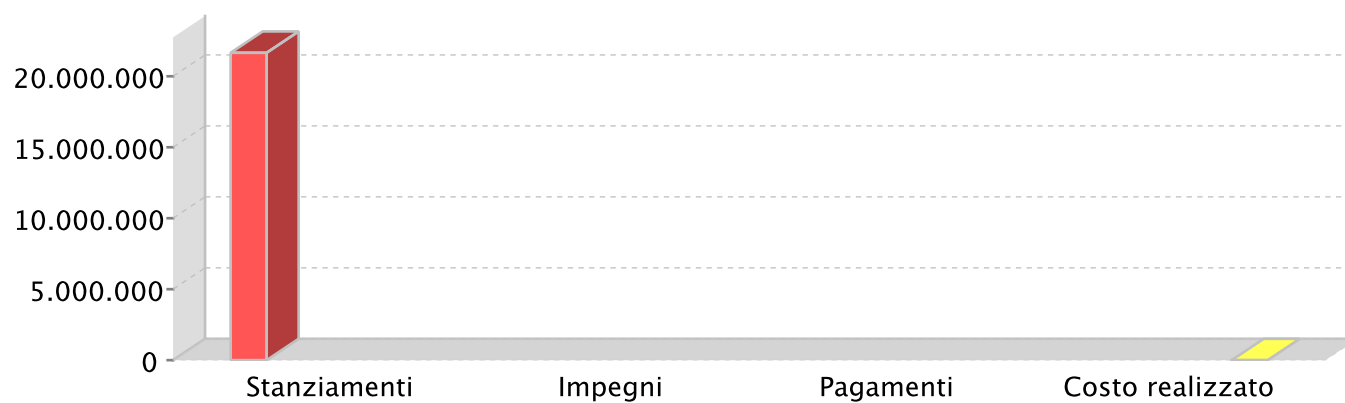

■ Stanziamenti=21.658.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 094 - S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, adeguamento tra Olbia e la S.S. 131dcn

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

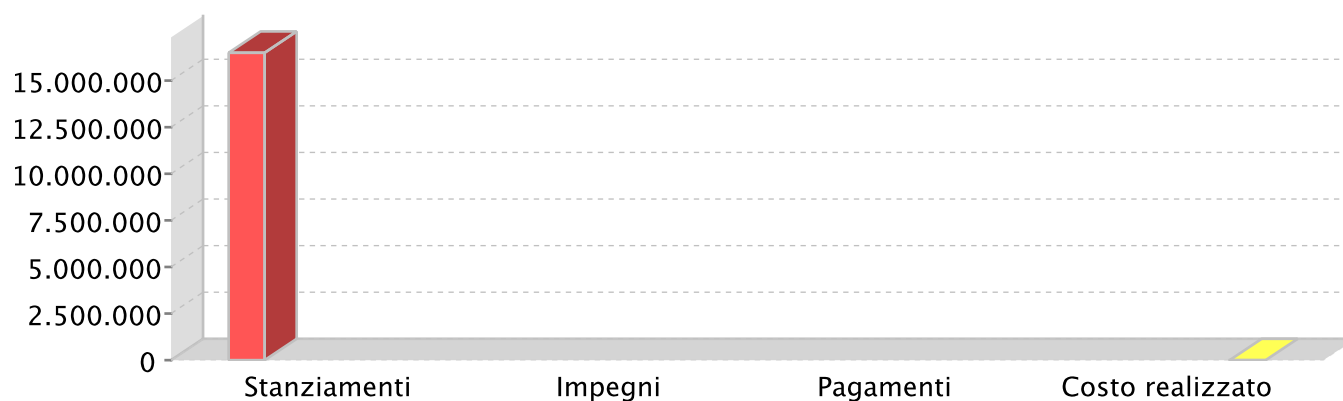

■ Stanziamenti=16.493.794,14 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 100 - S.S. 127 Tempio - Sassari - Lavori di ammodernamento e sistemazione - Scala Ruja-Tempio 1 lotto 1 stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

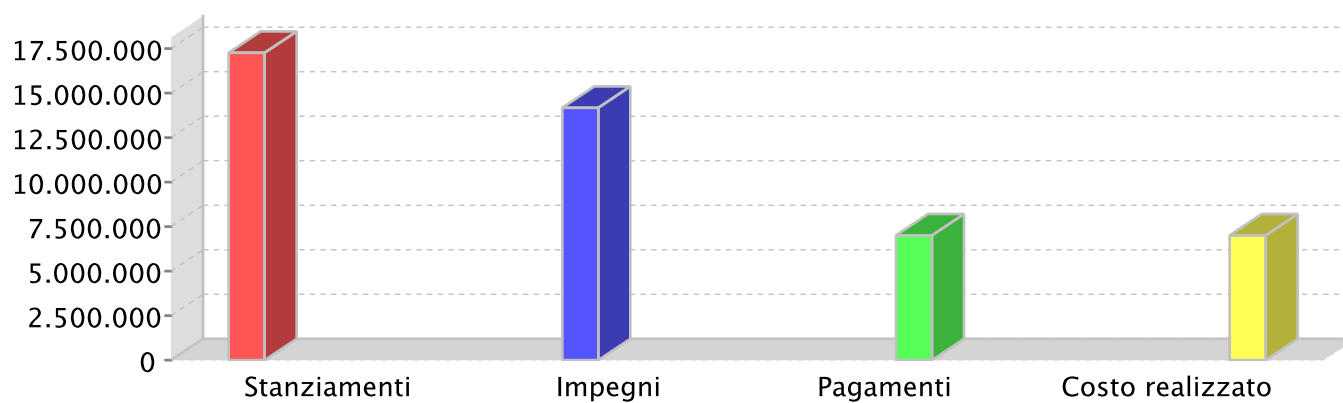

■ Stanziamenti=17.265.000,00 € ■ Impegni=14.176.026,41 €
■ Pagamenti=7.010.672,14 € ■ Costo realizzato=7.010.672,14 €

Avanzamento impegni: 82.11 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.61 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 40.61 % sullo stanziato

Report del progetto: 101 - S.S. 127 Tempio - Sassari Lavori di ammodernamento e sistemazione Scala Ruja-Tempio 1 lotto 2 stralcio

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Responsabile dell'intervento


Dott. Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

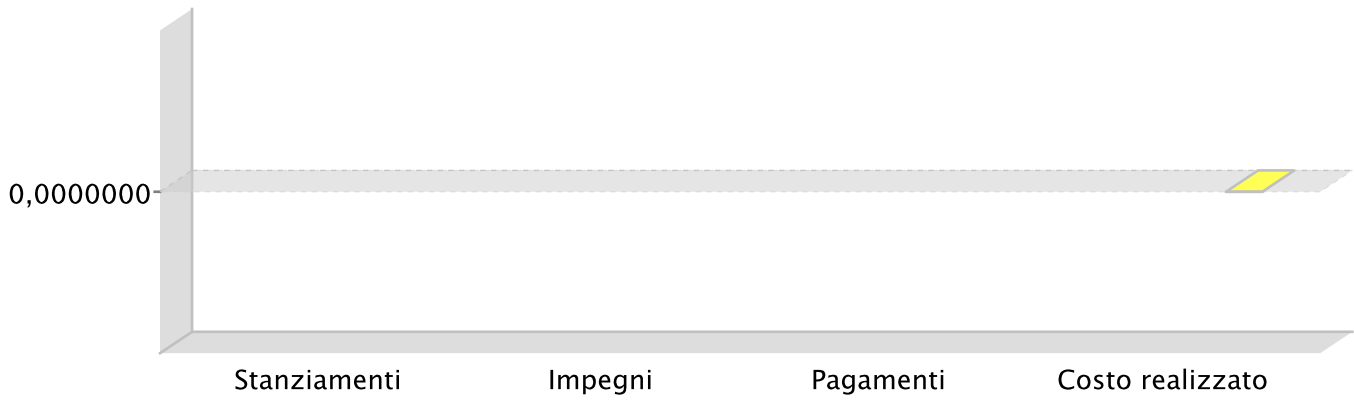

■ Stanziamenti=0,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: null % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 102 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento e sistemazione per l'eliminazione degli svincoli a

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=0,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: null % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 103 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di installazione di una barriera spartitraffico centrale tra i km 16+800 e

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

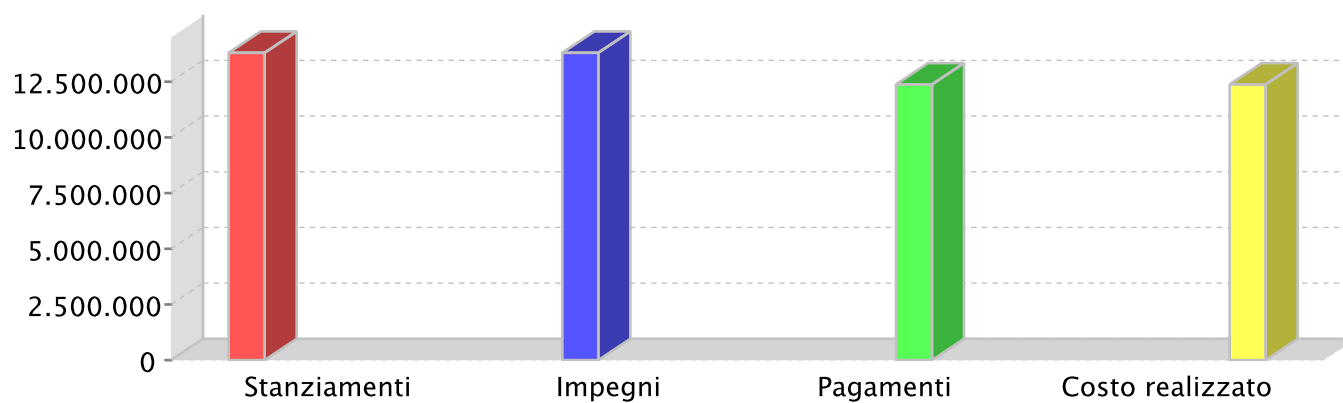

■ Stanziamenti=13.800.000,00 € ■ Impegni=13.800.000,00 €
■ Pagamenti=12.379.145,40 € ■ Costo realizzato=12.379.145,40 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 89.71 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 89.71 % sullo stanziato

Report del progetto: 104 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Circonvallazione di Iglesias

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=7.052.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 105 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento della S.S. 130 e S.S. 126 tratto Carbonia-Iglesias 1

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

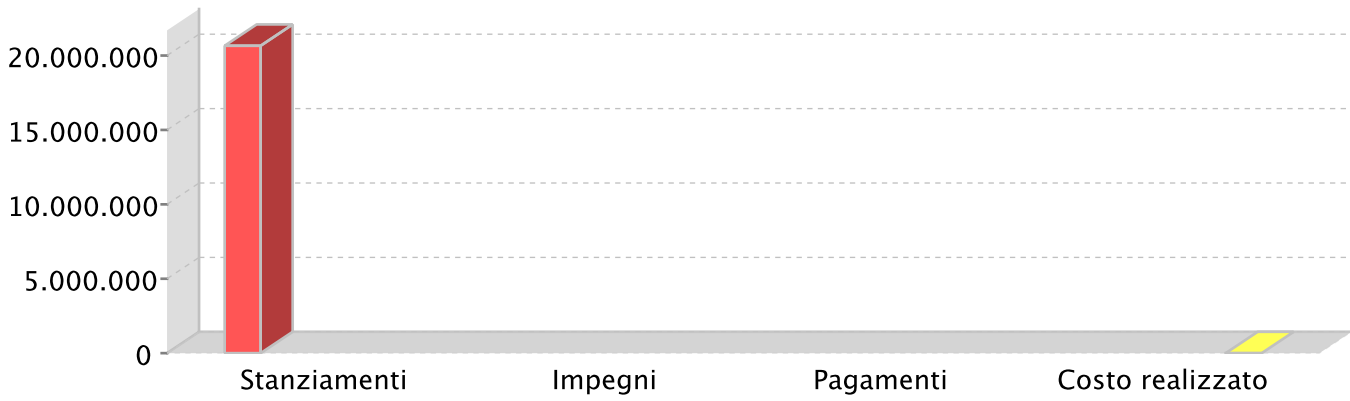

■ Stanziamenti=20.658.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 106 - S.S. 389 Bitti - Budduso (Prosecuzione collegamento con la S.P. Abbasanta-Budduso-Olbia)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) NUORO	Bitti
4) Olbia-Tempio	Budduso'

Soggetto Attuatore

Comunita montana n. 10 delle Baronie


Responsabile dell'intervento

Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Antonio Ortu

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

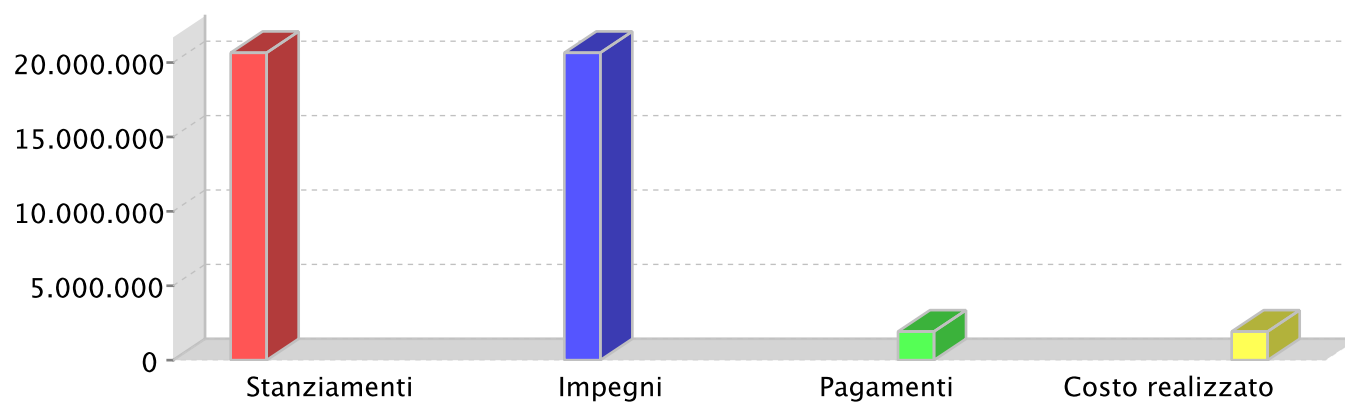

■ Stanziamenti=20.658.000,00 € ■ Impegni=20.658.000,00 €
■ Pagamenti=1.924.447,04 € ■ Costo realizzato=1.924.447,04 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 9.32 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 9.32 % sullo stanziato

Report del progetto: 107 - S.S. 389 tratto Ala dei Sardi-bivio Padru - collegamento alla Abbasanta-Budduso-Olbia

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari


Responsabile dell'intervento

Ing. Enrico Coda - Dirigente Settore 10? - Viabilita

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

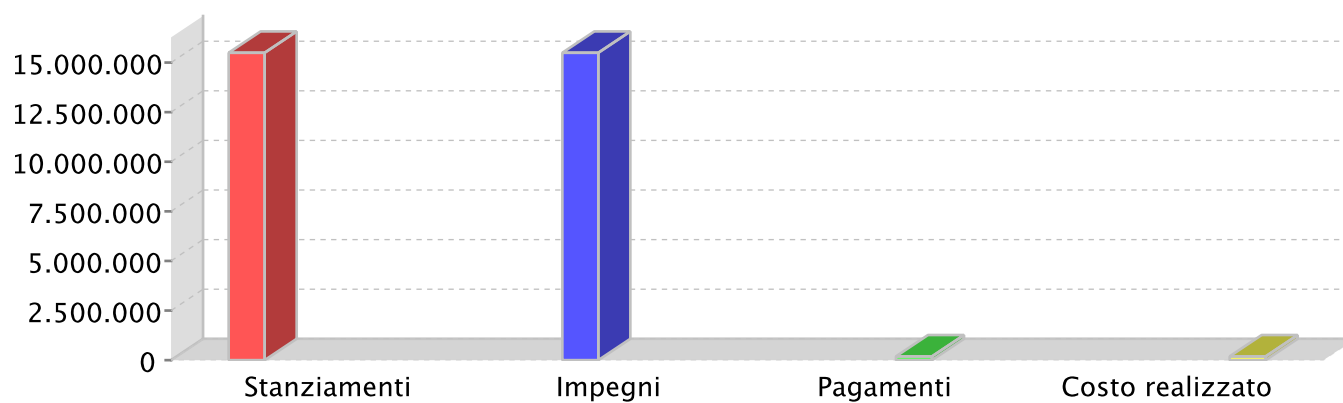

■ Stanziamenti=15.494.000,00 € ■ Impegni=15.494.000,00 €

■ Pagamenti=190.794,74 € ■ Costo realizzato=190.794,74 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 1.24 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 1.24 % sullo stanziato

Report del progetto: 108 - S.S. 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortoli lotto bivio Villagrande-svincolo Arzana

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

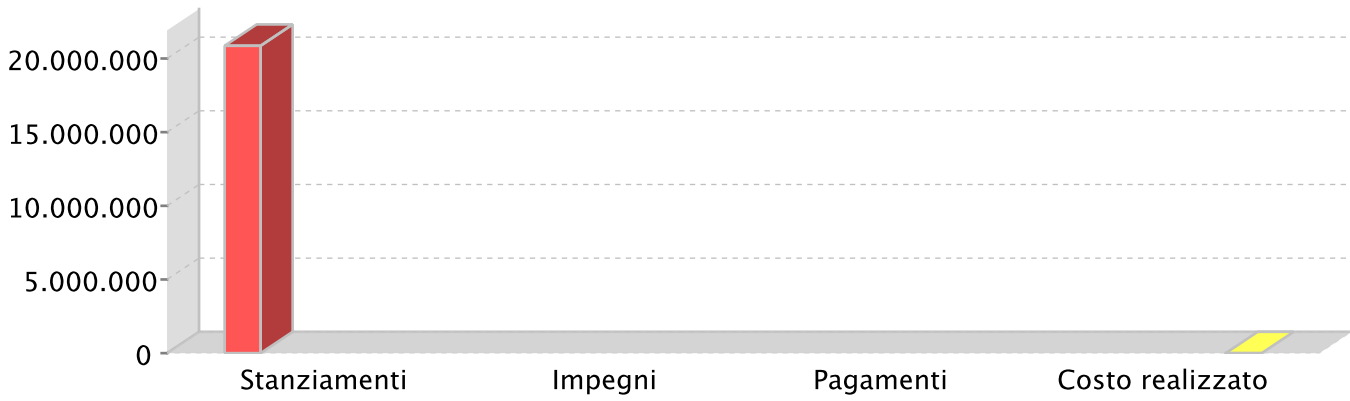

■ Stanziamenti=20.865.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 110 - S.S. 129bis Macomer - Bosa tratto Suni-Bosa

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Giorgio Carboni

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

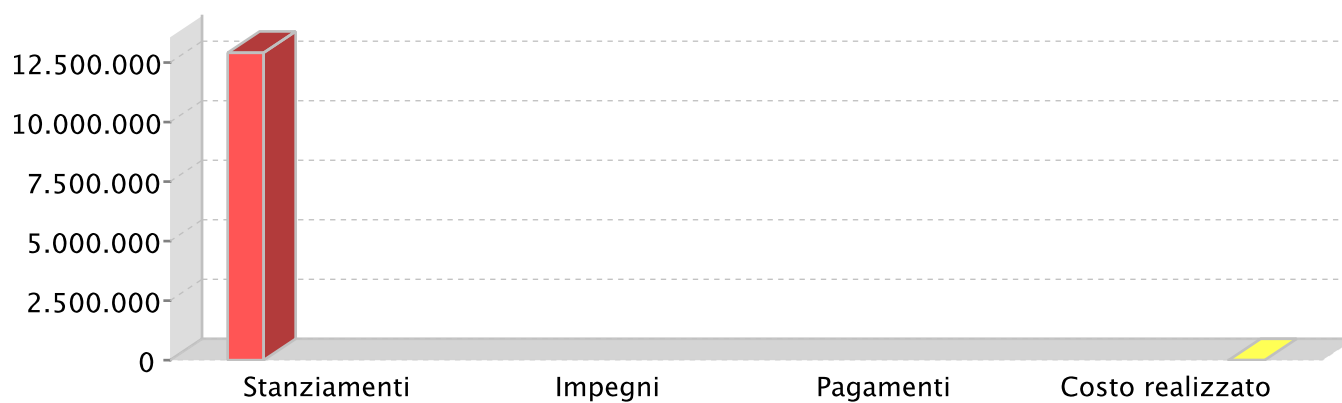

■ Stanziamenti=12.911.400,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 002 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 41+000 Svincolo Villasanta

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

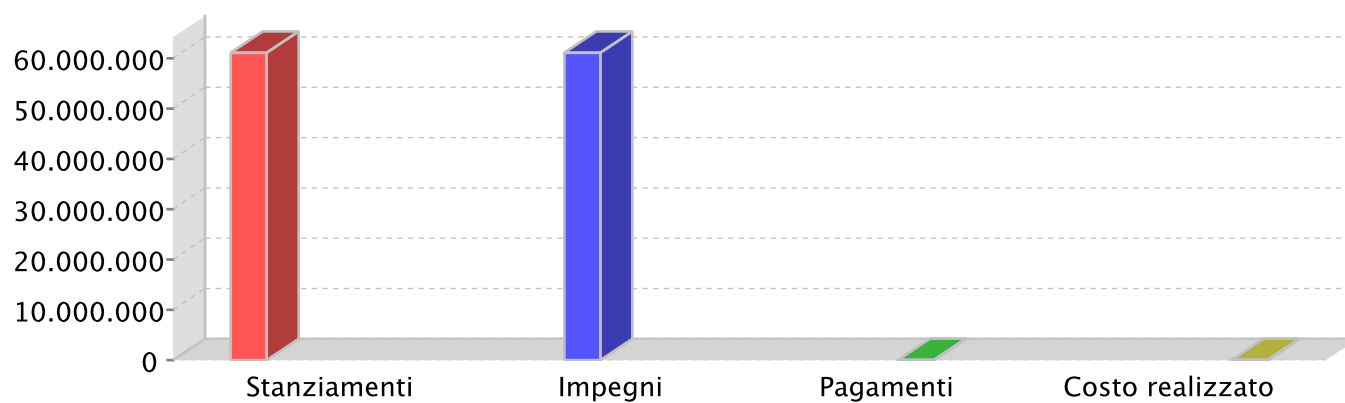

■ Stanziamenti=61.100.000,00 € ■ Impegni=61.100.000,00 €

■ Pagamenti=32.539,50 € ■ Costo realizzato=32.539,50 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.06 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.06 % sullo stanziato

Report del progetto: 001 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 32+412 Nuraminis -

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

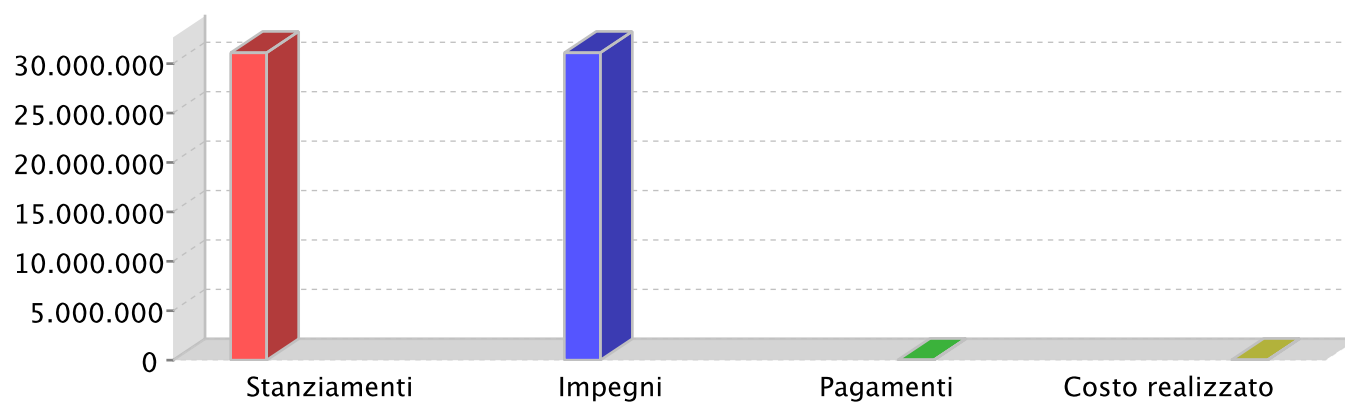

■ Stanziamenti=31.100.000,00 € ■ Impegni=31.100.000,00 €

■ Pagamenti=31.273,54 € ■ Costo realizzato=31.273,54 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.11 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.11 % sullo stanziato

**Report del progetto: 031 - Lavori di completamento della variante di Sassari -
Truncu Reale Porto Torres Lotto "B" tra i Km. 6+410 e**

Programma/Fonte

Intesa - APQ Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in Sardegna

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

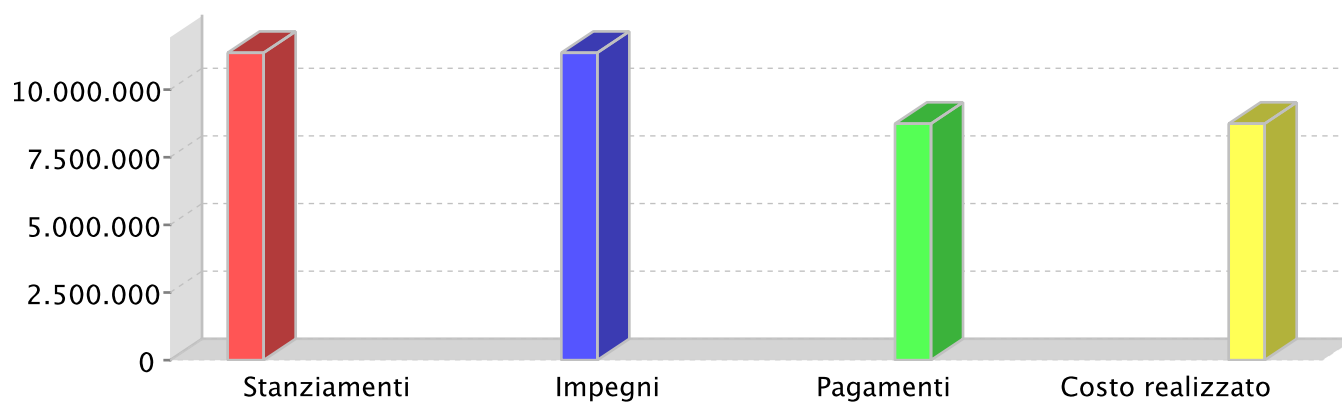

■ Stanziamenti=11.362.051,79 € ■ Impegni=11.362.051,79 €
■ Pagamenti=8.742.036,84 € ■ Costo realizzato=8.742.036,84 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 76.95 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 76.95 % sullo stanziato
