

## Misura 1.4-Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

74,4 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	49,8	100,0
Impegni	49,4	99,2
Pagamenti	36,5	73,2

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)

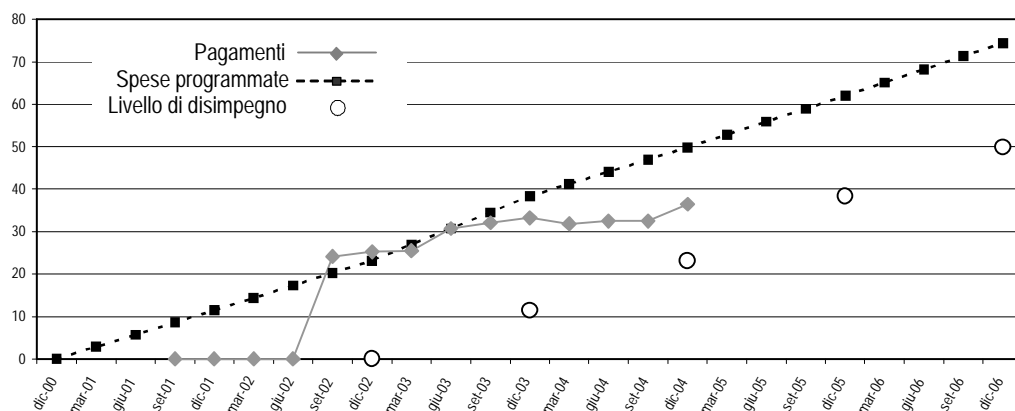

## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	45
Contributo ammesso totale	105,0 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	36,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	141,2 %
Dimensione media dei progetti	2.333.498 €
Avanzamento medio dei progetti	34,7 %


## Progetti ultimati

Numero	1	2,2 % del totale
Contributo ammesso	0,1 M€	0,1 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune

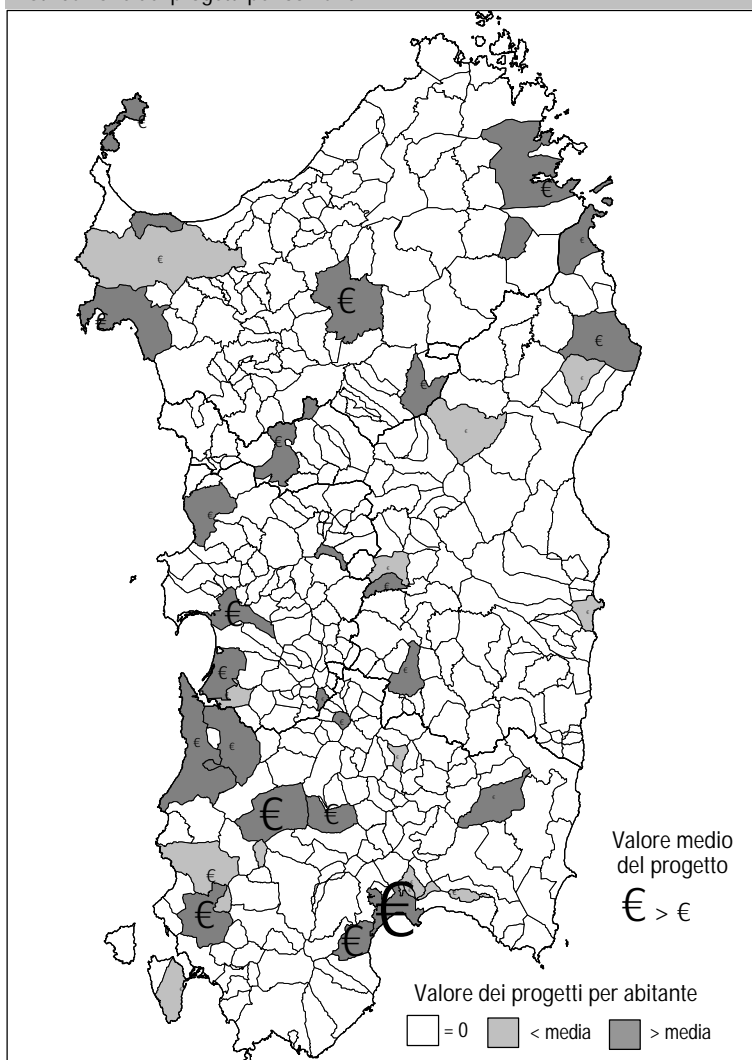

## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)

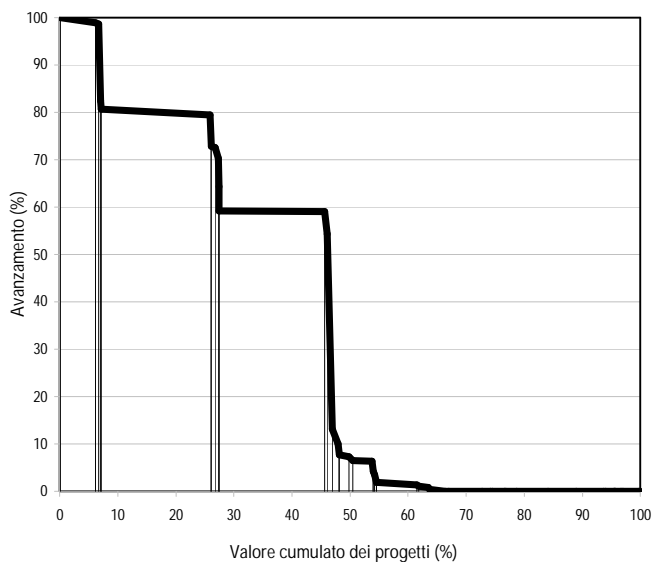

## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 004-Completamento impianto trattamento realizzazione terzo forno - CASIC	€ 19.625.362	26,4%	79,5%
2 003 - Impianto di digestione anaerobica - Villacidro	€ 19.077.924	25,6%	59,1%
3 017 - Completamento impianto a tecnologia complessa subambito A1 - CASIC	€ 7.230.397	9,7%	1,4%
4 006 - Impianto selezione, stabilizzazione e produzione CDR - C.I. Olbia	€ 6.356.827	8,5%	98,9%
5 Impianto selezione e stabilizzazione frazione organica	€ 6.014.909	8,1%	0,0%
