

## Misura 4.7-Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

43,2 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	31,1	100,0
Impegni	24,9	80,0
Pagamenti	10,6	34,2

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)

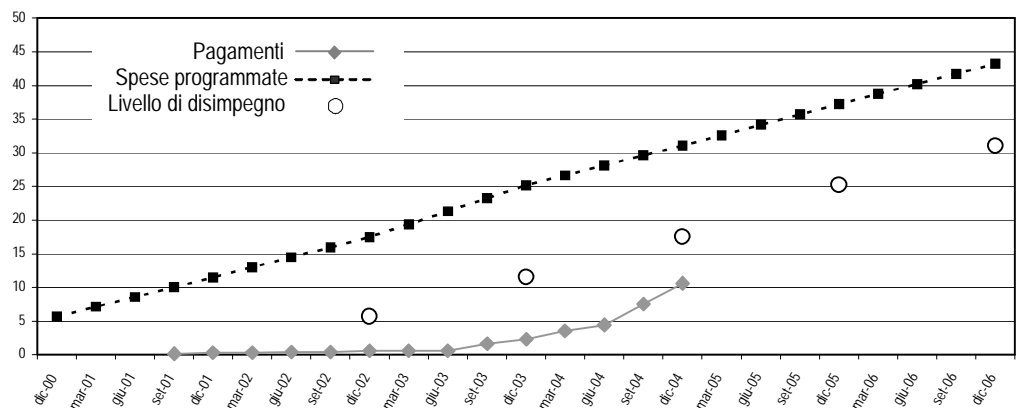

## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	52
Contributo ammesso totale	30,6 M€
Di cui da PIT	0,2 M€
Pagamenti totali	10,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	70,9 %
Dimensione media dei progetti	588.993 €
Avanzamento medio dei progetti	34,7 %


## Progetti ultimati

Numero	4	7,7 % del totale
Contributo ammesso	4,0 M€	13,1 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune

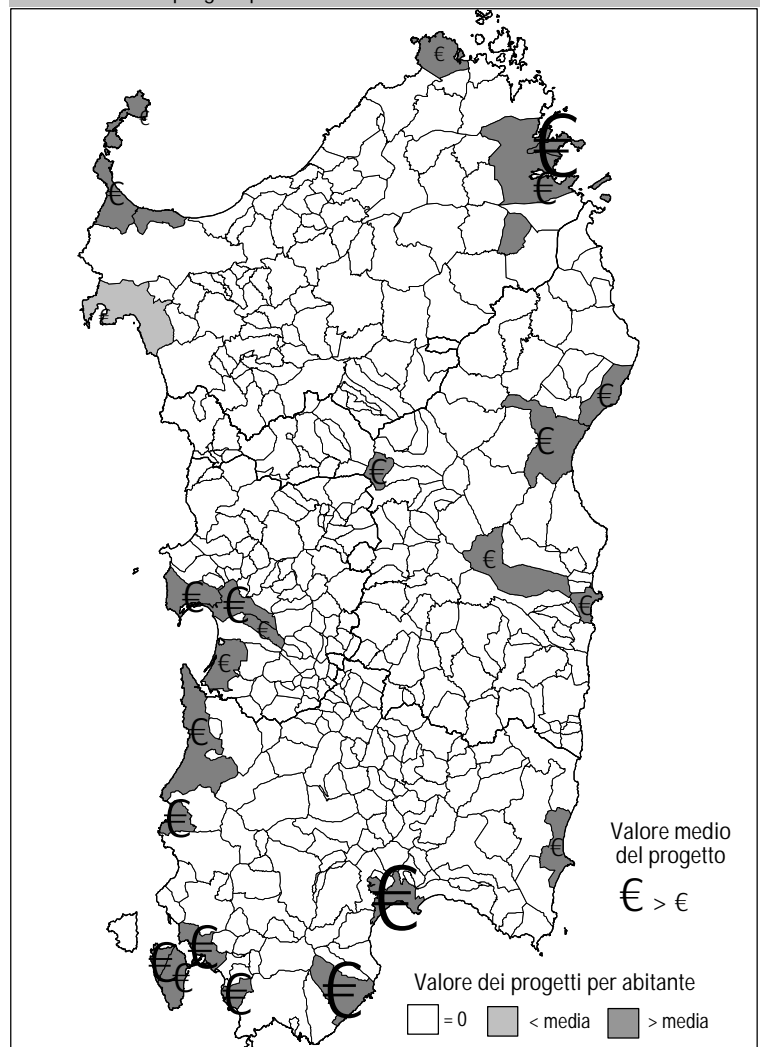

## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)

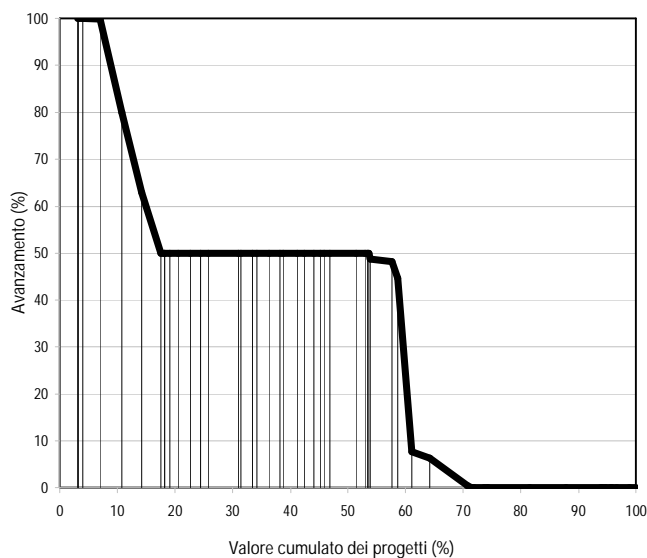

## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 IAC - Impianti e opere per le attività ittiche nella laguna di S. Gilla	€ 2.203.729	5,1%	0,0%
2 2PP- Realizzazione di strutture e attrezzature del porto da pesca Golfo Aranci	€ 1.995.000	4,6%	0,4%
3 3 PP - Recupero e ampliamento porto piccola pesca S. Elia	€ 1.930.000	4,5%	0,0%
4 1 IT- Realizzazione di un impianto di trasformazione e commercializzazione	€ 1.825.566	4,2%	0,0%
5 18 AC - Progetto per la valorizzazione produttiva e ambientale Laguna di Nora	€ 1.611.088	3,7%	50,0%
