




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Istruzione e Università

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

8

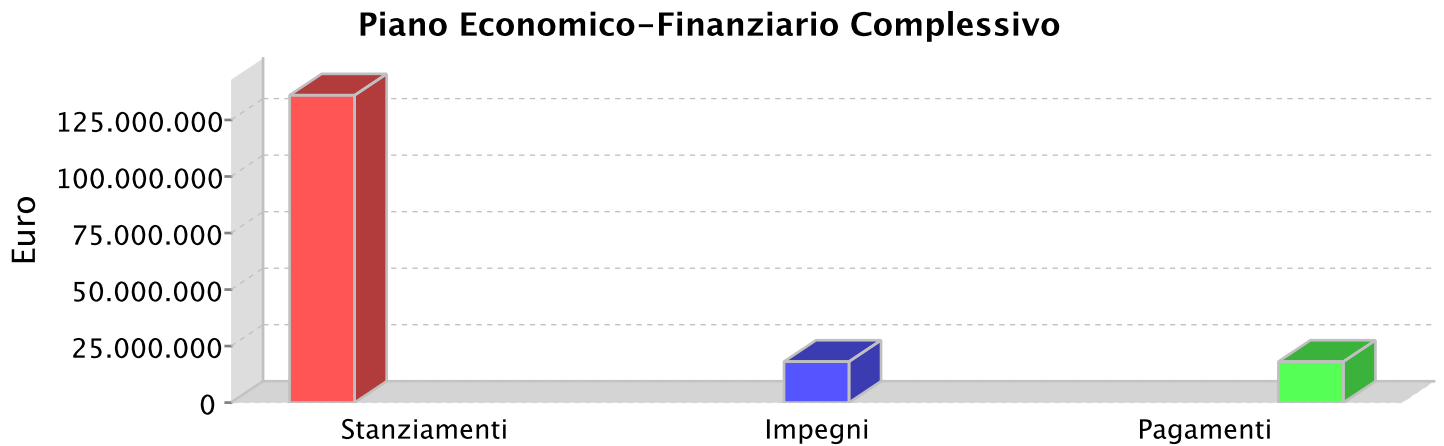


■ Stanziamenti=135.950.000,00 € ■ Impegni=18.150.000,00 €
■ Pagamenti =18.150.000,00 €

Avanzamento impegni: 13.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 13.36 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

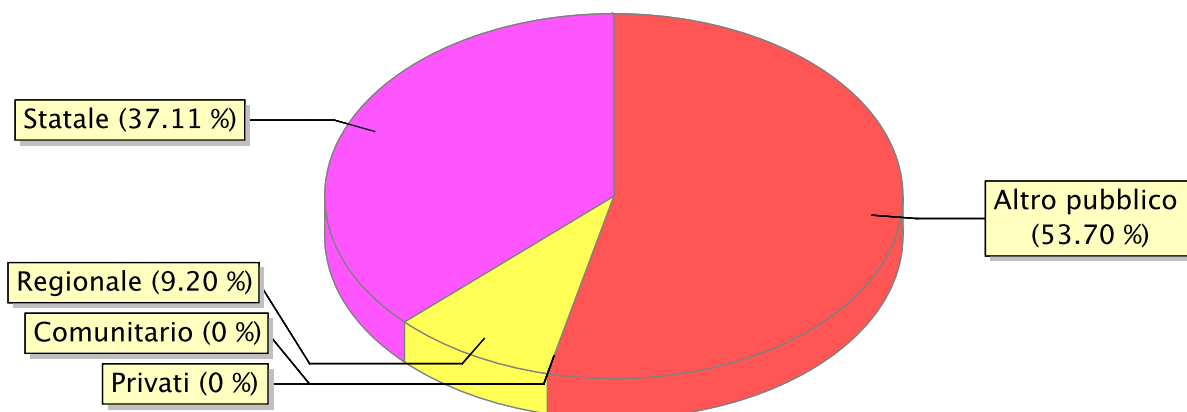

● Altro pubblico = 73.000.000 ● Comunitario = 0 ● Privati = 0
● Regionale = 12.500.000 ● Statale = 50.450.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

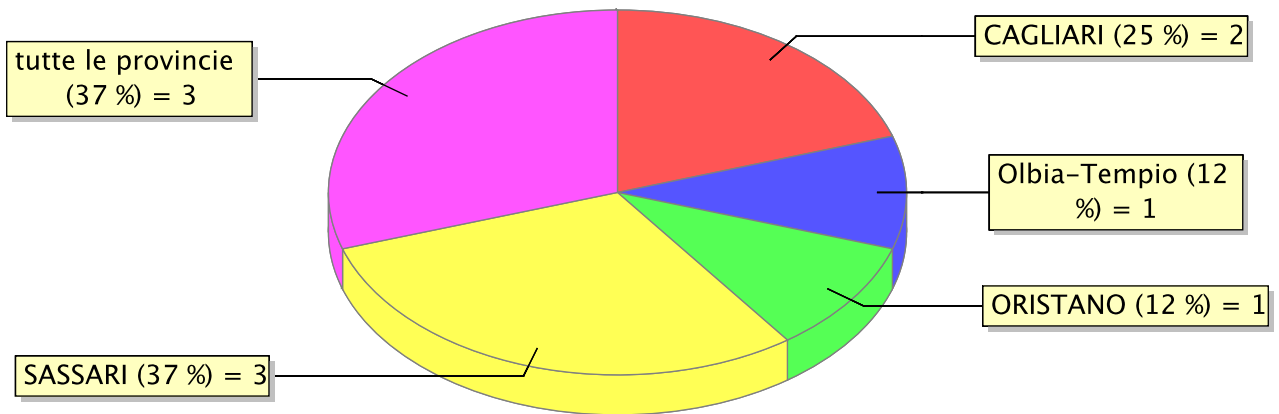

● CAGLIARI (25 %) = 2 ● Olbia-Tempio (12 %) = 1 ● ORISTANO (12 %) = 1
● SASSARI (37 %) = 3 ● tutte le provincie (37 %) = 3

Report del progetto: SarIS01 - Potenziamento del polo di Bonassai. Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell'Università di Sassari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

UNIVERSITA' di SASSARI


Responsabile dell'intervento

Ing. Giuseppe Gaeta

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

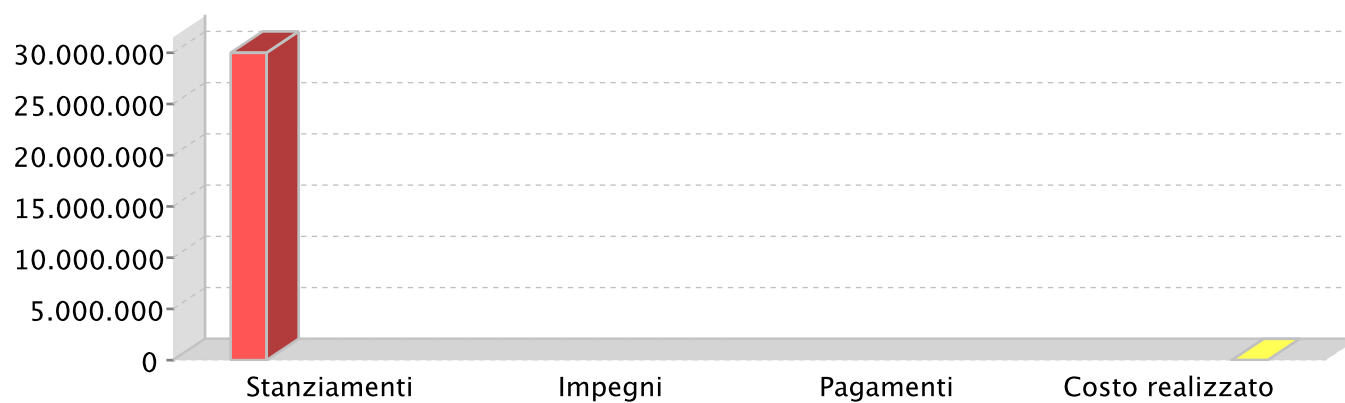

■ Stanziamenti=30.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarIS02 - Potenziamento del polo tecnologico dell'Universita di Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Universita di Cagliari


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Pillai

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

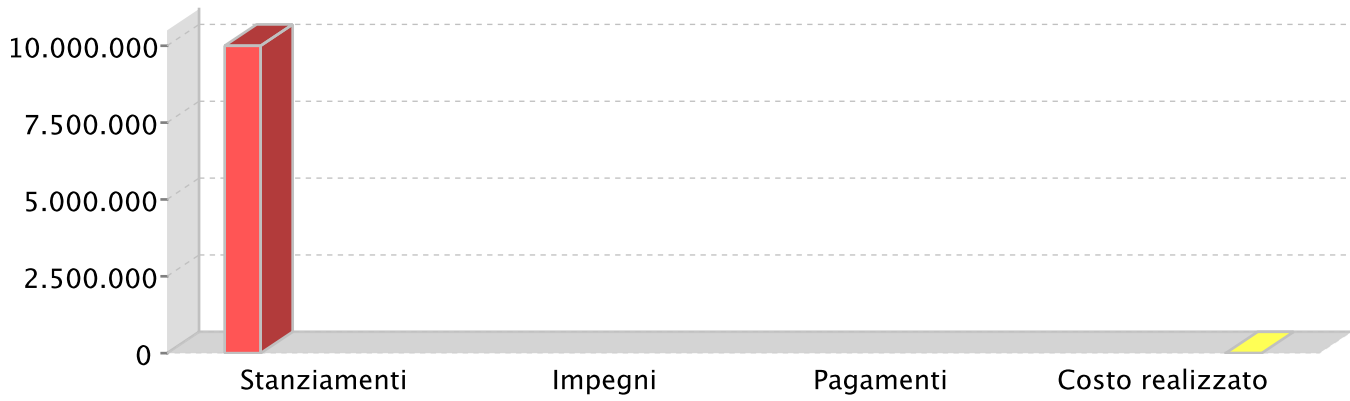

■ Stanziamenti=10.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €

■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarIS03 - Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Cagliari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

E.R.S.U.

Responsabile dell'intervento


Dr. Paolo Salis

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

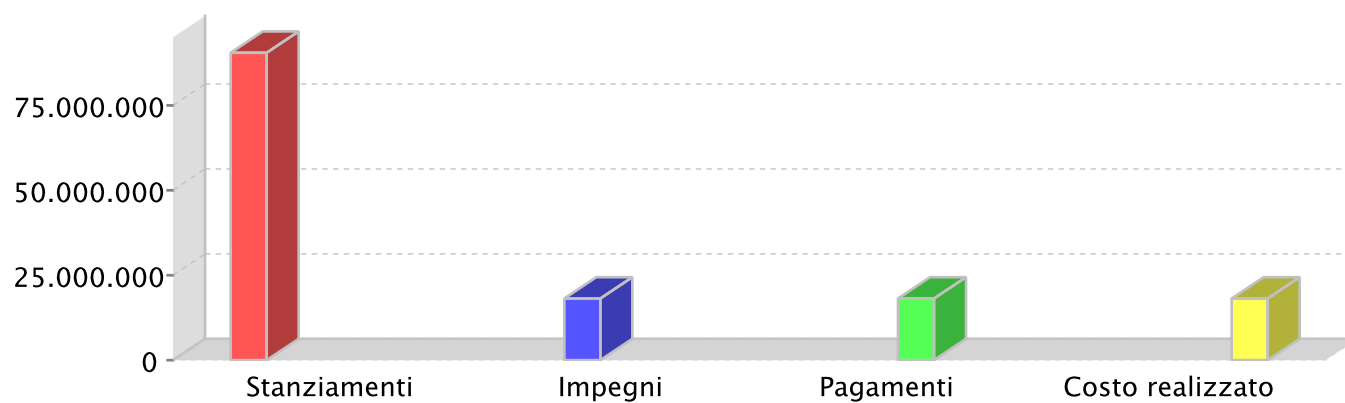

■ Stanziamenti=90.500.000,00 € ■ Impegni=18.150.000,00 €
■ Pagamenti=18.150.000,00 € ■ Costo realizzato=18.150.000,00 €

Avanzamento impegni: 20.06 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 20.06 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 20.06 % sullo stanziato

Report del progetto: SarIS04 - Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Sassari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

E.R.S.U.

Responsabile dell'intervento


Dott.ssa Maria Grazia Piras

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

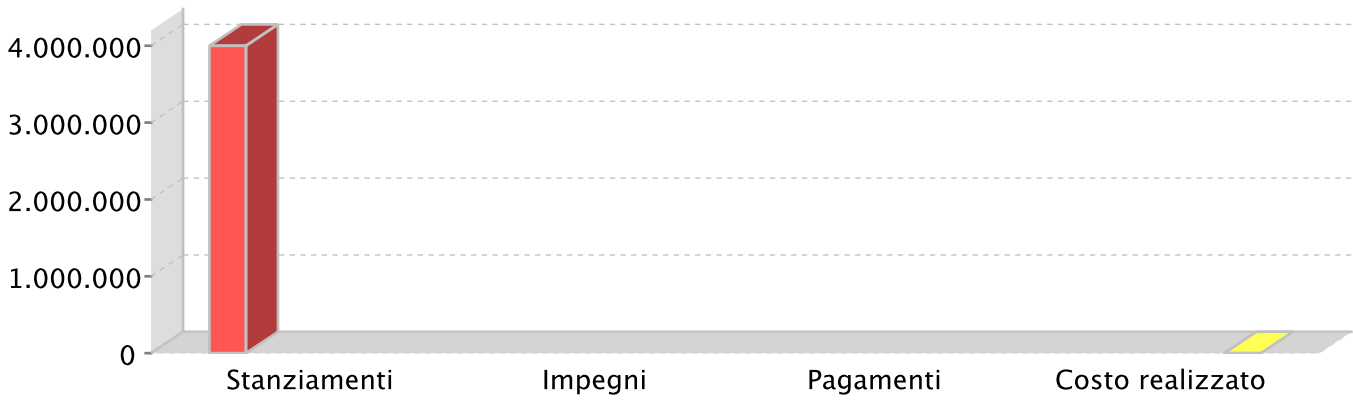

■ Stanziamenti=4.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarIS05 - Rete di scuole di eccellenza per il turismo - Istituti Alberghieri di Arzachena, Oristano e Alghero

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero
2) ORISTANO	Oristano
3) Olbia-Tempio	Arzachena

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Geom. Corda Valerio

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

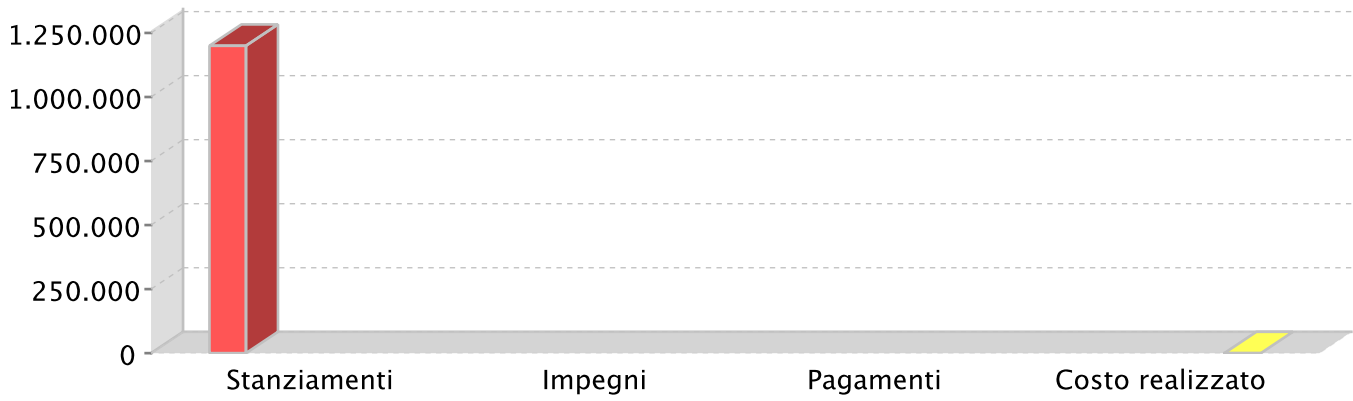

■ Stanziamenti=1.200.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarISSF01 - Studio fattibilità polo Universitario Cagliari e Sassari, sistema regionale residenze universitarie

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Maria Gabriella Meloni

Stato del progetto

In avvio



Piano Economico-Finanziario

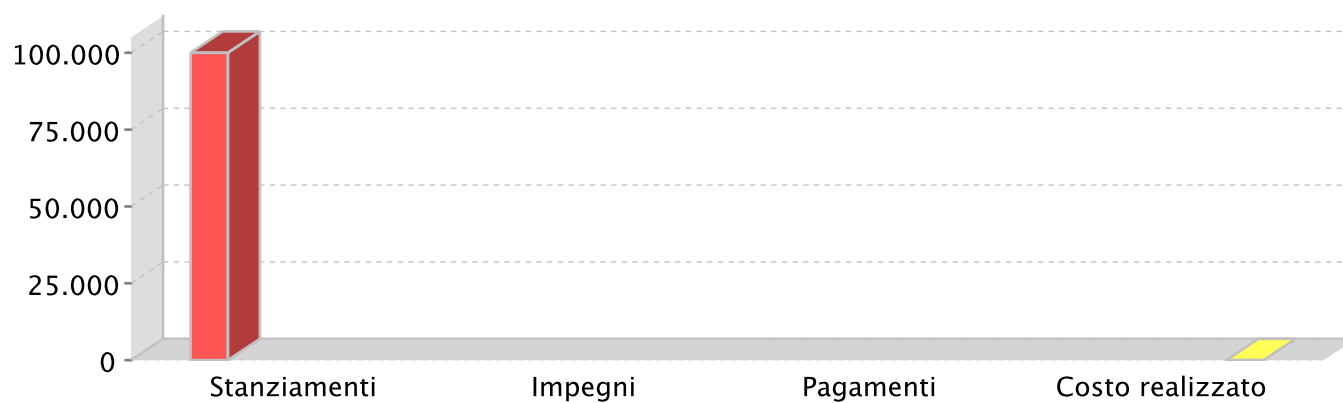

■ Stanziamenti=100.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarISSF02 - Studio fattibilita Polo di Bonassai. Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell'Universita di Sassari

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Universita

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Maria Gabriella Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

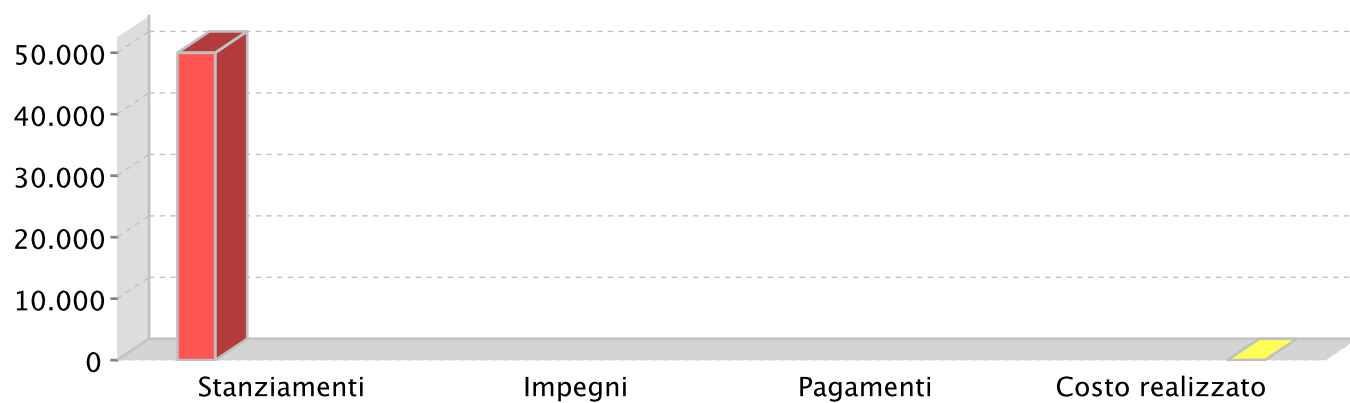

■ Stanziamenti=50.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: SarISSF03 - Studio di fattibilità di un Polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato all'area economica del

Programma/Fonte

Intesa - APQ Istruzione e Università

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Maria Gabriella Meloni

Stato del progetto

In avvio

Piano Economico-Finanziario

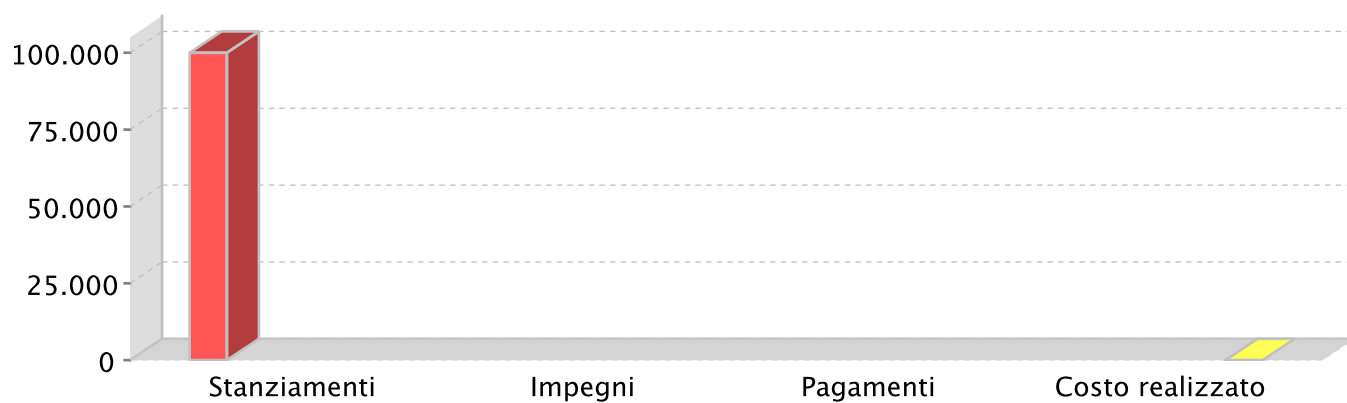

■ Stanziamenti=100.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
