



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE



Repubblica Italiana



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA

2000-2006

Rapporto Semestrale di Avanzamento
al 31.03.2003

Giugno 2003

**Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010**

Decisione CE: C(2000) 2359 dell'08.08.2000

Costo totale: Meuro 4.669,367

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 1.946,229

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:

FESR:	1.155,926 Meuro
FSE:	357,214 Meuro
FEOGA Orientamento	406,078 Meuro
SFOP:	27,011 Meuro

Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999

Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008
prorogato al 30.04.2009 per le spese effettuate dagli
Organismi che concedono gli aiuti ai sensi
dell'art. 9, punto l), del Reg. CE 1260/99

Indice

PREMESSA	4
1. STATO DI AVANZAMENTO AL 31.03.2003: ANALISI PER FONDO	5
1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 31.03.2003	5
1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa).....	7
2. ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ULTIMO SEMESTRE	9
2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione.....	9
2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002.....	10
3. STATO DI ATTUAZIONE AL 31.03.2003: ANALISI PER MISURA	12
Asse I – Risorse naturali	12
Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR.....	12
Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA	14
Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR	16
Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR.....	18
Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR	20
Misura 1.6: Energia - FESR.....	22
Misura 1.7: Monitoraggio - FESR.....	23
Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE.....	24
Asse II – Risorse culturali	25
Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR	25
Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR	28
Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR	30
Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE	32
Asse III – Risorse umane	34
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE.....	34
Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE.....	36
Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE.....	37
Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE	39
Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE	41
Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE.....	43
Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE.....	44
Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE	46
Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE	48
Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE.....	50
Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE....	52
Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR	54
Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR.....	56
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo	58
Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR.....	58

Misura 4.2:	Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR.....	62
Misura 4.3:	Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR.....	63
Misura 4.4:	Sviluppo integrato d'area - FESR	65
Misura 4.5:	Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR.....	66
Misura 4.6:	Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE	68
Misura 4.7:	Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP	70
Misura 4.8:	Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) – SFOP	72
Misura 4.9:	Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA.....	74
Misura 4.10:	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA.....	77
Misura 4.11:	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA.....	79
Misura 4.12:	Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA.....	81
Misura 4.13:	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA.....	82
Misura 4.14:	Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOGA	84
Misura 4.15:	Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA	85
Misura 4.16:	Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA.....	86
Misura 4.17:	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA.....	87
Misura 4.18:	Formazione - FEOGA	88
Misura 4.19:	Ricomposizione fondiaria - FEOGA	89
Misura 4.20:	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA	90
Misura 4.21:	Insediamiento dei giovani agricoltori - FEOGA	92
Asse V - Città		94
Misura 5.1:	Politiche per le aree urbane - FESR	94
Misura 5.2:	La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR.....	96
Misura 5.3:	Formazione per le Misure dell'Asse - FSE	97
Asse VI – Reti e nodi di servizio		98
Misura 6.1:	Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR.....	98
Misura 6.2:	L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR..	99
Misura 6.3:	Società dell'Informazione - FESR.....	101
Misura 6.4:	Formazione per la Società dell'Informazione – FSE.....	103
Misura 7.1:	Assistenza tecnica - FESR.....	104
 ALLEGATI.....		107
A - Tabelle di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura		
B - Aggiornamento sullo stato di attuazione degli adempimenti strategici		

Premessa

Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo ottobre 2002 al 31.03.2003.

Il *Rapporto* si compone di tre sezioni:

Il capitolo 1 “**Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo**” intende fornire un puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo. I paragrafi che lo compongono contengono infatti informazioni tabellari e spunti di riflessione sullo stato di avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo nonché sul grado di realizzazione finanziaria conseguita, intesa come capacità di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 “**Attività svolta nell’ultimo semestre**” fornisce un resoconto delle principali attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici e ineludibili adempimenti. In particolare, si è dato conto delle principali modifiche al Complemento di Programmazione e dello stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 “**Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Misura**” fornisce informazioni puntuali sulle singole misure di ciascun Asse prioritario, con un’analisi – quanto più possibile esaustiva – degli aspetti finanziari e procedurali.

1. Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 31.03.2003

Al 31.03.2003, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore significativo incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo totale pari a €4.669.367.254,00, l'ammontare degli impegni complessivamente assunti si accresce quasi del 26% rispetto al 30.09.2002 (341,279 Meuro circa in valore assoluto) portandosi a € 1.674.363.396,95; le spese sostenute si attestano, nel loro insieme, a € 755.032.502,98, pari a un incremento del 43% rispetto al semestre precedente (226,791 Meuro in valore assoluto).

Esecuzione finanziaria al 31.03.03	Costo programmato (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
FESR	2.593.153.000,00	2.311.852.000,00	1.188.743.591,67	1.005.197.888,46	602.958.955,77	554.995.930,18
FSE	714.428.000,00	714.428.000,00	237.112.718,00	237.112.718,00	74.170.321,01	74.170.321,01
FEOGA	1.285.795.124,00	812.156.000,00	242.164.550,10	171.946.591,84	75.104.944,12	72.552.083,42
SFOP	75.991.040,00	54.022.000,00	6.342.537,18	5.095.832,72	2.798.282,08	2.562.325,65
Totale POR	4.669.367.254,00	3.892.458.000,00	1.674.363.396,95	1.419.353.031,02	755.032.502,98	704.280.660,26

Avanzam al 31.03.03	Capacità di impegno %		Capacità di spesa %		Incremento rispetto al 30.09.02			
					Impegni		Pagamenti	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	Δ_{tot}	$\Delta_{quota\ pub}$	Δ_{tot}	$\Delta_{quota\ pub}$
FESR	45,84	43,48	23,25	24,01	24,45	5,24	30,38	20,00
FSE	33,19	33,19	10,38	10,38	24,97	24,97	59,07	59,07
FEOGA	18,83	21,17	5,84	8,93	33,03	50,20	358,34	431,76
SFOP	8,35	9,43	3,68	4,74	3,19	4,01	1,81	1,98
Totale POR	35,86	36,46	16,17	18,09	25,60	12,27	42,93	34,08

FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta la migliore *performance* sia in termini di capacità di impegno che di spesa, pari rispettivamente al 46% e a oltre il 23% del costo totale programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale di € 2.593.153.000,00 (€ 2.311.852.000,00 di quota pubblica) e di impegni pari a € 1.188.743.591,67, sono stati effettuati pagamenti per € 602.958.955,77 con incrementi superiori rispettivamente al 24% e al 30% dei valori rilevati a settembre.

Quantunque con tassi di crescita diversi, quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Tra queste, un contributo significativo alla *performance* del Fondo è da attribuire alle Misure dell'Asse I (che rappresentano il 37% del costo totale programmato FESR) che incidono per il 38% e per il 45% sul totale degli impegni e dei pagamenti FESR.

Seguono le Misure dell'Asse IV (22% del costo totale FESR) che concorrono con il 30% e il 28% all'ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Malgrado un livello di spesa più che

soddisfacente, permangono tuttavia criticità relativamente alle Misure 4.3 “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese” e 4.4 “Sviluppo integrato d’area”, che, a quasi tre anni dall’avvio del POR, non sono ancora state attivate.

Meno brillante l’andamento delle Misure dell’Asse VI (15% del costo totale FESR) la cui incidenza in termini di impegni (20%) e pagamenti (15%) sullo stanziamento per il Fondo risulta attenuato rispetto al semestre precedente (rispettivamente 33% e 16%).

FSE

A fronte di un costo totale di €714.428.000,00, a livello di Fondo, sono stati assunti impegni pari a € 237.112.718,00 ed effettuati pagamenti per € 74.170.321,01, con incrementi rispettivamente pari al 25% e al 59% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre.

I dati di monitoraggio finanziario testimoniano del parziale recupero dei ritardi subiti nella prima fase di attuazione grazie alla sensibile accelerazione procedurale di tutte le Misure rispetto al semestre precedente (avanzamento degli *iter* attuativi dei bandi pubblicati nel corso del 2001 per l’attivazione delle Misure).

Nel corso del semestre tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di impegno e di spesa.

Più precisamente gli incrementi più consistenti degli impegni, in valori assoluti, sono stati quelli delle Misure 3.1, 3.10 e 5.3; in termini di pagamenti, invece, sono state le Misure 3.2, 4.6 e 6.4 a far registrare gli aumenti maggiori.

Se si valuta l’apporto di ciascuna Misura alla *performance* del Fondo si conferma il dato emerso nel precedente semestre: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera significativa.

FEOGA

Il FEOGA presenta una *performance* che non soddisfa pienamente: sia la capacità d’impegno che la spesa (rispettivamente del 19% e del 6%) si attestano al di sotto dei valori medi del POR. Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 1.285.795.214,00 (€ 812.156.000,00 di quota pubblica) e di impegni pari a € 242.164.550,10, sono stati effettuati pagamenti per € 75.104.944,12, con incrementi rispettivamente pari al 33% e al 358% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre. Forte l’accelerazione registrata nei pagamenti che ha permesso di scongiurare il disimpegno automatico al 31.12.2002.

A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.9 “*Investimenti nelle aziende agricole*”, 4.10 “*Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”, 4.11 “*Commercializzazione dei prodotti di qualità*” e 4.21 “*Insediamiento giovani agricoltori*”, che rappresentano le componenti più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali beneficiari, nonché per l’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Un apporto significativo alla *performance* del Fondo è stato offerto dalla Misura 4.20 “*Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura*”, sia attraverso una serie di progetti coerenti, di cui la gran parte approvati ai sensi della LR 21/2000 e i restanti ritenuti ammissibili ma non rendicontabili nella precedente programmazione, sia con progetti ammessi e finanziati con il POR.

Nonostante gli sforzi compiuti dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per superare tutte le difficoltà di natura organizzativa che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, sforzi che hanno permesso nell’ultimo semestre di registrare incrementi percentuali sia in termini di capacità d’impegno che di spesa, forti criticità continuano a permanere soprattutto con riferimento ad alcune misure che a quasi tre anni dall’avvio del POR non sono state ancora attivate: Misura

4.14 “Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”, 4.15 “Incentivazione di attività turistiche e artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali”, 4.18 “Formazione”, 4.19 “Ricomposizione fondiaria”. È in fase di elaborazione la proposta di modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.15, 4.16, 4.19.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 8% e al 4% circa del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a €75.991.040,00 (€54.022.000,00 di quota pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 6.342.537,18 mentre i pagamenti sostenuti a € 2.798.282,08; l’andamento finanziario risulta stabile con limitati incrementi, pari rispettivamente al 3% e al 2% circa dei valori rilevati nello scorso semestre.

I risultati finanziari raggiunti al 31.03.2003 sono determinati dall’ammissione a beneficio di interventi rispondenti alle condizioni di ammissibilità, alle finalità e ai criteri del POR, approvati ai sensi della LR 19/1998.

Con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.2002 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando approvato con determinazione n. 2219/VI e pubblicato sul SS al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di interventi relativi alle sottomisure 4.7 B) “Acquicoltura”, 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca”, 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione”, 4.8 A) “Piccola pesca costiera” 4.8 D) “Azioni realizzate dagli operatori del settore” è stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33.

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, Stagni e Acquicoltura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate n. 32 domande per le quali sono in corso le procedure di selezione.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa)

Fondo	Pagamenti effettuati al 31.03.2003 (a)	Obiettivo programmatico di spesa*(b)	livello % a/b	Obiettivo previsionale**(c)	livello % a/c
FESR	602.958.955,77	688.648.369,30	88	874.114.742,41	69
FSE	74.170.321,01	186.885.000,00	40	171.233.450,25	43
FEOGA	75.104.944,12	339.102.040,00	22	243.723.272,98	31
SFOP	2.798.282,08	19.148.860,00	14	10.248.574,03	27

* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tener conto dell’anticipazione del 7%

** previsioni di spesa per il 2003 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2002

FESR

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €602.958.955,77; tale dato si approssima tanto al *target* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (fissato a € 688.648.369,30) quanto alle previsioni formulate dall’Autorità di Gestione, pari a € 874.114.742,41, soprattutto ove si tenga conto del semestre ancora disponibile per portare l’ammontare dei pagamenti a un livello ottimale (e per concorrere all’assegnazione delle risorse premiali del 4%).

Come si evince dalla tabella, le Misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore *performance* di spesa: l'obiettivo programmatico fissato dal Ministero è raggiunto per l'88%; quello previsionale fissato dalla Regione con un grado di realizzazione più modesto (69%).

Il risultato è da attribuire anche all'efficienza della "macchina amministrativa" che ha condotto a termine gli adempimenti delle prime due annualità e iniziato a portare a regime quelli del 2002.

FSE

La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali, conferma un andamento non pienamente soddisfacente. Al 31.03.2003 si registrano, infatti, pagamenti pari a €74.170.321,01. L'obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, pari a €186.885.000,00, risulta conseguito nella misura del 40%. Ancora distante il *target* di spesa formulato dall'Autorità di Gestione: a fronte di una soglia-obiettivo pari a €171.233.450,25, le Misure del Fondo fanno registrare, al volgere del primo trimestre del 2003, un livello di realizzazione del 43%.

Nondimeno, il livello di spesa conseguito al 31.12.2002 è stato sufficiente a scongiurare il rischio dell'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico. Infatti, l'ultima domanda di pagamento presentata evidenzia erogazioni per un ammontare di €58.547.044,79 di cui: €29.273.522,39 a valere sulla quota comunitaria, €20.491.465,68 su quella nazionale ed €8.782.056,72 su quella regionale.

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €75.104.944,12: il dato risulta ancora lontano sia dall'obiettivo programmatico stabilito per il 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato a €339.102.040,00, che dall'obiettivo previsionale di spesa dichiarato dalla Regione (€243.723.272,98).

Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del *target* MEF del 22%; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 31%. Nonostante il livello di spesa al I trimestre del 2003 sia ancora lontano dai valori-soglia dichiarati dalla Regione, sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili di Misura sembra si possa evitare il rischio di applicazione del disimpegno automatico per il corrente anno.

SFOP

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €2.798.282,08; il dato non pare in linea né con l'obiettivo programmatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato per il 2003 a €19.148.860,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine dell'anno (€10.248.574,03).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi sul 14% e il 27% rispettivamente.

Tuttavia, l'espletamento delle procedure successive alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando del 16.11.2001, fa prevedere per l'anno in corso un avanzamento finanziario tale da portare l'ammontare dei pagamenti a un livello ottimale.

Per le Misure cofinanziate dallo SFOP, si ricorda lo slittamento per le annualità 2000, 2001, 2002 del termine per l'applicazione del disimpegno automatico al 31.12.2004, come indicato nella nota della Commissione Europea n. 040302 del 01.08.2002. Ciò in considerazione della data di decisione della Commissione di approvazione del regime di aiuto (articolo 31, par. 2, comma 3 del Reg. (CE) 1260/99) che per l'intera dotazione delle Misure 4.7 e 4.8 (SFOP) del POR Sardegna è il 26.03.2002.

2. Attività svolta nell'ultimo semestre

2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel corso del semestre è stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell'Autorità di Gestione e approvate in sede di Comitato di Sorveglianza in data 12.02.2003.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.

Misure cofinanziate dal FESR

Misura 3.12

Sono stati ridefiniti gli obiettivi secondo la classificazione degli obiettivi specifici di riferimento QCS come segue:

- 18 "Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti";
- 21 "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".

Sono stati inoltre inclusi gli operatori e gli utenti dei Servizi per l'impiego tra i soggetti destinatari dell'intervento in aggiunta alla popolazione in età scolare.

Per gli interventi a regia regionale sono rimaste invariate le fasi procedurali mentre si è cassata la tempistica; la responsabilità del controllo contabile-finanziario della Misura è stato deferito al Servizio Affari Generali e Bilancio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.

Misura 5.1

La modifica apportata alla Misura riguarda unicamente l'inserimento del Comune di Villa San Pietro tra le aree territoriali prioritarie.

Misure cofinanziate dal FEOGA Orientamento

Misure 4.9 – 4.10 – 4.12 – 4.21

Nelle condizioni di ammissibilità, sono stati specificati in maniera più puntuale alcuni elementi per la determinazione della redditività delle aziende che praticano colture o allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del RLS.

Al fine di accelerare l'attuazione della Misura, è stato semplificato il cronogramma e meglio specificate le procedure di realizzazione.

Sono state accolte tutte le proposte formulate dall'Autorità Ambientale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Per facilitare la fase istruttoria sono stati specificati alcuni parametri tecnici e di ammissibilità delle spese.

Nella misura 4.10, con riferimento all'intensità dell'aiuto, si è introdotta una deroga ai massimali di spesa sovvenzionabile per i progetti dichiarati di particolare rilevanza regionale.

Misura 4.14

L'esigenza di modificare la Misura 4.14 del Complemento di Programmazione nasce dalla valutazione sia delle necessità di intervento nel territorio rurale, sia dall'effettiva capacità di risposta progettuale e di attuazione dello stesso territorio.

Nel formulare la proposte di modifica, si è tenuto conto dei punti critici che possono pregiudicare il raggiungimento dei risultati complessivi del programma di interventi, senza per altro variare gli obiettivi generali del POR e le condizioni di ammissibilità alla Misura:

- sono state descritte in maniera sintetica e più precisa le tipologie d'intervento;
- si è provveduto a una maggiore definizione e puntualizzazione dei soggetti destinatari dell'intervento;
- fra i beneficiari finali sono stati individuati "gli Enti pubblici e loro consorzi" che hanno sostituito il precedente beneficiario "Regione Autonoma della Sardegna" in quanto incoerente con le tipologie d'intervento;
- sono state introdotte e definite le procedure, inizialmente non previste nella Misura;
- sono stati fissati i due principali criteri di priorità per la selezione degli interventi, criteri facilmente individuabili e applicabili;
- al fine di facilitare l'istruttoria dei progetti, sono stati ridefiniti e descritti in modo più trasparente gli investimenti ammissibili e introdotto l'intensità dell'aiuto.

È stato modificato il piano finanziario con il trasferimento delle annualità 2000-2003 delle Misure 4.15 e 4.16 alla Misura 4.14.

A seguito della modifica delle Misure e del piano finanziario, si è reso necessario ridefinire gli indicatori e i relativi *target*.

Misure cofinanziate dal FSE

Nel corso del semestre alle Misure cofinanziate dal FSE si sono apportate, su proposta dell'Autorità di Gestione, una serie di modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza il 12.02.2003.

Si tratta di adeguamenti del "Contenuto tecnico della Misura" e di modifiche inerenti la "Procedura di attuazione della Misura".

Alla prima tipologia sono riconducibili le modifiche che riguardano i soggetti destinatari dell'intervento: in riferimento alle Misure 3.2 e 3.3, è stata eliminata la specificazione dei destinatari in "condizione professionale inattiva" in quanto ritenuta fuorviante e non esaustiva.

Per quanto riguarda le modifiche di tipo procedurale, da tutte le Misure cofinanziate dal FSE è stato eliminato l'elenco delle spese ammissibili: ove non esaustiva infatti, un'elencazione dettagliata potrebbe indurre in errore i soggetti attuatori e i beneficiari finali. È stata contestualmente eliminata, dal paragrafo "Spese ammissibili" la definizione "intensità di aiuto" configurandosi nel caso di specie regimi d'aiuto.

In riferimento alle Misure 3.10 e 3.11 si precisa che sono stati distinti i criteri di ammissibilità e di selezione delle attività formative dalle altre tipologie di attività previste; gli stessi criteri, peraltro, sono stati oggetto di modifiche e integrazioni.

2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Le azioni condotte dalla Regione Autonoma Sardegna nel corso del secondo semestre 2002 e fino alla data di riferimento del presente *Rapporto* consistono prevalentemente nella definizione delle Linee Guida per i PIT Selezione 2002.

Tale documento, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 39/24 del 10.12.2002, costituisce il punto di riferimento normativo principale per tutto il processo connesso alla definizione dei PIT.

Gli elementi di maggior rilievo possono sintetizzarsi come segue:

- la definizione delle procedure e dei contenuti dell'ottimizzazione dei PIT selezione 2001. A fronte dell'individuazione di interventi per ciascuno dei 13 PIT di cui alla selezione 2001, la RAS ha delineato un percorso di "affinamento" dei contenuti operativi di tali PIT che ne determinerà l'integrazione del quadro finanziario per un importo complessivo di operazioni pari a 111 Meuro circa;
- la definizione dettagliata delle fasi di progettazione dei PIT selezione 2002, dalla individuazione degli elementi fondanti del Progetto (territorio di riferimento e "idea forza") fino al momento della sottoscrizione del relativo Accordo di Programma. Coerentemente con quanto previsto dagli orientamenti comunitari, la RAS ha puntualmente definito momenti e modalità del confronto con il partenariato economico e sociale per l'acquisizione di contributi nel percorso di progettazione del PIT;
- la predisposizione degli strumenti e della modulistica necessaria alla presentazione dei progetti da parte delle Amministrazioni locali. Va peraltro rilevato che il percorso di definizione ed elaborazione dei Progetti è stato rafforzato attraverso l'attribuzione alle Province di un forte ruolo di coordinamento dell'azione dei singoli Tavoli di Concertazione locale.

La documentazione e le informazioni necessarie sul tema di cui si tratta sono oggetto di ampia trattazione nell'ambito di un *link* del sito istituzionale della RAS.

Infine, la RAS, con l'obiettivo di innalzare la qualità progettuale e assicurare un adeguato supporto agli Enti Locali, ha conferito incarico all'RTI di Assistenza Tecnica al POR di assisterla lungo tutto l'arco temporale e procedurale definito dalle Linee Guida per la definizione dei Progetti.

Nelle more della stipula del contratto e nei momenti immediatamente successivi sono state avviate le prime azioni propedeutiche all'apertura dei lavori quali:

- attivazione di una Segreteria Tecnica presso il CRP;
- attivazione di azioni per il necessario coordinamento dell'azione dell'RTI con quella posta in essere da Formez e ANCI a supporto degli Enti Locali.

3. Stato di attuazione al 31.03.2003: analisi per Misura

Asse I – Risorse naturali

Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della LR 24/1987, società di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che è incredibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas

Telefono: 070.606 6671

E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris

Telefono: 070.606 2252

E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta un ammontare di impegni pari a € 335.862.194,60, valore incrementato di quasi il 78% rispetto a settembre 2002. Si registra inoltre un incremento di circa il 21% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 186.728.921,22. La capacità di impegno passa quindi dal 37% a circa il 66% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 36,57% e la capacità di utilizzo si porta al 55,60% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	510.653.000,00	510.653.000,00	189.061.724,58	189.061.724,58	154.428.319,20	154.428.319,20
Situazione al 31.03.2003	510.653.000,00	510.653.000,00	335.862.194,60	335.862.194,60	186.728.921,22	186.728.921,22
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	146.800.470,02	146.800.470,02	32.300.602,02	32.300.602,02
Incremento % *	0,00	0,00	77,65	77,65	20,92	20,92
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	37,02%	37,02%	30,24%	30,24%	81,68%	81,68%
Situazione al 31.03.2003	65,77%	65,77%	36,57%	36,57%	55,60%	55,60%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2002 sono stati portati a termine i principali adempimenti strategici propedeutici all'attuazione della Misura.

Come già riportato nel precedente *Rapporto*, il 26.02.2002 si è conclusa la procedura di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione" che si configura come un programma di investimenti "ponte" nel ciclo integrato dell'acqua della Regione. Il Presidente della Giunta Regionale, nominato Commissario Straordinario per l'Emergenza idrica con ordinanza ministeriale del 12.04.2002 ha provveduto all'approvazione del *Piano d'Ambito* con Ordinanza n. 321 del 30.09.2002. Con deliberazione

n. 39/96 del 10.12.2002 la Giunta regionale, visti gli esiti dell'approvazione da parte degli Enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente, ha adottato lo Statuto dell'Autorità d'Ambito (art. 6 LR 29/97). Con la medesima deliberazione è stato approvato il regolamento per l'elezione dei 36 componenti dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito e conferito mandato all'Assessorato dei LLPP per l'espletamento delle procedure necessarie all'insediamento degli organi.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 334 del 31.12.2002 è stato approvato il *Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale* per l'utilizzo delle risorse idriche. È seguita l'Ordinanza n. 336 del 31.12.2002 con la quale il Presidente della Regione Sardegna, sempre in qualità di Commissario Governativo per l'Emergenza idrica, ha stabilito che la gestione del servizio idrico integrato venisse affidata direttamente, in via transitoria, entro il 30.06.2003, a uno specifico soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti operanti nell'ATO della Regione Sardegna. Ne consegue che tutti gli attuali gestori del servizio idrico in Sardegna confluiranno in un'unica società per azioni controllata dagli Enti Locali, costituendo un unico soggetto. Il principale di questi Enti è l'ESAF che, per far parte della costituenda società, dovrà trasformarsi in società per azioni.

A seguito della pubblicazione sul BURAS n. 22 del 29.07.2002 del bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*" e dopo l'espletamento della fase istruttoria, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento è stata approvata con Determinazione del Direttore dei Servizi del 3.12.02 e pubblicata sul BURAS n. 36 del 9.12.02. Sono stati finanziati 135 interventi, su 251 presentati, per un importo complessivo di €57.122.720,00. I comuni beneficiari degli interventi, classificati per densità di popolazione, si ripartiscono le risorse messe a bando come segue:

- €17.136.816,00 nei comuni con meno di 5.000 abitanti (1^a classe);
- €8.568.408,00 nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti (2^a classe);
- €17.136.816,00 nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti (3^a classe);
- €14.280.680,00 nei comuni con più di 50.000 abitanti (4^a classe).

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Ordinanza n. 349 del 25.03.2003, il Commissario Governativo ha affidato alla *SOGESID spa* l'incarico per l'implementazione delle attività necessarie per procedere, entro i termini prescritti dall'Ordinanza n. 336 del 31.12.2002 (ossia entro il 30 giugno 2003), all'affidamento del Servizio Idrico Integrato. Nell'ambito dell'attività di supporto conferita, la *SOGESID spa* – società a totale capitale pubblico – si farà carico di:

- predisporre una proposta di assetto societario per il soggetto gestore;
- pianificare gli obiettivi e predisporre un cronogramma con cui tutti i soggetti dovranno concorrere al raggiungimento dei programmi stabiliti.

Tale attività dovrà essere espletata entro il 15.05.2003.

In merito al bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*" si sta attualmente procedendo alla stipula delle deleghe con i Beneficiari finali.

Si è in attesa dell'approvazione del *Piano di Tutela delle acque* (DLgs 152/99). Con DGR n. 36/47 del 23.10.2001 viene fissata la data per l'adozione del *Piano* al 31.12.2003.

Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, su un costo totale programmato pari a €80.508.000,00, la Misura 1.2 presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	80.508.000,00	49.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	80.508.000,00	49.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Con Circolare Dirigenziale Prot. n. 10599 del 28.05.2001, è stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di proposte in merito all'acquisto di contatori (*Intervento A: Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende*) e ai sistemi di razionalizzazione delle condotte (*Intervento B: Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili*).

Gli studi di fattibilità presentati non sono stati ritenuti esaustivi rispetto all'individuazione e localizzazione dei contatori già esistenti e da installare e/o alle necessità di risanamento e ristrutturazione degli impianti irrigui; ciò ha determinato la richiesta da parte dell'Amministrazione di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.

Per l'intervento A "Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende" risposte in merito sono pervenute solo da alcuni Consorzi, per i quali si intende completare la procedura di approvazione degli interventi entro giugno 2003. Per l'intervento B "Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili" tutti i Consorzi hanno risposto in maniera più o meno esaustiva, pur rimanendo da completare la progettazione definitiva.

Intervento A	2001						2002												2003			
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Atto amministrativo e presentazione proposte - 55 gg																						
Selezione e istruttoria progetti - 6 mesi																						
Approvazione e pubblicazione graduatoria – 15 gg																						
Provvedimenti a favore beneficiari – 15 gg																						
Realizzazione - 24 mesi																						

 Preventivo

 Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori

Telefono: 070.606 6500

E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia

Telefono: 070.606 2349

E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel corso del semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento nell'ammontare dei pagamenti di quasi il 24%, passando in valore assoluto da €36.292.084,79 del 30.09.2002 a €44.982.069,28. Mentre la capacità di spesa si attesta al 16,32% delle somme stanziare, la capacità di tradurre in erogazioni le somme impegnate si porta a circa il 71%. La variazione negativa degli impegni è da imputare alla scelta operata dall'Assessorato dell'Industria di rendicontare – fra i progetti coerenti – unicamente gli interventi in avanzata fase di realizzazione o ultimati, provvisti di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	275.606.000,00	275.606.000,00	105.550.535,31	105.550.535,31	36.292.084,79	36.292.084,79
Situazione al 31.03.2003	275.606.000,00	275.606.000,00	63.539.626,89	63.539.626,89	44.982.069,28	44.982.069,28
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-42.010.908,42	-42.010.908,42	8.689.984,49	8.689.984,49
Incremento % *	0,00	0,00	-39,80	-39,80	23,94	23,94
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	38,30%	38,30%	13,17%	13,17%	34,38%	34,38%
Situazione al 31.03.2003	23,05%	23,05%	16,32%	16,32%	70,79%	70,79%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

La Misura si articola in tre ambiti di intervento: *Suolo*, *Zone umide*, *Prevenzione e sorveglianza degli incendi*.


Per gli interventi rientranti nell'ambito *Suolo* (a regia regionale), l'attuazione della Misura ha preso avvio con la predisposizione e pubblicazione sul Supplemento Straordinario del BURAS n. 43 del 16.11.2001 del bando di candidatura per l'assegnazione delle risorse previste dal POR per la linea d'azione. La fase di selezione si è conclusa con l'approvazione di 50 progetti, per un ammontare complessivo finanziabile di €42.721.000,00. La graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del Servizio della Tutela del Suolo e Politica Forestale (Assessorato Ambiente) n. 1135 del 20.05.2002 e pubblicata sul BURAS n. 23 dell'8.08.2002. I progetti ammessi a beneficio sono distribuiti come segue:

- 19 progetti, per un importo pari a €21.015.137,00 nella provincia di Cagliari (comprensivo di 2 progetti finanziati dall'Assessorato LLPP);
- 15 progetti, per un importo di €11.654.655,00 nella provincia di Nuoro;
- 11 progetti, per un importo di €9.268.199,00, nella provincia di Sassari;
- 5 progetti, per un importo di €2.383.209,00, nella provincia di Oristano.

Tra luglio e dicembre 2002 sono stati predisposti e inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti di delega.

Inoltre, a seguito di una variazione compensativa con la quale parte delle risorse assegnate alla linea d'azione *Prevenzione e sorveglianza degli incendi* sono state attribuite alla *Difesa del suolo* e *Zone umide*, si è provveduto a finanziare alcuni interventi (n. 27 per un totale di € 59.772.988,00) che, quantunque inseriti nella graduatoria, non avevano trovato copertura nei fondi inizialmente disponibili.

Misura 1.3 Suolo	2001			2002												2003		
	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Predisposizione bando pubblico – 15 gg																		
Adempimenti pubblicaz bando – 15gg																		
Pubblicaz. bando e presentazione proposte – 2 mesi																		
Istruttoria e approvazione graduatoria – 3 mesi																		
Provvedim delega a favore beneficiario – 1 mese																		
Progettaz esecutiva, appalto e realizzaz. - 36 mesi																		
Collaudo – 3 mesi																		



Preventivo
Consuntivo

Per l'ambito di intervento *Zone umide*, in attesa della pubblicazione del bando, sono stati ammessi ai finanziamenti del POR, con Atto di Programmazione, 2 interventi localizzati nel comune di Muravera. Anche per questa linea d'azione, le risorse assegnate non impiegate, concorreranno al finanziamento degli interventi di *Difesa del suolo*.

Rimane sospesa la linea d'azione *Prevenzione e sorveglianza degli incendi* in quanto la predisposizione del *Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* ha richiesto tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti. Il CdP colloca pertanto l'azione nella seconda fase di attuazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003

Sempre in ambito *Suolo* gli interventi verranno attuati tramite bando non appena sarà approvato il *Piano di Assetto Idrogeologico* (PAI), previsto entro giugno 2003.

Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi

Telefono: 070.606 6685

E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 1.4, a fronte di un costo totale programmato di € 74.388.000,00, registra un ammontare di impegni pari a € 36.723.913,00 e una spesa certificata di € 25.441.268,46. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano le seguenti percentuali: la capacità di impegno si attesta al 49%, la capacità di spesa al 34% e la capacità di utilizzo al 69%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	74.388.000,00	74.388.000,00	45.335.458,53	45.335.458,53	24.149.838,85	24.149.838,85
Situazione al 31.03.2003	74.388.000,00	74.388.000,00	36.723.913,00	36.723.913,00	25.441.268,46	25.441.268,46
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-8.611.545,53	-8.611.545,53	1.291.429,61	1.291.429,61
Incremento % *	0,00	0,00	-19,00	-19,00	5,35	5,35
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	60,94%	60,94%	32,46%	32,46%	53,27%	53,27%
Situazione al 31.03.2003	49,37%	49,37%	34,20%	34,20%	69,28%	69,28%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Dal punto di vista procedurale nel corso del 2002 sono stati portati a termine i seguenti adempimenti strategici propedeutici all'attuazione della Misura 1.4: in data 6.11.2002 è stato approvato dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano regionale gestione rifiuti. In merito all'approvazione dei singoli Piani provinciali, la Provincia di Cagliari ha provveduto con Delibera del Consiglio provinciale n. 32 del 16.05.2002.

Con DGR del 9.08.2002 è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate in risposta al bando pubblicato sul BURAS n. 34 del 16.11.2001, per la selezione di progetti di intervento diretti alla riduzione della produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cui è stato riservato un ammontare finanziario pari a €2.065.827,59.

L'importo, da imputare allo stanziamento previsto per l'annualità 2001, avrebbe consentito di finanziare unicamente i primi cinque interventi in graduatoria, di cui il quinto solo in parte. Una decisione politica ha consentito di superare l'*impasse* mediante il ricorso a una quota di risorse programmate per il 2002, finanziando in tal modo l'intera spesa ammissibile del quinto progetto e ulteriori quattro interventi. Risultano pertanto ammessi a beneficio comunitario nove progetti, per una spesa complessiva pari a €4.652.031,71 e distribuiti come segue:

- 4 progetti in provincia di Cagliari con un importo ammesso a finanziamento pari a € 3.408.144,00;
- 3 progetti in provincia di Nuoro, per un importo di €375.727,86;
- 1 progetto nella provincia di Oristano per €529.807,03;
- 1 progetto nella provincia di Sassari per €338.352,82.

Sempre in relazione all'ambito di intervento dei *rifiuti*, con Atto di Programmazione regionale del 30.12.2002 si è proceduto al finanziamento di due interventi di infrastrutturazione per la gestione integrata dei rifiuti, costituiti da un lotto funzionale dell'impianto di Oristano al servizio di tutto il territorio provinciale per un importo di € 4.614.795,88 e di un impianto di stabilizzazione e compostaggio nel comune di Ozieri al servizio di parte del subambito D1 di Sassari per un importo di €4.500.000.

È stato inoltre finanziato il completamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Cagliari a servizio di una popolazione di 500.000 abitanti per un importo di €7.230.396,58.

Per quanto riguarda l'ambito di intervento *siti inquinati*, il Piano Regionale di bonifica di siti inquinati, la cui approvazione era prevista dal CdP entro il 31.12.2002, è ancora in fase di elaborazione. Pur tuttavia si è avviato un intervento di emergenza in Provincia di Oristano per un importo di €1.089.724,05 da condurre nel rispetto del DM 471/99.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis

Telefono: 070.606 6597

E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.5 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno, che nei pagamenti. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni, in valore assoluto, si attestano a € 15.878.788,71 con un incremento di circa il 28% rispetto al 30.09.2002, mentre la spesa effettivamente sostenuta si accresce di un'aliquota più modesta (0,20%) portandosi a € 11.575.923,72.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	41.327.000,00	41.327.000,00	12.408.456,86	12.408.456,86	11.552.284,23	11.552.284,23
Situazione al 31.03.2003	41.327.000,00	41.327.000,00	15.878.788,71	15.878.788,71	11.575.923,72	11.575.923,72
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	3.470.331,85	3.470.331,85	23.639,49	23.639,49
Incremento % *	0,00	0,00	27,97	27,97	0,20	0,20
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	30,03%	30,03%	27,95%	27,95%	93,10%	93,10%
Situazione al 31.03.2003	38,42%	38,42%	28,01%	28,01%	72,90%	72,90%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Nel 2001 è stato pubblicato il bando "Rete ecologica Regionale" sul Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scadeva al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando. Entro i termini sono pervenute 46 proposte.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con la Determinazione n. 108 del 7.02.2003 del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attività Venatoria, pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, è stata approvata la graduatoria relativa alle proposte presentate in rispetto al bando citato.

Sono stati ammessi e finanziati 11 progetti per un importo complessivo di €9.613.197,41.

Sono stati giudicati ammissibili, ma non finanziati altri 11 progetti.


24 progetti sono stati dichiarati non ammissibili al finanziamento.

Gli 11 interventi ammessi al finanziamento sono così localizzati:

- 4 interventi nella provincia di Nuoro per un importo di €3.179.928,61;
- 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di €3.781.238,19;
- 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di €1.142.383,64;

- 2 interventi in provincia di Sassari per un importo di €1.509.646,97.

Come si evince dalla lettura del *gantt* a seguire, l'espletamento della fase istruttoria ha richiesto un periodo di tempo sensibilmente più lungo rispetto alle previsioni da CdP.

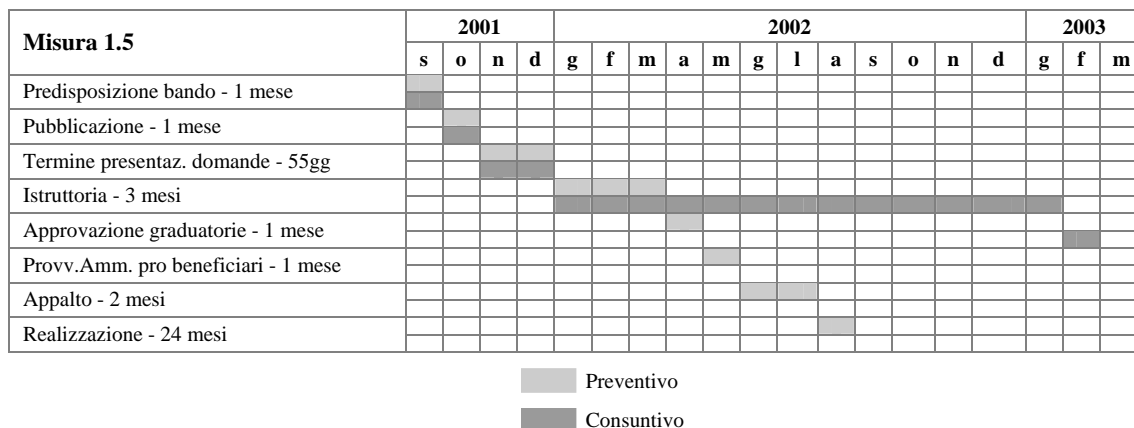

Misura 1.6: Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Perdura la situazione di stallo rilevata nel semestre precedente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	19.883.000,00	19.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	19.883.000,00	19.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	0,00	0,00	-	-	-	-
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>e/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Non si segnala alcuna novità nel corso del 2002.

Aggiornamento al 31.03.2003

Sulla GURI n. 60 del 13.03.03 è stato pubblicato il bando di gara inerente “Affidamento dell’incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell’ambito del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell’area di Cagliari”. Tale bando è stato emanato dall’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), soggetto al quale è stata delegata l’attuazione dell’intervento.

Oltre attraverso la pubblicazione citata, il bando è stato reso noto a mezzo della divulgazione su due quotidiani nazionali (il Sole 24 Ore e Repubblica) e due regionali (l’Unione Sarda e la Nuova Sardegna) in data 17.03.2003.

La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per il giorno 5.05.2003.

Si prevede il completamento della progettazione esecutiva entro il 2004, mentre l’affidamento dei lavori è ipotizzato per la primavera del 2005 e la loro conclusione stimata a fine 2007.

Misura 1.7: Monitoraggio - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris

Telefono: 070.606 6679

E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 1.7, a fronte di un costo totale di €28.511.000,00, registra un ammontare di impegni pari a €1.281.363,98 e di pagamenti pari a €1.027.160,76. Mentre la capacità di impegno si attesta al 4,49% del costo totale programmato, la capacità di spesa risulta pari al 3,60%, e la capacità di utilizzo supera l'80% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	28.511.000,00	28.511.000,00	4.389.883,64	4.389.883,64	690.201,66	690.201,66
Situazione al 31.03.2003	28.511.000,00	28.511.000,00	1.281.363,98	1.281.363,98	1.027.160,76	1.027.160,76
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-3.108.519,66	-3.108.519,66	336.959,10	336.959,10
Incremento % *	0,00	0,00	-70,81	-70,81	48,82	48,82
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	15,40%	15,40%	2,42%	2,42%	15,72%	15,72%
Situazione al 31.03.2003	4,49%	4,49%	3,60%	3,60%	80,16%	80,16%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Nel corso del 2002 non si è registrato nulla di rilevante ai fini dell'attuazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel primo trimestre 2003 sono stati pubblicati i seguenti due bandi:

- il primo, avente ad oggetto l'affidamento del servizio "Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati" per un importo a base di gara di € 150.000,00 (IVA esclusa), è stato pubblicato sul BURAS n. 6 del 28.02.2003. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il 14.04.2003;
- il secondo, avente ad oggetto l'affidamento del servizio "Realizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99", per un importo a base di gara di € 516.456,90 (IVA esclusa), è stato pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 23.04.2003.

Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Rispetto al precedente semestre, a fronte di impegni invariati, al 31.03.2003 si registra un incremento dei pagamenti, che porta la capacità di spesa al 3% circa ed una capacità di utilizzo delle risorse impegnate pari al 10%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	41.634.000,00	41.634.000,00	11.936.626,35	11.936.626,35	43.511,52	43.511,52
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	41.634.000,00	11.936.626,37	11.936.626,37	1.192.342,20	1.192.342,20
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,02	0,02	1.148.830,68	1.148.830,68
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,29	2.640,29
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	28,67%	28,67%	0,10%	0,10%	0,36%	0,36%
Situazione al 31.03.2003	28,67%	28,67%	2,86%	2,86%	9,99%	9,99%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Al 31.12.2002, l'avanzamento della Misura è ancora determinato esclusivamente dall'attuazione della linea B) "formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico" avvenuta con la pubblicazione del bando del 09.09.2001 "Interventi finalizzati all'aggiornamento del personale pubblico" che finanzia attività formative per un importo di € 13.261.451. A seguito degli affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 123 corsi destinati a 2.400 allievi, per un importo complessivo di €11.936.626,35,.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del trimestre si rileva un unico elemento di novità dal punto di vista procedurale rappresentato dall'avvio di 2 dei 123 corsi ammessi a finanziamento.

La completa attuazione della Misura è rimandata al secondo semestre del 2003, quando verranno messe a bando le due linee d'azione non ancora attivate. Più precisamente, si tratta della linea di intervento A) "formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore" e della linea C) "formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali".

Asse II – Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras

Telefono: 070.606 4928

E mail: lamarras@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura registra un incremento degli impegni pari al 18% e dei pagamenti pari a circa il 3% rispetto ai dati rilevati il 30.09.2002.

Gli indicatori di avanzamento mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno sfiora il 12%, la capacità di spesa supera il 10% e la capacità di utilizzo risulta pari all'87% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	145.023.000,00	145.023.000,00	14.475.203,56	14.475.203,56	14.475.203,56	14.475.203,56
Situazione al 31.03.2003	145.023.000,00	145.023.000,00	17.082.704,23	17.082.704,23	14.890.654,70	14.890.654,70
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.607.500,67	2.607.500,67	415.451,14	415.451,14
Incremento % *	0,00	0,00	18,01	18,01	2,87	2,87
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	100,00%	100,00%
Situazione al 31.03.2003	11,78%	11,78%	10,27%	10,27%	87,17%	87,17%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Da un punto di vista procedurale si registrano i seguenti avvenimenti significativi.

A seguito della pubblicazione del bando 2001 "Itinerario Città Regie" (BURAS n. 30 dell'8.10.2001) è stata approvata con Determinazione del 15.07.2002 e pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002 la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento. Sono stati ammessi a finanziamento 40 interventi, di cui 5 studi di fattibilità economico-finanziaria e storica, per un ammontare complessivo di €30.585.110,16 che consentiranno la realizzazione di:

- 21 interventi nella provincia di Sassari per un importo pari a €11.589.604,95;
- 14 interventi in provincia di Cagliari, per un importo pari a €10.123.880,49;
- 4 interventi localizzati nella provincia di Oristano, per un importo pari a €4.834.717,88;
- 1 intervento in provincia di Nuoro, per un importo pari a €4.036.906,84.

Nel mese di dicembre 2002 sono state stipulate le deleghe con i Comuni di Cagliari, Iglesias e Sassari. Durante il primo trimestre 2003 si è proseguito con gli altri Beneficiari finali e si prevede di terminare questa ulteriore fase entro maggio.

Misura 2.1 Città regie	2001			2002												2003		
	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02	■																	
Presentazione progetti - 60 gg		■	■	■														
Istruttoria e graduatoria - 90gg				■	■	■	■	■	■	■								
Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg							■	■			■	■						
Provv di concessione - 30 gg								■				■	■	■	■	■	■	■
Appalto e consegna lavori - 180 gg									■	■	■	■	■	■	■			
Esecuzione lavori																		

Preventivo
 Consuntivo

Nel corso del 2002 sono stati pubblicati due bandi per i quali è tuttora in corso la fase istruttoria. Il primo bando *“Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abbandonati a fini culturali e turistici”*, con una dotazione finanziaria pari a 28 Meuro, è stato pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002.

Il secondo bando relativo ai *“Percorsi turistico-religiosi”*, con una dotazione finanziaria di 15 Meuro, è stato pubblicato sul BURAS n. 26 del 6.09.2002. Sono pervenuti 19 progetti. La fase istruttoria ha avuto inizio a dicembre 2002. La pubblicazione della graduatoria è prevista per la fine di luglio 2003.

Aggiornamento al 31.03.2003



Relativamente al bando *“Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abbandonati a fini culturali e turistici”* non è ancora stata nominata la commissione per la selezione delle istanze progettuali pervenute (150 interventi, alcuni dei quali articolati in più proposte, per un totale di 280 progetti). Si prevede di iniziare la fase di istruttoria entro maggio 2003.

Si è chiusa la fase istruttoria a valere sul bando *“Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale”* (pubblicato sul SS n. 3, BURAS n. 30 dell'8.10.2001). La graduatoria è stata approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 93 del 05.02.2003 e pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003.

I progetti ammessi al finanziamento sono 14 (a fronte di 41 progetti presentati), per un importo complessivo di €19.145.466,66 e consentiranno la realizzazione di:

- 9 interventi in provincia di Cagliari per un importo di €7.571.623,76;
- 3 interventi nella provincia di Nuoro, per un importo di €10.109.687,59;
- 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di €1.464.155,31.



Misura 2.1 Archeologia nuragica	2001			2002												2003		
	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02																		
Presentazione progetti - 60 gg																		
Istruttoria e graduatoria - 90gg																		
Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg																		
Prov. di concessione - 30 gg																		
Appalto e consegna lavori - 180 gg																		
Esecuzione lavori																		

 Preventivo
 Consuntivo

Per il bando “*Parco Grazia Deledda*” (pubblicato sul SS n. 3, BURAS n. 30 dell’8.10.2001), con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 162 del 10.02.2003, pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, è stata approvata la graduatoria finale. I progetti ammessi sono 22 (a fronte di 27 progetti presentati) per un importo complessivo di € 11.706.912,71 e consentiranno la realizzazione di:

- 11 interventi nella provincia di Sassari, per un importo di €4.396.225,77;
- 11 interventi nella provincia di Nuoro per un importo complessivo di €7.310.686,94.

Misura 2.1 Parco Grazia Deledda	2001			2002												2003		
	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02																		
Presentazione progetti - 60 gg																		
Istruttoria e graduatoria - 90gg																		
Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg																		
Prov. di concessione - 30 gg																		
Appalto e consegna lavori - 180 gg																		
Esecuzione lavori																		

 Preventivo
 Consuntivo

Per quanto attiene al primo bando PIT, fanno parte della Misura 11 progetti appartenenti ai seguenti PIT:

- 1 progetto compreso nel PIT CA1;
- 2 progetti compreso nel PIT CA2;
- 7 progetti compreso nel PIT CA4;
- 1 progetto compreso nel PIT SS2.

Non si è ancora proceduto alla stipula delle deleghe ai Beneficiari finali in quanto i progetti esecutivi sono ancora in fase di redazione o in attesa di pareri. Si prevede di provvedere alla determinazione di delega in favore del Comune di Guspini entro giugno 2003, avendo l’Ente provveduto alla presentazione del progetto esecutivo.

Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci

Telefono: 070.606 4994

E mail: bertoluc@unica.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 2.2, nel semestre di riferimento, a fronte di un costo totale pari a €85.275.000,00 ha registrato un incremento nei valori di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente su € 15.740.924,31 ed € 10.277.670,56. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni risultano aumentati di quasi il 71% e la spesa dell'11,42% rispetto al dato rilevato al 30.9.2002.

Tale avanzamento si traduce in una capacità di impegno del 18,46%, una capacità di spesa pari al 12% e in una capacità di utilizzo delle risorse impegnate che supera il 65,29%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	85.275.000,00	85.275.000,00	9.224.667,61	9.224.667,61	9.224.667,61	9.224.667,61
Situazione al 31.03.2003	85.275.000,00	85.275.000,00	15.740.924,31	15.740.924,31	10.277.670,56	10.277.670,56
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	6.516.256,70	6.516.256,70	1.053.002,95	1.053.002,95
Incremento % *	0,00	0,00	70,64	70,64	11,42	11,42
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	100,00%	100,00%
Situazione al 31.03.2003	18,46%	18,46%	12,05%	12,05%	65,29%	65,29%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Bando "Parco Giuseppe Dessì"

È stato pubblicato nell'ottobre dell'anno 2001, sul BURAS n. 30, mentre la relativa graduatoria degli interventi ammessi è stata resa nota sul BURAS n. 14 dell'11.05.2002.

I progetti ammessi a finanziamenti sono 20 – tutti localizzati nella provincia di Cagliari – per un importo complessivo di €14.452.767,70.

Nel dettaglio il bando consentirà la realizzazione dei seguenti interventi:

- 7 interventi in comune di Villacidro, per un importo complessivo di €3.092.767,60;
- 5 interventi in comune di Arbus, per un importo di €3.454.905,00;
- 4 interventi in comune di Guspini, per un importo di €3.607.415,30;
- 2 interventi in comune di San Gavino Monreale, per un importo di €229.151,90;
- 1 intervento in comune di Buggerru, per un importo di €2.766.576,30;
- 1 intervento in comune di Fluminimaggiore, per un importo di €1.301.471,40.

Nei mesi di ottobre e novembre 2002 sono state stipulate le deleghe in favore di tutti i Beneficiari finali.

Bando "Archeologia industriale"

È stato pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 con un finanziamento globale previsto pari a 27 Meuro. Sono pervenuti 26 progetti e la fase istruttoria ha avuto inizio in dicembre. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine di luglio 2003.


Per quanto attiene al primo bando PIT fanno parte della Misura 5 progetti appartenenti ai seguenti PIT:

- 2 progetti appartenenti al PIT CA1;
- 2 progetti appartenenti al PIT CA2;
- 1 progetto appartenente al PIT SS1.

Non si è ancora proceduto alla stipula delle deleghe in quanto i progetti sono in fase di redazione o attesa di pareri. Si prevede di procedere entro maggio 2003.

Aggiornamento al 31.03.2003

A marzo sono stati firmati i primi contratti d'appalto e consegnati i lavori in favore dei Beneficiari finali selezionati a seguito del bando "Parco Giuseppe Dessì". Come si desume pertanto dalla lettura del *gantt* a seguire, a fronte di una tempistica pressoché in linea con quella prefigurata in sede di programmazione per i primi *step*, fa seguito un rallentamento in questa seconda fase procedurale.

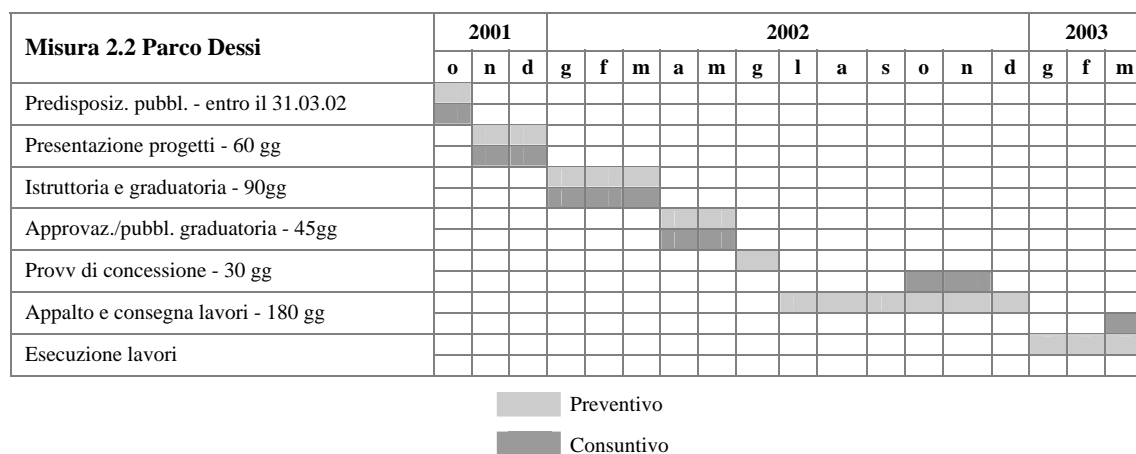

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi

Telefono: 070.606 4960

E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 2.3, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell'ammontare degli impegni che dei pagamenti superiore al 100% dei valori registrati al 30.09.2002. Gli impegni in valore assoluto passano da € 15.300.915,14 a € 33.490.565,20 mentre i pagamenti da € 6.252.308,20 si portano a € 12.609.571,83. Tali valori si traducono in una capacità di impegno del 31,12%, una capacità di spesa dell'11,72% e una capacità di utilizzo pari al 37,65%.

L'avanzamento della Misura è in parte ascrivibile anche alla realizzazione di nuovi progetti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	107.616.000,00	107.616.000,00	15.300.915,14	15.300.915,14	6.252.308,20	6.252.308,20
Situazione al 31.03.2003	107.616.000,00	107.616.000,00	33.490.565,20	33.490.565,20	12.609.571,83	12.609.571,83
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	18.189.650,06	18.189.650,06	6.357.263,63	6.357.263,63
Incremento % *	0,00	0,00	118,88	118,88	101,68	101,68
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	14,22%	14,22%	5,81%	5,81%	40,86%	40,86%
Situazione al 31.03.2003	31,12%	31,12%	11,72%	11,72%	37,65%	37,65%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Nel corso del 2002, si segnala la pubblicazione tanto delle graduatorie dei due bandi relativi all'anno 2001, quanto quella di due nuovi bandi relativi al 2002.

Con la graduatoria del bando "Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - CARAS" (BURAS n. 30 del 8.10.2001), pubblicata sul BURAS n. 14 dell'11.05.2002, sono state ammesse a finanziamento 23 proposte presentate da altrettanti Beneficiari finali, per un ammontare complessivo di €44.076.850,07; nel dettaglio:

- 10 interventi nella provincia di Cagliari a favore di 7 BF, per un importo di €15.347.818,23;
- 10 interventi nella provincia di Nuoro a favore di 7 BF, per un importo di €971.768,54;
- 7 interventi nella provincia di Sassari a favore di 6 BF, per €17.155.884,58;
- 4 interventi nella provincia di Oristano a favore di 3 BF per €1.590.255,84

Per tutti e 31 progetti i 23 Beneficiari finali hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti successivamente al trasferimento da parte della Regione della prima *tranche* di finanziamento pari al 25% dell'importo complessivo (LR 24/87).

La graduatoria relativa al bando “*Rete regionale di servizi per archivi e biblioteche*”, la cui fase istruttoria si è conclusa nel settembre 2002 (BURAS n. 28 del 26.09.2002), ha ammesso a finanziamento 10 progetti per un ammontare totale di €13.644.481,40 così distribuiti:

- 5 progetti, per un importo di €7.449.580,90, nella provincia di Cagliari;
- 2 progetti, per €3.589.375,45, nella provincia di Nuoro;
- 2 progetti, per un ammontare pari a €2.419.600,57, nella provincia di Sassari;
- 1 progetto nella provincia di Oristano per €185.924,48.

Si tenga presente che nell’ambito dei bandi esitati nel 2001 della Misura 2.1, sono stati finanziati – a valere sulla dotazione finanziaria della 2.3 – anche 2 progetti afferenti a proposte più ampie, nella provincia di Sassari (€51.307,41) e nella provincia di Cagliari (€88.314,13).


Relativamente ai PIT – selezione 2001 – il Responsabile di Misura ha espresso una valutazione di carenza finanziaria e tipologica per i seguenti 4 progetti:

- 2 progetti finanziati in provincia di Cagliari (Selargius e Monserrato), per un totale di € 776.368,00, si rimane in attesa degli ultimi pareri da parte degli organismi diversi dai BF;
- 2 progetti finanziati in provincia di Sassari (Arzachena e Castelsardo), per un totale di € 1.216.875,75.

Nel 2002 si registra la contestuale pubblicazione sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 9 del 29.03.2002 dell’invito a presentare proposte per “*Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - CARAS*” e del bando per “*Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali*”.

Aggiornamento al 31.03.2003

Per quanto concerne il secondo bando per “*Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - CARAS*”, si è conclusa la fase di istruttoria nel febbraio 2003 con la disamina dei progetti presentati dai 22 Beneficiari finali che, come mostra il *gantt*, ha richiesto tempi più lunghi rispetto al precedente bando. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro breve.

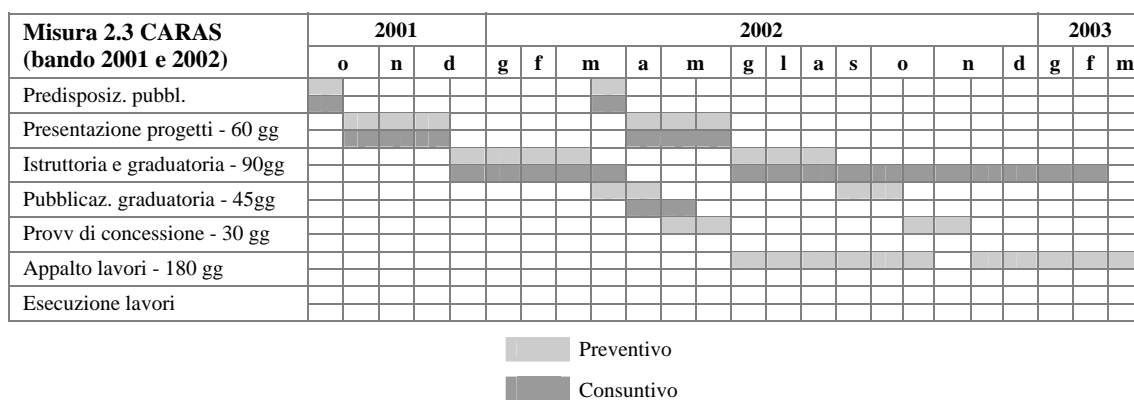

Per quanto attiene al bando “*Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali*”, la fase istruttoria è prossima a concludersi. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine di giugno 2003.

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di € 41.634.000, la Misura presenta impegni pari a € 6.981.580,59 – invariati rispetto al dato registrato al 30.09.2002 – e pagamenti sensibilmente incrementati pari a € 1.211.170,29. Gli indicatori esposti nella tabella evidenziano il quadro dell'avanzamento finanziario.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	41.634.000,00	41.634.000,00	6.981.580,67	6.981.580,67	9.148,38	9.148,38
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	41.634.000,00	6.981.580,59	6.981.580,59	1.211.170,29	1.211.170,29
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	- 0,08	- 0,08	1.202.021,91	1.202.021,91
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,18	13.139,18
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	16,77%	16,77%	0,02%	0,02%	0,13%	0,13%
Situazione al 31.03.2003	16,77%	16,77%	2,91%	2,91%	17,35%	17,35%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda il programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001 (risorse stanziare pari € 10.982.886, iscritte nel bilancio regionale 2000-01), al 31.12.2002 si rileva che dei 55 corsi finanziati, destinati a un numero di allievi pari a 650, ne sono stati avviati 17 per un importo di € 6.981.580,67.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo dell'offerta formativa finalizzata alla formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo. Gli organismi che possono partecipare alla gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attività pregressa nell'ambito della formazione.

Il programma della Misura 2.4, relativo alla Scheda Progetto C – Area Cultura e Spettacolo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/16 del 24.07.2001, prevede l'erogazione di borse di studio per favorire azioni di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo nei seguenti settori:

- C1: specializzazione post-universitaria sulla gestione e sul management organizzativo dei beni e degli eventi culturali e dello spettacolo, a favore di laureati residenti in Sardegna da almeno quattro anni;

- C2: formazione di figure manageriali destinate alla gestione e direzione di biblioteche e mediateche, anche con strutturazioni complesse, a favore di laureati residenti in Sardegna da almeno quattro anni;
- C3: formazione di attori che preferibilmente operino in compagnie teatrali in attività, a favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni;
- C4: formazione di consulenti musicali in favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni.

Al 31.03.2003 sono pervenute 165 richieste di inserimento nel catalogo formativo, che peraltro è ancora in fase di completamento. La pubblicazione del nuovo bando è prevista successivamente alla predisposizione del suddetto catalogo.

In riferimento al programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001, si registra un avanzamento procedurale: al volgere del primo trimestre del 2003 risultano infatti avviati nel complesso 21 corsi, di cui 2 già conclusi.

Asse III – Risorse umane

Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Dott. Andrea Segundu**Telefono:** 070.606 5538**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 31.03.2003, la Misura 3.1 registra un significativo incremento finanziario rispetto al III trimestre del 2002. Tuttavia, considerati i modesti valori assunti dalla capacità di impegno (11,32%) e soprattutto dalla capacità di spesa (0,38), la *performance* della Misura appare non ancora soddisfacente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	85.173.000,00	85.173.000,00	2.572.661,86	2.572.661,86	206.446,80	206.446,80
Situazione al 31.03.2003	85.173.000,00	85.173.000,00	9.643.376,48	9.643.376,48	322.937,08	322.937,08
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	7.070.714,62	7.070.714,62	116.490,28	116.490,28
Incremento %*	0,00	0,00	274,84	274,84	56,43	56,43
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	3,02%	3,02%	0,24%	0,24%	8,02%	8,02%
Situazione al 31.03.2003	11,32%	11,32%	0,38%	0,38%	3,35%	3,35%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

La Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione dei servizi per l'impiego, mentre sono in fase di completamento gli studi e le rilevazioni necessarie per la definizione delle modalità organizzative. Al 31.12.2002 sono state recepite le osservazioni delle parti sociali in sede di tavolo di concertazione, tuttavia la Giunta non ha ancora provveduto all'approvazione del Disegno di legge di Riforma dei servizi per l'impiego. Tale atto dovrà successivamente essere inoltrato al Consiglio regionale per l'approvazione con procedura d'urgenza.

L'avanzamento procedurale della Misura è da ascrivere a due dei tre servizi affidati con bandi di gara a procedura aperta del 18.10.2001.

Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio (importo bando €2.582.284,5)

In seguito all'aggiudicazione del servizio con Determinazione n. 363 dell'08.03.2002, si è provveduto alla stipula della convenzione nel mese di aprile scorso per un importo pari € 2.064.468,28. La conclusione del servizio ha avuto luogo nel mese di dicembre del 2002.

Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l'impiego (importo bando €774.685,35)

In data 18.12.2002 si sono conclusi i lavori relativi al “Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l’impiego”.

Lo studio costituisce il supporto scientifico per tutta la riorganizzazione del sistema pubblico per l’impiego.

Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL) (importo bando €7.366.741,21)

Si precisa che, sebbene sia stata pubblicata la graduatoria e aggiudicato il servizio con Determinazione dirigenziale n. 1985 del 09.07.2002, al 31.12.2002 la convenzione non è stata stipulata a causa di un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Deliberazione n. 4/1 del 31.01.2003 la Giunta regionale ha approvato il DDL di Riforma dei servizi per l’impiego, si è in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, che avrà luogo presumibilmente entro il mese di Giugno 2003.

In riferimento ai *centri di servizio per l’impiego* si precisa che la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le 4 Province e l’Assessorato del Lavoro per l’organizzazione di alcuni servizi innovativi e sperimentali (a partire dai 15 Comuni sedi di ex SCICA che hanno completato la ristrutturazione dei locali destinati a ospitare i centri per l’impiego) avrà luogo entro il mese di aprile del 2003.

Per quanto riguarda il bando “Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)”, è stata stipulata la convenzione di affidamento del servizio resa esecutiva con la determinazione n. 397 del 27.02.2003.

Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Prosegue il *trend* di crescita della capacità di utilizzo che al 31.03.2003 fa registrare un ulteriore incremento passando dal 63,33 al 74%. A fronte di impegni pari a € 28.360.031,05 e a pagamenti per €20.999.477,62, sia la capacità di impegno che quella di spesa sono incrementate di circa 10 punti percentuali, passando rispettivamente da quasi 48 a 59% e da 30,29 a 43,67%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	48.085.000,00	48.085.000,00	22.997.968,92	22.997.968,92	14.565.740,71	14.565.740,71
Situazione al 31.03.2003	48.085.000,00	48.085.000,00	28.360.031,05	28.360.031,05	20.999.477,62	20.999.477,62
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	5.362.062,13	5.362.062,13	6.433.736,91	6.433.736,91
Incremento %*	0,00	0,00	23,32	23,32	44,17	44,17
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	47,83%	47,83%	30,29%	30,29%	63,33%	63,33%
Situazione al 31.03.2003	58,98%	58,98%	43,67%	43,67%	74,05%	74,05%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Circa l'80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla *linea d'azione C*) "Carlo Magno" che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L. 144/99. Al 31.12.2002 si sono concluse le attività formative del secondo programma di interventi (annualità 2001/02), riservato ai giovani della classe 1985 e 1986, ai sensi del DPR n. 257 del 12.07.2000, art. 2, punto b), che ha comportato un finanziamento a carico del POR di €34.790.499,26.

Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001 sulla formazione finalizzata all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata (PIA, Contratti d'Area, Patti territoriali per l'occupazione, ecc.) – graduatoria approvata il 19.06.2002 (DG n. 1731) – nel mese di dicembre del 2002 si sono conclusi i 4 corsi finanziati, rivolti nel complesso a 65 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del primo trimestre dell'anno, ha avuto termine la programmazione dell'attività inerente l'annualità 2002-03, rivolta ai giovani nati nel 1987, nel 1986 e nel 1985. Oggetto della programmazione è stata la definizione delle qualifiche professionali acquisibili con la frequenza di corsi biennali. Al 31.03.2003, risulta avviato un corso di formazione la cui conclusione è prevista nel mese di giugno del 2003.

Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura presenta impegni in *overbooking* pari a €38.594.081,10 e un accresciuto ammontare di pagamenti pari a €25.203.763,51. La capacità di impegno si conferma superiore al 100%, ma lievemente inferiore rispetto al semestre precedente: infatti, tra il 30.09.2002 e il 31.12.2002, si è dovuto disimpegnare parte delle risorse allocate nel corso del terzo trimestre del 2002, per la riscontrata difficoltà di attuazione da parte dei beneficiari di alcuni progetti formativi. La capacità di spesa sfiora il 70% e quella di utilizzo – a fronte del sovraimpegno – è pari al 65,30%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	36.089.000,00	36.089.000,00	40.395.714,77	40.395.714,77	22.150.850,81	22.150.850,81
Situazione al 31.03.2003	36.089.000,00	36.089.000,00	38.594.081,10	38.594.081,10	25.203.763,51	25.203.763,51
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	- 1.801.633,67	- 1.801.633,67	3.052.912,70	3.052.912,70
Incremento %*	0,00	0,00	-4,46	-4,46	13,78	13,78
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>e/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	111,93%	111,93%	61,38%	61,38%	54,83%	54,83%
Situazione al 31.03.2003	106,94%	106,94%	69,84%	69,84%	65,30%	65,30%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L'avanzamento procedurale della Misura è prevalentemente da ascrivere a interventi formativi che si articolano in due linee d'azione:

- *Linea A*, relativa agli *interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all'assunzione da parte delle aziende partecipanti*;
- *Linea B*, relativa agli *interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di assunzione da parte delle aziende partecipanti*.

Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001, relativo a interventi integrati di formazione professionale, orientamento, assistenza e consulenza, alternanza formazione/lavoro, destinati all'inserimento di giovani, disoccupati da almeno sei mesi, e adulti, disoccupati da almeno dodici mesi, nelle aziende coinvolte nella programmazione negoziata, si precisa che al 31.12.2002, dei 50 corsi ammessi al beneficio comunitario con determinazione n. 1694/DG, destinati a un numero complessivo di allievi pari a 710, ne risultano avviati 17.

Aggiornamento al 31.03.2003

Si rileva un avanzamento procedurale determinato dagli interventi formativi delle Linee A e B. Più precisamente, si sono conclusi i 134 corsi della Linea A, mentre dei 24 corsi avviati con la Linea B ne risultano conclusi 22.

Per quanto attiene alle attività formative messe a bando il 09.09.2001, al 31.03.2003 risultano avviati 40 corsi fra quelli finanziati.

Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu

Telefono: 070.606 5538

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data del presente *Rapporto*, la Misura presenta significativi valori di impegno, pari a € 8.693.998,67. Si precisa che gli impegni assunti si riferiscono per €4.233.661,14 ad affidamenti di attività formative finalizzate all'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati; per €245.216,42 alla convenzione stipulata per l'affidamento della redazione del "Piano di comunicazione sui temi dell'inclusione sociale"; per €4.215.121,12 ad affidamenti di incarichi per l'istituzione di "Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

Ancora poco soddisfacenti appaiono sia la capacità di spesa che quella di utilizzo, che a fronte di un *budget* disponibile di €28.160.000,00 risultano rispettivamente pari a 1,05% e a 3,39%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	28.160.000,00	28.160.000,00	4.478.877,56	4.478.877,56	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	28.160.000,00	28.160.000,00	8.693.998,67	8.693.998,67	294.413,24	294.413,24
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	4.215.121,11	4.215.121,11	294.413,24	294.413,24
Incremento %*	0,00	0,00	94,11	94,11	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	15,91%	15,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	30,87%	30,87%	1,05%	1,05%	3,39%	3,39%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001, al volgere del 2002, la ditta aggiudicataria del servizio ha presentato il "*Piano di comunicazione territoriale sui temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati*". Si tratta di un progetto tramite il quale l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale intende realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione denominata "Un vantaggio per tutti" nell'ambito degli interventi previsti dalla Misura 3.4 del POR 2000-2006. La campagna, della durata di circa un anno, ha lo scopo di coinvolgere operatori pubblici e privati, cittadini e imprenditori nel processo di attuazione della normativa che fornisce gli strumenti per combattere l'esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati.

In riferimento al bando di gara del 18.10.2001 per la realizzazione dei "Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", nel mese di novembre del 2002 si è provveduto alla pubblicazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione del servizio.

Per quanto attiene agli interventi formativi della Misura diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati, messe a bando in data 09.09.2001, al 31.12.2002 sono stati avviati 7 corsi dei 38 ammessi al beneficio comunitario destinati nel complesso a 505 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

Si rileva un avanzamento procedurale del bando per la realizzazione dei “Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Tra il mese di gennaio e il mese di febbraio del 2003 sono state stipulate convenzioni con 34 comuni.

Nel corso del primo trimestre del 2003, anche le attività formative della Misura fanno registrare un avanzamento grazie all’avvio di 20 nuovi corsi.

Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Si rileva un lieve avanzamento dei pagamenti che si attestano a €26.445,40, con un'incidenza dello 0,11% rispetto al costo programmato. Rimane invariato l'ammontare degli impegni.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	23.000.000,00	23.000.000,00	4.260.252,96	4.260.252,96	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	23.000.000,00	23.000.000,00	4.260.252,96	4.260.252,96	26.445,40	26.445,40
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,40	26.445,40
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	18,52%	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	18,52%	18,52%	0,11%	0,11%	0,62%	0,62%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto attiene al bando "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione" pubblicato il 09.09.2001 (graduatorie pubblicate il 17.07.2002), si rileva che nel mese di ottobre del 2002 si sono concluse le procedure di affidamento ai soggetti attuatori. Nel complesso sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti che prevedono la realizzazione di azioni di studio e di monitoraggio. Considerata la complessità dei programmi finanziati, è ragionevole prevederne la conclusione non prima del 2004.

Aggiornamento al 31.03.2003

In conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003, resa esecutiva dalla Determinazione n. 487 dell'11.03.2003 del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, il 16.03.2003 è stato pubblicato un avviso con il quale si comunicano le modalità e i termini per la presentazione della domanda di accreditamento da parte degli organismi, pubblici o privati, che intendono svolgere attività di formazione professionale nel rispetto della programmazione regionale, comunque finanziata, e la cui finalità è il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, anche per quanto attiene alle qualifiche professionali necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro.

Le modalità di selezione prevedono l'utilizzo di un supporto informatico che dovrà essere compilato *on line* dai candidati. Al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni trasmesse, si prevede di effettuare visite ispettive presso gli organismi che hanno richiesto l'accredimento.

L'accreditamento è rilasciato dall'Assessorato del Lavoro per una o più sedi formative di organismi pubblici o privati, in riferimento alle macrotipologie formative successivamente definite e in relazione a una o più aree professionali della classificazione assessoriale:

- A) formazione per l'obbligo formativo
 - interventi previsti dalla L. 144/99 art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
- B) formazione *post* età dell'obbligo e formazione superiore
 - interventi formativi *post* obbligo, *post* diploma e *post* laurea;
 - formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
 - percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
 - formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea;
 - alta formazione *post* laurea;
 - corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate;
- C) formazione continua e permanente
 - destinata a persone occupate;
 - destinate a persone in CIG;
 - destinate a persone in mobilità.

La scadenza originariamente prevista per il 13.06.2003 è stata prorogata al 25.06.2003; infatti, problemi di ordine tecnico legati al funzionamento del sito per l'accreditamento hanno causato un notevole ritardo nell'invio delle *password* di accesso al sito agli enti, che hanno presentato domanda per accreditarsi.

Si rileva un avanzamento dell'*iter* attuativo del bando pubblicato il 09.09.2001 legato all'avvio dei 3 progetti ammessi al beneficio comunitario.

Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 3.6, a fronte di un costo programmato di €21.000.000,00 registra un significativo miglioramento nella capacità di impegno che al 31.03.2003 sfiora il 39%, con un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto al precedente semestre. L'ammontare degli impegni registrati si riferisce per €5.540.000,00 ai progetti presentati sul nuovo bando pubblicato nel 2001. Sostanzialmente invariata la capacità di spesa (12%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	21.000.000,00	21.000.000,00	2.504.076,78	2.504.076,78	2.504.076,78	2.504.076,78
Situazione al 31.03.2003	21.000.000,00	21.000.000,00	8.149.958,96	8.149.958,96	2.542.964,86	2.542.964,86
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	5.645.882,18	5.645.882,18	38.888,08	38.888,08
Incremento %*	0,00	0,00	225,47	225,47	1,55	1,55
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	100,00%	100,00%
Situazione al 31.03.2003	38,81%	38,81%	12,11%	12,11%	31,20%	31,20%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda l'avviso pubblico dell'8.10.2001 per la presentazione dei progetti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei *drop-out*, al 31.12.2002 le attività corsuali approvate con Deliberazione n. 18/27 del 17.07.2002 risultano iniziate solo in parte e con notevole ritardo.

Aggiornamento al 31.03.2003

Non si segnala alcuna novità rilevante nell'iter attuativo della Misura.

Nel corso del primo trimestre dell'anno sono stati impegnati gli importi relativi ai progetti presentati sul citato bando dell'8.10.2001 e ammessi al beneficio comunitario. La completa attivazione dei corsi è prevista tra il mese di giugno e di settembre del 2003.

Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna

Telefono: 070.606 4915

E mail: sannaant@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, l'avanzamento finanziario della Misura rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scorso semestre. La tabella evidenzia un decremento degli impegni a causa di un'errata imputazione dei dati di attuazione.

Significativo appare il tasso di utilizzo che da valori nulli del precedente semestre si attesta al 51,70%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	20.481.000,00	20.481.000,00	13.180.165,96	13.180.165,96	6.683.442,95	6.683.442,95
Situazione al 31.03.2003	20.481.000,00	20.481.000,00	12.950.050,60	12.950.050,60	6.694.714,99	6.694.714,99
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	- 230.115,36	- 230.115,36	11.272,04	11.272,04
Incremento %*	0,00	0,00	-1,75	-1,75	0,17	0,17
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	64,35%	64,35%	32,63%	32,63%	50,71%	50,71%
Situazione al 31.03.2003	63,23%	63,23%	32,69%	32,69%	51,70%	51,70%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L'attivazione della Misura è avvenuta con la pubblicazione del bando del 18.05.2001 (scadenza 18.06.2001) a seguito del quale sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi POR e i rimanenti con fondi del Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Si tratta di corsi avviati nel mese di aprile 2002 di durata biennale la cui conclusione è, pertanto, prevista alla fine del mese di aprile 2004, ad eccezione di due corsi che si concluderanno nel mese di maggio del 2003.

Con la Deliberazione n. 39/57 del 10.12.2002 la Giunta regionale ha approvato il bando (con il Piano delle macroaree e dei relativi professionali) relativo alla presentazione dei progetti IFTS per il biennio 2002-2003. Con tale atto viene disposto che la spesa complessiva prevista è di € 10.264.800,00, di cui € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MUIR) – che verranno accreditati, tramite la Direzione Scolastica Regionale, direttamente alle scuole – ed € 7.450.000,00 a carico dei fondi POR 2000-2006. La Giunta ha autorizzato l'impegno dei fondi regionali sui pertinenti capitoli di bilancio regionale, come segue:

- € 2.802.000,00 sul bilancio regionale 2002, UPB S11.040 capitolo 11171-00 (e 420.000,00) e 11172-00 (€ 2.382.000,00);
- € 4.648.000,00 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale 2003.

Il bando con i relativi allegati è stato pubblicato il 28.12.2002 sul Supplemento Straordinario del BURAS n. 28 e sul sito della Regione Sardegna.

Aggiornamento al 31.03.2003

In risposta al citato bando del 28.12.2002, nel corso del primo trimestre dell'anno 2003 sono stati presentati 147 progetti, di cui 50 finanziabili (compresi quelli ministeriali). Con Decreto Assessoriale n. 900 del 26.03.2003, è stata nominata la commissione di valutazione. La fine della fase di valutazione dei progetti è prevista per il mese di maggio del 2003 con la susseguente pubblicazione della graduatoria suddivisa per province. L'avvio dei corsi avrà presumibilmente luogo nel mese di settembre del 2003.

Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Come si evince dalla tabella, sebbene al 31.03.2003 si registri un considerevole avanzamento nei pagamenti, gli indicatori finanziari assumono valori poco apprezzabili. In particolare, ben distanti da livelli soddisfacenti appaiono sia la capacità di spesa pari all'1,56% che la capacità di utilizzo delle risorse disponibili che si attesta all'11,46%.

Si segnala una differenza, pari a € 272.723,32, tra l'ammontare degli impegni rilevati dal monitoraggio finanziario al 30.09.2002 e quello al 31.03.2003, dovuta a un mero errore materiale.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	35.004.000,00	35.004.000,00	5.043.947,03	5.043.947,03	7.873,80	7.873,80
Situazione al 31.03.2003	35.004.000,00	35.004.000,00	4.771.223,71	4.771.223,71	546.951,70	546.951,70
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	- 272.723,32	- 272.723,32	539.077,90	539.077,90
Incremento %*	0,00	0,00	-5,41	-5,41	6.846,48	6.846,48
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	14,41%	14,41%	0,02%	0,02%	0,16%	0,16%
Situazione al 31.03.2003	13,63%	13,63%	1,56%	1,56%	11,46%	11,46%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, quattro linee d'intervento: "Diogene", "Vulcano", "Diana" ed "Ellade".

Diogene

Rispetto al 30.09.2002, non si rileva alcun avanzamento procedurale delle linea d'intervento.

Diana

Si registrano progressi nell'iter attuativo del bando pubblicato in data 11.11.2001, relativo alla Scheda progetto B (scadenza 12.12.2001), con il quale è stata attivata la linea d'azione. Al 31.12.2002, successivamente all'approvazione della graduatoria finale con Determinazione n. 1730/D.G. il 19.06.2002 e a seguito degli affidamenti effettuati, sono stati avviati 9 corsi dei 31 finanziati (destinati complessivamente a circa 440 allievi).

Ellade

Al 31.12.2002 la linea di intervento non è stata ancora attivata.

Aggiornamento al 31.03.2003

Vulcano

In data 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa” finalizzata alla formazione permanente individualizzata di lavoratori. Gli organismi formativi che possono partecipare alla gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attività pregressa nell’ambito della formazione.

Il programma previsto dalla Misura 3.8, Scheda Progetto A – Formazione permanente individualizzata /Progetto Vulcano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/24 del 4.10.2001, prevede l’erogazione di assegni di studio (*voucher*) finalizzati alla partecipazione a interventi di aggiornamento professionale a favore di residenti in Sardegna da almeno tre anni, con particolare riferimento alle esigenze della popolazione femminile, occupati presso le imprese, la cui professionalità è a rischio di obsolescenza.

Al 31.03.2003 risultano presentate 361 proposte, mentre è ancora in fase di predisposizione l’istituendo “Catalogo dell’offerta formativa”.

Diana

Per quanto riguarda gli interventi formativi messi a bando l’11.11.2001, alla data del presente *Rapporto* risultano avviati complessivamente 18 corsi dei 31 finanziati.

Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'avanzamento finanziario della Misura 3.9 permane al di sotto delle effettive potenzialità, considerati i valori assunti dagli indicatori esposti in tabella. A fronte di impegni di ammontare invariato rispetto al precedente semestre, si rileva l'avvio delle attività legate all'erogazione delle risorse che denotano una capacità di spesa pari allo 0,28% del costo programmato e una capacità di utilizzo delle risorse impegnate pari all'1,01%; si tratta, quindi, di valori alquanto modesti, lontani da livelli soddisfacenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	28.437.000,00	28.437.000,00	7.933.773,00	7.933.773,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	28.437.000,00	28.437.000,00	7.933.773,00	7.933.773,00	79.893,75	79.893,75
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.893,75	79.893,75
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	27,90%	27,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	27,90%	27,90%	0,28%	0,28%	1,01%	1,01%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Al 31.12.2002 non si rileva alcun avanzamento procedurale del bando del 23.09.2001, per il quale, con Deliberazione n. 25/10 del 24.07.2001, la Giunta Regionale ha stanziato la somma di €8.921.302 destinata alla formazione di personale con qualifica "quadri e dirigenti". Infatti, non risulta avviato nessuno dei 686 corsi ammessi al beneficio comunitario e destinati a 12.272 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 23.02.2003 è stato pubblicato un avviso con il quale l'Assessore del Lavoro, al fine di procedere all'individuazione degli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti Locali, ha inteso promuovere un'azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all'interno delle proprie strutture amministrative, un'analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. Al 31.03.2003 non si è ancora completata la fase di acquisizione delle proposte dei Comuni: a causa di difficoltà operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la formulazione delle rispettive richieste.

Al fine di meglio individuare i fabbisogni, l'Amministrazione regionale sta provvedendo all'elaborazione di un *software* che consenta un'aggregazione più agevole delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute. Successivamente all'individuazione dei fabbisogni formativi dei Comuni minori, si prevede di realizzare un'azione mirata verso i Comuni maggiori e le Province che ancora non hanno risposto all'invito formulato.

Relativamente al bando del 23.09.2001, si segnala l'avvio di 5 interventi formativi.

Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu

Telefono: 070.606 5538

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un *budget* disponibile per la realizzazione della Misura pari a €62.353.000,00, si rileva un consistente incremento dell'ammontare delle risorse impegnate nel corso del semestre che attestano una capacità di impegno pari al 37,52% del costo programmato. Si precisa che gli impegni assunti si riferiscono per €6.952.944,09 agli interventi formativi contemplati dalla Misura, per €242.812,21 all'affidamento dell'incarico per la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura e, infine per €16.198.154,26 all'affidamento del servizio di attività istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese. Poco soddisfacente l'ammontare dei pagamenti che al 31.03.2003 determinano una capacità di spesa e di utilizzo rispettivamente pari allo 0,70 e all'1,85%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	62.353.000,00	62.353.000,00	7.195.756,30	7.195.756,30	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	62.353.000,00	62.353.000,00	23.393.910,56	23.393.910,56	433.761,60	433.761,60
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	16.198.154,26	16.198.154,26	433.761,60	433.761,60
Incremento %*	0,00	0,00	225,11	225,11	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	11,54%	11,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	37,52%	37,52%	0,70%	0,70%	1,85%	1,85%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell'assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente: in altri termini i cosiddetti "nuovi bacini d'impiego".

Al 31.12.2002, dei bandi pubblicati nel corso del 2001, quello relativo all'affidamento dell' "Attività istruttoria e valutazione per l'erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d'impiego" fa registrare progressi attuativi. Più precisamente, in data 12.11.2002 è stata conferita esecutività alla convenzione stipulata nel mese di ottobre del 2002 con la Banca di Sassari. Sono stati conseguentemente effettuati impegni di spesa per €16.198.154,18.

Per quanto concerne il bando relativo alla "Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego", pubblicato il 09.09.2001, la conclusione della procedura per l'affidamento delle attività formative è avvenuta nel mese di ottobre 2002. Al 31.12.2002, dei 111 corsi di

formazione ammessi a finanziamento e destinati a 5.728 allievi, ne risulta avviato unicamente uno.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del primo trimestre del 2003 ha avuto luogo un avanzamento dell'*ter* del bando “Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10” finalizzato alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego, pubblicato il 18.10.2001. Sono state, infatti, presentate da parte delle società aggiudicatrici le seguenti ricerche:

- “Opportunità di *business* nel campo delle forniture di servizi innovativi basati sulle nuove tecnologie” - Progetto presentato il 10.02.2003 da parte di *Databank spa*;
- “Le opportunità in Sardegna per la creazione ed il consolidamento di imprenditorialità nei nuovi bacini d’impiego” - Progetto presentato il 04.03.2003 da parte di *Scenari srl*;

Al 31.03.2003 risultano non ancora completate le seguenti ricerche:

- “L’offerta turistica delle aree interne della provincia di Cagliari rapportata alla domanda internazionale di turismo sostenibile” - *Centro Servizi promozionali per le imprese (Cagliari)*;
- “Normative, strumenti e buone prassi per l’imprenditoria nei nuovi bacini d’impiego”, Det. N. 356/LAV. - *Iskom Consulting srl*;
- “Limiti, potenzialità e prospettive di sviluppo del sistema imprenditoriale nella gestione dei servizi minori”, Det. N. 358/LAV. - *Ad Vertere srl*.

Si presume che verranno presentate entro il mese di aprile del 2003.

Alla fine del primo trimestre 2003, risultano avviati 21 dei 111 corsi finanziati con il bando, finalizzato alla realizzazione di attività formative inerenti la Misura, pubblicato il 09.09.2001.

Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu

Telefono: 070.606 5538

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 3.11 registra un contenuto avanzamento finanziario rispetto al precedente semestre: a fronte di un costo programmato di € 43.086.000,00, gli impegni rimangono invariati mentre i pagamenti da valori nulli passano a € 114.944,60. I valori assunti dagli indicatori finanziari esposti in tabella rivelano una situazione nel complesso modesta e poco soddisfacente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	43.086.000,00	43.086.000,00	6.773.365,28	6.773.365,28	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	43.086.000,00	43.086.000,00	6.773.365,28	6.773.365,28	114.944,60	114.944,60
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 0,00	100,00
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	15,72%	15,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	15,72%	15,72%	0,27%	0,27%	1,70%	1,70%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L'avanzamento procedurale della Misura è determinato dai due bandi pubblicati il 18.10.2001.

Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili

Si è provveduto all'erogazione del primo stato di avanzamento lavori, con determinazione di pagamento n. 3643/LAV del 6.12.2002 in favore della ditta aggiudicataria del servizio e cioè dell'ATI composta dalla società Pragma snc e dalla ENCO srl.

Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile

Con delibera n. 34/43 del 29.10.2002 la Giunta regionale ha approvato una variazione compensativa che ha determinato un incremento dei fondi 2002 disponibili per la Misura di € 2.357.000. Tale incremento consentirà di raggiungere l'obiettivo prefissato e, cioè, la concessione di circa 400 prestiti d'onore ad altrettante donne disoccupate per la costituzione di ditte individuali.

Con determinazione n. 3746/LAV del 23.12.2002, sono state approvate le risultanze istruttorie relative alle prime 113 istanze di concessione di prestiti presentate; 70 sono risultate positive, 10 negative, 26 non procedibili, mentre 6 sono ancora in fase di definizione.

Al 31.12.2002 risultano complessivamente presentate 600 domande di finanziamento.

Per quanto riguarda gli *interventi formativi* (in materia di incentivi alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, normativa sul lavoro), al 31.12.2002 non si registra alcun avanzamento finanziario o procedurale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Non si segnalano novità rilevanti. Al 05.02.2003 risultano presentate complessivamente 675 richieste di finanziamento di cui 91 istruite positivamente.

Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, entro la fine del mese di aprile del 2003 si prevede di utilizzare in aggiunta alle risorse 2000-01, i fondi 2002 disponibili sull'UPB Lavoro, pari a €3.535.000. Allo stato attuale è in fase di elaborazione il bando di gara relativo agli interventi formativi con il quale verranno assegnate risorse per un ammontare complessivo di €4.548.436.

Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03 2003, su un costo totale programmato di €54.752.000,00, gli impegni risultano pari a € 15.340.925,69 e i pagamenti a € 7.832.966,90. A fronte di tali importi si registrano una capacità di impegno pari al 28%, di spesa superiori al 14% e di utilizzo pari al 51%.

L'avanzamento è da ascrivere anche alla cantierizzazione di alcuni progetti infrastrutturali per l'inclusione scolastica.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	54.752.000,00	54.752.000,00	6.041.554,06	6.041.554,06	2.592.203,07	2.592.203,07
Situazione al 31.03.2003	54.752.000,00	54.752.000,00	15.340.925,69	15.340.925,69	7.832.966,90	7.832.966,90
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	9.299.371,63	9.299.371,63	5.240.763,83	5.240.763,83
Incremento % *	0,00	0,00	153,92	153,92	202,17	202,17
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	11,03%	11,03%	4,73%	4,73%	42,91%	42,91%
Situazione al 31.03.2003	28,02%	28,02%	14,31%	14,31%	51,06%	51,06%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura 3.12, finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell'offerta di istruzione e al potenziamento dei servizi per l'impiego, mostra un avanzamento procedurale in relazione agli interventi di edilizia scolastica.


Con il primo bando PIT, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 15.12.2001, sono stati ammessi a finanziamento due progetti per un importo complessivo di €2.093.715,40.

Nel corso del 2002 si registra la pubblicazione sul BURAS n. 7 del 9.03.2002 della graduatoria dei progetti presentati dagli Enti locali sul bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica" per l'annualità 2001 (BURAS n. 30 dell'8.10.2001).

I progetti ammessi al finanziamento sono 43, per un importo complessivo di €10.109.643,81, così distribuiti:

- 26 progetti in provincia di Cagliari per un importo di €5.315.158,79;
- 7 progetti nella provincia di Nuoro, per un importo di €2.499.651,40;
- 5 progetti nella provincia di Sassari, per un finanziamento di €1.644.398,76;
- 5 progetti in provincia di Oristano per un importo pari a €650.434,86.

In data 17.06.2002 è stato disposto un unico provvedimento di delega per tutti i Beneficiari finali mentre si è cominciato ad appaltare i lavori a partire dal mese di ottobre. Sebbene tutti i lavori abbiano avuto inizio, il *gantt* di seguito riportato evidenzia un *iter* ancora in corso giacché non tutti i Beneficiari hanno provveduto a trasmettere i relativi contratti all'Assessorato competente. Si tratta pertanto di un ritardo puramente burocratico.

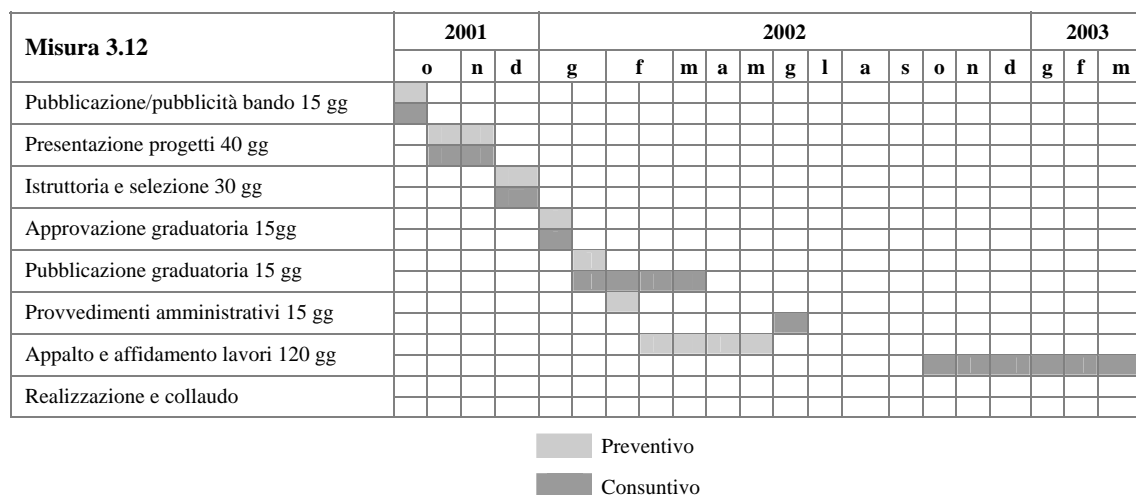

In accordo con quanto previsto nel CdP, i progetti di natura strettamente infrastrutturale devono essere accompagnati da un'azione di analisi conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica regionale, in raccordo con la messa a punto del sistema informativo statistico sulla scolarità, previsto nella Misura 3.6. Tale azione non è stata ancora avviata, in quanto si è in attesa della definizione dell'analogica Anagrafe nazionale, di cui l'Anagrafe regionale rappresenterà una sottoarticolazione. Tuttavia se ne prevede l'avvio entro l'anno in corso.

Da ultimo, per quanto riguarda l'invito ai Comuni e alle Province interessate a presentare proposte per la realizzazione di centri per l'impiego che subentrino alle attuali SCICA, nel 2002 sono state stipulate le convenzioni con 15 del 28 Comuni sede delle attuali SCICA e precisamente: Quartu Sant'Elena, Ales, Mogoro, Iglesias, Cuglieri, Tempio Pausania, Ozieri, Sorgono, Sanluri, Ghilarza, Sassari, Lanusei, Oristano, San Gavino Monreale, Muravera.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Determina n. 658 del 13.03.2003, il Direttore Servizio Pubblica Istruzione ha approvato il bando "Infrastrutture per l'edilizia scolastica – 2002-2004", pubblicato sul BURAS n. 9 del 25.03.2003. L'importo messo a bando è pari a €14.359.284,60, mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 24.05.2003.

Sono attualmente in fase di predisposizione delle lettere, da inviare entro giugno 2003 alle quattro Province, affinché si attivino nel sollecitare una risposta da parte dei 13 Comuni che non hanno trasmesso alcuna manifestazione di interesse a seguito dell'invito pubblicato nel 2002.

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.**Responsabile di Misura:** Dott. Gianfranco Montis**Telefono:** 070.606 4649**E mail:** gianfranco.montis@posta.regione.sardegna.it**L'attuazione finanziaria**

Alla data di riferimento, la capacità di impegno per mero errore materiale si contrae rispetto al semestre precedente, attestandosi a circa il 9% del costo totale programmato; la capacità di spesa passa invece dal 5,97% al 6,79% e la capacità di utilizzo dal 55,11% al 72,08% delle risorse impegnate.

In termini assoluti, al 31.03.2003, si registrano impegni per €7.733.700,88 e spese sostenute per €5.574.599,57, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	82.124.000,00	82.124.000,00	8.901.700,54	8.901.700,54	4.905.704,83	4.905.704,83
Situazione al 31.03.2003	82.124.000,00	82.124.000,00	7.733.700,88	7.733.700,88	5.574.599,57	5.574.599,57
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-1.167.999,66	-1.167.999,66	668.894,74	668.894,74
Incremento % *	0,00	0,00	-13,12	-13,12	13,64	13,64
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	10,84%	10,84%	5,97%	5,97%	55,11%	55,11%
Situazione al 31.03.2003	9,42%	9,42%	6,79%	6,79%	72,08%	72,08%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002**

La Misura prevede che la Regione definisca un *Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico* di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Dopo l'approvazione della prima versione del *Piano* da parte della Giunta regionale in data 28.12.2001 (Delibera n. 48/19), a giugno 2002 il MIUR trasmette le proprie valutazioni e indicazioni per la modifica e l'integrazione del *Piano*, a cui l'AdG nel luglio 2002 ha risposto con il *Piano* modificato. Il MIUR richiede ulteriori integrazioni per il completamento della procedura e per la piena operatività del *Piano*.

In relazione all'attività di animazione scientifica e tecnologica prevista dalla Misura, nel mese di settembre 2002 la Giunta regionale, al fine di assicurare maggiore operatività ed efficacia a tale azione, ne ha deliberato la delega al Consorzio 21, Ente regionale che opera sotto la vigilanza dell'Assessorato della Programmazione. L'Assessore regionale della Programmazione, a seguito della DGR n. 31/22 del 18.09.2002 con cui la Giunta regionale ha dato vita alla nuova configurazione del sistema delle partecipazioni del Consorzio 21, sta valutando l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all'affidamento del servizio nei confronti del Consorzio 21.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 25.02.2003 è stato approvato dalla Giunta regionale il *Piano regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico*. Il documento contiene alcune importanti novità frutto di un confronto costante tra la Regione e il Ministero della Ricerca Scientifica. L'obiettivo è quello di varare progetti operativi finalizzati alla creazione di un ambiente tecnologicamente avanzato, funzionale alle esigenze delle piccole e medie imprese della Sardegna e che consenta una integrazione più marcata fra il mondo della ricerca e quello della produzione. Tra i punti qualificanti vi è inoltre la definizione di un Fondo di garanzia per le imprese che investono nella ricerca, l'erogazione di contributi *ad hoc* e la formazione manageriale dei ricercatori.

È in fase di predisposizione un invito a presentare proposte di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, per aiuti da erogare nei limiti del "*de minimis*".

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure di seguito descritte, Società di servizi.**Responsabile di Misura** (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta**Telefono:** 070.606 2125**E mail:** industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it**Responsabile di Misura** (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu**Telefono:** 070.606 2493**E mail:** industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it**Responsabile di Misura** (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna**Telefono:** 070.606 4339**E mail:** turismo@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Nonostante il rallentamento della spesa rispetto al semestre precedente (la percentuale di incremento scende dal 218% registrato al 30.09.2002 all'attuale 47%), al 31.03.2003 per la Misura 4.1 si registra un avanzamento che fa presagire l'esaurimento delle risorse pubbliche stanziare in tempi più brevi rispetto durata del Programma. I pagamenti a valere sulla quota pubblica si attestano infatti su un valore assoluto pari a €115.581.673,70, assorbendo pertanto circa il 74% dello stanziamento. Viceversa, la contrazione del dato di impegno è imputabile alla revoca di alcuni progetti finanziati dall'Assessorato dell'Industria. In ragione dell'*overbooking* la capacità di utilizzo delle risorse allocate (erogazioni/impegni) si attesta su percentuali più modeste rispetto alla capacità di spesa.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	314.022.000,00	157.011.000,00	178.015.033,60	178.015.033,60	111.223.033,61	111.223.033,61
Situazione al 31.03.2003	314.022.000,00	157.011.000,00	356.597.983,38	173.052.280,17	163.544.699,28	115.581.673,70
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	178.582.949,78	- 4.962.753,43	52.321.665,67	4.358.640,09
Incremento %*	0,00	0,00	100,32	-2,79	47,04	3,92
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	56,69%	113,38%	35,42%	70,84%	62,48%	62,48%
Situazione al 31.03.2003	113,56%	110,22%	52,08%	73,61%	45,86%	66,79%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

L'avvio della Misura 4.1 è stato determinato dalla linea di azione C) “Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento” condivisa fra l'Assessorato all'Industria e l'Assessorato al Turismo e Artigianato. Per la parte di competenza

dell'Assessorato dell'Industria, normativa di riferimento è la LR 15/94 che regola gli incentivi in conto capitale e interessi alle PMI industriali; tale legge rimanda sotto il profilo procedurale alle prescrizioni dettate dall'art. 30 della LR 17/93 e alla L. 488/92. In conformità alla scheda di misura del CdP e alle suddette disposizioni normative, sono stati pubblicati due bandi annuali (2000 e 2001). Gli 87 progetti presentati a bando del 1999 sono stati ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del POR in quanto coerenti con le finalità della Misura e con gli obiettivi del QCS, per un ammontare complessivo di agevolazioni concedibili pari a €35.094.056,10.

Il bando 2000 è stato pubblicato sul BURAS n. 16 del 19.05.2000 e la relativa graduatoria sul BURAS n. 7 del 1.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a € 50.161.978,58 distribuito sul territorio regionale come segue:

- 42 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a €11.926.974,49;
- 54 progetti in provincia di Sassari, per un importo di €18.514.003,84;
- 32 progetti in provincia di Nuoro, per ammontare pari a €16.162.834,56;
- 11 progetti in provincia di Oristano, per agevolazioni complessive di €3.558.165,69.

Il bando 2001 (pubblicato sul BURAS n. 25 Supplemento Straordinario n. 27 dell'8.09.2001), che poneva quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 28.02.2002, è rimasto sospeso per 13 mesi nelle more della stipula delle convenzioni con gli Istituti di credito deputati all'erogazione delle agevolazioni. A seguito della stipula di tali convenzioni (17.10.2002), nella metà di ottobre ha avuto inizio la fase istruttoria delle proposte che alla fine del 2002 risulta ancora in corso. Si prevede che nel mese di maggio gli Istituti avranno concluso la fase istruttoria e il servizio dell'Assessorato potrà procedere alla predisposizione della graduatoria entro i trenta giorni previsti dalle direttive.

Alla buona *performance* della linea di azione C, hanno contribuito anche i progetti presentati ai sensi della LR 51/93, di competenza dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, che a tutto il 2002 può stimare un numero di provvedimenti di concessione a "sportello" per circa 4000 istanze.

Rispetto alle altre azioni in cui si articola la Misura si registra quanto segue.

Per le linee d'azione A) "*Animazione economica*" e B) "*Servizi reali per le PMI*" in data 23.12.2002 con nota n. 3257, è stata inviata da parte dell'Assessore dell'Industria, una proposta di deliberazione contenente le Direttive e i criteri per l'attuazione delle due linee d'azione. La proposta in particolare prevedeva in riferimento all'art. 6, comma 1, lett. e della LR 7/2002 che "qualora le azioni non siano affidate ad Agenzie Governative o svolte direttamente, i soggetti beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica", per appalto concorso. Tale proposta di delibera, corredata dalle relative direttive di attuazione, non ha al momento ottenuto un atto di approvazione da parte della Giunta. Nel frattempo l'AdG, nel tentativo di dare attuazione alle linee di azione, richiamando quanto proposto nella scheda di misura del CdP, ha suggerito all'Assessorato dell'Industria di procedere all'elaborazione e redazione di un Piano organico comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti, quale preconditione per l'affidamento diretto degli incarichi. Al momento il Piano attende un parere di coerenza da parte dell'AdG, prima di essere portato in Giunta.

Si è tuttora in attesa della soluzione delle problematiche connesse all'individuazione del soggetto attuatore (Agenzie governative).

Per le linee d'azione D) "*Fondi per la capitalizzazione delle PMI*" ed E) "*Prestiti partecipativi alle PMI*" tra maggio e luglio 2002 è stata trasmessa alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione la bozza del testo delle Direttive di attuazione.

Relativamente alla linea di azione D), è intercorsa una fitta interlocuzione tra l'Assessorato all'Industria e la Commissione Europea in ordine al contenuto delle sopra citate direttive. Nel corso di tale interlocuzione il testo è stato più volte aggiornato tenendo conto delle osservazioni di volta in volta formulate dalla CE. In particolare, il regime ha trovato una sua più definita configurazione nell'ambito del documento comunitario sul capitale di rischio.

Alla linea d'azione F) "*Fondi garanzia*" si è inteso dare attuazione con LR 2/2001 e relative Direttive di attuazione, notificate alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione in data 18.09.2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione e considerate le difficoltà per l'autorizzazione del regime di aiuto, previo suggerimento della stessa Commissione la notifica del regime è stata ritirata nel mese di settembre 2002.

Per la linea d'azione G) "*Sportelli Unici per le imprese*", al momento non attivata, è ipotizzabile una modifica nell'ambito della scheda di Misura del CdP, volta alla trasformazione della dicitura "Sportello Unico" in "Sportello Unico Virtuale" nel tentativo di rispondere alle esigenze dei singoli Comuni presenti sul territorio regionale che nel frattempo hanno comunque attivato forme tradizionali di sportello da mettere in rete. Anche per l'attuazione di questa linea di azione si rimanda all'approvazione da parte della Giunta del Piano organico e alla relativa individuazione del soggetto attuatore, nonostante la scheda di Misura non preveda che tale azione sia ricompresa nel piano stesso.

Aggiornamento al 31.03.2003

La conclusione della fase istruttoria relativa alle proposte presentate a seguito del bando 2001 per la linea di azione C) "*Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento*", parte Industria LR 15/94, è prevista per la metà di maggio con conseguente pubblicazione della graduatoria sul BURAS nei successivi dieci giorni. Sempre per questa linea d'azione è prevista la pubblicazione di un terzo bando LR 15/94 entro il secondo semestre 2003.

Per la linea d'azione D) "*Fondi per la capitalizzazione delle PMI*" in data 28.03.2003, tramite la Presidenza della Giunta, è stato inviato alla CE un ulteriore testo di Direttive di attuazione che tenesse conto del documento comunitario sul capitale di rischio. Tale progetto di direttive ha eliminato ogni riferimento al Reg. CE 70/2001, ritenuto non pertinente per la tipologia di aiuto. Infatti, per il capitale di rischio risulta complesso calcolare "l'equivalente sovvenzione" e stabilire un legame preciso con i costi ammissibili. Coerentemente al punto 8 del documento della Commissione denominato "Comunicazione su Aiuti di stato e capitale di rischio" gli interventi di cui al progetto ultimo inviato dall'Amministrazione, saranno rivolti alle sole PMI per un importo non superiore a 500.000,00 Euro. Tutte le partecipazioni saranno orientate alla realizzazione di un profitto e verrà stabilito un legame tra l'investimento e la remunerazione dei Responsabili delle decisioni di investimento. Su tale ultimo progetto l'Amministrazione attende una decisione da parte della CE.

Anche per la linea di azione E) "*Prestiti partecipativi alle PMI*" si è avuta una lunga e complessa interlocuzione con la Commissione, sempre sulla base di una direttiva di attuazione presentata dall'Assessorato all'Industria. In risposta alle osservazioni della CE in data 5.02.2003, l'Amministrazione sta elaborando una ulteriore versione – da inviare, a seguito di richiesta di proroga, entro la prima decade di aprile – che tenga conto delle osservazioni formulate dalla CE e riconduca l'azione in argomento nell'ambito delle disposizioni fondamentali del Reg. CE 70/2001. Gli interventi ammissibili riguarderanno esclusivamente investimenti in capitale fisso relativi alla costruzione di un nuovo impianto produttivo o

l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione di uno stabilimento esistente. L'intensità massima del finanziamento prevista sarà pari al 50% delle spese ammissibili. L'aiuto non potrà superare l'intensità espressa in ESN (equivalente sovvenzione netto) e ESL (equivalente sovvenzione lordo), prevista dalla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-06.

Nel caso la Commissione Europea non dovesse autorizzare il regime di aiuto verrà comunque data attuazione alle azioni mediante l'applicazione del regime "*de minimis*". Pertanto con l'ultimo CdP notificato è stato previsto il regime di aiuto suddetto.

È già stata predisposta inoltre una bozza del bando di gara per la selezione delle banche e/o società finanziarie cui verrà affidata la gestione del Fondo, da adeguare al testo definitivo delle direttive ove autorizzate dalla CE. Pertanto, si prevede di dar corso al bando di gara entro la fine del 2003.

Relativamente alla linea d'azione F) "*Fondi garanzia*" si è proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della Legge relativamente al Titolo II (contributi in conto interessi) per la concessione dei contributi nell'ambito del regime "*de minimis*". Tale testo, inviato nel corso del primo trimestre del 2003 all'Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni, è tutt'ora all'esame degli uffici, impegnati a risolvere, in particolare, il problema relativo all'individuazione dei soggetti istruttori. Relativamente al Titolo I della LR 2/2001 (integrazioni fondi rischio) è intendimento dell'Amministrazione procedere alla predisposizione di nuove Direttive di attuazione.

Infine per l'avvio della linea d'azione H) "*Monitoraggio del sistema delle infrastrutture*" è in corso di predisposizione una proposta di delibera per l'affidamento diretto di incarico all'Osservatorio Industriale, per l'attività di monitoraggio del sistema delle infrastrutture e redazione del Piano regionale delle dotazioni infrastrutturali. Il ricorso all'affidamento diretto, allo stato attuale, si rende necessario per tre motivi fondamentali:

- recuperare il ritardo accumulato sulla tempistica di attuazione dell'azione così come previsto dal CdP;
- capitalizzare le esperienze e il bagaglio conoscitivo del soggetto attuatore individuato, con conseguente riduzione dei costi di realizzazione del progetto;
- dare immediata attuazione alle operazioni già selezionate nell'ambito del bando PIT 2001, come sancito dagli Accordi di Programma e poter accogliere le nuove proposte che perverranno con la Selezione PIT 2002, che potranno essere realizzate solo previa approvazione di un Piano Regionale delle infrastrutture.

Misura 4.2: Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR

Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.2, il cui avanzamento finanziario si conferma alimentato prevalentemente da progetti coerenti, registra un aumento unicamente nel valore dei pagamenti rispetto al dato rilevato al 30.09.2002. In valore assoluto la spesa certificata risulta pari a € 1.113.343,34, importo che si traduce in un incremento in termini di capacità di spesa (da 14% a 19%) e di utilizzo (da 53% a 71%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	5.741.000,00	5.741.000,00	1.566.104,32	1.566.104,32	831.578,77	831.578,77
Situazione al 31.03.2003	5.741.000,00	5.741.000,00	1.566.104,32	1.566.104,32	1.113.343,34	1.113.343,34
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	281.764,57	281.764,57
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	27,28%	27,28%	14,48%	14,48%	53,10%	53,10%
Situazione al 31.03.2003	27,28%	27,28%	19,39%	19,39%	71,09%	71,09%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto "Programma di intervento per il marketing territoriale".

Per la linea d'azione A) "Sistemi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa" è stata costituita la *Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna* (denominata *IES srl*), per la cui operatività si prevede di proporre alla Giunta regionale l'approvazione del "Programma pluriennale per il Marketing territoriale 2000-2006 - Linee strategiche e strumenti operativi per le attività di promozione e marketing territoriale per l'attrazione di investimenti esterni", con particolare riferimento alle azioni A, B e C del CdP del POR Sardegna 2000-06, sulla base del quale saranno in seguito predisposti i programmi operativi annuali, così come previsto dallo stesso CdP.

Per le linee d'azione B) "Attrazione diretta di investimenti esterni" e C) "Dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri" non è stato rilevato alcun avanzamento procedurale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini

Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto si conferma un avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	37.316.000,00	18.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	37.316.000,00	18.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Per l'attuazione della linea d'azione A) "Animazione economica" e B) "Incubazione di impresa" si rimane in attesa dell'approvazione del Piano organico comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti, quale preconditione per procedere all'affidamento diretto degli incarichi.

Per la linea d'azione C) "Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese" è stata trasmessa alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione la bozza del testo delle Direttive di attuazione. Ne è conseguita una lunga interlocuzione con la Commissione con la richiesta di chiarimenti formali.

Nessun avanzamento procedurale è stato rilevato infine per la linea d'azione D) "Fondi etici". Si sta valutando l'opportunità di non avviare questa azione.

Aggiornamento al 31.03.2003

Linea d'azione C) *“Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”*

In riferimento alla nota della Commissione inviata in data 14.02.2003, a seguito di richiesta di proroga, si sta procedendo alla predisposizione di un ulteriore testo di Direttive. In particolare si intende tener conto della peculiarità dell'intervento costituito da due componenti: partecipazione al capitale e contributi in conto interessi.

Relativamente al capitale di rischio, si chiederà alla CE di valutarlo nell'ambito della comunicazione su Aiuti di Stato e capitale di rischio (GUCE c. 235 del 21.08.2001), Relativamente alla componente dei contributi in conto interesse il riferimento rimane il Reg. CE 70/2001.

Con le ultime modifiche del Complemento di Programmazione è stata prevista l'attuazione dell'azione nell'ambito del regime *“de minimis”*. Nel caso la Commissione europea non dovesse autorizzare il regime di aiuto verrà comunque data attuazione alla linea nell'ambito del regime suddetto.

Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650

E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Anche per la Misura in esame non si registra alcun avanzamento finanziario.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	14.352.000,00	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	14.352.000,00	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

È in corso una verifica sull'attuabilità dell'intervento nell'ambito del POR e sull'eventuale necessità di riprogrammazione della Misura.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR

Beneficiario finale:

- Linea A: Regione – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
- Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici
- Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali
- Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini**Telefono:** 070.606 7287**E mail:** turismo@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 31.03.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 4.5 evidenzia da un lato la rettifica dei valori di impegno e dall'altro un massiccio incremento dei valori di spesa rispetto al semestre precedente: gli impegni si attestano su un importo pari a € 2.623.145,21 mentre la spesa passa da € 340.820,24 a € 2.463.487,01 determinando un incremento del 623%.

Ciononostante la Misura fa registrare la più bassa capacità di impegno di tutto il POR. Benché quindi la capacità di utilizzo della quota pubblica si approssimi all'esaurimento degli impegni giuridicamente assunti (94%), la capacità di spesa – parametro in questo caso maggiormente significativo ai fini dell'assorbimento della dotazione pubblica della Misura – raggiunge appena l'1,25% dello stanziamento.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	196.912.000,00	98.456.000,00	3.603.130,45	3.603.130,45	340.820,24	340.820,24
Situazione al 31.03.2003	196.912.000,00	98.456.000,00	2.623.145,21	2.623.145,21	2.463.487,01	2.463.487,01
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-979.985,24	-979.985,24	2.122.666,77	2.122.666,77
Incremento %*	0,00	0,00	-27,20	-27,20	622,81	622,81
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	1,83%	3,66%	0,17%	0,35%	9,46%	9,46%
Situazione al 31.03.2003	1,33%	2,66%	1,25%	2,50%	93,91%	93,91%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

- *Linea di intervento B) "Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico",* pubblicazione dei bandi relativi alle annualità 2001 e 2002:
 - BURAS n. 19 del 26.06.2001, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.442.701,00. La graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 20 interventi per un importo complessivo finanziabile di € 3.355.231,59;
 - BURAS n. 13 del 2.05.2002, con una dotazione della medesima entità dell'annualità precedente;
- *Linea di intervento C) "Itinerari turistici integrati",* pubblicazione sul BURAS n. 19 del 29.06.2002 del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi

relativi agli “Itinerari turistici integrati – itinerario turistico-religioso: Progetto *Cattedrali di Sardegna*”, per un importo complessivo di €10.329.000,00;

- *Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”*, pubblicazione sul BURAS n. 38 del 28.12.2002 del bando 2002-2003 per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinias, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, per un importo complessivo di €12.000.000,00;
- *Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”*, pubblicazione sul BURAS n. 38 del 28.12.2002 del bando 2002 per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati – Archeologia mineraria”, per un importo complessivo di €5.000.000,00.

Aggiornamento al 31.03.2003

Relativamente al bando “*Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico*” afferente alla linea d’azione B), è stata pubblicata nel BURAS n. 2 del 17.01.2003 la Determina di approvazione della graduatoria del bando 2002 che individua 34 progetti per un importo complessivo finanziabile di €4.615.990,00. I progetti risultano così localizzati:

- 18 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a €3.281.087,18;
- 10 progetti in provincia di Nuoro, per contributi pari a €502.371,36;
- 6 progetti in provincia di Sassari, per contributi pari a €832.530,14.

Al fine di facilitare la lettura del *gantt* di seguito riportato, si rammenta che il bando ha finanziato spettacoli e manifestazioni che alla data di presentazione delle domande fossero già in corso di svolgimento o che dovevano necessariamente svolgersi entro l’anno (31.12.2002).

Misura 4.5 Linea B	2002												2003		
	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando															
Presentazione progetti - 60 gg															
Istruttoria e graduatoria - 30gg															
Approvaz./pubbl. graduatoria -															
Svolgimento eventi															
Erogazione contributi (60 gg da fine evento)															

Preventivo

Consuntivo

Misura 4.6:Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, il monitoraggio finanziario evidenzia un significativo avanzamento della spesa che si attesta a €9.788.450,55. Ne discende una capacità di spesa pari all'8,36% delle risorse disponibili e una capacità di utilizzo del 25,69% rispetto alle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	117.024.000,00	117.024.000,00	38.102.729,73	38.102.729,73	409.306,19	409.306,19
Situazione al 31.03.2003	117.024.000,00	117.024.000,00	38.102.741,27	38.102.741,27	9.788.450,55	9.788.450,55
Variatione (v.a.)	0,00	0,00	11,54	11,54	9.379.144,36	9.379.144,36
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	2291,47	2291,47
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>e/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	32,56%	32,56%	0,35%	0,35%	1,07%	1,07%
Situazione al 31.03.2003	32,56%	32,56%	8,36%	8,36%	25,69%	25,69%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Trattandosi di una Misura trasversale, per la programmazione degli interventi formativi si è provveduto alla raccolta dei fabbisogni formativi dell'Assessorato di riferimento e sulla scorta delle proposte pervenute sono state predisposte 6 Schede progetto, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 25/12 del 24.07.2001.

Il bando, finalizzato ad attività formative per circa €29.287.754 (pari all'intera disponibilità inserita nel bilancio 2001), pubblicato il 09.09.2001, fa registrare un avanzamento procedurale. Al 31.12.2002 infatti dei 504 corsi finanziati ne risultano avviati 220 e conclusi 64.

Aggiornamento al 31.03.2003

Il 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale si sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel "Catalogo dell'offerta formativa" finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Gli organismi che possono partecipare alla gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attività pregressa nell'ambito della formazione, o imprese *leader* nel settore informatico, con esperienza minima quinquennale.

Il programma previsto dalla Misura 4.6, Scheda Progetto B - Formazione specifica - approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/12 del 24.07.2001, prevede l'erogazione di borse di studio per la partecipazione a seminari, *stage* e interventi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico,

Telematico e delle Società dell'Informazione a favore di residenti in Sardegna da almeno tre anni, occupati presso imprese con sede operativa nell'Isola che ricoprono uno o più dei seguenti profili professionali: ingegneri di processo del *software*, integratori di sistema del *software*, amministratori di *database*, grafici multimediali, programmatori Internet, specialisti di sicurezza delle reti, o giovani disoccupati, laureati in ingegneria informatica e ingegneria elettronica. Alla data del presente *Rapporto* sono state presentate 405 domande per l'inserimento nel Catalogo dell'offerta formativa, la cui predisposizione risulta ancora *in itinere*. In riferimento agli interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001 si segnala che, alla fine del mese di marzo del 2003, dei 504 corsi ammessi al beneficio comunitario ne risultano nel complesso avviati 252 e conclusi 97.

Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.7 registra capacità di impegno e di spesa pari rispettivamente al 5% e circa all'1% del costo totale programmato. Rispetto alla situazione registrata al 30.09.2002, i valori di esecuzione finanziaria non presentano incrementi.

I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.7 B) *Acquicoltura*, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e selezionati con le procedure di cui alle Direttive di applicazione della LR 19/98 recante "Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura", norma di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	62.810.160,00	43.218.000,00	3.116.761,14	1.870.056,68	589.891,08	353.934,65
Situazione al 31.03.2003	62.810.160,00	43.218.000,00	3.116.761,14	1.870.056,68	589.891,08	353.934,65
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	4,96%	4,33%	0,94%	0,82%	18,93%	18,93%
Situazione al 31.03.2003	4,96%	4,33%	0,94%	0,82%	18,93%	18,93%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

I Bando

A seguito della conclusione della selezione, è stata approvata con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.02 la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando approvato con determinazione n. 2219/VI e pubblicato sul S.S. al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria è stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33.

Su 33 progetti presentati (21 *Acquicoltura* – 3 *Attrezzature Porti da Pesca* – 9 *Trasformazione e Commercializzazione*) sono risultati ammissibili 15 progetti per un investimento complessivo preventivato di circa €9.910.000,00, come di seguito si riporta:

- 4.7 B) *Acquicoltura* 9 progetti con una spesa preventivata di circa €3.632.000,00;
- 4.7 C) *Attrezzature Porti da Pesca* 1 progetto con una spesa preventiva di circa €1.032.000,00;

- 4.7 D) *Trasformazione e Commercializzazione* 5 progetti con una spesa preventivata di circa €5.245.000,00.

II Bando

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate 32 domande per le quali al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione.

L'attuazione della Sottomisura 4.7 B) presenta una problematica connessa all'orientamento dell'UE in riferimento alla nota n. 6066736 del 03.12.2002, con la quale la Direzione Generale Pesca del MiPAF ha comunicato "l'invito" dell'UE, del 22.11.2002, a sospendere tutti i finanziamenti di progetti che possono comportare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentaria di spigole e orate. Da tali orientamenti conseguono criticità di natura economica e giuridico-amministrativa: le prime connesse alla dipendenza dalle importazioni di spigole e orate, in quanto la produzione regionale copre solo il 40% circa del fabbisogno; le seconde inerenti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni comunitarie.

Aggiornamento al 31.03.2003

Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente l'esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999.

Interventi a titolarità regionale	2001						2002						2003									
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese																						
Selezione domande e approvazione graduatorie - 1 mese																						
Istruttoria progetti - 2 mesi																						
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese																						
Realizzazione - 24 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Interventi a regia regionale	2001						2002						2003									
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	n
Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese																						
Istruttoria e approvazione graduatoria - 2 mesi																						
Provvedimenti delega a favore beneficiari - 2 mesi																						
Progettazione esecutiva - 3 mesi																						
Appalto e realizzazione - 28 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

**Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99)
- SFOP**

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.8 registra capacità di impegno e di spesa pari rispettivamente al 24,47% e al 16,75% del costo totale programmato.

I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D) “Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico programma regionale previsto dall’art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per l’attuazione degli interventi finanziari dell’Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	13.180.880,00	10.804.000,00	3.029.507,29	3.029.507,29	2.158.682,94	2.158.682,94
Situazione al 31.03.2003	13.180.880,00	10.804.000,00	3.225.776,04	3.225.776,04	2.208.391,00	2.208.391,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	196.268,75	196.268,75	49.708,06	49.708,06
Incremento %*	0,00	0,00	6,48	6,48	2,30	2,30

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	22,98%	28,04%	16,38%	19,98%	71,26%	71,26%
Situazione al 31.03.2003	24,47%	29,86%	16,75%	20,44%	68,46%	68,46%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

I nuovi impegni riguardano il completamento del “piano di riconversione della pesca a sciabica e a strascico”.

I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)

Scarsa la risposta degli operatori del settore: l’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) *Piccola pesca costiera* è stato valutato negativamente in fase istruttoria.

II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02)

Al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione delle domande presentate, di cui 11 nella sottomisura 4.8 A) *“Piccola pesca costiera”* e 2 domande sulla sottomisura 4.8 D) *“Azioni realizzate dagli operatori del settore”*.

Interventi a titolarità regionale: A), D)	2001			2002												2003		
	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicaz bando e presentaz domande - 1 mese																		
Selez domande e approvaz graduatorie - 1 mese																		
Istruttoria progetti - 2 mesi																		
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese																		
Realizzazione - 24 mesi																		

Preventivo

Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente l'esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999, nonché all'introduzione della nuova sottomisura 4.8 E) "Azioni innovative". Tale previsione di intervento, già indicata nel POR con riferimento all'art. 17 del Reg. CE 2792/99 si rende opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e acquacoltura che l'Amministrazione intende perseguire.

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.9, registra un piccolo decremento negli impegni pari al -1,91%, e un forte incremento nei pagamenti pari al 1.901,43%, rispetto ai dati rilevati al 30.09.2002. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 100.797.243,90, si registrano pagamenti pari a € 21.053.146,62. Tali valori consentono di determinare le aliquote relative sia alla capacità d'impegno che di spesa che si attestano rispettivamente al 22% e al 4,61% del costo totale programmato.

L'avanzamento finanziario registrato nel semestre è conseguenza delle erogazioni della prima rata di pagamento per le operazioni approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell'ERSAT (interventi A, B, E, G, I, L, M); mentre per le operazioni relative agli interventi D), H) e N) approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura nei mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N), si stanno erogando oltre che pagamenti intermedi anche i saldi relativamente a interventi di bieticoltura e olivicolo.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	456.290.000,00	241.302.000,00	102.755.073,87	50.375.196,58	1.051.903,42	486.834,18
Situazione al 31.03.2003	456.290.000,00	241.302.000,00	100.797.243,90	52.638.249,92	21.053.146,62	20.818.375,68
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-1.957.829,97	2.263.053,34	20.001.243,20	20.331.541,50
Incremento %*	0,00	0,00	-1,91	4,49	1.901,43	4.176,28
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	22,52%	20,88%	0,23%	0,20%	1,02%	0,97%
Situazione al 31.03.2003	22,09%	21,81%	4,61%	8,63%	20,89%	39,55%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Nel corso dell'anno 2001, mediante bandi pubblici, sono state attivate le direttive e procedure tecnico-amministrative per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la Misura. I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con Deliberazioni di Giunta Regionale, rese esecutive con Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, e pubblicati sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) *Bovino da Latte*, B) *Bovino da carne*, D) *Cavallo Anglo-Arabo-Sardo*, E) *Ovicaprino*, G) *Attività zootecniche complementari e alternative*, H) *Olivicolo*, I) *Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta*, L) *Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche*, M) *Comparto delle piante aromatiche ed officinali*. Il bando relativo all'Intervento N) *Bieticoltura da zucchero* è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.

Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell'ERSAT (a detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un'apposita convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura che ha regolato le condizioni per l'affidamento delle competenze e delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N).

In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee n. 1.375 domande, così suddivise per linea di intervento: A) n. 44 – B) n. 124 – D) n. 87 – E) n. 585 – G) n. 66 – H) n. 141 – I) n. 144 – L) n. 47 – M) n. 37 – N) n. 100.

È importante segnalare che i ritardi nella concessione dei finanziamenti ai singoli destinatari finali sono in parte da attribuirsi alla riorganizzazione dei Servizi della Sede centrale dell'Assessorato dell'Agricoltura (approvata con DPG del 26.06.2002) che ha comportato la ridefinizione dell'allegato tecnico al bilancio 2002-04, approvato con D.A. Prog. n. 89/B dell'11.07.2002, e la conseguente impossibilità per il Direttore del Servizio competente di emettere prima di tale data gli Ordini di Accreditamento a favore dei singoli Servizi Ripartimentali.

Intervento N – 1° bando	2001						2002										2003					
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	n
Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi																						
Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi																						
Istruttoria progetti - 4 mesi																						
Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi																						
Realizzazione – 12- 24 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Interventi A), B), E), G), I), L), M) 1° bando	2001						2002										2003					
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	n
Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi																						
Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi																						
Istruttoria progetti - 4 mesi																						
Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi																						
Realizzazione – 12 - 24 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Interventi D), H) 1° bando	2001						2002										2003					
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	n
Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi																						
Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi																						
Istruttoria progetti - 4 mesi																						
Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi																						
Realizzazione -12 - 24 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 1/11 del 7.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/F "Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori" per gli anni 2002-2003-2004.

L'Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito Internet della Regione in data 09.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre l'08.05.2003.

Con DGR n. 6/17 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/C "Apicoltura" per gli anni 2002-2003-2004.

L'Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 29.05.2003.

Con DGR n. 6/18 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento 4.9/E "Ovicaprino" per gli anni 2002-2003-2004.

L'Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 29.05.2003.

Sono in fase di elaborazione le Direttive e le procedure operative per gli interventi A) "Bovino da latte" e B) "Bovino da carne".

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a € 237.080.000,00, la Misura 4.10 presenta, rispetto al semestre precedente un incremento di oltre il 6% nell'ammontare degli impegni, pari a €21.020.655,79, e del 100% nei pagamenti che si attestano a €3.990.329,75.

La capacità di impegno si porta così all'8,87% del costo totale, la capacità di spesa rimane al di sotto del 2%, mentre la capacità di utilizzo sfiora il 19%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	237.080.000,00	126.600.000,00	19.754.928,44	9.877.464,22	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	237.080.000,00	126.600.000,00	21.020.655,79	10.510.327,84	3.990.329,75	3.990.329,75
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.265.727,35	632.863,62	3.990.329,75	3.990.329,75
Incremento % *	0,00	0,00	6,41	6,41	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	8,33%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	8,87%	8,30%	1,68%	3,15%	18,98%	37,97%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Sul primo bando, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001, la selezione delle domande è stata effettuata dalla Commissione di valutazione prevista al punto 10 dello stesso. La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 3041 del 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo, con Determinazione n. 686 del 24.06.2002 dello stesso Direttore Generale; in totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati all'ERSAT i compiti connessi alla istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi o definitivi presentati per le domande ritenute ammissibili, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ad oggi l'attività istruttoria si appresta ad essere conclusa, con 26 progetti istruiti positivamente che hanno determinato l'avanzamento finanziario registrato nel semestre.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.10 per gli anni 2002-2003-2004. L'Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet

della Regione in data 16.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15.05.2003. Le aspettative sono ottimistiche in quanto la risposta del territorio è stata immediata: si prevedono alcune centinaia di domande.

Rilevante ai fini dell'avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa 3A di Arborea, già positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia. È previsto a valere sulla misura un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell'importo complessivo massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro. L'erogazione del contributo è subordinata alla valutazione positiva del "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di Programmazione. Attualmente si attende l'esito della valutazione.

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	2001						2002						2003									
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi																						
Selezione domande e approvazione graduatorie - 2 mesi																						
Presentazione progetti esecutivi - 3 mesi																						
Istruttoria e provvedimenti a favore beneficiari - 4 mesi																						
Realizzazione - 24 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 31.03.2003, la Misura 4.11, registra un significativo incremento sia nell'ammontare degli impegni, che dei pagamenti. I primi passano da €5.873.231,208 registrati al 30 settembre, a €9.776.566,33, mentre la spesa passa da €0,00 all'importo di €3.596.451,42.

Tali dati si traducono in un'accresciuta capacità di impegno pari al 19,96% (rispetto all'11,99% del semestre precedente), capacità di spesa del 7,34% (contro lo 0%) e di utilizzo di circa il 37% (0% al 30 settembre).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	48.982.000,00	24.491.000,00	5.873.231,20	5.266.434,18	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	48.982.000,00	24.491.000,00	9.776.566,33	9.169.769,31	3.596.451,42	3.596.451,42
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	3.903.335,13	3.903.335,13	3.596.451,42	3.596.451,42
Incremento % *	0,00	0,00	66,46	74,12	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	11,99%	21,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	19,96%	37,44%	7,34%	14,68%	36,79%	39,22%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Per le annualità 2000-2001 la concessione di aiuti ha riguardato 113 istanze, su 230 domande ammissibili, di cui alla graduatoria approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.2002.

Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l'annualità 2001, è stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione che ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19.

Con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 217/B del 25.11.2002 è stato predisposto sul bilancio regionale il trasferimento dei fondi dalla UPB S06.061 alla UPB S06.075, in tal modo sarà possibile emettere determinazioni di concessione del contributo per tutte le 230 domande ritenute ammissibili.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 16/2003 del 18.02.2003, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l'annualità 2002.

Per accedere agli aiuti previsti dalla Misura 4.11, annualità 2003, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003.

Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità	2001						2002												2003			
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi																						
Istruttoria - 2 mesi																						
Approvazione graduatoria - 1 mese																						
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese																						
Realizzazione - 12 mesi																						

Preventivo

Consuntivo

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.12, su un costo totale programmato pari a €48.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	48.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	48.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Con DGR n. 41/42 del 17.12.2002, sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura. Tali Direttive recepiscono sia le modifiche apportate al CdP in risposta alle osservazioni della Commissione sulle norme minime da rispettare in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, sia le modifiche attivate mediante procedura scritta (il requisito della redditività aziendale calcolato con il metodo del Reddito netto viene superato e sostituito dal criterio del Reddito Lordo Standard, RLS); le direttive prevedono, inoltre, uno snellimento delle procedure di approvazione delle operazioni.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 10/39 del 28.03.2003, sono state apportate alcune integrazioni alla sopraccitata DGR 41/42 del 17.12.2002, in ottemperanza alle osservazioni formulate dall'AdG in merito alle restrizioni poste dall'Assessorato all'Agricoltura riguardo alle nuove costruzioni previste dal POR.

Entro la prima metà di maggio 2003 si prevede la pubblicazione dell'Avviso nei due quotidiani regionali a maggior tiratura e sul sito Internet della Regione.

Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco

Telefono: 070.606 6284

E mail: agricoltura.servizio.produzioni.animali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della *performance*, accompagnato da una soddisfacente capacità di utilizzo pari al 75,78% delle somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di €4.087.424,81, si registrano pagamenti pari a €3.097.501,57. Tali valori consentono di determinare il *trend* relativo sia alla capacità d'impegno che di spesa, rispettivamente del 29,34% e del 22,23% del costo totale programmato.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	13.932.000,00	13.932.000,00	3.441.768,41	3.441.768,41	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	13.932.000,00	13.932.000,00	4.087.424,81	4.087.424,81	3.097.501,57	3.097.501,57
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	645.656,40	645.656,40	3.097.501,57	3.097.501,57
Incremento % *	0,00	0,00	18,76	18,76	100,00	100,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	24,70%	24,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	29,34%	29,34%	22,23%	22,23%	75,78%	75,78%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di apparecchiature e attrezzature finalizzato essenzialmente all'ammodernamento tecnologico della strumentazione scientifica utilizzata per l'esecuzione di analisi routinarie nell'ambito dei programmi assegnati al Laboratorio dell'ARAS (Associazione Regionale Allevatori della Sardegna).

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo intervento è pari €3.441.768,41 di cui il 90% è stato già erogato. Tale intervento è stato portato a compimento ed è in corso di elaborazione la rendicontazione finale.

In data 30.12.2002, con Delibera di Giunta Regionale n. 44/16 è stato approvato il secondo programma d'investimento che prevede l'acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attività in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell'intervento prevede un impegno finanziario pari a €645.656,40.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati all'ERSAT i compiti connessi all'attuazione degli Interventi 3) "Realizzazione dei Centri di informazione telematica" e 4) "Creazione di reti telematiche". L'Ente sta predisponendo il programma per la realizzazione dei centri di informazione e delle reti telematiche.

Interventi 1), 2)	2001						2002										2003						
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	
Presentazione programma dell'ARAS																							
Istruttoria programma																							
Approvazione programma																							
Provvedimenti a favore beneficiari																							
Realizzazione																							
	<div></div> Consuntivo																						

■ Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.14, su un costo totale programmato pari a €13.821.878,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	5.556.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	13.821.878,00	10.655.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	8.265.878,00	6.655.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	148,77	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

Aggiornamento al 31.03.2003

Si è resa necessaria una modifica al Complemento di Programmazione che renderà più coerente l'attuazione della Misura. La proposta di modifica è stata portata all'attenzione del Comitato di Sorveglianza tenutosi in data 11-12 febbraio 2003 che ne ha approvato i contenuti.

Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a €2.815.670,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	6.311.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	2.815.670,00	1.689.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	-3.495.330,00	-2.034.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	-55,38	-54,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR sembrerebbero indirizzare l'Assessorato a non attivarla. Sembrerebbe pertanto opportuna, nel corso del 2003, una modifica al POR e una riprogrammazione finanziaria per spostare le risorse su altre Misure.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nell'eventualità che la Misura non venga attuata, nel piano finanziario del CdP le annualità 2000-2001-2002-2003 dalla Misura 4.15 sono state trasferite alla Misura 4.14. Si è dunque passati da un costo totale programmato di €6.311.000,00 a €2.815.670,00.

Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2002, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a €4.156.666,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	10.390.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	4.156.666,00	3.379.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	-6.233.334,00	-4.620.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	-59,99	-57,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale e lo sviluppo di attività agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e abbandono. Conseguentemente per l'attuazione della Misura si renderà necessaria, nel corso del 2003, una modifica al POR.

Aggiornamento al 31.03.2003

Anche nel piano finanziario della Misura 4.16 si è resa necessaria una riprogrammazione finanziaria, spostando le annualità 2000-2001-2002-2003 verso la Misura 4.14. Si è dunque passati da un costo totale programmato di €10.390.000,00 a €4.156.666,00.

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della *performance*, accompagnato da una soddisfacente capacità di utilizzo pari al 77,64% delle somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di €13.037.829,35, si registrano pagamenti pari a €10.122.575,12. Tali valori collocano la capacità d'impegno e di spesa rispettivamente al 51,13% e al 39,70% del costo totale programmato.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	25.500.000,00	21.000.000,00	12.465.058,18	9.472.073,60	8.950.515,70	6.904.493,14
Situazione al 31.03.2003	25.500.000,00	21.000.000,00	13.037.829,35	10.020.993,46	10.122.575,12	8.259.509,03
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	572.771,17	548.919,86	1.172.059,42	1.355.015,89
Incremento % *	0,00	0,00	4,60	5,80	13,09	19,63
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	48,88%	45,11%	35,10%	32,88%	71,80%	72,89%
Situazione al 31.03.2003	51,13%	47,72%	39,70%	39,33%	77,64%	82,42%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Lo stato di attuazione presenta impegni e pagamenti relativi a investimenti di sostituzione realizzati nell'ambito della tipologia di Intervento A) "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali".

Gli interventi sono stati realizzati secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000.

Beneficiari dell'intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale, l'accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Per l'attuazione dell'intervento B) "Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione", è in fase di definizione il protocollo di accordo con l'Ente "Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale" per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica a difesa del comprensorio interessato dalla Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a €12.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative sta richiedendo tempi relativamente lunghi per la soluzione di aspetti connessi all'attuazione degli interventi.

I ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione della Misura sono in corso di recupero a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.19, su un costo totale programmato pari a €75.081.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	75.081.000,00	44.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	75.081.000,00	44.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento % *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

L'esecuzione degli interventi previsti dalla Misura è prevista in tre fasi: propedeutica, attuativa e realizzativa. La fase propedeutica prevede l'elaborazione di un Programma generale e di Piani dettagliati di ricomposizione fondiaria; all'approvazione di ogni Piano dettagliato dovrebbe seguire l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione, la valutazione e la selezione delle domande presentate dagli agricoltori. A seguito delle considerazioni emerse nell'ambito dell'Assessorato in merito alla complessità dell'intervento e ai tempi effettivi di esecuzione delle tre fasi, che potrebbero anche superare il termine del Programma, è in corso una verifica sull'attuabilità dell'intervento nell'ambito del POR e sull'eventuale necessità di riprogrammazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti rurali, gli operatori agricoli per l'elettrificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un notevole incremento della *performance* accompagnato da una discreta capacità di utilizzo delle somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 64.289.829,92, si registrano pagamenti pari a € 13.114.939,64. La capacità d'impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 34,63% e al 7,07% del costo totale programmato.

Gli impegni si riferiscono: per il 50% circa a progetti coerenti, di cui la gran parte approvati con la LR 21/2000 e i restanti ritenuti ammissibili, ma non rendicontati nella precedente programmazione; per l'altro 50% a nuovi progetti di viabilità rurale.

I pagamenti sono invece totalmente riconducibili a progetti coerenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	185.628.000,00	157.552.000,00	17.048.816,06	15.343.934,46	1.313.868,50	1.182.481,65
Situazione al 31.03.2003	185.628.000,00	157.552.000,00	64.289.829,92	56.364.826,50	13.114.939,64	12.659.915,97
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	47.241.013,86	41.020.892,04	11.801.071,14	11.477.434,32
Incremento %*	0,00	0,00	277,09	267,34	898,19	970,62
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	9,18%	8,27%	0,71%	0,64%	7,71%	7,71%
Situazione al 31.03.2003	34,63%	30,36%	7,07%	6,82%	20,40%	22,46%

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Le procedure tecnico-amministrative per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono state attivate in data 2.10.2001 con Circolare Assessorile n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073 rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di interventi di viabilità, elettrificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e dalle Comunità Montane.

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura.	2001						2002										2003					
	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Atto amministrativo e presentazione proposte - 2 mesi																						
Istruttoria progetti																						
Approvazione progetti																						
Provvedimenti delega a favore beneficiari																						
Progettazione esecutiva, appalto e realizzazione																						

Preventivo

Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Come mostra la tabella, la Misura 4.21, al 31.03.2003, presenta aumenti nei valori di impegno e di spesa significativi, se confrontati con il semestre precedente.

Gli impegni registrano un incremento del 41% circa passando da € 20.700.000,00 a € 29.155.000,00; ancora più rilevante è il dato relativo ai pagamenti che aumentano del 297% rispetto al 30.09.2002, passando da €5.070.000,00a €20.130.000,00

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	82.000.000,00	82.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
Situazione al 31.03.2003	82.000.000,00	82.000.000,00	29.155.000,00	29.155.000,00	20.130.000,00	20.130.000,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	8.455.000,00	8.455.000,00	15.060.000,00	15.060.000,00
Incremento %*	0,00	0,00	40,85	40,85	297,04	297,04
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	25,24%	25,24%	6,18%	6,18%	24,49%	24,49%
Situazione al 31.03.2003	35,55%	35,55%	24,55%	24,55%	69,04%	69,04%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

In attuazione della Misura sono stati emanati due bandi.

I bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della domanda e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando sono già state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione in favore dei richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all'erogazione della prima quota di €15.000 ai giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente sono state numerose e le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande ammesse, anche lo stanziamento finanziario del 2002 coprirà ulteriori domande di premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.

Insediamento dei giovani agricoltori - 1° bando	2001							2002							2003								
	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi																							
Selezione domande - 3 mesi																							
Approvazione graduatoria - 2 mesi																							
Istruttoria e avvenuto insediamento																							
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese																							

Preventivo

Consuntivo

II bando (S.S. n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001 e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell'insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il II bando sono già state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione e all'erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Insediamento dei giovani agricoltori - 2° bando	2001							2002							2003								
	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m
Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi																							
Selezione domande - 3 mesi																							
Comunicazione d'idoneità e approvaz. graduatoria																							
Istruttoria tecnico - amministrativa																							
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese																							

Preventivo

Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Si segnala la pubblicazione sul BURAS n. 9 del 25.03.2003 del terzo bando per la concessione del sostegno al primo insediamento dei giovani agricoltori per l'annualità 2003.

Asse V - Città

Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Marco Melis**Telefono:** 070.606 4325**E mail:** mmelis@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario: gli impegni si incrementano del 10% passando da € 29.620.345,67 a € 32.519.274,71, mentre i pagamenti aumentano del 97%, portandosi a € 15.853.797,92 (€ 8.065.957,71 al 30.09.2002).

Tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 20% e al 10% del costo totale programmato), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	163.068.000,00	163.068.000,00	29.620.345,67	29.620.345,67	8.065.957,71	8.065.957,71
Situazione al 31.03.2003	163.068.000,00	163.068.000,00	32.519.274,71	32.519.274,71	15.853.797,92	15.853.797,92
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.898.929,04	2.898.929,04	7.787.840,21	7.787.840,21
Incremento % *	0,00	0,00	9,79	9,79	96,55	96,55
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	18,16%	18,16%	4,95%	4,95%	27,23%	27,23%
Situazione al 31.03.2003	19,94%	19,94%	9,72%	9,72%	48,75%	48,75%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

Il 16.09.2002 è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario al BURAS n. 27, l'invito a presentare proposte a valere sulla Misura 5.1 "Politiche urbane", con una dotazione finanziaria di € 65.441.000,00. In data 10.12.2002 con Delibera di Giunta n. 39/13 è stata approvata un'integrazione al bando di gara, essendosi reso necessario ottemperare all'obbligo della disponibilità di risorse finanziarie da destinare ai PIT 2002. Tale ridefinizione ha riguardato tre aspetti del bando:

- da un punto di vista finanziario, rideterminandone l'importo complessivo (29 Meuro);
- da un punto di vista procedurale, prorogando al 28.02.2003 i termini di presentazione delle proposte da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari (inizialmente prevista per il 16.12.2002);
- nei criteri di selezione, richiedendo che le proposte presentate fossero coerenti con il PIT territoriale di riferimento.

A partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando è stata prevista (art. 6) l'attivazione, presso la Direzione Generale Urbanistica, di appositi Sportelli di Osservazione

Progetti a raggio provinciale, con funzioni di orientamento delle proposte progettuali e servizio di pre-istruttoria e pre-valutazione delle istanze, a supporto della struttura responsabile della Misura. Con note del 25.09.2002 del Direttore Generale sono state emanate delle lettere di invito a presentare proposte per l'affidamento e la gestione degli Sportelli sopracitati.

Con Determinazione n. 442/DG del 06.11.2002 sono stati approvati i verbali di valutazione del 22.10.2002 in base ai quali è risultato quanto segue:

- società aggiudicataria per lo Sportello della provincia di Cagliari è la *CRITERIA srl*,
- per gli Sportelli nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano nessuna delle offerte ricevute è risultata idonea. Si è pertanto provveduto, con ulteriori note del 26.11.2002, a indire un nuovo invito per la presentazione di proposte a seguito del quale con Determinazione n. 617/DG del 24.12.2002 è risultata aggiudicataria la società *CRES sas*.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 13.01.2003 è stato stipulato il contratto con la *CRITERIA srl* per un importo pari a € 159.600,00, reso esecutivo con Determinazione n. 44/CRP del 27.02.2003. Alla medesima data, con Determinazione n. 45/CRP, è stato reso esecutivo anche il contratto stipulato con la *CRES sas* per €130.680,00.

Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati operativi a partire dal 20.01.2003. Fino al 28.02.2003, le strutture hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento dei soggetti proponenti; per contro, durante le prime due settimane di marzo, sono state messe a punto – dalle Società di consulenza con il Responsabile di Misura – le procedure di apertura dei plichi pervenuti e i moduli elettronici per la registrazione dei contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di apertura. Le società di assistenza, contestualmente alle attività legate all'apertura dei plichi, stanno svolgendo le attività di pre-istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo scopo di coadiuvare e supportare la struttura responsabile della Misura e la commissione interassessoriale che avrà il compito di accertare l'ammissibilità dei Progetti Integrati pervenuti e di valutarli ai fini del finanziamento.

In data 28.02.2003 sono scaduti i termini di presentazione delle proposte a valere sul primo bando della Misura 5.1 "*Politiche urbane*" ed è attualmente in corso di nomina la commissione istruttoria. Alla scadenza del bando sono pervenuti 65 progetti integrati per un totale di circa 1.200 operazioni proposte. Di queste circa 700 sono a valere sulla Misura 5.1 per un ammontare complessivo pari a 490 Meuro, a fronte della dotazione finanziaria del bando pari a 29 Meuro.

Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, Ipab, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani

Telefono: 070.606 5409

E mail: ghiani.it@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 5.2, mentre l'ammontare degli impegni risulta invariato rispetto al semestre precedente, i pagamenti fanno registrare un lieve incremento passando da €4.534.007,75 a €4.856.051,59 effettuati al 31.03.2003. Per quanto il dato relativo alla capacità di utilizzo (83%) rilevi la progressiva saturazione degli impegni assunti, tanto la capacità di allocare gli stanziamenti, quanto la capacità di spesa evidenziano il divario rispetto all'obiettivo di pieno utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	28.778.000,00	28.778.000,00	5.836.995,87	5.836.995,87	4.534.007,75	4.534.007,75
Situazione al 31.03.2003	28.778.000,00	28.778.000,00	5.836.995,87	5.836.995,87	4.856.051,59	4.856.051,59
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	322.043,84	322.043,84
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	20,28%	20,28%	15,76%	15,76%	77,68%	77,68%
Situazione al 31.03.2003	20,28%	20,28%	16,87%	16,87%	83,19%	83,19%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Sul BURAS n. 32 del 4.11.2002 è stato pubblicato il primo bando di gara (approvato con Deliberazione n. 23/63 del 18.07.2002) "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali", relativo all'attuazione delle tipologie di azioni A) "Centri di aggregazione sociale", per un ammontare di risorse stanziare pari a €4.000.000,00, e D) "Servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia", con uno stanziamento di €2.916.926,00.

Aggiornamento al 31.03.2003

Il termine per la presentazione delle proposte si è chiuso il 3.01.2003. Al 31.03.2003 non è ancora stata nominata la commissione deputata all'istruttoria. Relativamente alle altre linee d'azione, a causa delle difficoltà di avvio, si sta valutando l'ipotesi di una riprogrammazione.

Misura 5.3: Formazione per le Misure dell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Come si evince dalla tabella, la Misura registra un avanzamento finanziario solo in termini di capacità di impegno che si attesta intorno al 27% delle risorse programmate. I pagamenti permangono nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	41.634.000,00	41.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	41.634.000,00	11.193.153,70	11.193.153,70	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	11.193.153,70	11.193.153,70	0,00	0,00
Incremento %*	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>e/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2003	26,88%	26,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

La valenza trasversale all'intero Asse V della Misura fa sì che la definizione del Piano Operativo per la realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

L'avanzamento procedurale della Misura è legato al bando dell'11.11.2001. Infatti nel mese di dicembre del 2002 con la pubblicazione delle graduatorie si è conclusa la procedura di valutazione dei 74 progetti presentati.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli interventi formativi nel mese di dicembre ha avuto luogo la stipula delle convenzioni con i soggetti aggiudicatari. Nel complesso sono stati finanziati 22 corsi destinati a 7.560 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Asse VI – Reti e nodi di servizio

Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR

Beneficiario finale: Regione, Anas, Consorzi Industriali.**Responsabile di Misura:** Ing. Paolo Fois**Telefono:** 070.606 2381**E mail:** llpp.sim@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 31.03.2003, la Misura 6.1 presenta impegni in *overbooking* pari a €216.176.482,73; rispetto al semestre precedente si registra una crescita significativa dei pagamenti che passano da € 58.317.150,65 a €79.606.893,24 con un tasso di incremento del 37%.

Se la capacità di impegno si attesta al 129%, la capacità di spesa risulta accresciuta fino a raggiungere il 48% del costo totale, mentre la capacità di utilizzo è pari al 37% delle risorse allocate per effetto del rilevante sovraimpegno.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	167.055.000,00	167.055.000,00	274.561.492,93	274.561.492,93	58.317.150,65	58.317.150,65
Situazione al 31.03.2003	167.055.000,00	167.055.000,00	216.176.482,73	216.176.482,73	79.606.893,24	79.606.893,24
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-58.385.010,20	-58.385.010,20	21.289.742,59	21.289.742,59
Incremento % *	0,00	0,00	-21,26	-21,26	36,51	36,51
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	164,35%	164,35%	34,91%	34,91%	21,24%	21,24%
Situazione al 31.03.2003	129,40%	129,40%	47,65%	47,65%	36,82%	36,82%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

L'avanzamento procedurale è da ascrivere principalmente alle opere in corso di realizzazione da parte dell'ANAS. In particolare, 12 interventi sono relativi all'adeguamento e allo sviluppo della maglia viaria principale, mentre 6 interventi riguardano i centri intermodali e i raccordi ferroviari.

Con DGR n. 12/26 del 16.04.2002, è stato approvato l'aggiornamento al Piano Regionale dei Trasporti, reso esecutivo con Determinazione n. 356/4969 del 7.08.2002.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 6.2: L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.**Responsabile di Misura:** Ing. Giorgio Lusso**Telefono:** 070.606 7303**E mail:** trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

La Misura 6.2 registra un decremento tanto degli impegni quanto dei pagamenti rispetto al 30.09.2002, riconducibile in entrambi i casi all'affinamento del dato relativo a due importanti progetti finanziati (le metropolitane leggere di Cagliari e di Sassari). Pertanto, in valore assoluto gli impegni scendono a €19.831.006,38 e le spese a €11.118.364,56.

Allo stato dei fatti, la capacità di impegno della Misura si comprime dal 32% al 15% e la capacità di spesa diminuisce di un punto percentuale rispetto al semestre precedente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	132.769.000,00	132.769.000,00	42.974.153,30	42.974.153,30	12.378.789,45	12.378.789,45
Situazione al 31.03.2003	132.769.000,00	132.769.000,00	19.831.006,38	19.831.006,38	11.118.364,56	11.118.364,56
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	-23.143.146,92	-23.143.146,92	-1.260.424,89	-1.260.424,89
Incremento % *	0,00	0,00	-53,85	-53,85	-10,18	-10,18
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	32,37%	32,37%	9,32%	9,32%	28,81%	28,81%
Situazione al 31.03.2003	14,94%	14,94%	8,37%	8,37%	56,07%	56,07%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002*

L'Assessorato ai Trasporti ha ammesso al finanziamento il progetto “*Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo delle mobilità nell'area vasta di Cagliari*”, per un importo preventivato di €9.873.370,06, a valere sulle risorse delle annualità 2000-2002. Il progetto è stato presentato congiuntamente dal Comune di Cagliari e dal Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari. Le disponibilità residue del triennio 2000-2002 – fatti salvi gli impegni sottoscritti con l'Accordo di Programma relativo ai PIT “SS1”, di cui al DPGR n. 160 del 18.12.2002, riferiti alla “Viabilità via XXV Aprile del Comune di Sassari” (€ 2.790.000,00) – potranno essere utilizzate a integrazione delle risorse 2003-2006 in vista dell'imminente varo del bando relativo al quadriennio.

È in fase di elaborazione la bozza di avviso pubblico per il quadriennio 2003-2006 finalizzato a:

- la valorizzazione della mobilità collettiva di ambito urbano e metropolitano;
- il riequilibrio delle modalità di trasporto.

Le risorse messe a bando dovrebbero ammontare a € 108.895.000,00 da utilizzare nelle aree urbane di Cagliari e Sassari per:

- la trasformazione dei sistemi di trasporto di massa esistenti in tramvia veloce;

- l'assegnazione di frequenze metropolitane, variazioni e rettifiche di rete, ubicazione di nuove fermate su tratte ferroviarie esistenti, in particolare per quelle a maggiore valenza urbana;
- la realizzazione di nuove linee a bassa emissione di sostanze inquinanti (tram e filobus);
- l'attivazione di sistemi di priorità semaforica in favore del trasporto pubblico;
- il controllo e la gestione a distanza della rete e dei flussi di traffico;
- gli interventi finalizzati a incentivare lo scambio intermodale dei passeggeri.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 6.3: Società dell'Informazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli

Telefono: 070.606 5812

E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a €94.660.000,00, la Misura 6.3 presenta, rispetto al semestre precedente, un incremento di circa il 19% nell'ammontare degli impegni, pari a € 4.693.471,91, e del 46% nei pagamenti che si attestano a €2.612.171,09.

La capacità di impegno si consolida così sul 5% del costo totale, la capacità di spesa rimane al di sotto del 3%, mentre la capacità di utilizzo aumenta passando dal 46% al 56%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	94.660.000,00	94.660.000,00	3.931.911,60	3.931.911,60	1.794.434,22	1.794.434,22
Situazione al 31.03.2003	94.660.000,00	94.660.000,00	4.693.471,91	4.693.471,91	2.612.171,09	2.612.171,09
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	761.560,31	761.560,31	817.736,87	817.736,87
Incremento %*	0,00	0,00	19,37	19,37	45,57	45,57
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	4,15%	4,15%	1,90%	1,90%	45,64%	45,64%
Situazione al 31.03.2003	4,96%	4,96%	2,76%	2,76%	55,66%	55,66%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Piano per la Strategia per lo Sviluppo della Società dell'Informazione

Il Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale entro il 31.12.2001. Si è in attesa dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della *Strategia* modificata sulla base delle osservazioni del Gruppo di Lavoro del QCS.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale

L'intervento, di competenza dell'Assessorato Affari Generali, non fa registrare alcun avanzamento procedurale; *impasse* in parte imputabile alla mancanza di una struttura "dedicata" all'attuazione e gestione della linea d'azione.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici – "Rete regionale di biblioteche multimediali"

Per quanto riguarda le azioni di competenza dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, a fronte della pubblicazione sul Supplemento Ordinario al BURAS n. 30 dell'8.10.2001, dell'invito a presentare proposte per la realizzazione del progetto, è stata approvata e pubblicata, sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, la relativa graduatoria con cui sono stati ammessi a finanziamento 37 progetti (per un totale di 41 interventi), per un importo

complessivo pari a €5.133.467,31 (il 5,42% del costo totale della Misura) che consentiranno di realizzare:

- 16 interventi nella provincia di Cagliari, per un importo di €2.560.173,37;
- 8 progetti nella provincia di Nuoro , per un importo pari a €986.041,69;
- 8 progetti nella provincia di Sassari, per un importo di €1.106.534,18;
- 5 interventi in provincia di Oristano , per un importo di €480.718,07.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna (SITR)

A seguito della delibera della Giunta Regionale n. 18/4 dell'11.06.2002, è stata avviata la predisposizione dello studio di fattibilità per la creazione del SITR.

La stesura definitiva di detto studio di fattibilità verrà completata entro e non oltre il luglio 2003 e l'appalto per il complemento del SITR verrà indetto nell'autunno 2003.

Relativamente alle altre azioni in corso si evidenzia che al 31.12.2002:

- è in fase di collaudo finale la Carta dell'uso del suolo, nonché l'ultimo lotto della Carta Tecnica Regionale;
- è in fase di predisposizione il capitolato per la formazione del *database* geografico derivato dalla Carta Tecnica Regionale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura evidenzia un avanzamento in termini di spesa. Si tratta, peraltro, di un incremento rilevante che denota una capacità di spesa e una capacità di utilizzo che passano rispettivamente dallo 0,11 all'11,33% e dallo 0,31 al 30,69%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	41.634.000,00	41.634.000,00	15.374.593,70	15.374.593,70	47.140,93	47.140,93
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	41.634.000,00	15.374.593,70	15.374.593,70	4.718.089,62	4.718.089,62
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.948,69	4.670.948,69
Incremento %*	0,00	0,00	0,00	0,00	9908,48	9908,48
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	36,93%	36,93%	0,11%	0,11%	0,31%	0,31%
Situazione al 31.03.2003	36,93%	36,93%	11,33%	11,33%	30,69%	30,69%

* $(\text{dati al } 31.03.03 - \text{dati al } 30.09.02) / (\text{dati al } 30.09.02)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L'avanzamento procedurale della Misura è relativo al bando pubblicato il 09.09.2001 che assegna risorse pari a € 16.852.505, di cui € 10.982.456 corrispondenti all'intera disponibilità del bilancio 2001 (POR annualità 2000-01), e € 5.870.049 a valere sulle risorse POR annualità 2002. A quest'ultima annualità verrà, inoltre, riferita la quota di € 1.036.116 relativa al bando pubblicato a valere sulla Misura 3.9 (PO riguardante la formazione nella Pubblica Amministrazione).

Successivamente alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori avvenuta nel mese di luglio del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 1.325 corsi (destinati complessivamente a 26.500 allievi).

Aggiornamento al 31.03.2003

Al 31.03.2003 sono state avviate le attività formative di 4 corsi finanziati.

Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello

Telefono: 070.606 4702

E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 7.1 registra una crescita significativa sia degli impegni che dei pagamenti. I primi passano da €4.368.091,68 registrati al 30.09.2002 a €6.224.419,67, mentre la spesa passa da € 430.534,47 all'ammontare di € 849.340,74 con una percentuale di incremento del 97%.

Tali dati si traducono in un'accresciuta capacità di impegno pari al 47% (rispetto al 33% del semestre precedente), capacità di spesa del 6% (contro il 3%) e di utilizzo del 14% (10% al 30 settembre scorso).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2002	13.322.000	13.322.000	4.368.091,68	4.368.091,68	430.534,47	430.534,47
Situazione al 31.03.2003	13.322.000	13.322.000	6.224.419,67	6.224.419,67	849.340,74	849.340,74
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.856.327,99	1.856.327,99	418.806,27	418.806,27
Incremento %*	0,00	0,00	42,50	42,50	97,28	97,28
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2002	32,79%	32,79%	3,23%	3,23%	9,86%	9,86%
Situazione al 31.03.2003	46,72%	46,72%	6,38%	6,38%	13,65%	13,65%

* $(\text{dati al 31.03.03} - \text{dati al 30.09.02}) / (\text{dati al 30.09.02})$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2002**Monitoraggio*

La Regione Sardegna, nei primi mesi dell'anno 2002, si è determinata ad adottare "MONIT2000" quale *software* per il monitoraggio delle operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000-06.

Il programma è stato installato nella versione *stand alone* e, nella sua nuova configurazione, prevede una postazione principale (postazione "zero") presso l'Autorità di Gestione, delle postazioni sub-principali per Fondo e un numero variabile di postazioni secondarie presso gli Assessorati competenti per l'attuazione delle singole misure.

In data 11.10.2002 è stata stipulata la convenzione con il Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari con cui si è dato avvio al programma di monitoraggio e di valutazione degli effetti occupazionali prodotti dagli interventi di maggior impatto, ai fini dell'assegnazione della riserva di premialità del 4% (art. 44 del Reg. CE 1260/99). L'importo della convenzione, resa esecutiva con Determinazione n. 267/CRP del 18.11.2002 è di €176.160,00.

Piano di Comunicazione

Con nota del 23.12.2002, l'Autorità di Gestione del POR ha inviato alla pubblicazione sul primo numero 2003 del BURAS il bando di gara relativo alle azioni di informazione previste dal Piano di Comunicazione. Il Piano, come peraltro previsto dalle "Disposizioni in materia di informazione e di pubblicità dei Fondi strutturali" contenute nel Reg. CE 1159/2000, persegue i seguenti obiettivi:

1. informare i potenziali beneficiari finali sulle possibilità offerte dagli interventi cofinanziati dall'Unione europea a valere sul FESR, sul FSE, sul FEAOG e sullo SFOP;
2. favorire il conseguimento di un efficace livello di partenariato con gli operatori al fine di attrarre investimenti;
3. garantire la trasparenza dell'azione dell'Unione europea in collaborazione con l'Amministrazione statale e regionale nei confronti dei potenziali beneficiari finali;
4. informare e aumentare la notorietà delle opere realizzate in Sardegna con i Fondi strutturali;
5. sensibilizzare l'opinione pubblica regionale sul ruolo svolto dall'Unione europea e dare un'immagine omogenea dei suoi interventi;
6. contribuire alla creazione di un efficiente sistema di comunicazione interna fra i soggetti dell'Amministrazione regionale coinvolti nell'attuazione del POR Sardegna 2000-06.

La valutazione intermedia

Il Valutatore, in base a quanto disposto dalle Linee guida per la valutazione intermedia dei Programmi Operativi, ha elaborato in versione preliminare il *Documento di descrizione del disegno di valutazione*, il *Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della strategia e del sistema degli indicatori*, presentati al Comitato di Sorveglianza del 6-7 luglio 2002.

Successivamente l'attività si è concentrata sull'analisi dell'avanzamento del Programma, dei cronogrammi, dei criteri di ammissibilità e selezione e sulle tematiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità) da cui sono stati prodotti i seguenti documenti: *I primi risultati*, *Cronogrammi delle procedure e stato di avanzamento degli impegni*, *Analisi della coerenza dei criteri di ammissibilità*, *Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi*, *Analisi della coerenza dei criteri di selezione*, *Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi di gara e le griglie di valutazione*, *La Legge regionale 15/94*, *L'indicatore ambientale e le priorità regionali nel bando 1999 e nel bando 2000*, *Documento di descrizione del disegno della valutazione metodologica di analisi per la valutazione di impatto strategico delle Pari Opportunità*.

Aggiornamento al 31.03.2003

Monitoraggio

Nel mese di marzo 2003 sono state installate 8 postazioni secondarie presso i Responsabili di Misura dell'Assessorato dell'Agricoltura. La procedura prevede il ricorso a un "protocollo di dialogo" con "MONIT2000" che consente la "migrazione" dei dati archiviati dall'ERSAT e dai Servizi Ripartimentali.

Assistenza Tecnica

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6/52 del 25.02.2003, ha disposto che l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione delle procedure PIT venisse affidata al RTI Ecosfera SpA – Agriconsulting SpA – Eures Group Srl. In data 28.03.2003 è stata stipulata la convenzione con le suddette società al fine di regolare le modalità di attuazione del servizio.

Piano di Comunicazione

Sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 e sulla GUCE n. 1 del 2.01.2003 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-06, Leader +, Interreg III A Sardegna-Corsica-Toscana. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.03.2003.

Sportelli Osservazione Progetti

Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati attivati il 20.01.2003. Le società aggiudicatrici del Servizio sono la *Criteria srl* per la Provincia di Cagliari e la *CRES sas* per le Province di Oristano, Sassari e Nuoro (cfr. Misura 5.1). Durante la fase propedeutica all'attività di *front desk*, attraverso una serie di incontri tra il Responsabile di Misura e i professionisti degli Sportelli Osservazione Progetti, si è approfondita la conoscenza del bando al fine di individuarne possibili difficoltà interpretative. Durante le prime sei settimane di attività gli Sportelli hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento dei soggetti proponenti. Le modalità operative si sono così articolate:

- attività di primo contatto destinate a rilevare i dati della proposta dell'ente locale e le informazioni necessarie alla comprensione della natura e della complessità dell'istanza informativa;
- attività di secondo contatto attraverso sia l'esame approfondito della problematica sollevata dai Comuni che un supporto all'indirizzo strategico delle proposte;
- un terzo livello di attività caratterizzato dalla formulazione di pareri di esperti, eventualmente anche in forma scritta.

Durante le prime due settimane di marzo sono state messe a punto, dalle Società di consulenza e dal Responsabile di Misura, le procedure di apertura dei plichi pervenuti e il *format* dei moduli elettronici per la registrazione dei contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di apertura.

Le società di assistenza, contestualmente alle attività legate all'apertura e alla verifica dei plichi, stanno svolgendo le attività di pre-istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo scopo di coadiuvare e supportare la struttura responsabile della Misura e la commissione interassessoriale che dovrà accertare l'ammissibilità dei Progetti Integrati pervenuti e provvedere alla loro valutazione ai fini dell'ammissione al finanziamento.



Allegati

A - Tabelle di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura

B - Aggiornamento sullo stato di attuazione degli adempimenti strategici
