



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2006

Giugno 2007

Indice

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA	6
FESR	7
FSE	9
FEOGA	11
SFOP	15
1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 16	
1.1. Evoluzione del contesto	16
2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE 17	
2.1. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'Intervento ed eventuali misure adottate	17
FESR	17
FSE	18
FEOGA	19
SFOP	21
2.2. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione	22
2.3 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni adottate	22
2.4. Ricorso all'Assistenza tecnica	24
2.5. Modalità di raccolta dei dati	27
2.6. Pubblicità dell'Intervento	27
2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari	35
2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie	37
2.9 Controllo finanziario	40
2.10 Informazioni relative alle tecniche di ingegneria finanziaria	44
3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA	46
3.1 Tabella riepilogativa, generale e per Fondo, delle spese effettive	46
3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea	54
4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE	56
Asse I – Risorse naturali	56
Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR	57
Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA	60
Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR	62
Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR	65
Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR	67
Misura 1.6 – Energia - FESR	70
Misura 1.7 – Monitoraggio - FESR	72
Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE	74
Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva – FEOGA	76
Asse II – Risorse culturali	79

Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici – FESR.....	79
Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR.....	82
Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR	84
Misura 2.4 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE.....	86
Asse III – Risorse umane	89
Misura 3.1 –Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE.....	90
Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE.....	92
Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE	94
Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE...	95
Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE	98
Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE	100
Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria - FSE	101
Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente - FSE	104
Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE	106
Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE.....	107
Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE	109
Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR.....	111
3.13. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR.....	113
Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE	116
Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II – FSE	117
Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE	119
Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE	121
Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione - FSE.....	122
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo.....	125
Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR	126
Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR	129
Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR.....	132
Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d'Area – FESR	132
Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR.....	134
Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE	138
Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP	140
Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)- SFOP	142
Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA	145
Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA	148
Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA.....	151
Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA	153
Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA ..	155
Misura 4.14 – Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale – FEOGA.....	158

Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA	160
Misura 4.16 – Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA.....	160
Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA.....	160
Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA	162
Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA	164
Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA	167
Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA	168
Asse V– Città.....	171
Misura 5.1 – Politiche urbane - FESR.....	171
Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR	174
Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE	177
Asse VI– Reti e nodi di servizio.....	180
Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente – FESR.....	180
Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR	183
Misura 6.3 – Società dell'informazione - FESR.....	184
Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione - FSE.....	189
Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti - FESR	191
Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR.....	194
5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI	197
6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI.....	201
SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro.....	201
Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario.....	202

Allegato 1 – Reg. CE 2792/99 - Allegato I - Stato di avanzamento dei Programmi

Allegato 2 – Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale

Allegato 3 – Progetti esemplari

Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010

Decisione CE: C(2005) 4820 dell'01.12.2005
che modifica la decisione C(2000) 2359 dell'08.08.2000

Costo totale: Meuro 4.258,555

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 2.118,293

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:

FESR:	1.300,490 Meuro
FSE:	372.,214 Meuro
FEOGA Orientamento	418,578 Meuro
SFOP:	27,011 Meuro

Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999


Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008

Considerazioni generali sui risultati del Programma

A seguito della riprogrammazione di metà percorso dei Fondi strutturali, il costo totale pubblico del POR Sardegna, è attualmente pari € 4.236.586.000,00¹,

Avanzamento della spesa certificata rispetto all'obiettivo N+2


La spesa certificata al 31.12.2006 è pari a € 2.576.662.176,51, corrispondente a una capacità di spesa del Programma del 60,8%. Va evidenziato che all'avanzamento finanziario del Programma ha contribuito in maniera sostanziale il FESR che ha fatto registrare nel periodo in esame un avanzamento di € 418.484.859,64 pari a circa il 73% dell'incremento registrato sull'intero Programma. Tale positiva

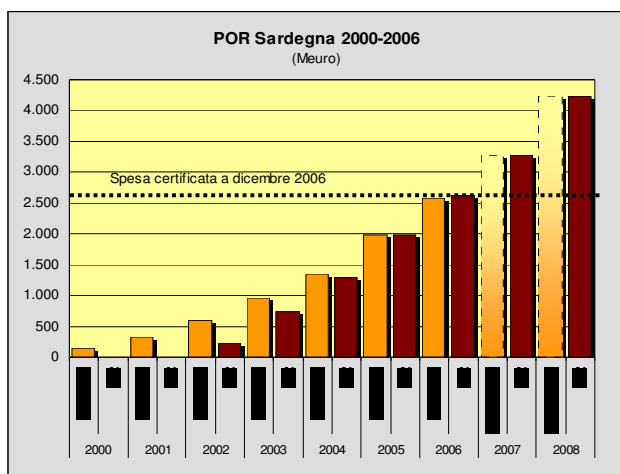

performance del Fondo, tuttavia, non ha consentito di compensare per il 2006 la progressiva riduzione del margine esistente tra pagamenti certificati e *target* annuale di spesa, peraltro già rilevata negli anni precedenti. Risulta evidente dal grafico di fianco riportato che, a livello di Programma, tale dinamica evidenzia al 31.12.2006 un livello della spesa certificata insufficiente (-38,4M€) al raggiungimento del *target* annuale previsto.

Tale risultato è prevalentemente attribuibile all'insufficiente avanzamento della spesa registrato dal FEOGA e dallo SFOP nel 2006.

Composizione della spesa monitorata

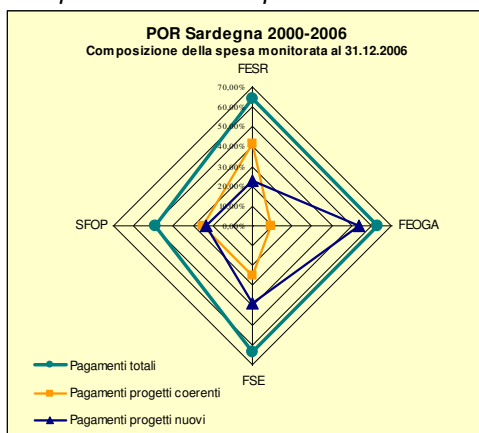

Dal grafico di fianco riportato risulta evidente, per ciascun Fondo il contributo dei progetti coerenti alla composizione della spesa monitorata al 31.12.2006.

I progetti coerenti – di I e II fase - contribuiscono alla copertura della spesa totale per il 48% e sono quelli in gran parte finanziati dal FESR, fondo rispetto al quale i pagamenti effettuati su tali progetti, alla data del 31.12.2006, raggiungono il 60,8% della spesa totale certificata. Seguono lo SFOP con un'incidenza dei progetti coerenti sulla spesa totale di circa il 52%, il FSE e il FEOGA con quote percentuali rispettivamente del 39,5% e del 14,8%. In valori assoluti, la composizione della spesa al 31.12.2006 può essere sintetizzata nel prospetto che segue.

POR 2000-2006 – Spesa monitorata al 31.12.2006 per Fondo

Fondo	Costo totale a	Spesa			Contributo progetti coerenti c/b
		Totale	di cui coerenti	di cui POR	
		b	c	d	
Fesr	2.600.980.000,00	1.649.662.254	1.002.094.419	647.567.836	60,8%
Fse	744.428.000,00	468.576.161	185.122.216	283.453.945	39,5%

¹ Sommatoria della quota comunitaria e della quota nazionale.



Feoga	837.156.000,00	521.602.651	77.056.456	444.546.195	14.8%
Sfop	54.022.000,00	36.740.830	19.062.391	17.678.440	51,9%
Totale	4.236.586.000,00	2.676.581.896	1.283.335.482	1.393.246.416	48%

Nell'anno in corso, tuttavia, è stata registrata una sensibile riduzione del contributo dei progetti coerenti all'avanzamento della spesa nell'ambito di azione del FESR (-5 punti percentuali) e dello SFOP (-10 punti percentuali) a fronte di un incremento registrato per gli altri due fondi: +13 punti percentuali per il FSE e +4 punti percentuali per il FEOGA.

FESR

Il grafico di sinistra evidenzia una capacità di spesa al 31.12.2006 del Fondo sufficiente (+2% circa) a garantire a fine anno il raggiungimento della soglia N+2.

A destra si evince il contributo determinante dei progetti coerenti all'avanzamento finanziario di alcune misure.

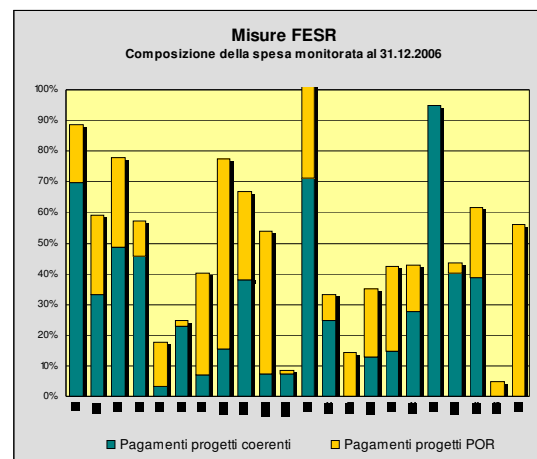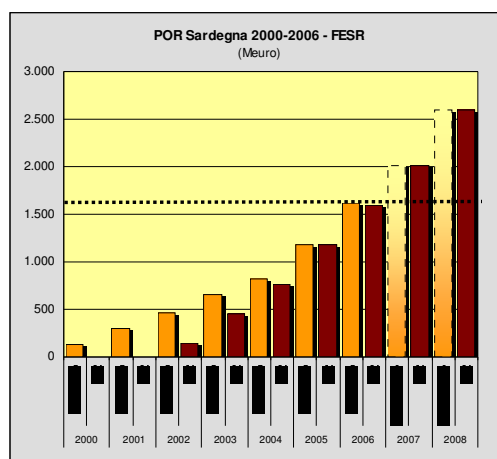

Il Fondo presenta una buona *performance* sia in termini di capacità di impegno sia in termini di spesa pari, rispettivamente, al 86,4% e al 63,4% del costo totale programmato, valori al di sopra della media del POR. Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 2.600.980.000,00 e di impegni monitorati pari a € 2.247.183.916,18, al 31.12.2006 sono stati effettuati pagamenti per € 1.649.662.254,28.

Come già sopra evidenziato alla fine dell'anno in corso la capacità di spesa del Fondo calcolata come rapporto tra pagamenti monitorati e costo totale, è assestata al 63% evidenziando un miglioramento dell'indicatore di efficienza della gestione di 15 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Le misure dell'Asse I contribuiscono in modo significativo all'avanzamento del Fondo: gli impegni delle "Risorse naturali" rappresentano infatti il 43% degli impegni del FESR e i pagamenti il 46% della spesa complessiva. Seguono le misure dell'Asse VI che incidono in termini di impegni per il 18% e in termini di pagamenti per il 17%. L'Asse II, che costituisce il 14% del costo totale programmato, incide per circa il 13% su impegni e spesa del Fondo.

Le misure con le migliori *performance* in termini di capacità di impegno sono la 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua*, la 1.4 *Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento*, la 4.1 *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*, la 6.1 - *Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente* e la 6.3 *Società dell'informazione*. Gli impegni in *overbooking* registrati su tali misure sono solo in parte riconducibili alla rendicontazione di "progetti coerenti" con le finalità del POR e del QCS.

In termini di spesa la Misura più efficiente è la 4.1: l'intera dotazione finanziaria al 31.12.2006 si è tradotta in pagamenti. Seguono le Misure 6.1 - *Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente*, 1.1 - *Ciclo integrato dell'acqua*, con il 94,9% e l'84,4% rispettivamente; le Misure 2.2 - *Archeologia industriale* con il 73% di avanzamento e 1.4 *Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento* con il 77,8%. Le restanti misure si attestano su livelli di spesa inferiori alla media del FESR (63,42%).

Il significativo avanzamento è stato prevalentemente determinato dalla Misura 4.1 *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*, che ha fatto registrare a fine anno un *overbooking* di pagamenti legato all'incremento nella rendicontazione delle operazioni

registrato nel mese di dicembre e connesso con le attività della linea d'azione a) "Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti di impresa nel settore industriale, artigianale e dei servizi".

Sei misure fanno ancora registrare una spesa inferiore al 30% del costo programmato: 1.6 *Energia*; 1.7 *Monitoraggio Ambientale*; 3.13 *Ricerca, sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio*; 4.2 *Pubblica Amministrazione per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva*; 4.4 *Sviluppo integrato d'area e di filiera*; 6.5 *Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti*.

Rispetto al conseguimento dei risultati si rileva che, relativamente all'Asse 1 – Risorse naturali, con l'attuazione della Misura 1.4 *Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento*, si è incrementata notevolmente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che è passata dall'1,7% del 2000 e al 4% del 2003, al dato attuale del 23%, che prefigura un sicuro raggiungimento del target a fine programma (35% al 2008). Analogamente per i siti potenzialmente contaminati, a seguito degli studi di caratterizzazione, sono state avviate le bonifiche di alcuni dei siti individuati con l'opera di monitoraggio e censimento attuata attraverso la Misura 1.7- *Monitoraggio ambientale*: alla data di riferimento 7 interventi di bonifica di importanti siti risultano conclusi. Va rilevato che gli interventi realizzati con risorse POR hanno contribuito a ridurre il numero dei siti censiti a inizio programma, passati da un valore complessivo di 691 ai 365 del 2004.

La Misura 1.5 *Rete ecologica regionale*, con gli 85 piani di gestione attivati supera il target previsto per l'indicatore *Superficie coperta da strumenti di gestione* (10%) attestandosi su un risultato del 60%. Anche gli *Enti locali coinvolti nei progetti*, 60% alla data di riferimento superano il target previsto per fine programma (40%).

La Misura 1.6 – *Energia*, attraverso il programma che prevede incentivi alle PMI per l'installazione di impianti fotovoltaici ha permesso l'installazione di 13 impianti aventi una potenza complessiva di 235,33 Kwp. Nessun risultato è stato conseguito per l'indicatore *Energia prodotta effettivamente consumata*, in quanto l'intervento di realizzazione di due minicentrali idroelettriche, nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari, risulta in corso di realizzazione.

Per la Misura 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua* si riscontra invece l'impossibilità di quantificare i risultati raggiunti rispetto alla riduzione delle perdite, sia in fase di adduzione che di distribuzione della risorsa idrica, rispetto al dato disponibile al 2000; tale valore era da considerarsi quale valore medio tra perdite fisiche e amministrative e pertanto non indicativo di un risultato effettivo in termini fisici. Attualmente il Gestore unico, affidatario del Servizio idrico integrato, attraverso il Piano Industriale regionale fornisce un dato pari all' 8,3% nella fase di adduzione e del 30% in fase di distribuzione, che si discosta dai valori forniti inizialmente da una pluralità di enti gestori, ma che è sicuramente più attendibile del dato di previsione. La sottomisura *Opere fognario-depurative*, con una *Capacità di depurazione* di 3.800.000 A.E. supera il valore atteso a fine programma (A.E. 3.430.000) così come con il secondo indicatore, *Utenze servite da depuratore*, che al 31.12.2006 risultano raggiunte per l'87,5% (incremento di 8 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2000).

Per quanto riguarda l'Asse 2 – Risorse culturali, i *Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza già esistenti*, censiti per la Misura 2.1 *Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici* raggiungono le 500.000 unità (dato incrementato di oltre 150.000 unità rispetto al 2000).

La Misura 2.2 *Archeologia industriale*, con 200.000 Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione registrati al 31.12.2006 e l'avanzata attuazione degli interventi fa prevedere il sicuro raggiungimento del target a fine programma (400.000 unità).

A conferma della buona performance finanziaria della Misura 2.3 *Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo*, si segnalano i risultati soddisfacenti conseguiti attraverso l'attuazione delle *Azioni di recupero, restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili storici per archivi e biblioteche*, poiché: il n. *degli Iscritti al prestito* si incrementa di 1.000 unità, le azioni relative alla realizzazione di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione e messa in rete fanno registrare un incremento di 1.000 *Rappresentazioni teatrali e musicali* e di 250.000 *Utenti delle attività di spettacolo e animazione* (rispettivamente 5.585 e 550.000 i target a fine programma).

Anche per la Misura 3.12 *Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione*, dell'Asse 3 Risorse umane, risultano conseguiti gli obiettivi già al 2006, poiché le *Scuole dotate di mensa* risultano 90, le *Scuole dotate di aule informatiche* risultano 700, le

Scuole dotate di laboratori linguistici e scientifici sono 900 e le Scuole dotate di spazi per attività sportive e ricreativo-culturali 650.



Per le misure dell' **Asse 4 Sistemi locali di sviluppo**, i risultati raggiunti confermano il trend finanziario: la *Misura 4.1 Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale* con gli *Investimenti sostenuti (cumulati)*, che ammontano a € 140.181.000, supera il 50% del valore atteso (€ 280.000.000) mentre gli *Investimenti sostenuti in nuove imprese (cumulati)* e gli *Investimenti sostenuti nei servizi (cumulati)* (rispettivamente € 59.599.000 e € 6.958.000 al 31.12.2006) superano il target di fine periodo. Per la *Misura 4.2 P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva* si registra un risultato significativo per l'indicatore *Comuni con SUAP associato o singolo* che sono 280 alla data del presente rapporto rispetto agli 8 del 2003 (valore atteso 338). Anche il *Tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività* passa dai 90 giorni del 2003 ai 60 giorni attuali raggiungendo il valore atteso a fine programma. Infine la *Misura 4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna* contribuisce a incrementare a 7,42 milioni le Presenze negli esercizi alberghieri (erano 6,3 milioni nel 2000).

La *Misura 5.1 Politiche per le aree urbane* dell'Asse 5 - Città registra il valore di 60 ha per la *Superficie degli interventi di riqualificazione urbana*, a fronte degli 85 stimati a fine programma, mentre per le Strutture per il turismo e il tempo libero e per le Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative il risultato raggiunto incrementa rispettivamente la *Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il tempo libero* di 1 mq e la *Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il verde* di 2 mq.

A valere sull'**Asse 6 Reti e nodi di servizio** la *Misura 6.3 Società dell'informazione* raggiunge e supera il target a fine programma previsto dall'indicatore *Utenti dell'Amministrazione regionale collegabili con via telematica*, in quanto, al 31.12.2006, tutti i 3.500 utenti dell'Amministrazione regionale risultano collegati in rete. Relativamente alla *Misura 6.1 Corridoio Plurimodale Sardegna – Continente*, per la *Durata percorrenza itinerario SS 125* si rileva una riduzione dei tempi medi di percorrenza di 24 minuti rispetto al dato medio rilevato nel 2000, 148 minuti è il tempo medio attuale e 100 minuti è valore atteso per fine periodo).

FSE

La domanda di pagamento del 21.12.2006, pari a € 481.546.527,26, evidenzia un soddisfacente avanzamento finanziario del Fondo Sociale Europeo, corrispondente al 64,68% dello stanziamento disponibile (€ 744.428.000,00).

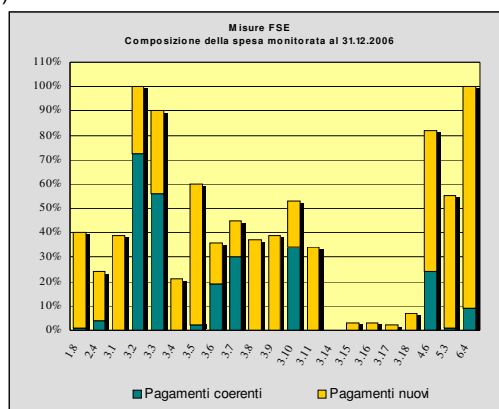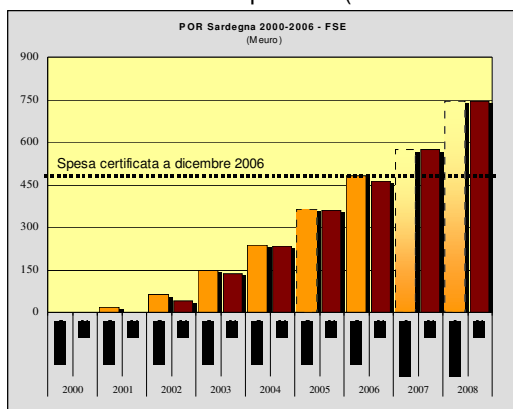

Le risorse allocate hanno prodotto un incremento di circa 105 Meuro, passando da € 513.444.534,11 a € 618.838.968,6, mentre le risorse erogate sono caratterizzate da un avanzamento di circa 117 Meuro rispetto a quanto registrato alla fine del 2005 (€ 364.119.812,42), superando di 15 punti percentuali circa, la metà della dotazione finanziaria del Fondo. L'avanzamento delle spese sopracitato è dovuto all'azione trainante di alcune misure, il cui ruolo si evince in modo chiaro da una rassegna dei rispettivi indici di realizzazione. La *Misura 3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro*, la *Misura 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, la *Misura 3.7 Formazione superiore e universitaria*, la *Misura 3.9 Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione*, la *Misura 3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale* e la *Misura 3.17 Formazione per le misure dell'Asse V* hanno fornito un apporto determinante ai fini dei risultati richiamati in

precedenza. Scendendo nel dettaglio, con l'azione "Carlo Magno" relativa agli interventi sull'obbligo formativo, la Misura 3.2 è quella che ha dato maggiore consistenza all'avanzamento finanziario del Fondo, benché essa tragga giovamento dalla rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR. Tale misura presenta una capacità di allocazione di risorse superiore al 100% del costo programmato ed una capacità di erogazione pari al 100%. Da porre in risalto è sicuramente il buon avanzamento delle Misure 3.6, 3.7, 3.9, 3.16 e 3.17 che pur non avendo raggiunto il livello realizzativo della Misura 3.2, palesano una crescita più forte, negli impegni e nei pagamenti, rispetto alle rimanenti misure dell'Asse III. In questo senso, si propongono all'attenzione le Misure 3.6, che rispetto al 2005 fa registrare un tasso di crescita del 38% circa sia nelle allocazioni che nelle erogazioni, e la Misura 3.7, la quale, a fronte della nuova situazione di *overbooking* negli impegni, evidenzia un tasso di crescita del 29% circa in tema di pagamenti. Resta, tuttavia, da sottolineare che tutte le misure citate ad esempio, eccetto la 3.2 il cui costo programmato ha avuto un forte incremento e la 3.17 che rispetto al 2005 ha conservato il medesimo costo, hanno subito un decremento della dotazione finanziaria in virtù dell'ultima rimodulazione del Piano Finanziario, così da far innalzare necessariamente le percentuali di realizzazione.

Sicuramente da menzionare sono inoltre le Misure 4.6, in *overbooking* in relazione agli impegni e con una percentuale della capacità di spesa pari a circa l'82% e la Misura 6.4, la quale pur esibendo una capacità d'impegno pari al 105% circa, aveva già raggiunto il 100% della spesa nel 2005.

Le difficoltà segnalate nel precedente Rapporto in ordine all'allocazione delle risorse sono state in parte superate, se si considera che gli impegni del 2006, nel loro totale, realizzano l'83% circa sul totale del costo programmato. Quest'ultima circostanza, in modo particolare, lascia prefigurare che nel corso del 2007 potrà essere raggiunto il traguardo della totale allocazione del *budget* del FSE.

Le azioni di assistenza tecnica sono state alimentate con l'obiettivo di assicurare un supporto costante nelle diverse fasi di realizzazione delle misure e delle operazioni e, di conseguenza, una crescente acquisizione di competenze.

Una continua e regolare attività di *audit*, protesa a garantire un miglioramento dell'attività di monitoraggio e controllo, ha caratterizzato, infine, i rapporti tra Autorità di Gestione e i Responsabili di Misura.

Con riferimento ai risultati conseguiti dalle Misure del Fondo si rileva quanto segue.

La Misura 3.1 *Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego*, nonostante le difficoltà iniziali legate al ritardo nel recepimento della riforma dei servizi per l'impiego, presenta nel suo complesso una *performance* soddisfacente. Tale affermazione trova conferma nell'indicatore di risultato *tasso di copertura* che a fronte di un *target* previsto pari al 40% registra al 31.12.2006 un valore pari al 75%. Tale risultato, se si considerano la capacità di impegno (57,8%) e di spesa (52,4%) della misura, sembrerebbe eccessivamente sovraordinato rispetto alla previsione di *target* di fine periodo. Tuttavia, è da rilevare che il calcolo dell'indicatore andrà parzialmente affinato in quanto l'attuale configurazione del SIL/Labora non consente al momento l'estrapolazione di un dato completamente depurato (il calcolo effettuato considera al numeratore come collocati gli avviati al 2° trimestre 2007 secondo il dato SIL; al denominatore considera come iscritti le persone in cerca di occupazione secondo il dato ISTAT nel II trimestre 2007).

La Misura 3.2 - *Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro*, che ha raggiunto il 100% delle realizzazioni, registra per l'indicatore di risultato *tasso di inserimento lordo* un valore pari a 43%. Tale valore è in linea con il *target* previsto di fine programma pari a 45%.

I valori degli indicatori della Misura 3.4 *Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati* corrispondono allo stato di attuazione della stessa: l'indicatore *tasso di inserimento lordo* rispecchia gli esiti dell'andamento degli interventi formativi che sono conclusi (valore 2006 14%, *target* previsto 15%); il valore registrato per l'indicatore *beneficiari delle politiche* è ancora basso rispetto al *target* previsto per fine programma perché la maggior parte degli interventi finanziati dalla misura è ancora in corso.



Con riferimento alla Misura 3.10 *Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego* si segnala un valore dell'indicatore al 2006 pari a 1.700 superiore al *target* previsto di fine periodo pari a 1.000. Dato che la misura non ha ancora esaurito la programmazione, il valore atteso a fine programma non potrà che aumentare.

Anche il valore registrato (0,7%) per l'indicatore *tasso di copertura* della Misura 3.11 *Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro*, se analizzato congiuntamente ai dati di attuazione finanziaria (capacità di impegno 45,08%, capacità di spesa 40,45%), fa presupporre il superamento del valore indicato in sede di programmazione quale *target* di fine periodo (0,9%).

I valori degli indicatori delle Misure 3.16 *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale* e 3.18 *Formazione per la società dell'informazione* vengono analizzati tenendo conto del fatto che le stesse hanno una misura omologa rispettivamente negli Assi IV (Misura 4.6) e VI (Misura 6.4) che copre il periodo di programmazione 2000 – 2003. Ciò premesso, tenuto conto del fatto che le misure 4.6 e 6.4 hanno speso l'intera dotazione finanziaria e che le corrispondenti misure dell'Asse III registrano valori soddisfacenti di attuazione, si può senz'altro affermare che l'andamento degli indicatori di risultato è in linea con la previsione di fine programma.

FEOGA

Al 31.12.2006 gli impegni assunti a valere sul Fondo FEOGA (€ 634.325.648,07) rappresentano il 76% del costo programmato, con un incremento del 17,61% rispetto al valore rilevato l'anno precedente. I pagamenti certificati, pari a € 462.822.164,52 (55% della dotazione finanziaria del Fondo) sono aumentati rispetto a quanto registrato alla fine del 2005 di 50,13 Meuro in valore assoluto e del 12,15% in termini percentuali.

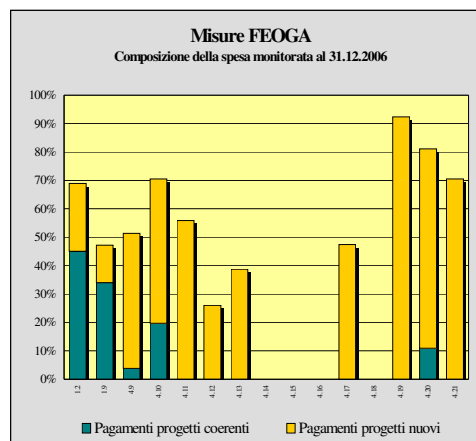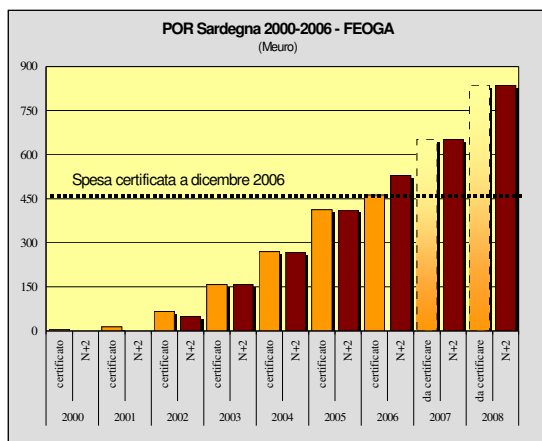

Le Misure che hanno maggiormente contribuito all'avanzamento della spesa sono la 1.2 *“Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole”*, la 4.20 *“Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura”*, la 4.21 *“Insediamento giovani agricoltori”* e la 4.10 *“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli”*. Ancora critico il livello di spesa (inferiore al 30% della propria dotazione finanziaria) delle Misure 4.12 *Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini*, 4.13 *Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale*, 4.14 *Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale* e 4.18 *Agricoltura: Formazione professionale specifica*.

Nel corso dell'anno sono state poste le basi per garantire il recupero dei ritardi accumulati.

Con riferimento alla Misura 4.12, sono stati pubblicati i bandi a valere sulle tre azioni in cui si articola la misura ed è stata programmata l'intera dotazione finanziaria. In relazione alla Misura 4.14, si rilevano notevoli progressi dal punto di vista procedurale: a maggio è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei progetti locali presentati dai Comuni e dai Consorzi di Comuni a valere sull'azione 4.14.a, a novembre ha fatto seguito la pubblicazione della graduatoria e nei primi mesi del 2007 si procederà all'emanazione dei decreti di concessione del contributo a favore dei beneficiari finali.

L'azione 4.14.b, invece, sarà attuata dall'Ente Foreste sulla base di un Programma di interventi in fase di definizione. Infine, per quanto riguarda la Misura 4.18 la graduatoria con la quale sono stati individuati gli Enti di Formazione professionale è stata approvata nel marzo 2006 e al 31 dicembre 2006 risultano avviati 12 corsi.

Nel corso del 2006 l'attuazione finanziaria del Fondo mostra una brusca frenata.

Il modesto avanzamento degli impegni deriva dalla insufficiente attività di emanazione di nuovi bandi nel 2005 e dallo slittamento della pubblicazione dei bandi 2006 nel secondo semestre dell'anno. Inoltre, le revoche, le rinunce e le economie di progetti già finanziati, hanno ulteriormente ridotto il livello degli impegni raggiunto precedentemente. Solo attraverso la rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR si è potuto in parte colmare e sopperire a tale decremento.

Ancora più critica la situazione dal lato dell'avanzamento delle spese certificate, che complessivamente ammontano a € 462.822.164,52, con una differenza rispetto all'obiettivo minimo (n+2) di € 66.845.054,54. L'applicazione della regola del disimpegno automatico comporterebbe per la Regione Sardegna la perdita di 56.818.296,36 euro, dei quali 33.422.527,27 euro di quota comunitaria e 23.395.769,09 euro di cofinanziamento nazionale.

Le difficoltà di avanzamento della spesa sono riconducibili:

- alla presenza di migliaia di progetti di investimento di piccola portata finanziaria cui si aggiunge la scarsa liquidità finanziaria delle aziende agricole aggravata dall'abbassamento dei prezzi all'origine delle principali produzioni regionali (es. latte ovino) che compromette la realizzazione delle opere nei tempi previsti, comporta la mancata erogazione dei saldi e in numerosi casi la rinuncia dei finanziamenti da parte delle aziende, oppure la revoca da parte dell'Amministrazione regionale;
- ai contenziosi che hanno avuto come effetto il ritardo o la sospensione dei lavori per la realizzazione di progetti cofinanziati sulle Misure 4.9 e 4.20.
- ai ritardi degli accertamenti di regolare esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle Misure gestite dai Servizi Ripartimentali (4.12, 4.17 e 4.21) ascrivibili alla mancanza di risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle missioni ai tecnici incaricati.

Con riferimento alla Misura 4.9, sono stati presentati 1.631 ricorsi gerarchici avverso le graduatorie. L'esame dei ricorsi presentati è avvenuto nel rispetto dei novanta giorni disponibili per la chiusura dei procedimenti, così come disposto all'art. 6 del DPR n. 1199/1971. L'elevato livello del contenzioso ha rappresentato un'anomalia rispetto all'andamento fisiologico delle procedure di attuazione, determinando la sospensione delle istruttorie di selezione delle operazioni e ovviamente lo slittamento dell'avvio degli interventi e dei pagamenti. La pubblicazione delle nuove graduatorie derivanti dall'accoglimento dei ricorsi gerarchici è prevista nel primo trimestre del 2007.

In relazione alla Misura 4.20, è stata accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale l'istanza di sospensiva avverso il bando di gara pubblicato dal Comune di Sinnai per l'esecuzione di un acquedotto rurale.

L'Autorità di Gestione del POR Sardegna, sulla base del notevole contenzioso generato dalle procedure di selezione del bando 2006 della Misura 4.9 e della sospensione della procedura di gara relativa alla Misura 4.20 ha richiesto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento CE 1260/99, la sospensione dell'applicazione della regola del disimpegno automatico per la somma di 73.160.678,94 euro di cui 36.580.339,47 di quota FEOGA.

Alla data del presente Rapporto, l'A.d.G. del POR Sardegna ha ricevuto la nota con la quale la Commissione Europea fornisce la motivazione della mancata accettazione della domanda di sospensione e invita le Autorità competenti, in caso di disaccordo sulla proposta di disimpegno, a trasmettere gli elementi che giustificano eventuali correzioni dell'importo da disimpegnare. L'Autorità di Gestione con nota del 27 aprile 2007 esprime il proprio disaccordo sulla proposta di disimpegno formulata dalla Commissione e fornisce gli elementi che, coerentemente con la normativa e la prassi comunitaria, giustificano la correzione dell'importo proposto a titolo di disimpegno automatico.

Vengono di seguito riportati gli indicatori di risultato relativi alle Misure Feoga comprese negli Assi I e IV del Programma. Gli interventi finanziati non sono ancora giunti a completa conclusione, ma la quantificazione, effettuata sulla base dei dati attualmente disponibili, fa rilevare un significativo avanzamento nell'attuazione delle misure.

Più in particolare per il FEOGA si evidenzia quanto segue.

Relativamente all'**Asse 1 – Risorse naturali**, per entrambi gli indicatori della *misura 1.9 Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva*, è stato raggiunto il target prefissato per la fine del programma. Risulta infatti ridotto il tempo di risposta dell'apparato antincendio rispetto alla richiesta di primo intervento a terra (è ormai inferiore ai 14 minuti) e la superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento risulta, come prefissato, inferiore ai 13,5 ettari.

Per l'Asse 4, lla Misura 4.9 *Investimenti nelle aziende agricole*, la percentuale delle aziende beneficiarie sul totale delle aziende agricole regionali (5%) risulta aver superato il target prefissato per la fine del programma (4,4%) e la SAU delle aziende agricole beneficiarie risulta essere il 10% circa della superficie agricola complessiva regionale.

L'attuazione della misura 4.10 *Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli* presenta un incremento dell'indicatore *Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura*, tale da permettere il superamento del target di fine periodo. Per quanto riguarda invece l'indicatore *Export di prodotti agroalimentari*, la quantificazione, effettuata sulla base di dati Istat 2006 provvisori, conferma la tendenza alla contrazione del valore in euro correnti delle esportazioni agro-alimentari regionali (136,22 milioni di euro il valore nel 2005). Tale inflessione è imputabile alla variazione del cambio dollaro/euro. La maggior quota di esportazione dei prodotti agroalimentari sardi (74% circa) è costituita dall'aggregato latte e derivati, il principale prodotto, pecorino romano, presenta una concentrazione delle esportazioni su un unico mercato di riferimento (Stati Uniti). La fluttuazione negativa del mercato e la conseguente caduta dei prezzi all'origine del latte ovino hanno provocato gravi conseguenze finanziarie.

La Misura 4.11 *Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità* raggiunge il target prefissato di 5 *Prodotti DOP e IGP della regione Sardegna* (agnello sardo e olio extra vergine di oliva Sardegna (IGP), Fiore sardo, pecorino romano e pecorino sardo (DOP).

Per quanto concerne la Misura 4.12 *Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini*, l'indicatore *Esercizi agro - turistici totali* si riferisce al totale delle aziende agrituristiche iscritte all'Albo Regionale. Il target a fine programma risulta ampiamente superato tranne per gli esercizi agro-turistici con intrattenimento. La Misura risulta in forte ritardo (su 315 interventi avviati quelli conclusi sono 67), il completamento degli interventi potrà determinare una migliore offerta di servizi agro-turistici mediante l'introduzione di attività qualificanti (es. fattorie didattiche).

Con riferimento alla Misura 4.13, risultano già soddisfatti i target prefissati per la fine del programma; risulta infatti sottoposto ad analisi il 99% della produzione regionale di latte vaccino e il 98% di latte ovicaprino.

In relazione alla Misura 4.14, *Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali*, a seguito dell'avviso pubblicato nel 2006 sono stati ritenuti ammissibili 39 progetti locali, il budget complessivo ha permesso il finanziamento dei primi 10 progetti in graduatoria.

Per quanto concerne la Misura 4.17, è opportuno specificare che il tasso di copertura delle aziende danneggiate dalle calamità naturali del 1999 è pari al 100%, devono invece essere conclusi gli interventi del bando 2006 relativi alla ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate dalle piogge alluvionali e dalle grandinate del 2005.

Sulla misura 4.19, Ricomposizione fondiaria, a confermare la buona performance finanziaria si affiancano risultati soddisfacenti, infatti, la SAU aziendale media dei beneficiari della Misura 4.19 risulta pari a 82,38 ettari.

Sulla Misura 4.20 *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura*, le aziende agricole servite da strade rurali risultano 18.279, si prevede, per la fine del programma e la conclusione degli interventi in corso di realizzazione il pieno soddisfacimento del target prefissato. Risultano 512 le aziende agricole servite da elettrodotto potenziati attraverso l'azione 4.20.c.



Per una corretta quantificazione dell'indicatore di risultato relativo alla misura 4.21 si è resa opportuna una sua modifica. I dati disponibili (Eurostat, Farm Structure Survey) permettono infatti di individuare i conduttori delle aziende agricole di età inferiore ai 35 anni e non ai 40, come precedentemente previsto.

Il valore indicato in tabella si riferisce alla rilevazione del 2003, in base alla quale l'indicatore generazionale, espresso dal rapporto tra conduttori con meno di 35 anni e di 55 anni ed oltre, si attesta a 0,07.

ASSE	Misura	Indicatore di risultato	unità di misura	Target	Risultati al 2006
ASSE 4 SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO	4.21 – Insediamento giovani agricoltori	Conduttori < 35 anni / conduttori >55	%	0,10	0,07

SFOP

Nel corso del 2006, le Misure 4.7 e 4.8, cofinanziate dallo SFOP, hanno fatto registrare un modesto avanzamento finanziario. Rispetto ai valori registrati alla fine del 2005, gli impegni

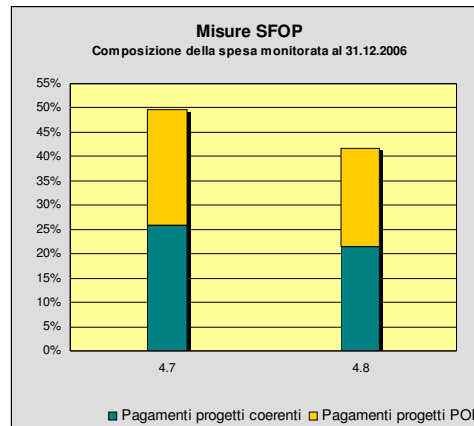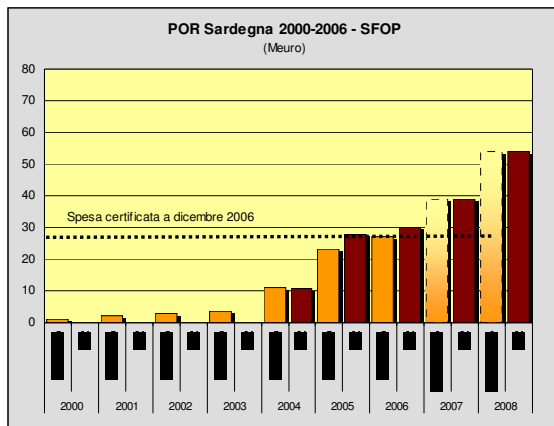

hanno prodotto un incremento di circa 1,3 Meuro (+ 2,83%) passando da € 47.733.112,76 a € 49.082.303,17 e i pagamenti una crescita di circa 4,7 Meuro (+ 12,60%), passando da € 32.013.901,55, a € 36.740.830,41.

La Misura 4.7, pur registrando un incremento maggiore di soli 3 punti percentuali rispetto alla Misura 4.8, contribuisce per l'85% alla crescita dei pagamenti del fondo, per effetto della più consistente dotazione finanziaria. Nel 2006 l'avanzamento finanziario realizzato è ascrivibile all'attuazione delle operazioni selezionate attraverso i bandi del 2004, in minor misura alla realizzazione dei progetti finanziati con i bandi del 2001 e del 2002 e, in minima parte alle operazioni finanziate attraverso il bando del 2006 concernente la sottomisura 4.8 A) *Piccola pesca costiera*.

Al 31.12.2006 i pagamenti rendicontati a valere sullo SFOP non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di spesa. L'A.d.G. del POR Sardegna, con nota 21929 del 22 dicembre 2006 ha chiesto alla Commissione europea la sospensione del disimpegno automatico delle risorse finanziarie in base all'applicazione dell'art. 31 punto 2 cpv. 3 del Reg. (CE) 1260/99. Le motivazioni addotte riguardano i contenziosi che hanno avuto come effetto il ritardo o la sospensione dei lavori per la realizzazione di sei progetti cofinanziati sulla Misura 4.7 *"Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione"* per un importo totale pubblico di € 3.475.122,08. Non essendo pervenute osservazioni contrarie da parte della Commissione, la richiesta di sospensione si ritiene accettata e si può quindi ritenere scongiurato il disimpegno delle risorse.

1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1.1. Evoluzione del contesto

Non si segnalano per il 2006 dinamiche od eventi significativi tali da incidere sul contesto di riferimento del Programma operativo.

2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE

2.1. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'Intervento ed eventuali misure adottate

Le iniziali difficoltà di carattere organizzativo che tanto hanno influito sull'andamento del Programma, difficoltà peraltro già denunciate in occasione dei precedenti Rapporti, hanno attivato un processo di selezione di azioni conseguenti che ha permesso il consolidamento di procedure e strumenti tali da consentire, da un lato, un'evoluzione dei processi di spesa sufficiente per allontanare la minaccia del disimpegno automatico e, dall'altro, il ridimensionamento dell'impegno dell'Amministrazione nella gestione vera e propria del Programma.

Iniziative particolarmente significative e incisive sotto il profilo organizzativo sono state avviate con gradualità, dovendo definire e condividere le relative procedure di attuazione su più livelli e settori d'intervento.

In effetti, pure se già nel 2005 è stato portato a compimento un primo provvedimento di rafforzamento delle direzioni generali maggiormente coinvolte nella gestione dei fondi comunitari, un'iniziativa più efficace e puntuale rispetto alle effettive esigenze dell'Amministrazione ha preso il via nel 2006 ed è rappresentata dalla predisposizione del Piano di fabbisogno del personale 2005-2008². Sulla base di esigenze specifiche e priorità espresse dalla Giunta regionale, a fine 2006 sono state, infatti, selezionate figure specialistiche destinate ad affiancare l'Amministrazione sulle tematiche inerenti le politiche comunitarie³.

Analoga priorità ha caratterizzato il piano di assunzioni per il 2006⁴, attivato per le fasce dirigenziali destinate all'area economico/finanziaria delle politiche comunitarie e delle politiche sociali.

Contestualmente a questo articolato programma di rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione, sono stati realizzati moduli formativi di approfondimento riguardanti le politiche comunitarie e la gestione dei fondi del POR rivolti sia ai funzionari assunti nel biennio 2004/2005, sia ai funzionari già in servizio presso l'Amministrazione. Tale attività è stata reiterata nel 2006 e sarà ripetuta nel 2007.

In tale contesto occorre altresì segnalare la proficua esperienza derivante dall'attivazione dei nuovi strumenti di programmazione quali la Nuova Progettazione Integrata e i Programmi di Alta Formazione. Strumenti attraverso i quali sono stati sperimentati innovativi processi di analisi del territorio e verifica dei fabbisogni di concerto con l'istituzione di organismi partenariali e tecnici di concertazione e gestione della programmazione.

FESR

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

Pure in presenza di un sostanziale *trend* positivo del Fondo sotto il profilo dell'avanzamento della spesa e di un ormai attivato processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi, permangono anche nel 2006 talune criticità: da un lato quelle legate al sottodimensionamento della struttura amministrativa, dall'altro quelle connesse con le specificità attuative di talune misure che sensibilmente influenzano la tempistica realizzativa delle operazioni e che talvolta non si conciliano con la tempistica di attuazione della programmazione comunitaria.

Le principali problematiche riguardano in particolare:

- la già denunciata inadeguatezza della qualità progettuale manifestata dai beneficiari finali delle operazioni infrastrutturali e alla non tempestiva risposta degli stessi nella fase di rendicontazione della spesa, alle quali è stato dato seguito mettendo a disposizione degli stessi, per il tramite dei Responsabili di Misura, un'assistenza tecnica dedicata.

² Di cui alle deliberazioni n.21/19 del 17.05.2005 e n. 42/1 del 06.09.2005.

³ Concorsi banditi con DA n. 972/P e DA n. 976/P del 16 settembre 2005.

⁴ Di cui alla Deliberazione 15/15 del 13.04.2006 e il bando di concorso DA n. 589/P del 10.07.2006.

Originariamente attivata per accompagnare le attività progettuali e amministrative delle operazioni pertinenti le misure 2.1 e 5.1 del POR, a fine anno è stata estesa, con l'aggiudicazione del *Bando per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica specialistica a favore degli enti locali della Sardegna, beneficiari finali delle operazioni finanziate dal POR*⁵, anche alle Misure 1.1 (per la parte gestita dall'Assessorato Lavori pubblici), 1.3, 2.3 e 4.5;

- il prolungamento delle attività connesse all'elaborazione della progettazione esecutiva e, talvolta, dell'affidamento lavori, che ha imposto per talune misure, di prevedere tra i criteri di ammissibilità delle operazioni la presenza di un livello progettuale non inferiore alla progettazione definitiva;
- l'inerzia dei beneficiari finali, in particolare gli enti locali, rispetto alle istanze dell'Amministrazione in termini di rispetto dei cronogrammi concordati, verso i quali l'Amministrazione nel corso del 2006 è intervenuta attivando procedure di revoca dei finanziamenti e decadenza dei benefici.

FSE

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

Il FSE rileva alcune criticità di carattere organizzativo e procedurale, conseguenza soprattutto del sottodimensionamento della struttura organizzativa. Legati a tali difficoltà si evidenziano alcuni elementi di continuità in rapporto alle novità nella programmazione degli interventi segnalate nel RAE del 2005, particolarmente per quanto concerne le politiche del lavoro.

Dal punto di vista organizzativo è d'uopo segnalare la considerevole perdita di unità lavorative che l'Assessorato del *Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale* ha subito nel corso del 2006. Tale situazione è da ricondurre ad un processo di riorganizzazione interna della Regione, anche in termini di snellimento e professionalizzazione dell'organico, conseguente ai recenti provvedimenti legislativi in materia di decentramento amministrativo e trasferimento di competenze alle Province e agli Enti locali. La riduzione d'organico dell'Assessorato palesa il rischio di ripercussioni negative sulle molteplici linee d'attività dello stesso, non ultime l'utilizzo e la spendita delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. Pertanto, le problematiche di natura organizzativa persistono nonostante nell'anno in questione abbiano trovato continuità alcune iniziative avviate nel corso del 2005 e finalizzate a contenere, da una parte, le carenze della struttura organizzativa dei settori dell'Amministrazione responsabili della gestione del Fondo, dall'altra, a semplificare le procedure di attuazione delle misure.

Per quanto riguarda le difficoltà di tipo organizzativo, infatti, si è provveduto a dare seguito alle innovazioni introdotte negli anni precedenti, quali il cosiddetto "Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi" da cui si attinge per formare le commissioni di valutazione ed il ricorso al "lavoro interinale" per l'implementazione delle risorse umane addette al monitoraggio degli interventi FSE.

Le criticità organizzative sono riconducibili non solo a una dotazione di personale non adeguata, in termini numerici, rispetto al maggiore carico di lavoro che l'attuazione del POR ha comportato, ma anche ad esigenze di tipo specialistico-formativo. A tal proposito, in linea con il processo di riorganizzazione della Regione sopracitato ed attraverso la Misura 3.9 "Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione", è previsto, nei primi mesi del 2007, l'avvio di un "Programma di Sviluppo delle Competenze del Management della Regione e di supporto al processo d'innovazione del sistema regionale".

Dal punto di vista procedurale si conferma quanto già palesatosi nel corso dell'annualità precedente, ossia il superamento dell'eccessiva durata dei tempi intercorrenti dalla data di pubblicazione dei bandi a quella di approvazione delle graduatorie finali, che è passato da circa 1 anno a poco più di 5 mesi grazie all'elaborazione ed attuazione di procedure più agili nella selezione di proposte progettuali.

Nella stessa ottica il servizio di "controllo rendicontale", già affidato nel corso del 2005, che consente la verifica amministrativo-contabile della documentazione di spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei rendiconti finali trasmessi dalle Agenzie formative, prosegue nel suo operato

⁵ Di cui alla Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 265 del 29/6/2006.

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di snellimento delle procedure attuative delle misure.

FEOGA

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

Per quanto attiene al FEOGA, permangono le criticità di natura organizzativa all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura, dei Servizi Territoriali e dell'ERSAT (l'Ente strumentale delegato alla gestione delle misure 4.9, 4.10 e 4.11); alcune azioni correttive di natura attuativa-procedurale sono state adottate in parte nel corso degli anni precedenti.

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle fasi connesse alla presentazione delle domande di contributo, sono state adottate procedure finalizzate all'applicazione concreta delle leggi regionali in materia di organizzazione amministrativa a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Ciò ha consentito ai Responsabili di Misura di approvare direttamente i provvedimenti amministrativi conformi alle direttive di attuazione della Giunta regionale e concernenti la presentazione delle domande, la selezione e attuazione delle operazioni, nonché di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto tramite la pubblicazione di Bandi o di appositi Avvisi pubblici.

Riguardo l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità e di priorità, le modifiche apportate al Complemento di programmazione hanno consentito di semplificare e accelerare le procedure di selezione delle domande.

In sede di selezione e valutazione delle domande, la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità viene effettuata sulla base delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, consentendo una notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra termine di presentazione delle domande e approvazione delle graduatorie.

Nel 2005, al fine di accelerare i tempi di realizzazione delle operazioni e snellire ulteriormente le procedure tecnico-amministrative, è stata modificata la modalità di erogazione dell'anticipazione per le misure 4.9, 4.10 e 4.12 prevedendo un'unica soluzione pari all'80% del contributo.

La riduzione dei tempi intercorrenti tra pubblicazione della graduatoria ed emanazione del provvedimento di concessione del contributo richiede adeguamenti strutturali e organizzativi connessi all'espletamento della fase di istruttoria tecnica delle domande ammissibili.

Benché siano stati attuati diversi interventi di natura correttiva dell'assetto organizzativo dei Servizi dell'Assessorato⁶ e sia stato operato il coinvolgimento dell'ERSAT⁷, il ritardo nella soluzione, peraltro sempre parziale e mai definitiva, della carenza di risorse umane comporta un'intrinseca debolezza dell'intera struttura tecnico-amministrativa preposta alla gestione degli interventi del POR.

Le soluzioni adottate negli anni precedenti con l'utilizzo di contratti interinali non hanno sortito effetti duraturi, in quanto alla scadenza dei predetti contratti di lavoro si sono ripresentate le precedenti criticità, con la conseguente difficoltà, per il personale ordinario a svolgere in maniera compiuta tutti gli adempimenti previsti dal Programma.

Nel 2006, al fine di superare le carenze di organico e far fronte al carico di lavoro necessario per il completamento della Programmazione 2000 – 2006, si è ricorso a forme straordinarie di assistenza tecnica rivolte in particolare ai Servizi Ripartimentali di Cagliari, Oristano e Nuoro per lo svolgimento delle funzioni attinenti l'istruttoria, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei

⁶ L'assetto organizzativo dei Servizi dell'Assessorato istituiti con DPGR 4/2000 era fondato su una logica "di filiera" non rispondente allo sviluppo e attuazione di strategie di intervento orizzontali alle strutture produttive, le infrastrutture, la valorizzazione e promozione delle produzioni agricole, lo sviluppo rurale. Con DGR n. 17/20 del 30.05.2002, DGR n. 21/49 del 16/07/2003 e infine con Decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28.04.05, è stata approvata un'articolazione dei Servizi che si suppone funzionale all'attuazione delle azioni – misure di intervento agricolo e rurale e successivamente sono stati nominati i Direttori dei Servizi di nuova istituzione.

⁷ La carenza di figure tecniche, negli uffici dei Servizi centrali e Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura, rispetto alla notevole attività amministrativa e tecnica connessa all'attuazione delle diverse azioni di sviluppo rurale e di ammodernamento delle strutture agricole ha determinato la decisione (DGR n. 48/22 del 28.12.2001 e DGR 14/25 del 13.05.2003) di trasferire all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT) i compiti istruttori connessi all'attuazione di alcune Misure (4.9 – 4.10 – 4.11). Il trasferimento dei compiti istruttori all'ERSAT è regolato da apposita Convenzione (stipulata in data 05.08.2002) che definisce procedure, modalità e tempi entro i quali svolgere l'attività.

progetti finanziati a valere sulle Misure 4.12, 4.17 e 4.21. I professionisti individuati hanno cominciato la loro attività alla fine del 2006.

In relazione alla Misura 4.14, a maggio è stato pubblicato l'Avviso pubblico relativo all'azione 4.14.a, rivolto alla selezione dei progetti locali presentati dai Comuni e dai Consorzi di Comuni cui ha fatto seguito, nel mese di novembre, la pubblicazione della graduatoria. Nei primi mesi del 2007 si procederà all'emanazione dei decreti di concessione del contributo a favore dei beneficiari finali. Nel mese di giugno 2006 l'Autorità di Gestione ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR, tra i quali sono compresi i Comuni e i Consorzi di Comuni finanziati con la Misura 4.14. L'affidamento dell'incarico è avvenuto al termine dell'anno ed a partire dal 2007 sarà garantito anche il supporto e l'assistenza tecnica dedicata agli Enti Locali per l'espletamento degli adempimenti amministrativi necessari alla gestione ed al controllo delle numerose operazioni comprese nei progetti locali ammessi a finanziamento.

La più rilevante criticità rilevabile nel corso del 2006 è senz'altro rappresentata dal forte rallentamento dell'esecuzione finanziaria del Fondo.

Per quanto concerne gli impegni, si è registrato un insufficiente avanzamento, imputabile in primo luogo alla modesta attività di emanazione di nuovi bandi nel 2005 e allo slittamento della pubblicazione dei bandi del 2006 nel secondo semestre dell'anno, e, in secondo luogo, alle revoche, rinunce ed economie relative a progetti già finanziati che hanno contribuito a ridurre il livello degli impegni precedentemente raggiunto.

Maggiormente problematica la situazione dal lato dell'avanzamento della spesa.

Le spese certificate con la domanda di pagamento del dicembre 2006 ammontano a 462.822.164,52 euro, con una differenza rispetto alla soglia del disimpegno automatico di 66.845.054,54 euro.

Tale minore spesa è riconducibile a diversi ordini di problemi.

In primo luogo la presenza di migliaia di progetti di investimento di piccola portata finanziaria cui si aggiunge la scarsa liquidità finanziaria delle aziende agricole aggravata dall'abbassamento dei prezzi all'origine delle principali produzioni regionali (es. latte ovino) compromette la realizzazione delle opere nei tempi previsti, comporta la mancata erogazione dei saldi e in numerosi casi la rinuncia dei finanziamenti da parte delle aziende, il ridimensionamento degli investimenti precedentemente previsti oppure la revoca da parte dell'Amministrazione regionale. Si può stimare una riduzione del 30% circa del valore iniziale delle domande ammesse a finanziamento sulle Misure 4.9 e 4.10 per effetto delle revoche, delle rinunce e delle minori realizzazioni.

Per quanto concerne la mancanza di liquidità delle aziende agricole, è imprescindibile un'analisi delle criticità che hanno colpito il comparto agricolo regionale e che hanno avuto ripercussioni sulla capacità di investimento e sul rispetto della tempistica prefissata da parte delle aziende destinatarie degli aiuti. A tal proposito si rammentano la siccità e le alte temperature degli anni 2000-2001-2002 e in particolare del 2003 e del 2005, il virus giallo del pomodoro, che ha danneggiato le produzioni delle annate 2002/2003 e 2003/2004; l'epidemia di peste suina africana del 2004 e il costante problema della peste suina classica, l'epidemia di blu tongue del 2004 alla quale si sono aggiunti i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante e infine la crisi di mercato del carciofo e degli ortaggi in generale, che ha avuto inizio nell'autunno del 2006.

Si sottolinea che per il superamento delle suddette criticità sono state avviate regolari procedure di aiuto volte a risarcire gli agricoltori per i danni subiti, ma i tempi procedurali necessari per dare attuazione agli aiuti non permettono l'immediata soddisfazione delle aziende, che, seppur indennizzate con la massima celerità, non riescono a gestire in modo ordinario le liquidità finanziarie.

Un altro problema che ha ostacolato la velocità di spesa è costituito dall'insufficienza delle risorse finanziarie regionali necessarie per il pagamento delle missioni ai tecnici incaricati degli accertamenti di regolare esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle Misure gestite dai Servizi Ripartimentali (4.12, 4.17 e 4.21). Come precedentemente descritto, tale criticità dovrebbe essere superata nel 2007 grazie al ricorso all'assistenza tecnica dedicata ai Servizi Ripartimentali di Cagliari, Oristano e Nuoro, rivolta all'accelerazione delle procedure di istruttoria e controllo dei progetti finanziati a valere su tali Misure.

Il livello insoddisfacente della spesa è comunque principalmente attribuibile al problema dei contenziosi che hanno avuto come effetto il ritardo o la sospensione dei lavori per la realizzazione di progetti cofinanziati sulle Misure 4.9 e 4.20.

Con riferimento alla Misura 4.9, sono stati presentati 1.631 ricorsi gerarchici avverso le graduatorie. L'esame dei ricorsi presentati è avvenuto nel rispetto dei novanta giorni disponibili per la chiusura dei procedimenti, così come disposto all'art. 6 del DPR n. 1199/1971. L'elevato livello del contenzioso ha rappresentato un'anomalia rispetto all'andamento fisiologico delle procedure di attuazione, determinando la sospensione delle istruttorie di selezione delle operazioni e ovviamente lo slittamento dell'avvio degli interventi e dei pagamenti. La pubblicazione delle nuove graduatorie derivanti dall'accoglimento dei ricorsi gerarchici è prevista nel primo trimestre del 2007.

Con riferimento alla Misura 4.20, è stata accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale l'istanza di sospensione avverso il bando di gara pubblicato dal Comune di Sinnai per l'esecuzione di un acquedotto rurale.

L'Autorità di Gestione del POR Sardegna, sulla base del notevole contenzioso appena descritto, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento CE 1260/99, la sospensione dell'applicazione della regola del disimpegno automatico per la somma di 73.160.678,94 euro di cui 36.580.339,47 di quota FEOGA.

L'A.d.G. del POR Sardegna ha però ricevuto la nota con la quale la Commissione Europea fornisce la motivazione della mancata accettazione della domanda di sospensione e invita le Autorità competenti, in caso di disaccordo sulla proposta di disimpegno, a trasmettere gli elementi che giustificano eventuali correzioni dell'importo da disimpegnare. L'Autorità di Gestione con nota del 27 aprile 2007 ha espresso il proprio disaccordo sulla proposta di disimpegno formulata dalla Commissione e ha fornito gli elementi che, coerentemente con la normativa e la prassi comunitaria, giustificano la correzione dell'importo proposto a titolo di disimpegno automatico.

SFOP

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

L'attuazione delle Misure SFOP è affidata al Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che si occupa anche del coordinamento regionale dell'attuazione del PON Pesca.

Durante gli esercizi di autovalutazione e in sede di Comitato di Sorveglianza, è stato più volte evidenziato il sotto-dimensionamento del Servizio.

Nell'ottica di garantire un sostegno tecnico nelle diverse fasi di realizzazione delle misure e delle operazioni, con il ricorso alla Misura 7.1 "Assistenza Tecnica", l'Autorità di Gestione ha stipulato una convenzione con un agronomo esperto in acquacoltura e con un ingegnere. Le due figure professionali individuate collaborano nel Servizio alle attività di istruttoria e valutazione dei progetti presentati, garantendo inoltre un'attività di "orientamento" dei potenziali destinatari della progettazione.

Grazie al loro supporto, la qualità dei progetti presentati è notevolmente migliorata e i tempi di approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei bandi pubblicati nel corso del 2004, si sono ridotti per i progetti di acquacoltura, trasformazione e commercializzazione. Non si rileva invece un'analoga accelerazione per quanto concerne la sottomisura 4.8 C) "Promozione e ricerca di nuovi sbocchi", la graduatoria relativa al bando del 2004 è stata pubblicata nel 2006.

Anche nell'ultima fase di programmazione si registrano dei rallentamenti procedurali, in particolare nello slittamento dei tempi previsti per la pubblicazione del bando relativo alla misura 4.7 e di quello relativo alle sottomisure 4.8.A e 4.8.B, annunciata per entrambi nel primo trimestre del 2006 e posticipata rispettivamente ad agosto e dicembre 2006. Nel caso del bando della misura 4.7 lo slittamento è da ricercare nei tempi necessari all'AdG per verificare e garantire la coerenza degli interventi previsti con i processi innovativi di sviluppo locale integrato previsti nella revisione di medio periodo del POR.

Nella seconda metà del 2006, la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in considerazione dei consistenti carichi di lavoro derivanti dalla gestione delle Misure in esame, ha proceduto ad una ricognizione delle risorse umane disponibili ed ha provveduto ad assegnare al Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura due funzionari tecnici che contribuiranno allo snellimento ed all'accelerazione delle procedure attuative relative alle Misure in oggetto.

Infine, tra le criticità di natura procedurale si sottolinea l'elevato grado di irregolarità rilevate dall'Ufficio di controllo di II livello.

Da sottolineare che l'alta percentuale di irregolarità riscontrate è attribuibile ai progetti finanziati attraverso i bandi emanati nelle prime annualità di gestione del Programma, periodo caratterizzato dal sopraccitato sotto-dimensionamento del Servizio responsabile della gestione del Fondo. La carenza di personale è sicuramente all'origine di alcune irregolarità procedurali che seppur di scarsa gravità rivelano una certa sistematicità.

Sulla base delle verifiche effettuate presso gli Uffici del Responsabile di Misura, dei beneficiari e dei destinatari finali delle operazioni esaminate, si evidenziano irregolarità riguardanti:

- correttezza della documentazione amministrativa (carenze progettuali, carenze nella documentazione richiesta (per es. mancata sottoscrizione dell'atto di nomina da parte del Direttore dei lavori, mancata copia del contratto stipulato con il consulente progettista, etc)
- rispetto dei tempi precedentemente previsti (avvio dei lavori, adempimenti procedurali).

In sintesi, le più numerose criticità segnalate riguardano il mancato rispetto delle regole in materia di archiviazione della documentazione da parte dei beneficiari e dei destinatari dei finanziamenti.

Attualmente, in seguito alla segnalazione delle irregolarità riscontrate dall'Ufficio del controllo di II livello al Responsabile di Misura, sono state avviate ulteriori attività di accertamento.

Una più capillare attività di controllo di I livello, che ridurrà notevolmente il livello delle irregolarità sarà garantito dalla riorganizzazione degli uffici responsabili conseguente alla Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura (L.R. 8 agosto 2006 n.13). A questo proposito è necessario specificare che l'attività di gestione ed erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna è trasferita all' Argea Sardegna che subentra all'esercizio di parte delle funzioni svolte dall'Ersat e dai Servizi Ripartimentali dell'agricoltura precedentemente in capo all'Assessorato dell' agricoltura e riforma agro-pastorale.

Inoltre, in seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 37/23 del 25.9.2007 le competenze in materia di pesca e le funzioni di Autorità di Pagamento dello SFOP saranno trasferite dall'Assessorato all'Ambiente a favore dell'Assessorato dell'Agricoltura.

All'interno di Argea Sardegna, che come sopra accennato curerà la gestione degli aiuti comunitari, sarà istituito un Ufficio ispettivo che si occuperà in particolar modo delle verifiche relative al rispetto del mantenimento della destinazione economico sociale dei beni oggetto di finanziamento. Tale rinnovato assetto organizzativo permetterà una più efficace attività di controllo con la conseguente riduzione delle eventuali irregolarità.

2.2. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione

Nel corso dell'incontro annuale tenutosi a Palermo il 16 e il 17 ottobre 2006 tra la Commissione e le Autorità di Gestione italiane dei Programmi Regionali dell'Obiettivo 1 sono stati trattati i temi generali riguardanti i contenuti del rapporto annuale di esecuzione 2006, le prospettive di rispetto della regola "n+2" per l'anno 2006, gli orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-2006 e le attività di preparazione del periodo di programmazione 2007-2013.

Gli argomenti che più direttamente hanno interessato la Regione Sardegna e l'attuazione del POR sono stati:

- l'assicurazione da parte dell'Amministrazione a conseguire il livello di spesa previsto per il 31.12.2006 che eviti il disimpegno automatico;
- l'impegno a riassegnare le risorse liberate.

2.3 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni adottate

Data delle riunioni e principali decisioni adottate

Nel 2006 si sono tenuti due Comitati di Sorveglianza: il primo in data 1 Febbraio e il secondo in data 24 Giugno. In particolare, in quello di febbraio sono state approvate:

- le proposte di modifica al Complemento di Programmazione;
- il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza relativo ai termini della consultazione scritta.

Il CdS ha inoltre preso atto:

- della Decisione C(2005) 4820 del 1° Dicembre 2005 della Commissione Europea di approvazione del POR;
- dell'aggiornamento della valutazione intermedia consegnato dal Valutatore indipendente nella sua versione definitiva il 30.12.2005.
- dello Stato di avanzamento del POR al 31.12.2005 che prevede:
 - lo stato di avanzamento del programma per Assi e Misure al 31.10.2005 nei *report* standard predisposti dall'IGRUE;
 - l'avanzamento della spesa certificata al 31.12. 2005;
 - l'elenco aggiornato dei Progetti Coerenti
 - la presentazione delle previsioni di attuazione per le Misure critiche;
 - lo stato di attuazione dei Grandi Progetti
- dello Stato degli adempimenti previsti dal QCS, dal POR e dal CdP
- delle azioni per migliorare e potenziare la capacità di gestione, attuazione monitoraggio e controllo del POR;
- del Piano Regionale per l'Internalizzazione delle Competenze;
- dello stato di avanzamento del nuovo percorso della Programmazione territoriale e della Progettazione integrata;
- delle attività poste in essere nell'ambito del Piano di Comunicazione;
- degli approfondimenti tematici e progetti innovativi nella prospettiva di Lisbona;
- della comunicazione sul percorso e sulle attività relativa alla nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013;
- delle comunicazioni sulla chiusura dei Programmi del periodo di programmazione 1994/1999.

Nel Comitato di Sorveglianza del 24 Giugno sono state approvati:

- il Rapporto annuale di esecuzione per l'anno 2005;
- le proposte di modifica del Complemento di Programmazione

Il CdS ha inoltre preso atto:

- dello Stato di avanzamento del POR al 30.04.2006;
- degli approfondimenti tematici relativi a:
 - il Piano per il Turismo sostenibile;
 - lo Stato di attuazione dei Grandi Progetti;
- dell'informativa sullo stato di avanzamento del nuovo percorso della Programmazione territoriale e della Progettazione integrata;
- delle attività realizzate nell'ambito del Piano di Comunicazione;
- del censimento e collaudo della cartellonistica, effettuato per garantire l'osservanza, monitoraggio e il controllo del rispetto delle previsioni del Reg. (CE) 1159/99;
- delle comunicazioni sul percorso e sulle attività relative alla nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 e, in particolare:
 - sull'informativa relativa ai DSR e ai POSR;
- dell'informativa sulla Valutazione ex ante e sulla Valutazione ambientale strategica;
- delle Comunicazioni sulla chiusura dei Programmi del periodo di programmazione 1994/1999 e, in particolare:
 - gli ulteriori controllo sul FESR per il POP 1994/99;
 - la chiusura del PIC Leader II.

Data delle procedure scritte e principali decisioni adottate

Il 3.3.2006 (Prot. n. 2728) è stata attivata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione della Sintesi del Comitato di Sorveglianza del 1° Febbraio 2006.

Il 14.04.2006 (Prot. 3348) è stata attivata la procedura scritta per l'approvazione del Verbale del Comitato di Sorveglianza del 1° Febbraio 2006, che si è conclusa l'11.05.06.(Prot. n.3864).

Il 26.09.2006 (Prot. 18570) è stata avviata la procedura scritta per l'approvazione del Verbale del Comitato di Sorveglianza del 23.06.2006 che si è conclusa il 20.10.2006 (Prot. 19730).

Il 14.11.2006 (Prot. 20397) è stata avviata la procedura scritta per la modifica al Complemento di Programmazione, che si è conclusa in data 1.12.2006 (Prot. 21022)

Il 6.12.2006 è stata avviata la procedura scritta per la modifica del POR (Prot. 21176).

Eventuali riunioni di Gruppi di lavoro

Nel corso dell'anno si sono svolti degli incontri di approfondimento con il Comitato di Coordinamento del Programma e con il Partenariato istituzionale, economico e sociale che hanno riguardato principalmente la condivisione delle proposte di modifica del Complemento di Programmazione, il processo di attuazione del Programma, le procedure per l'attuazione del nuovo corso sulla Progettazione integrata, le attività proposte per il nuovo corso di programmazione 2007-2013.

2.4. Ricorso all'Assistenza tecnica

Nel 2006 l'Autorità di Gestione, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla norma 11, par. 2.4 del Reg. CE 448/2004, si è avvalsa della disponibilità finanziaria della Misura 7.1 – Assistenza tecnica per proseguire nelle diverse azioni di supporto al POR Sardegna, così sinteticamente riassumibili:

- monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento e valutazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario, del rispetto della tempistica di realizzazione e della coerenza con la programmazione regionale;
- assistenza all'attuazione del Programma, alla supervisione dei tempi e delle procedure di attuazione delle Misure;
- assistenza tecnica specialistica di supporto all'Autorità di gestione e ai Responsabili di Misura nelle fasi di completamento dei programmi, nelle fasi di verifica e controllo di primo livello;
- supporto alle attività del Comitato di Sorveglianza nonché all'Autorità di Pagamento. Inoltre, con riferimento all'Ufficio di Controllo di secondo livello, nel corso del 2006 si è provveduto a selezionare attraverso procedura di evidenza pubblica una società incaricata per l'assistenza tecnica e supporto alla struttura responsabile delle attività connesse ai controlli di secondo livello e alla Dichiarazione a conclusione degli interventi del POR 2000-2006 e del Programma Leader Plus;
- attività di affiancamento alle diverse professionalità operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, preposte direttamente e indirettamente alla gestione, controllo e monitoraggio dei fondi strutturali, al fine di favorirne la crescita professionale e creare omogeneità nell'azione amministrativa.

Nel corso dell'anno si evidenzia la costante azione di collaborazione con i diversi organi regionali preposti alla stesura di documenti strategici utili al Comitato di Sorveglianza e all'Autorità di Gestione e l'azione di supporto ad ampio spettro per lo studio, l'organizzazione e l'avvio della Progettazione Integrata Territoriale avviata nel 2006.

Nel 2006 sono proseguite le attività di Assistenza tecnica "dedicata" a favore di alcune Misure, i cui beneficiari finali risultano gli Enti locali, che presentavano particolari criticità in ordine all'attuazione, controllo e monitoraggio delle operazioni.

Sono state altresì svolte azioni di accompagnamento e assistenza tecnica all'Amministrazione regionale attraverso le attività attraverso le "Azioni di sistema" previste dal PON ATAS a favore della Regione Sardegna. In particolare, le azioni attuate nell'ambito della Misura 1.2 del PON ATAS per il 2006 sono quelle di seguito elencate.

Asse I "Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale"

Misura 1.2 A1 e A2 - PO Internazionalizzazione 1° e 2° stralcio

Avvio protocollo intesa Regione Sardegna – Regione Marrakech Marocco PRINT.

Valorizzazione dei percorsi di internazionalizzazione nei territori interessati dai PIT.

AT alle Regioni Ob. 1 (SFERA) e azioni trasversali di scouting e tutoraggio alle imprese.

Assistenza tecnica ai PIT.

Misura 1.2 B - PO Ambiente e Sviluppo sostenibile

Task force per attuazione rete ecologica regionale.
Assistenza Tecnica di supporto alle task force regionali.
Task force per supporto all'ARPA.
Task force supporto Rete Ecologica Regionale.

Misura 1.2 C - PO Difesa del suolo

Azioni di supporto e assistenza agli Assessorati dell'Ambiente, dei Lavori pubblici e degli Enti locali.
Realizzazione del Progetto PODIS Programma operativo di difesa del suolo.

Misura 1.2 D – PO Energia

Seminari e workshop, studi e ricerche.
Azioni di supporto per il risparmio energetico, fonti rinnovabili; assistenza tecnica all'Asse 4 "Sistemi locali di sviluppo".

Misura 1.2 E – PO Turismo

Unità di supporto locale per valorizzare l'offerta integrata turistica.

Misura 1.2 F - MBAC

Supporto centrale attraverso il progetto SFERA alle ex soprintendenze regionali.
Back office locali per il miglioramento della progettazione delle risorse culturali e implementazione dell'Asse II del POR.
Attività di sostegno ai PIT 2005-2006 Valorizzazione beni culturali e sviluppo locale.

Misura 1.2 G – PO DICOTER

Assistenza agli enti locali nell'ambito degli studi di fattibilità per opere pubbliche

Misura 1.2 H1 – PO Risorse idriche (irrigue) – Primo stralcio

Azioni di monitoraggio, progettazione, realizzazione e utilizzo di software dedicato (SIGRIA) e assistenza tecnica all'Assessorato all'Agricoltura e ai Consorzi di Bonifica

Misura 1.2 H2 – PO Risorse idriche – Secondo stralcio

Attività di supporto a favore di ATO e Regione Sardegna con fornitura hardware e software dedicati

Misura 1.2 I – PO Volontariato

Assistenza tecnica e consulenza diretta alla Regione Sardegna.
Assistenza tecnica di supporto alla programmazione 2007-2013.
Task force per la ricognizione sul fabbisogno delle nuove competenze e il sostegno ruoli fasce deboli.
Sostegno all'implementazione delle Misure del FSE che finanziano i servizi alla persona e le imprese sociali.

Misura 1.2 L – PO MIPAF Sviluppo rurale

Assistenza tecnica alla progettazione integrata in campo agricolo e sviluppo rurale attraverso il supporto dell'INEA

Misura 1.2 M – PO Salute

Assistenza tecnica per gli Osservatori epidemiologici regionali e avviamento del sistema di valutazione sulla qualità dei servizi offerti

Misura 1.2 N – PO Pari opportunità

Task force regionali; assistenza tecnica e di supporto all'attuazione dei PIT e dell'Autorità per le politiche di genere; attività di supporto e monitoraggio su bandi e comunicazione pubblica.

Asse II "Formazione della Pubblica Amministrazione e azioni di sistema per le politiche per l'inserimento al lavoro e adeguamento del sistema formativo"

Misura II. 1 A. PIT Lavoro

La *task force* locale ha affiancato i Responsabili di Misura per la predisposizione di alcuni bandi. Monitoraggio degli esiti occupazionali dei progetti finanziati sulla Misura 3.11. Monitoraggio per la costituzione dei Centri per l'Impiego, rapporto di analisi e interviste ai Responsabili dei Centri.

Misura II. 1 Azione D "Iniziative specifiche d'animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli Italiani residenti all'estero."

Supporto alla progettazione del corso per giovani sardi emigrati, gestori delle Vetrine sarde all'estero e organizzazione degli incontri con i responsabili dell'Ente di formazione designato.

Trattative con l'Assessorato al Lavoro ed alla Programmazione per collaborare con l'Osservatorio nell'attuazione del Programma Master & Back. Contatti con le Università di Cagliari e Sassari e creazione di reti Interregionali e Internazionali.

Organizzazione di seminari tematico-geografici realizzati in Spagna, Belgio, Germania e Francia, di un seminario di taglio economico sul mercato USA, di un seminario di taglio scientifico per avviare una collaborazione con gli USA. Sottoscrizione di 3 protocolli di collaborazione internazionali.

Creazione di 12 *focal point* nominati ufficialmente dalle sedi diplomatico-consolari locali (Berlino, Francoforte, San Paolo e Montevideo, Buenos Aires, Miami, Tunisi, Marocco, Toronto, Sydney, Perth, Melbourne). Coinvolgimento di 7 uffici OIL, di 27 comunità italiane, di 40 circoli dei sardi all'estero, per un totale di 646 (+81) soggetti coinvolti. Realizzazione di studi e ricerche nel settore.

Misura II 2 Azione 1 Progetto Traguardi

Realizzazione di *Focus Group* con i Dirigenti per la costruzione del repertorio delle competenze. Affiancamento al personale del Settore FP (Ufficio FSE) per la realizzazione di un'attività di miglioramento organizzativo dei processi portati avanti dallo stesso. Affiancamento ai responsabili delle Misure 3.2 e 3.8 per la definizione di ipotesi di programmazione sui temi dell'apprendistato professionalizzante e della formazione individualizzata per occupati. Supporto al personale regionale impegnato nello svolgimento dei controlli di I livello e realizzazione del relativo manuale procedurale. Realizzazione delle interviste ai responsabili di Fondo e ai Responsabili di Misura per la ricostruzione della mappa dei servizi esternalizzati rispetto alla gestione del POR. Sostegno per le attività di monitoraggio e per l'avvio della nuova programmazione comunitaria 2007-2013.

Misura II 2 – Azione 3. Progetto Sprint

Le attività portate avanti per tutto il 2006 hanno riguardato principalmente l'accompagnamento all'Autorità di Gestione e al gruppo tecnico del Centro Regionale di Programmazione nelle varie fasi di progettazione e attuazione della nuova strategia di programmazione territoriale e progettazione integrata. In particolare:

- Attività di accompagnamento ai lavori dei Tavoli di Partenariato Provinciale e Regionale. Supporto ai lavori degli 8 Tavoli Provinciali di Partenariato Istituzionale e Socio Economico, con l'obiettivo di affiancare la Regione nel processo di condivisione e di progettazione con i territori.
- Supporto alla raccolta dei dati sull'avanzamento finanziario del POR Sardegna, alla sistematizzazione dei dati riguardanti i 13 PIT. Aggiornamento del sistema informativo GRILLO e dei dati riguardanti gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo locale (PIA, APQ, ecc.), anche con l'obiettivo di supportare il lavoro dei laboratori di progettazione sia territoriali che tematici.
- Attivazione dei Gruppi Tecnici Regionali col compito di elaborare le linee guida per la presentazione dei Progetti Integrati, scrivere i bandi e elaborare i criteri di ammissibilità dei Progetti sui diversi temi trattati.
- Partecipazione alle attività territoriali previste dalla nuova fase di progettazione integrata in Sardegna. Supporto per l'organizzazione dell'accoglienza e dello smistamento delle 13.000 domande di partecipazione pervenute e nell'elaborazione di una scheda per la valutazione della completezza delle domande. Predisposizione degli strumenti di comunicazione e diffusione per l'avvio della fase di costituzione dei Partenariati di Progetto e di presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale e Regionale.
- Collaborazione e supporto nella stesura della Guida per la Predisposizione dei Progetti Integrati di Sviluppo. Attività di accompagnamento al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per la definizione dei criteri di valutazione dei progetti. Progettazione workshop sul Project Cycle Management, metodologia GOPP e Logical

Framework, finalizzati alla diffusione e facilitazione della metodologia individuata nella Guida per la stesura dei Progetti Integrati di Sviluppo.

- In riferimento alla programmazione comunitaria 2007-2013: la task force ha curato la stesura di una nota di sintesi del Documento Strategico Regionale della Sardegna che è confluita in una relazione presentata in occasione del seminario di discussione fra le Regioni del Mezzogiorno sul tema "Le politiche di sviluppo locale nella programmazione 2007 – 2013".

Misura II 2 – Azione 3 D . PIT Agora

L'attività è stata orientata all'affiancamento tecnico dei Laboratori Tematici Regionali, alla predisposizione delle bozze per la costruzione e per la presentazione dei Progetti Integrati. Inoltre, è stato fornito un supporto all'Autorità di Gestione nel trattamento delle criticità riscontrate e nell'attività di animazione, con la produzione di *slide*, presentazioni e altro materiale per i Tavoli di Partenariato. Apporto metodologico al processo della Progettazione Integrata e alla realizzazione delle relative linee guida. Coordinamento territoriale e attività di sostegno alle PA. Supporto alla costituzione dei partenariati di progetto.

2.5. Modalità di raccolta dei dati

Validazione	Bimestre di riferimento	Scadenza validazione	Validazione da parte dell'Autorità di Gestione
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	28.02.2006	30.03.2006	29.03.2006
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	30.04.06	30.05.2006	30.05.2006
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	30.06.2006	30.07.2006	04.08.2006
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.08.2006	30.09.2006	29.09.2006
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.10.2006	30.11.2006	06.12.06
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale Avanzamento fisico	31.12.2006	30.01.2007	09.02.07

Così come per il 2005, anche per il 2006 il monitoraggio ha avuto una cadenza bimestrale sia per quanto riguarda i dati finanziari e sia per quanto riguarda i dati procedurali.

Per il monitoraggio fisico è stata rispettata la scadenza ordinaria di dicembre, tuttavia la validazione effettiva è stata effettuata il 09.02.07 per temporanea indisponibilità del Sistema centrale dell'IGRUE.

2.6. Pubblicità dell'Intervento

Le attività di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico e ai potenziali beneficiari sono state attuate attraverso il Piano di Comunicazione del Por Sardegna, con il supporto dell'Assistenza Tecnica.

Attività in collaborazione con altri assessorati/enti etc.

Concorso fotografico “Una foto per la tua città”

Nel 2006 si è concluso il concorso fotografico “Una foto per la tua città”. L’iniziativa, avviata nel 2005, è stata realizzata in collaborazione con l’Assessorato agli Enti Locali e con il Servizio scolastico regionale. Alla seconda fase del concorso hanno partecipato 9 scuole. Compito dei ragazzi è stato documentare i cambiamenti avvenuti nel proprio comune, grazie ai finanziamenti della misura 5.1, con un’attenzione particolare al ruolo svolto dall’Unione Europea in generale, e dal POR Sardegna in particolare. Una commissione di valutazione, riunitasi nel mese di maggio ha valutato i diversi elaborati pervenuti. Il 6 ottobre 2006 si è svolta la premiazione finale, con l’assegnazione di una stazione multimediale alla scuola vincitrice.

Incontri territoriali

Collaborazione a “*Summer School* di sviluppo locale Sebastiano Brusco”. Il Piano di Comunicazione ha supportato l’organizzazione del convegno incentrato sullo sviluppo locale, svoltosi a Seneghe dal 7 al 9 luglio.

Campagne di comunicazione:

Attraverso il Piano di Comunicazione sono state realizzate due campagne di comunicazione mirate: una per il “Programma *Master and Back*” e l’altra per la nuova Progettazione integrata.

Programma *Master and Back*

Gli strumenti per promuovere il Programma sono stati:

- Il lancio della campagna pubblicitaria (febbraio-marzo 2006), ideata con uno slogan e un format grafico riconoscibili. La campagna ha privilegiato i seguenti strumenti di comunicazione: cartellonistica nelle 8 province sarde; brochure informative e pieghevoli; spot radio-tv; manifesti di grande enfasi nei principali aeroporti sardi.
- L’aggiornamento dello speciale *Master and Back* presente sul sito istituzionale della regione, <http://www.regione.sardegna.it/argomenti/istruzione/masterandback/> dove sono state pubblicate tutte le informazioni e la documentazione utile riguardante il programma.
- La pubblicazione e distribuzione della Guida per la partecipazione e attuazione del Programma.
- L’attivazione di un *call center* con numero verde per fornire un servizio di informazione e assistenza ai giovani interessati.

Progettazione Integrata

Gli strumenti utilizzati per la promozione:

- Una campagna pubblicitaria, (maggio-ottobre 2006) ideata con uno slogan e un format grafico riconoscibili. La campagna ha privilegiato i seguenti strumenti di comunicazione: pubblicità sui quotidiani locali, locandine distribuite su tutto il territorio e manifesti di grande enfasi nei principali aeroporti sardi.
- Attivazione a partire dal mese di maggio 2006 di un *link* sul sito istituzionale della RAS, <http://www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazioneintegrata/>, dedicato alla Progettazione integrata. Nel sito sono state pubblicate tutte le informazioni e la documentazione utile riguardante la Progettazione Integrata. Lo speciale è stato aggiornato giornalmente con tutte le *news* riguardanti le attività dei laboratori territoriali, dei partenariati provinciali e regionali e di tutti gli appuntamenti in programma nell’Isola.
- Un *call center*, per fornire un servizio di informazione e assistenza.

Il Sito istituzionale

Nel corso del 2006, la sezione dedicata alla *Programmazione Europea* è stata implementata con la creazione di una pagina *ad hoc* dedicata alle attività di comunicazione e informazione realizzate con il Piano di Comunicazione del POR (nel rispetto del Regolamento CE 1260/1999 e del Regolamento CE 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità). La Sezione *Programmazione Europea*, è stata oggetto di un’indagine curata dal Fornez, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con il Dipartimento della Funzione Pubblica dal titolo “Strumento di Analisi dei Siti web sui Programmi Operativi” A.S.P.O. Questa analisi è stata un utile strumento per verificare la completezza delle informazioni presenti sul sito della Regione Sardegna, riguardanti la programmazione 2000-2006 e i Fondi Strutturali. Dai risultati dell’indagine, (su un campione di 7 Regioni) la Sardegna è risultata seconda con un punteggio di 72/100, preceduta soltanto dalla Campania con 73 punti. Sempre nel 2006, è stata creata la sezione *Programmazione 2007-2013*, ancora in fase di costruzione. Il sito viene aggiornato con

l'inserimento della nuova documentazione disponibile relativa ai Fondi Strutturali e al POR Sardegna. Nella sezione *Europa* del sito istituzionale, sono state inserite invece le news e gli approfondimenti riguardanti le tematiche europee.

Progettazione e produzione di materiali

Il calendario POR Sardegna 2007, redatto in due lingue (italiano-inglese), è stato ideato per dare rilievo a quei progetti realizzati con il POR Sardegna che hanno poca visibilità, quali ad esempio azioni immateriali o interventi dislocati in luoghi non accessibili al grande pubblico. Il calendario è stato distribuito in modo capillare attraverso diversi canali quali i quotidiani locali, i centri commerciali, etc. È stato diffuso inoltre presso i circoli dei sardi presenti nella penisola e all'estero.

L'Ufficio media relation

L'addetto alle relazioni esterne ha seguito le diverse iniziative, dando enfasi alle attività realizzate. Ha curato inoltre i rapporti con l'Autorità di Gestione e con i media provvedendo inoltre all'aggiornamento del Sito Istituzionale della Regione Sardegna, in collaborazione con l'URP.

Le azioni rivolte ai potenziali beneficiari

Il Comitato di Sorveglianza

Tra le attività del Piano vi è stata l'organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, accompagnate da una giornata dedicata alla visita di alcuni dei progetti finanziati con il POR. Nel corso del 2006 il Comitato di sorveglianza si è riunito due volte e i Rappresentanti della Commissione europea e dei Ministeri hanno potuto visitare gli interventi realizzati lungo l'asse turistico attrezzato del Lago Mulargia e dell'Oasi del Monte Moretta; l'anfiteatro di Orroli, il sistema bibliotecario di Isili, l'Isola Dolce di Isili, il palazzo Aymerich, il Museo e il Cesil di Laconi (febbraio 2006); l'azienda casearia Fattorie Girau e il depuratore di Arborea (giugno 2006).

Indagine quali-quantitativa

Nel corso del 2006 sono stati pubblicati i risultati di un'indagine, condotta nel 2005, per rilevare il livello di informazione, conoscenza e sensibilizzazione dei fondi strutturali da parte dei cittadini, enti pubblici e portatori di interesse. Il sondaggio è stato effettuato telefonicamente o in alcuni casi è stato acquisito via e-mail. Esso ha testato i programmi di finanziamento, i canali di informazione utilizzati per la promozione dei fondi strutturali e la valutazione degli stessi. Dal sondaggio è emerso che gli enti pubblici e i portatori di interesse sono maggiormente informati in materia di fondi strutturali, rispetto alla popolazione. C'è tuttavia una discreta fiducia, da parte di quest'ultima sull'utilità dei finanziamenti UE. I tre *focus* di intervistati sono a conoscenza delle attività di informazione e comunicazione della Regione. I mezzi attraverso i quali sono state apprese informazioni sui fondi strutturali sono stati la radio, la tv, la stampa nazionale e locale per la popolazione, per i portatori di interesse e gli enti pubblici internet, il BURAS e la GUUE. Tra settembre e dicembre 2006, è stata effettuata una indagine finale rivolta soltanto alla popolazione. Il sondaggio è stato effettuato attraverso interviste dirette, personali e telefoniche, sulla base di un questionario appositamente redatto. I dati raccolti sono stati informatizzati e verranno pubblicati, a seguito di elaborazione, nel corso del 2007.

Progettazione e produzione dei materiali

Nel corso del 2006 è stato riprogettato il format di comunicazione, in sintonia con le "Linee guida per l'uso dell'identità visiva" della Regione Sardegna. Ciò ha comportato l'applicazione del nuovo format sugli strumenti e sui documenti prodotti. Il nuovo format ha mantenuto le costanti indispensabili per la riconoscibilità dell'elemento comunicato. Esso garantisce un'immagine coordinata, immediatamente riconoscibile e riconducibile alle attività di promozione della Regione Sardegna e del POR Sardegna 2000-2006.

Di seguito vengono presentati i materiali che sono stati realizzati:

- Il POR Sardegna 2000-2006, approvato con Decisione C (2005) n.4820 del 1 dicembre 2005 a seguito della revisione di metà periodo, in versione cofanetto. Il Documento si è rivelato un utile strumento di lavoro pratico e maneggevole da utilizzare.

- Un Catalogo con alcuni dei progetti realizzati con il contributo del POR Sardegna.
- L'opuscolo "Cartelloni Obbligatorii" finalizzato all'utilizzo corretto della cartellonistica di cantiere. La guida è destinata in particolare ai soggetti attuatori delle misure.
- Il secondo Catalogo progetti "Sardegna Progetti e sviluppo". Il catalogo è stato premiato come miglior progetto a livello internazionale, il 9 novembre 2006 al Co.mpa di Bologna, il salone della Comunicazione Pubblica.
- La relazione dal titolo "Sardegna più visibilità allo sviluppo" sull'utilizzo corretto della cartellonistica e delle targhe espositive permanenti, per pubblicizzare gli interventi realizzati con il POR Sardegna.
- Il calendario POR Sardegna.

Tutti i materiali sono stati distribuiti in sede di Comitato di Sorveglianza e sono stati pubblicati nel sito della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, nella pagina "Comunicazione" del POR Sardegna 2000-2006.

Animazione territoriale

Partecipazione all'incontro regionale "Reti Europee". Svoltosi a Nuoro il 31 marzo 2006, l'incontro è stato un'occasione interessante per riflettere su quali azioni di comunicazione e informazione possono essere attivate nel futuro immediato, per avvicinare il cittadino alle Istituzioni e per renderlo consapevole del ruolo svolto dall'Unione Europea per favorire la crescita e lo sviluppo dell'Isola.

Azioni di comunicazione e informazione: sensibilizzazione dei beneficiari finali

Fra le attività previste nel Piano di Comunicazione vi è stata anche la sensibilizzazione dei Responsabili di Misura e dei Beneficiari finali, sulle azioni di informazione e pubblicità da adottare, in conformità al Reg. 1159 del 2000. A tal fine nel corso del 2006:

- È stata completata un'attività di informazione nei confronti dei Responsabili di Misura e dei beneficiari finali, seguita da un'indagine sull'utilizzo corretto della cartellonistica. I risultati, pubblicati nella *brochure* "Sardegna – più visibilità allo sviluppo", hanno mostrato che gli adempimenti di cui al Regolamento 1159/2000, in materia di cartellonistica sono conosciuti dai Beneficiari finali. Tuttavia in diversi casi si è riscontrata un'applicazione non corretta degli stessi. Criticità che sono state in parte colmate con la correzione dei cartelli errati e con la predisposizione e diffusione di materiale informativo *ad hoc*, pubblicato anche nel sito istituzionale. La *brochure* è stata corredata da un cd interattivo con il Cartello Donatello che mette in mostra esempi di cartellonistica corretta ed errata.
- È stata effettuata una ricognizione, presso i beneficiari finali, dei progetti coerenti di prima e seconda fase finanziati con il POR e ancora privi di targhe permanenti. A seguito dei risultati emersi, l'amministrazione ha effettuato una gara pubblica per l'acquisto delle targhe e ha quindi provveduto alla loro distribuzione presso i beneficiari finali.



Misura 1.1 Schema fognario depurativo - San Vero Milis



Misura 6.2 Metropolitana leggera di Cagliari



Misura 3.12 - Scuola elementare Elmas

"QUESTO PROGETTO E' COFINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA"

- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE -

COMUNE DI CAGLIARI
Assessorato ai LL.PP.
Servizio Edilizia Pubblica 2

P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 BANDO 2002/2004 - MISURA 3.12

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO GIOVANI SITO IN VIA DANTE A CAGLIARI

IMPORTO DI PROGETTO	€ 146.767,19
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 142.613,40
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 122.419,34 oltre a
CONTRATTO	€ 4.153,79 per Oneri di sicurezza
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. ING. CLARA PALA
PROGETTISTA	ARCH. STEFANO LILLIU
DIRETTORE DEI LAVORI	ARCH. STEFANO LILLIU
IMPRESA APPALTATRICE	ANDREONI s.r.l. Cagliari
	ATTESTAZIONE SOA N. 0809/2 Og2 CLASS. IV
CONSEGNA DEI LAVORI	09 DICEMBRE 2004
ULTIMAZIONE LAVORI	07 APRILE 2005
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	GEOM. EMANUELE MANCOSU
SUBAPPALTATORI	

Centro Giovani

Sportello Informa & Orienta


Internet Point

ORIENTARE
Formazione e Informazione


Sportello Informa Donna

Sala prove registrazioni musicali

Misura 3.12 Scuola Media Ugo Foscolo - Cagliari



Misura 6.2 sito ZTL - Sistemi controllo area vasta Cagliari

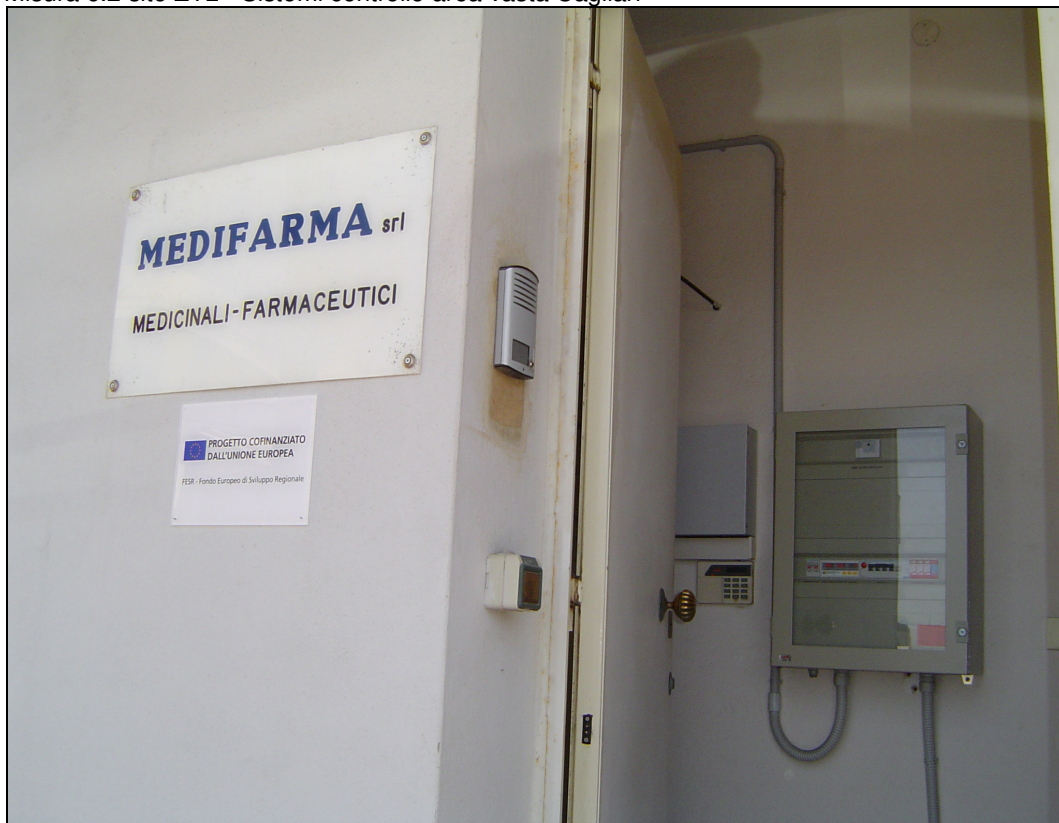

Misura 1.6 - Medifarma s.r.l. - Cagliari

2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari

Piano di Sviluppo Rurale

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Sardegna è stato approvato con Decisione C(2001)4630 del 21.12.2001 e modificato con Decisione C(2005)4581 del 21.12.2005. Il costo totale del Piano ammonta a 403,73 milioni di Euro di cui 302,77 a carico del FEOGA. Il PSR prevede il completamento degli impegni assunti ai sensi delle vecchie misure di accompagnamento ex Reg. CE 2078/92 (misure agroambientali), 2079/92 (prepensionamento) e 2080/92 (misure forestali) e l'attivazione di tre nuove misure: E) Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali, F) Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica, H) Imboschimento delle superfici agricole.

L'Autorità di gestione del Piano è l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna; all'ERSAT sono stati affidati i compiti in materia di attuazione delle misure, dalla ricezione delle domande fino all'invio degli elenchi di liquidazione ad AGEA (organismo pagatore). Il coordinamento e l'integrazione con le misure del POR Sardegna è curato dallo stesso Assessorato dell'Agricoltura, responsabile della gestione delle misure del POR cofinanziate dal Feoga – Orientamento.

L'articolazione della Programmazione per lo Sviluppo Rurale delle Regioni Obiettivo 1 (Misure strutturali previste all'interno del POR e Misure "di accompagnamento" all'interno dei PSR) se da un lato evitano la sovrapposizione di interventi tra programmi diversi dall'altro esigono un più forte coordinamento.

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia le Misure del PSR sono coordinate e gestite dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è coordinatore del FEOGA Orientamento ed allo stesso tempo Autorità di gestione del PSR. Dal punto di vista sostanziale esistono collegamenti stretti tra le Misure del POR e quelle del PSR. In particolare si segnala la Misura 4.18 del POR "Formazione specifica in agricoltura", le cui azioni formative sono dirette anche ai beneficiari di Misure del PSR, in particolare per gli operatori biologici. In tal modo anche gli altri interventi attivati nel PSR come la Misura F "Misure agroambientali", sia per l'agricoltura biologica sia per la Misura di nuova introduzione nel 2005 relativa al benessere degli animali, trovano poi nel POR un'adeguata valorizzazione, ad esempio con la Misura 4.11 "Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità" e con la Misura 4.9 "Investimenti aziendali".

Programma Leader+ Sardegna

Il programma Leader+ Sardegna è stato approvato con Decisione C(2002)248 del 19 febbraio 2002.

La Regione nella predisposizione del Programma ha curato la sua complementarietà e integrazione con il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, con le altre Iniziative Comunitarie quali Equal e Interreg III e con gli altri progetti della Programmazione negoziata.

Il Complemento di Programmazione stabilisce che la strategia dei Piani di Sviluppo Locale debba evidenziare il valore aggiunto apportato da Leader nei confronti degli altri strumenti di Programmazione, ed infatti nella selezione dei Piani di Sviluppo Locale sono stati attribuiti 10 punti alla complementarietà degli interventi previsti nei singoli PSL con le altre politiche in atto nei territori di riferimento. In tal modo è stata garantita l'integrazione dei singoli PSL con le azioni programmate attraverso gli altri strumenti attuativi degli aiuti strutturali comunitari.

Questo al fine di garantire che i PSL siano concepiti e soprattutto attuati in un'ottica di integrazione con gli altri progetti finanziati nell'ambito del POR, del PSR, di Interreg, di Equal, dei Piani pluriennali di Sviluppo Socio-Economico delle Comunità Montane, dei Programmi Integrati d'Area (PIA), dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), dei Patti Territoriali (PT).

Tutti i territori di intervento selezionati del Programma sono interessati dai principali strumenti attuativi dei fondi strutturali, quali il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, Interreg III A (che però in Sardegna interessa solo le Province di Sassari e Nuoro) e Equal.

Allo stato attuale di avanzamento dei Piani di Sviluppo Locale (la percentuale di realizzazione degli interventi e di spendita delle relative risorse è pari a circa il 67% del totale programmato) si può affermare che, concretamente, nella loro attuazione è stata realizzata una complementarietà

e sinergia con gli altri interventi comunitari ed è stata assicurata la non sovrapposizione e ripetizione di quanto già realizzato con altre tipologie di strumenti.

Il Coordinamento è assicurato, anche, dal fatto che l'Autorità di Gestione del POR è anche Autorità di Gestione del Programma Leader+ Sardegna.

Inoltre, il coordinamento è assicurato dal *Comitato di coordinamento regionale interassessoriale* istituito con Determinazione del Direttore del CRP nei primi mesi del 2003. Il Comitato è composto dall'Autorità di Gestione, che lo presiede, dal Gruppo di lavoro Leader+ del CRP e dai rappresentanti degli Assessorati Agricoltura, Ambiente, Pubblica Istruzione, Turismo e Artigianato, tale composizione assicura la complementarità e la non sovrapposizione con gli altri interventi gestiti direttamente dai sopra citati Assessorati.

Relativamente ai Gruppi di Azione Locale, beneficiari finali dell'Asse I e Asse II del Programma Leader+ pare significativo il loro coinvolgimento nella nuova fase della Progettazione Integrata del POR Sardegna e nella costituzione dei distretti rurali.

Interreg III A

Il Pic Interreg III A - Francia "Isole" Sardegna-Corsica-Toscana è stato approvato con Decisione C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001. Il programma prevede la cooperazione tra la Provincia di Sassari, la Provincia di Livorno e la Corsica, ed è strutturato in quattro assi: I-Favorire l'accessibilità e l'integrazione nella zona transfrontaliera (reti e servizi); II-Realizzare una strategia trasversale di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio (ambiente, turismo e sviluppo sostenibile); III-Sviluppare una cooperazione dinamica nella zona transfrontaliera (scambi transfrontalieri); IV-Attuazione del programma e assistenza tecnica.

L'Autorità di Gestione è un organo collegiale composto da due rappresentanti per ciascuna delle tre regioni transfrontaliere, di cui uno responsabile dell'Autorità di Gestione Ausiliaria.

La rappresentanza esterna dell'Autorità di Gestione è affidata alla Regione Sardegna (CRP) e coincide con l'Autorità di Gestione del POR Sardegna che assicura il coordinamento tra i Programmi. Il Comitato di Gestione provvede alla selezione e all'approvazione definitiva dei progetti da ammettere a finanziamento, certificandone il carattere transfrontaliero, approva le azioni dirette previste dal Programma e dal Complemento di programmazione e provvede alla sorveglianza coordinata sull'attuazione del Programma. Del Comitato fanno parte anche due membri del CRP in veste di rappresentanti della Sardegna.

La Provincia di Sassari, Autorità di Gestione Ausiliaria per la Sardegna, provvede alla raccolta ed al primo esame dei progetti, e trasmette le risultanze al Comitato di Gestione, preposto alla selezione ed all'approvazione definitiva degli stessi. Prima dell'invio al Comitato di Gestione, i progetti vengono trasmessi per eventuali osservazioni al CRP, che si avvale della cooperazione degli Assessorati di volta in volta competenti per materia al fine di evitare l'eventuale finanziamento dei progetti a valere su altri programmi, garantendo in tal modo il coordinamento tra Interreg III A e le altre iniziative comunitarie.

Equal

La Commissione Europea ha approvato in data 29.03.2001 il Documento Unico di Programmazione relativo al Programma di Iniziativa Comunitaria Equal. Il programma si concentra su cinque assi: Asse I – Occupabilità; Asse II – Imprenditorialità; Asse III – Adattabilità; Asse IV – Pari opportunità; Asse V – Richiedenti asilo. Gli assi IV e V non sono stati attivati dalla Regione Sardegna.

L'Autorità di Gestione dell'Iniziativa Comunitaria Equal è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alcune delle competenze dell'Autorità di Gestione in materia di programmazione e di gestione dell'iniziativa comunitaria sono assegnate alle Regioni e Province Autonome, cui spetta l'attuazione del Programma a livello territoriale (Organo Intermedio). In Sardegna il ruolo è svolto dall'Assessorato al Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Affari Generali. Il coordinamento tra le iniziative Equal e il POR è assicurato dal Direttore generale dell'Assessorato al Lavoro in qualità di Responsabile per le azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Integrazione del POR con i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori rientranti nei regimi di sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato

Il POR Sardegna ha previsto la deroga di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 del Regolamento CE 1257/99 per il comparto ortofrutticolo e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP. Tale eccezione si giustifica in quanto in Sardegna esistono pochissime

Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 che possono finanziare interventi strutturali e la loro capacità finanziaria è insufficiente a sostenere investimenti individuali a favore delle aziende dei soci aderenti. In particolare, la deroga comprende:

- a) misure realizzate dalle imprese agricole individuali appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM: saranno finanziate quelle iniziative non comprese nei programmi operativi e che siano coerenti e compatibili con la strategia e con gli obiettivi della organizzazione dei produttori. La coerenza deriverà da specifica dichiarazione dell'organizzazione medesima a livello di bando/avviso;
- b) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate non appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute;
- c) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate le cui aziende sono ubicate in aree non comprese nei bacini sottesi ad organizzazioni di produttori riconosciute e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute.

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori sono coordinati e gestiti dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è anche coordinatore del FEOGA Orientamento.

Coordinamento con i PON che insistono sul territorio regionale

Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, garantirne la coerenza nello stesso settore e la correlazione al territorio, l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha provveduto all'interno dei propri uffici alla nomina di un Referente per ciascun Programma Operativo Nazionale. I referenti partecipano ai Comitati di Sorveglianza dei PON relativi alle materie di propria competenza, garantendo in tal modo il necessario collegamento tra i due livelli. A livello regionale, invece, è attuata una collaborazione tra i referenti del CRP e gli uffici regionali competenti per settore affinché vengano attuate metodologie comuni e identificate soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi.

In fase di programmazione, la complementarietà degli interventi è assicurata dagli indirizzi per la programmazione regionale contenuti nei PON. Nella fase di attuazione, il raccordo tra Autorità ministeriali e Regioni è stato formalizzato attraverso Accordi o Protocolli di Intesa, che per la Regione Sardegna hanno riguardato i seguenti PON: PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione, PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, PON Trasporti, PON Pesca e PON Scuola.

L'azione di coordinamento è rafforzata altresì dall'attività svolta in seno al Comitato di Sorveglianza del QCS Obiettivo 1 e dai Gruppi di Lavoro operativi nell'ambito del QCS stesso.

2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie

Concorrenza, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Autorità di Gestione garantisce nell'attuazione degli interventi l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Analisi del ruolo dell'Autorità ambientale regionale e della sua efficacia

Coinvolgimento dell'Autorità Ambientale nell'attuazione del POR

Nell'esecuzione del suo mandato istituzionale, l'Autorità Ambientale è chiamata a cooperare con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del POR per assicurare l'integrazione della componente ambientale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Nel corso del 2006 ha partecipato all'attuazione del Programma soprattutto intervenendo sui bandi per la selezione delle iniziative da finanziare. In alcuni casi l'intervento si è limitato ad un semplice parere di coerenza (es. misura 4.1 b), d) ed e)), in altri si è proceduto all'integrazione di elementi di sostenibilità (es. Misure 5.1, 5.2, 4.5 a) e alla valutazione delle iniziative proposte a finanziamento sulla base di criteri di sostenibilità inseriti nei bandi (es. Misura 4.14, 5.1, 1.8).

Interventi particolarmente significativi hanno riguardato la Misura 1.8 "Formazione per misure dell'Asse I" (l'AA, dopo aver collaborato con il RdM all'elaborazione del bando sulla Linea d'intervento B "Informazione ambientale", ha partecipato alla commissione di valutazione delle proposte) e la Misura 4.5.a, per la quale, in piena collaborazione con il RdM, sono stati individuati criteri di valutazione e tipologie di intervento che orientassero la riqualificazione delle strutture ricettive verso la sostenibilità ambientale. L'AA ha inoltre collaborato all'attuazione della Misura 1.5, assistendo il RdM nell'istruttoria degli strumenti di gestione per i siti della Rete Natura 2000 cofinanziati attraverso la Misura.

Volendo compiere una valutazione complessiva, l'esperienza maturata consente di affermare che la partecipazione alla scrittura dei bandi e alle commissioni di valutazione non rappresenta una modalità sufficientemente efficace di integrazione della componente ambientale. A fronte di un elevato dispendio di risorse umane essa non incide in modo significativo sulla sostenibilità degli interventi. I criteri di selezione ambientali hanno infatti un peso relativamente basso nell'attribuzione del punteggio complessivo e generalmente non esplicano nessun effetto sull'ammissione a finanziamento degli interventi. A questa criticità si potrebbe ovviare introducendo un punteggio minimo ambientale come condizione di ammissibilità. Ma molto più efficace si ritiene la partecipazione dell'Autorità Ambientale nelle definizioni delle scelte strategiche e degli atti di pianificazione e programmazione a monte dei bandi e un maggior coinvolgimento nei settori di sviluppo che presentano un maggior impatto ambientale (trasporti, energia, città). La prossima introduzione della valutazione ambientale strategica potrà probabilmente garantire per il futuro l'integrazione ambientale in una fase precoce del processo decisionale in tutti i piani e programmi che possono produrre effetti sull'ambiente.

Criticità

La criticità, lamentata negli anni precedenti, legata carenza di risorse umane rispetto a quanto inizialmente previsto dal Progetto Operativo Ambiente (POA) del PON ATAS è stata colmata: a seguito *mid term review* del PON ATAS, l'AA ha avuto risorse sufficienti per dotarsi di ulteriori 9 unità di personale.

Un'altra annosa criticità è rappresentata dalla difficoltà che l'AA incontra nell'ottenere il riconoscimento del proprio ruolo di soggetto deputato ad assicurare l'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali: in alcuni settori, infatti, difficilmente l'ambiente è tenuto in considerazione nel momento in cui si effettuano le scelte strategiche di sviluppo. In relazione a tale criticità si ritiene che l'applicazione generalizzata della Valutazione Ambientale Strategica possa rappresentare un valido strumento di integrazione della sostenibilità ambientale.

Attività in corso

L'AA prosegue la propria attività relativa all'ultima fase di attuazione del POR Sardegna, attraverso l'integrazione della componente ambientale nei bandi per la selezione delle iniziative da finanziare (bando per i pacchetti integrati di agevolazioni- sezione turismo) e la partecipazione alle Commissioni di valutazione delle iniziative (Misura 5.1).

In vista della programmazione 2007-2013 l'AA ha condotto la VAS del nuovo POR FESR, predisponendo il rapporto ambientale e collaborando con l'Autorità della Programmazione per condurre il processo di partecipazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico interessato. È stato inoltre integrato il DSR preliminare, predisposto dall'AdG, con riferimento alle tematiche d'interesse (educazione ambientale, monitoraggio, turismo sostenibile, etc).

Nell'intento di applicare metodologie condivise ai Fondi strutturali e alla programmazione ordinaria regionale, una parte dell'attività viene dedicata all'attuazione di progetti sperimentali per la promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della promozione dell'Agenda 21 Locale, dell'educazione e informazione ambientale, della promozione del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, del turismo sostenibile.

Prosegue inoltre la sperimentazione della Valutazione Ambientale Strategica alla pianificazione regionale pertinente (Piano Forestale Regionale, Piano Energetico, Piano di Sviluppo Rurale, etc).

Applicazione delle principali direttive comunitarie

Direttiva 91/271/CEE – Acque reflue urbane - Direttiva 91/676/CEE – Nitrati- Direttiva 2000/60/CE – Direttiva quadro sulle acque: La Regione ha provveduto all'individuazione delle aree sensibili con lo studio di aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Con DGR 1/12 del 18/01/2005 è stata designata come zona vulnerabile da nitrati una parte della piana di Arborea (OR). Con DGR 14/17 del 4/4/2006 è stato approvato in via definitiva il Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, in attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 91/676/CEE (art. 19, comma 6 D Lgs 152/99). Con DGR n. 14/16 del 04/04/2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Tutela delle Acque previsto dall'art 44 D Lgs 152/99: nella redazione del documento si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE, di modo che il Piano risponde già ai requisiti richiesti dalla Direttiva per i Piani di Gestione dei bacini idrografici. Durante la redazione si è anche provveduto alla ridefinizione delle aree sensibili.

Direttiva 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62 CE – Rifiuti, e rifiuti pericolosi e imballaggi e rifiuti di imballaggi - In attuazione del decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) la Regione ha predisposto le tre sezioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, imballaggi), approvate rispettivamente con le DGR 57/2 del 17/12/98, 13/34 del 30/04/2002 e 29/13 del 29/08/2002. Il piano è stato trasmesso alla Commissione Europea e approvato in data 06/11/2002. La Regione ha inoltre predisposto il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, approvato con DGR 45/34 del 5/12/2003. Da ultimo, la Regione ha provveduto, con la DGR 51/15 del 12/12/2006, alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti del 1998, per adeguarlo alla nuova configurazione istituzionale degli Enti locali e per renderne più ambiziosi gli obiettivi.

Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Con DGR 24/11 del 29.07.03 è stato emanato un "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE". In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 36/03 è stato predisposto un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Uccelli selvatici e habitat- A livello regionale risultano attualmente individuati 92 proposti Siti di Interesse Comunitario e 15 Zone di Protezione Speciale. Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 6 §1 della Direttiva Habitat (adozione di misure di conservazione che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione) la Regione ha predisposto delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" e ha destinato una consistente parte dei fondi della Misura 1.5 alla redazione e attuazione degli strumenti di gestione. Per porre fine al contenzioso originato dalla sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana nella causa C-378/01, con DGR 9/17 del 7/03/2007 sono state individuate ulteriori 22 ZPS

Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di impatto ambientale; Direttiva 42/2001/CE- Valutazione Ambientale Strategica- La disciplina regionale in materia di VI A è contenuta nell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, modificata con la L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 18, con la L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 17, e con la L.R. 29 aprile 2003, art. 20. Nel corso del 2005 con la Deliberazione n. 5/11 del 15/02/2005 la Giunta Regionale ha modificato le procedura per l'espletamento della VIA a livello regionale, al fine di renderla più efficaci (attraverso la costituzione di un Ufficio Regionale delle Valutazioni Ambientali- UVAR) e di allinearla rispetto all'evoluzione normativa europea, nazionale e regionale in materia. Con successiva DGR n. 38/32 del 2/8/2005 al suddetto UVAR è stato assegnato una funzione di coordinamento e supporto tecnico per l'espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. È comunque in via di predisposizione una disciplina organica delle valutazioni ambientali a livello regionale, la cui adozione è resa problematica dalla incertezza del panorama normativo nazionale. In ogni caso la Regione ha iniziato ad applicare la Direttiva VAS alla pianificazione di livello Regionale

Ruolo e compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere

Nella fase di revisione di medio periodo, si è provveduto a rafforzare l'attenzione sull'applicazione ed integrazione del principio di pari opportunità in tutti gli interventi messi in atto dal POR Sardegna, provvedendo in primo luogo a formalizzare il ruolo ed i compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere.

L'Autorità per le Politiche di Genere è l'organismo preposto alla corretta ed efficace integrazione del principio di pari opportunità trasversalmente in tutte le misure ed assicura, altresì, la conformità degli interventi con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e *mainstreaming* di genere. Tale organismo è intervenuto in tutte le fasi di attuazione del Programma svolgendo un ruolo consultivo, propositivo e promozionale nei confronti dell'Autorità di Gestione del POR Sardegna, più precisamente:

- come ruolo consultivo, coerentemente con quanto disposto dal Reg. CE 1260/99, artt. 12 e 34, l'Autorità per le Politiche di Genere è intervenuta nella fase di elaborazione di tutti i bandi attraverso un parere preventivo, che si configura come obbligatorio, anche se non vincolante, per garantire la regolarità delle operazioni, la compatibilità con la normativa comunitaria ed il rispetto della priorità trasversale "pari opportunità";
- nell'esercizio del suo compito propositivo, nella fase di revisione del Programma, è intervenuta per proporre l'inserimento di azioni e/o linee di intervento con un impatto più significativo sulle pari opportunità. Nell'ambito del processo della Progettazione Integrata, l'Autorità per le Politiche di Genere, con il supporto della *Task Force* del DPO, ha proposto ipotesi di progetti da presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida per l'integrazione del *mainstreaming* di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto attività di assistenza tecnica ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano. Il contributo ai due territori di riferimento, visibile nei Rapporti d'area, ha riguardato la lettura del contesto in chiave di genere e l'inserimento nei Progetti Integrati di obiettivi specifici e azioni in chiave di PO. In sintesi le azioni proposte riguardano: la riqualificazione di strutture ricettive e dei servizi per rendere le realtà locali veri sistemi ospitanti per le famiglie con bambini; il sostegno alla creazione di professionalità specialistiche e nuove imprese femminili; progetti di inclusione attraverso il microcredito sociale; progetti per l'introduzione di modelli di organizzazione aziendali flessibile e innovativi finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e familiari; progetti per lo sviluppo di modelli di cooperazione sociale e delle iniziative di inclusione e integrazione legate alla multifunzionalità dell'azienda agricola (fattorie sociali); potenziamento e miglioramento della dotazione strutturale di servizi (asili nido, servizi di prossimità) volti a facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; reti di cooperazione tra Comuni per l'integrazione dei servizi scolastici, culturali e sociali e delle politiche settoriali.

2.9 Controllo finanziario

Metodologia e Attività svolta

L'attività svolta nell'anno 2006 si è articolata nelle seguenti fasi:

- Ricognizione e valutazione dei controlli di I livello
- Analisi dei rischi
- Campionamento della spesa rendicontata al 31.12.2005
- Esecuzione dei controlli

Per quanto riguarda la prima fase, sono state analizzate le procedure seguite dall'Autorità di Gestione, dalle Autorità di Pagamento e dai Responsabili di Misura con l'effettuazione di interviste e l'acquisizione degli elementi documentali a supporto delle procedure adottate. E' stata inoltre effettuata un'analisi delle attività di controllo svolte da ogni Responsabile di Misura. Si è quindi proceduto alla valutazione del rischio per ogni misura attraverso il metodo del *Combined Risk Assessment (CRA)*.

Per il campionamento della spesa è stata utilizzata la tecnica Monetary Unit Sampling (MUS) . L'estrazione del campione di operazioni da sottoporre al controllo di II livello è stata effettuata con il software ACL. L'ampiezza del campione è stata determinata con il software EY MICROSTART (software proprietario Ernst & Young) sulla base dei seguenti parametri:

- Grado di rischio definito sulla base di elementi intrinseci a ciascuna misura (esempio: il grado di tangibilità dei progetti finanziati, la numerosità e la tipologia dei soggetti delegati

all'attuazione) e della valutazione dei sistemi di controllo adottati (come l'esistenza di un'adeguata segregazione di funzioni, l'esistenza di controlli idonei a prevenire errori di completezza, realtà, legittimità, valutazione, competenza, contabilizzazione, rendicontazione delle transazioni, nonché i risultati di verifiche di autorità nazionali e comunitarie).

- Livello di rilevanza
- Errore tollerabile
- Numero di errori attesi

Sono state selezionate inoltre tutte le operazioni di importo superiore al *key item*, ossia all'errore tollerabile.

Sono stati iniziati i controlli sul campione.

Riepilogo della spesa controllata al 31.12.2006

La situazione dei controlli di II livello al 31.12.2006 per i quattro Fondi viene di seguito illustrata. Per il FESR si registrano al 31.12.2006 spese certificate con la domanda di pagamento per un importo pari a € 1.622.403.939,98 e controlli effettuati su 31 operazioni, che hanno comportato la verifica di € 89.276.688,78, garantendo il superamento della soglia minima del 5% di spesa controllata (5,50%).

Per il FEOGA a fronte di una spesa dichiarata nella domanda di pagamento al 31.12.2006 di € 462.822.164,52, è stato controllato un importo di € 67.995.806,02 su 141 operazioni, pari al 14,69% dell'avanzamento finanziario.

Per quanto attiene il FSE, al 31.12.2006 sono stati effettuati controlli su 143 operazioni per € 32.225.167,00, ovvero per un importo pari al 6,69% della spesa certificata nella domanda di pagamento al 31.12.2006, che è pari a € 481.546.527,26.

Per lo SFOP la spesa certificata al 31.12.2006 dall'Autorità di Pagamento è pari a € 36.740.810,40. I controlli hanno interessato 7 operazioni per un importo di € 3.107.825,31 (8,46%).

I dati vengono riassunti nella seguente tabella:

Fondi	Popolazione	Campione		Controlli		
	Spesa rendicontata al 31.12.2006	Spesa campionata al 31.12.2006	Operazioni campionate	Spesa controllata al 31.12.2006	Operazioni controllate	Spesa controllata su rendicontata
	€	€	N.	€	N.	%
	a	b	c	d	e	f = d/a
FESR	1.622.403.939,98	450.033.828,89	84	89.276.688,78	31	5,50%
FEOGA	462.822.164,52	90.075.975,07	175	67.995.806,02	141*	14,69%
FSE	481.546.527,26	78.524.397,02	171	32.225.167,00	143	6,69%
SFOP	36.740.810,40	27.230.390,11	51	3.107.825,31	7	8,46%
Totale	2.603.513.442,16	645.864.591,09	481	192.605.487,11	322	7,40%

* Per il FEOGA il dato riportato nel RAE 2005 (167 operazioni controllate) è stato rettificato in seguito a una verifica complessiva effettuata nel 2006. Il numero di operazioni controllate al 31.12.2005 era pari a 122; il numero di operazioni controllate al 31.12.2006 era pari a 141.

Si evidenzia che, nonostante la percentuale di spesa controllata si allinei intorno a valori omogenei per i quattro fondi, ad eccezione del Feoga che risulta nettamente superiore, il numero di operazioni controllate per il Fesr e lo Sfop risulta significativamente inferiore al numero di operazioni campionate. Questo stato di avanzamento dei controlli risente della metodologia seguita negli anni precedenti, in cui l'attività era stata concentrata sul Feoga e sul Fse. E' intenzione dell'Ufficio ripartire uniformemente i controlli tra i diversi fondi, tuttavia l'attività di verifica delle operazioni nel corso dell'anno ha risentito del ritardo dovuto alla necessità di procedere all'estrazione di un nuovo campione dell'intero universo (spese rendicontate al 31.12.2005) sulla base di un campionamento statistico che tenesse conto dell'analisi di rischio per ciascuna misura. E' stato necessario effettuare un audit system su tutte le misure. Per tale ragione, e in considerazione delle diverse caratteristiche di ogni misura, non è stato possibile raggiungere valori omogenei nel numero di operazioni controllate e nel valore della spesa media controllata per progetto.

A titolo indicativo si forniscono di seguito i dettagli relativi ai controlli effettuati nelle annualità precedenti al 2006.

Situazione al 31.12.2003

Fondi	Spesa di riferimento		Controlli	
	Spesa totale ammissibile al 31.12.2003	Spesa da controllare - campione al 31.12.2003	Spesa controllata al 31.12.2003	Spesa controllata su ammissibile
	€	€	€	%
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f = c/a</i>
Fesr	409.597.789,00	73.279.833,00	47.612.500,64	11,62%
Feoga	100.945.950,27	3.794.918,10	3.580.558,30	3,55%
Fse	124.362.149,17	21.484.260,88	10.991.810,68	8,84%
Sfop	2.512.617,59	1.381.903,60	1.027.968,95	40,91%
Totale	637.418.506,03	99.940.915,58	63.212.838,57	9,92%

Situazione al 31.12.2004

Fondi	Spesa di riferimento		Controlli	
	Spesa totale ammissibile al 31.12.2004	Spesa da controllare - campione al 31.12.2004	Spesa controllata al 31.12.2004	Spesa controllata su ammissibile
	€	€	€	%
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f = c/a</i>
Fesr	882.157.967,50	195.880.525,71	66.170.348,26	7,50%
Feoga	255.115.409,36	96.642.339,47	4.185.003,11	1,64%
Fse	181.281.858,87	49.252.173,00	23.059.520,75	12,72%
Sfop	7.303.029,86	3.680.086,93	1.027.968,95	14,08%
Totale	1.325.858.265,59	345.455.125,11	94.442.841,07	7,12%

Situazione al 31.12.2005

Fondi	Spesa di riferimento		Controlli	
	Spesa totale ammissibile al 31.12.2005	Spesa da controllare - campione al 31.12.2005	Spesa controllata al 31.12.2005	Spesa controllata su ammissibile
	€	€	€	%
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>f = c/a</i>
Fesr	1.203.919.080,34	113.382.572,07	66.170.348,26	5,50%
Feoga	412.696.809,84	81.975.025,70	5.845.164,47	1,42%
Fse	364.119.812,42	65.284.956,21	23.059.520,75	6,33%
Sfop	32.011.564,78	3.090.195,84	1.027.968,95	3,21%
Totale	2.012.747.267,38	263.732.749,82	96.103.002,43	4,77%

N.B.: La spesa da controllare è in diminuzione rispetto al 2004, per effetto dell'eliminazione di alcuni interventi dalla programmazione comunitaria 2000-2006, effettuata dall'Autorità di Gestione.

Controlli organizzativi, contabili e normativi

I controlli effettuati sui quattro fondi nel 2006 hanno evidenziato il permanere di alcune carenze e inadeguatezze della struttura organizzativa e talune – anche conseguenti - anomalie nei sistemi di gestione delle operazioni che talvolta impattano sull'efficacia del Controllo di primo livello.

Permangono, infatti, difficoltà dovute al turn over del personale dedicato alla gestione e ai controlli in itinere delle operazioni, a cui si aggiunge talvolta l'utilizzo di procedure non omogenee e standardizzate per i controlli in loco e la relativa formalizzazione.

Gli uffici separati incaricati dei controlli di I livello, istituiti presso le direzioni generali che gestiscono misure P.O.R. col compito di effettuare la verifica amministrativa e contabile sulla

documentazione di spesa fornita dai responsabili di misura, risultano parzialmente operativi; in tal caso la loro attività è limitata al solo riscontro contabile.

Per il FSE, pur se risulta ridotta l'attività ispettiva condotta direttamente dai RdM, va segnalato che è stata attivata una struttura incaricata dei controlli di I livello, che dal 2005 garantisce controlli in itinere ed a conclusione degli interventi, diversamente modulati in base all'ammontare finanziario dei progetti.

Si può considerare consolidato il superamento della criticità costituita dalla separazione delle funzioni tra Direttore Generale, Responsabili di Misura e Autorità di Pagamento.

Nei controlli su progetti ormai conclusi, a livello di Responsabile di Misura o di Beneficiario Finale, si è riscontrato ancora qualche caso di non adeguata separazione di funzioni tra i soggetti che rivestono i ruoli di gestione e di controllo.

A livello di Responsabili di Misura sono stati riscontrate interpretazioni differenti delle procedure sulla gestione delle irregolarità, ovvero comportamenti non univoci nel trattamento delle stesse.

Non risulta ancora definito un programma complessivo di verifiche ex post sul mantenimento della destinazione d'uso, con un sistema di registrazione e monitoraggio complessivo delle verifiche ex post effettuate nell'ambito dei diversi sistemi. un sistema di registrazione e monitoraggio centrale delle verifiche ex post effettuate nell'ambito dei diversi sistemi. un sistema di registrazione e monitoraggio centrale delle verifiche ex post effettuate nell'ambito dei diversi sistemi. un sistema di registrazione e monitoraggio centrale delle verifiche ex post effettuate nell'ambito dei diversi sistemi.

Anche in seguito agli esiti dei controlli sono state apportate le seguenti modifiche ai sistemi di organizzazione, di gestione e di controllo:

- L'Autorità di Gestione ha dimostrato nell'anno 2006 un adeguato livello di attenzione nell'affrontare le criticità segnalate e nel disporre correttivi.
- E' aumentata l'attività di coordinamento sui controlli di I livello, sia rispetto alla verifica documentale che ai controlli in loco, e sono stati diffusi i manuali con linee guida per dare evidenza alle verifiche interne effettuate.
- E' aumentata l'attenzione dell'AdG e dei RdM verso la necessità di segnalare senza indugio le irregolarità rilevate; è stato avviato l'accertamento delle irregolarità segnalate durante i controlli di II livello e da organismi esterni; sono state regolarizzate le procedure di segnalazione delle irregolarità all'OLAF.
- Sono stati istituiti formalmente i registri delle irregolarità e dei recuperi presso le autorità di pagamento; vengono registrate nella contabilità le rettifiche apportate alla contabilità delle spese dichiarate, e vengono regolarmente allegate alle domande di pagamento le schede relative alle rettifiche ed ai recuperi.
- E' aumentata la sensibilità verso l'esigenza di mantenere costantemente separate le funzioni di gestione e di controllo a livello di RdM e beneficiari finali.

Irregolarità riscontrate nell'anno 2006

FESR

Le irregolarità riscontrate incidono per una percentuale contenuta, pari allo 0,55% sul totale delle spese controllate, non sono risultate sistematiche e riguardano l'affidamento di incarichi con procedure non coerenti con la normativa vigente nel periodo di programmazione POR.

Gli esiti dei controlli effettuati alla fine del 2006 sono stati trasmessi ai soggetti interessati nel corso dell'anno 2007.

FEOGA

Le irregolarità riscontrate incidono per una percentuale contenuta, pari allo 0,09% sul totale delle spese controllate e non sono risultate sistematiche. Le tipologie di problematiche riscontrate sono relative a:

- Non corrette registrazioni contabili della spesa
- Non corretta rendicontazione della spesa
- Mancata o incompleta realizzazione dell'opera

- Mancanza di requisiti di ammissione
- Realizzazione non conforme dell'azione
- Spese non legittime - costo beneficio non probante

I Responsabili di Misura hanno avviato le attività di accertamento delle irregolarità e di recupero delle somme confermate irregolari.

FSE

Le irregolarità riscontrate incidono per una percentuale contenuta, pari allo 0,78% sul totale delle spese controllate e non sono risultate sistematiche. Le tipologie di problematiche riscontrate sono relative a:

- Mancanza di documentazione giustificativa della spesa
- Spese non ammissibili ai sensi della normativa comunitaria
- Non corrette registrazioni contabili della spesa
- Non corretta rendicontazione della spesa
- Mancata o incompleta realizzazione dell'opera
- Contabilità assente
- Spese non afferenti al periodo di realizzazione
- Spese non legittime / costo beneficio non probante

I Responsabili di Misura hanno avviato le attività di accertamento delle irregolarità.

SFOP

Le irregolarità riscontrate incidono per una percentuale pari al 14,47% sul totale delle spese controllate. Sono in corso le attività di verifica per valutare la sistematicità o meno degli errori rilevati.

Le tipologie di irregolarità riscontrate sono:

- Vendita del bene anteriormente alla scadenza dei 5 anni prevista nel decreto di concessione del contributo

Non ammissibilità dell'operazione per presentazione della domanda oltre i termini previsti in bando.

Sono stati avviati dal Responsabile di Misura gli accertamenti sulle irregolarità segnalate dall'ufficio di controllo di II livello nel 2006.

2.10 Informazioni relative alle tecniche di ingegneria finanziaria

Gli strumenti di ingegneria finanziaria attivati nell'ambito del POR Sardegna sono inseriti nell'ambito della misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale e, in particolare, nelle azioni che hanno ad oggetto l'attuazione dei seguenti aiuti di stato autorizzati:

- n. 511/02 inerente i "Fondi per la capitalizzazione delle PMI" notificato ed autorizzato in data 17.09.2003 con nota C(2003) n. 3229, attivato nell'ambito della linea di azione b), della Misura 4.1 del POR Sardegna;
- n. 402/02 inerente i "Prestiti partecipativi alle PMI" notificato ed autorizzato in data 23.06.2003 con nota C (2003) n. 2015 attivato nell'ambito della linea d'azione "d" della Misura 4.1 del POR Sardegna;
- n. 597/02 inerente i "Fondi di Seed capital per l'avviamento di nuove imprese" notificato ed autorizzato in data 25.09.2003 con nota C (2003) n. 3453, attivato nell'ambito della linea d'azione "e" della Misura 4.1 del POR Sardegna.

In ottemperanza della norma n. 8 del Reg. (CE) n. 448/2004 e nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni poste dallo stesso, i Fondi opereranno come entità giuridica indipendente, o come un capitale in seno ad una istituzione finanziaria già esistente, con una contabilità totalmente separata nella forma del conto corrente bancario.

L'intervento finanziario sarà volto all'acquisizione, da parte dell'Istituto gestore, di una partecipazione al capitale sociale nell'impresa beneficiaria, le assunzioni di partecipazioni avverranno esclusivamente in occasione di aumento di capitale sociale. Potranno beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese industriali operanti nei settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 1991 sezione C/D, nonché le imprese fornitrici di servizi ausiliari alle imprese industriali e le PMI aderenti ai Consorzi fidi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, delle costruzioni, dei servizi connessi alle attività industriali, del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi. Le operazioni di partecipazione saranno effettuate solo in aziende, in fase di costituzione, di avviamento o di espansione. Gli aiuti non potranno essere concessi ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. I proventi dei Fondi non saranno distribuiti ai partecipanti, ma reinvestiti negli stessi. Alla fine del periodo di programmazione POR Sardegna 2000-06 la giacenza finale dei fondi, al netto dei costi di gestione, sarà ripartita tra gli investitori (pubblico e privato) in proporzione alle quote possedute. L'Amministrazione regionale potrà comunque effettuare qualsiasi tipo di controllo sia sulle singole operazioni di partecipazione che sul corretto funzionamento dei Fondi.

3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Le tabelle che seguono sono state elaborate conformemente alle indicazioni formulate dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alla predisposizione del Rapporto annuale di esecuzione. In ossequio agli orientamenti del DPS, i dati di avanzamento finanziario si riferiscono agli impegni e ai pagamenti registrati nel sistema di monitoraggio MonitWeb.

Di seguito sono rappresentate le tabelle relative:

- all'esecuzione finanziaria per Assi, Misure e Fondo del POR, registrata al 31.12.2006 in termini di spesa pubblica certificata;
- al totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione e dallo Stato sino al 31.12.2006.

3.1 Tabella riepilogativa, generale e per Fondo, delle spese effettive

Le tabelle a seguire mostrano una spesa complessiva del Programma, al 31.12.2006, di € 2.603.513.422,16, pari al 61,14% della spesa ammissibile totale prevista. Per l'anno oggetto di trattazione, l'avanzamento del FESR, FSE, FEOGA e SFOP ha consentito di evitare l'applicazione del disimpegno automatico.

Per il raffronto tra spese certificate e spesa ammissibile si è tenuto conto nella del piano finanziario approvato con decisione CE(2005)4820 del 1° dicembre 2005. Lo stesso piano finanziario è stato altresì utilizzato nell'analisi condotta sulle misure di cui al successivo Capitolo 4.

Tabella riepilogativa POR Sardegna 2000-2006
CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010
Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
Asse I	1.044.678.000,00	81.660.064,67	82.989.625,86	91.731.594,83	108.117.697,15	77.048.972,63	146.565.280,55	165.964.982,65	754.078.218,34	72,18%	
1.1	510.653.000,00	46.012.849,09	60.913.190,51	65.954.819,48	77.766.617,40	37.508.592,96	86.402.415,40	75.305.372,23	449.863.857,07	88,10%	344 -345
	224.687.320,00								227.547.229,62		344
	285.965.680,00								222.316.627,45		345
1.2	49.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.773,46	2.301.743,56	22.984.717,86	33.963.234,88	68,96%	1308
1.3	275.606.000,00	25.329.331,45	7.287.453,87	12.351.116,57	17.095.597,45	22.918.391,64	40.460.590,18	33.290.943,83	158.733.424,99	57,59%	353
1.4	74.388.000,00	8.185.809,53	7.419.003,93	8.368.488,99	8.484.701,52	0,00	7.382.325,98	17.779.049,49	57.619.379,44	77,46%	343-351
	66.949.200,00								56.049.605,50		343
	7.438.800,00								1.569.773,94		351
1.5	49.327.000,00	1.839.471,06	7.238.213,03	4.012.912,76	1.269.591,77	1.763.456,38	5.051.867,88	6.963.228,23	28.138.741,11	57,05%	171-172-353
	34.528.900,00								24.195.983,56		171
	4.932.700,00								299.521,94		172
	9.865.400,00								3.643.235,61		353
1.6	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.757,00	408.552,33	3.207.184,97	3.884.494,30	17,75%	332-162
	19.913.530,00								3.187.395,84		332
	1.969.470,00								697.098,46		162
1.7	28.511.000,00	292.603,54	131.764,52	576.886,34	157.053,28	169.686,96	800.042,38	4.712.446,06	6.840.483,08	23,99%	322-323
	27.085.450,00								6.840.483,08		322
	1.425.550,00								0,00		323
1.8	24.056.000,00	0,00	0,00	467.370,69	3.344.135,73	3.379.128,47	1.644.520,28	1.005.003,00	9.840.158,17	40,91%	23
1.9	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.185,76	2.113.222,56	717.036,98	5.194.445,30	47,22%	125-126-127

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
	8.800.000,00								5.194.445,30		125
	550.000,00								0,00		126
	1.650.000,00								0,00		127
Asse II	396.970.000,00	14.059.921,35	11.636.560,61	10.780.712,31	22.139.316,30	41.926.582,79	49.839.834,91	53.875.000,84	204.257.929,11	51,45%	
2.1	171.721.068,00	5.700.020,38	6.523.205,60	2.802.032,90	3.305.773,58	14.434.642,32	18.012.959,05	22.718.735,78	73.497.369,61	42,80%	354
2.2	49.576.932,00	4.476.382,03	3.790.832,40	1.460.770,20	3.030.422,08	10.887.696,29	6.712.730,02	7.919.999,71	38.278.832,73	77,21%	354
2.3	151.616.000,00	3.883.518,94	1.322.522,61	5.847.974,71	12.387.743,24	15.398.254,46	24.736.311,78	23.223.420,68	86.799.746,42	57,25%	354
2.4	24.056.000,00	0,00	0,00	669.934,50	3.415.377,40	1.205.989,72	377.834,06	12.844,67	5.681.980,35	23,62%	23
Asse III	724.930.000,00	4.448.989,80	20.729.485,00	39.982.612,36	52.840.104,47	57.433.779,39	116.969.781,54	125.673.099,43	418.077.851,99	57,67%	
3.1	46.823.758,00			289.160,64	5.058.657,42	5.011.555,77	6.674.563,28	7.516.802,30	24.550.739,41	52,43%	21
3.2	165.530.091,00		3.754.064,71	16.164.775,13	5.234.267,28	15.541.496,23	48.435.396,65	76.400.091,00	165.530.091,00	100,00%	21-23
	49.659.027,30								158.536.429,84		21
	115.871.063,70								6.993.661,16		23
3.3	56.043.000,00	0,00	10.330.895,80	13.574.176,33	7.008.396,14	5.175.531,73	12.338.132,94	1.795.817,61	50.222.950,55	89,62%	21-23-24
	2.802.150,00								49.720.721,04		21
	14.010.750,00								502.229,51		23
	39.230.100,00								0,00		24
3.4	41.913.764,00	0,00	0,00	162.977,26	2.711.936,57	3.082.078,65	4.372.802,31	3.985.177,57	14.314.972,36	34,15%	22
3.5	9.000.000,00	0,00	0,00		960.269,53	2.737.827,69	1.333.679,66	405.829,31	5.437.606,19	60,42%	23
3.6	21.049.558,00	0,00	2.504.076,78	19.331,80	3.860.760,86	675.881,94	1.710.860,87	4.240.700,92	13.011.613,17	61,81%	22-23
3.7	33.467.475,00	1.133.895,50	2.071.486,30	3.276.579,11	2.628.507,52	4.061.877,45	3.630.321,30	4.808.116,48	21.610.783,66	64,57%	23
3.8	21.500.000,00	0,00	0,00	432.672,27	2.100.278,58	1.556.225,55	948.035,65	2.311.280,37	7.348.492,42	34,18%	23

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
3.9	26.009.975,00	0,00	0,00	24.290,03	3.564.595,72	1.590.707,53	2.843.591,57	5.195.544,88	13.218.729,73	50,82%	23
3.10	69.253.000,00	0,00	0,00	230.193,15	3.592.691,87	9.933.220,18	23.532.432,48	4.353.230,56	41.641.768,24	60,13%	24
3.11	41.169.822,00	0,00	0,00	45.532,61	7.649.334,86	3.263.643,63	4.344.862,52	1.349.214,82	16.652.588,44	40,45%	25
3.12	62.752.000,00	55.849,24	1.060.454,22	4.733.340,08	8.350.115,40	4.685.500,06	6.158.697,00	10.497.691,05	35.541.647,05	56,64%	36
3.13	78.124.000,00	3.259.245,06	1.008.507,19	1.029.583,95	120.292,72	118.232,98	0,00	974.907,13	6.510.769,03	8,33%	181-182-183-164
	19.531.000,00								6.510.769,03		181
	43.749.440,00								0,00		182
	9.374.880,00								0,00		183
	5.468.680,00								0,00		164
3.14	642.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23
3.15	3.214.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.180,39	404.180,39	12,57%	23
3.16	29.834.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.184,63	988.184,63	3,31%	23-24
	23.867.242,40								201.205,70		23
	5.966.810,60								786.978,93		24
3.17	13.300.000,00							225.169,84	225.169,84	1,69%	23
3.18	5.301.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.405,31	221.160,57	867.565,88	16,36%	23
Asse IV	1.266.085.040,00	17.491.117,38	39.636.733,68	71.303.754,39	115.966.082,89	137.479.280,83	234.590.908,97	132.015.922,65	748.483.800,79	59,12%	23
4.1	179.586.000,00	10.250.561,52	29.318.704,00	10.923.869,03	0,00	4.631.494,73	55.206.014,40	75.304.602,23	185.635.245,91	103,37%	161-165-413
	169.069.544,00								175.716.041,15		161
	10.000.000,00								9.919.204,76		165
	516.456,00								0,00		413

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
4.2	9.000.000,00	86.764,76	574.780,38	312.355,80	139.442,40	139.185,28	-15.370,10	430.408,30	1.667.566,82	18,53%	163-164
	7.000.000,00								82.251,06		163
	2.000.000,00								1.585.315,76		164
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.456,65	2.084.456,65	10,42%	164-324
	12.824.000,00								2.084.456,65		164
	7.176.000,00								0,00		324
4.5	140.456.000,00	0,00	974.960,56	264.529,80	1.268.979,36	2.169.927,55	19.111.309,05	22.147.505,51	45.937.211,83	32,71%	171-172
	110.399.043,00								27.398.929,52		171
	30.056.957,00								18.538.282,31		172
4.6	64.150.000,00	0,00	0,00	5.689.622,49	22.298.553,88	19.662.042,44	4.207.701,54	896.104,49	52.754.024,84	82,24%	23-24
	51.320.000,00								47.086.888,13		23
	12.830.000,00								5.667.136,71		24
4.7	62.810.160,00	266.749,99	323.141,10	452.071,52	1.253.576,53	8.445.490,73	16.359.931,11	4.133.599,75	31.234.560,73	49,73%	144-145-143
	16.674.166,67								7.125.923,76		143
	24.220.073,33								19.895.314,91		144
	21.915.920,00								4.213.322,06		145
4.8	13.180.880,00	834.453,11	927.534,59	396.695,23	105.427,70	1.495.097,19	1.151.395,97	595.645,88	5.506.249,67	41,77%	143-146-147-414
	2.243.400,00								0,00		143
	1.001.000,00								637.094,00		146
	8.676.480,00								4.064.651,24		147

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
	1.260.000,00								804.504,43		414
4.9	216.302.000,00	0,00	0,00	20.481.301,92	6.966.903,55	35.511.690,49	32.742.816,76	-5.525.461,12	90.177.251,60	41,69%	111
4.10	136.600.000,00	0,00	0,00	3.990.329,76	4.227.128,92	33.856.980,48	18.671.687,52	7.637.092,20	68.383.218,88	50,06%	114
4.11	30.491.000,00	0,00	0,00	2.122.911,91	4.117.752,94	3.633.230,45	4.163.896,62	-287.593,92	13.750.198,00	45,10%	1304
4.12	24.001.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.866,38	2.524.241,00	-900.464,00	2.530.643,38	10,54%	1307
4.13	15.659.000,00	0,00	0,00	3.097.501,58	0,00	827.722,36	369.886,60	0,00	4.295.110,54	27,43%	1305
4.14	34.497.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1306-1310
	27.597.652,00								0,00		1306
	6.899.413,00								0,00		1310
4.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1310-1311
4.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.17	22.781.565,00	1.685.968,20	4.056.931,74	2.554.602,84	882.429,74	1.276.125,84	389.276,18	-500.281,88	10.345.052,66	45,41%	1.313
4.18	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.129,28	418.129,28	6,97%	113
4.19	64.957.278,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	41.926.143,26	24.000,02	59.950.143,28	92,29%	1302
4.20	143.612.534,00	4.366.619,80	3.460.681,31	917.962,51	46.220.887,87	20.118.426,91	27.286.979,06	13.653.179,26	116.024.736,72	80,79%	1309
4.21	82.000.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	10.485.000,00	4.805.000,00	10.495.000,00	11.905.000,00	57.790.000,00	70,48%	112
Asse V	371.902.000,00	8.126.332,28	9.829.316,28	9.715.440,09	9.972.842,98	21.943.631,53	51.230.692,25	47.024.222,75	157.842.478,16	42,44%	
5.1	319.068.000,00	4.780.882,60	6.729.285,15	8.357.995,20	8.739.376,96	15.092.950,26	45.928.797,58	42.990.748,31	132.620.036,06	41,56%	352
5.2	28.778.000,00	3.345.449,68	3.100.031,13	1.357.444,89	445.859,14	660.426,61	403.089,65	2.721.213,01	12.033.514,11	41,81%	36-413-166
	20.576.916,00								12.033.514,11		36
	3.700.000,00								0,00		413

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
	4.501.084,00								0,00		166
5.3	24.056.000,00	0,00	0,00		787.606,88	6.190.254,66	4.898.805,02	1.312.261,43	13.188.927,99	54,83%	23
Asse VI	430.540.000,00	13.501.344,47	24.970.991,34	50.225.278,87	43.786.169,80	50.094.702,69	64.210.460,65	62.725.050,39	309.513.998,21	71,89%	
6.1	201.572.566,00	11.589.070,01	16.128.296,18	41.136.237,41	31.529.357,62	33.641.901,22	34.532.274,94	16.997.113,06	185.554.250,44	92,05%	318-312
	198.732.053,00								185.554.250,44		312
	2.840.513,00								0,00		318
6.2	98.251.434,00	976.244,08	8.624.972,42	4.049.381,66	423.006,38	3.129.243,56	11.282.185,64	13.127.608,19	41.612.641,93	42,35%	317
6.3	94.660.000,00	936.030,38	217.722,74	1.550.997,11	3.508.878,52	5.261.255,49	14.215.892,46	32.027.529,14	57.718.305,84	60,97%	32
6.4	24.056.000,00	0,00	0,00	3.488.662,69	8.324.927,28	8.062.302,42	4.180.107,61	0,00	24.056.000,00	100,00%	23
6.5	12.000.000,00						0,00	572.800,00	572.800,00	4,77%	161-166-171-36-413-415
	2.000.000,00								0,00		161
	2.000.000,00								0,00		166
	1.000.000,00								0,00		171
	5.000.000,00								0,00		36
	960.000,00								172.800,00		413
	1.040.000,00								400.000,00		415
Assistenza tecnica	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	3.487.896,07	11.259.165,56	48,01%	
7.1	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	3.487.896,07	11.259.165,56	48,01%	411-412-413-415
	17.001.250,00								9.300.941,86		411
	1.758.750,00								1.483.024,75		412

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spesa cumulata al 31.12.2006	% realizz. totale	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+c+d+e+f+g+h	l=i/a	n
	2.345.000,00								151.186,13		413
	2.345.000,00								324.012,82		415
Totale	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	590.766.174,78	2.603.513.442,16	61,14%	
FESR	2.600.980.000,00	131.000.083,35	162.363.900,44	175.918.386,49	180.142.197,44	174.638.813,66	379.855.698,97	418.484.859,63	1.622.403.939,98	62,38%	
FSE	744.428.000,00	1.133.895,50	18.660.523,59	44.535.278,70	82.540.297,52	91.129.764,06	126.120.053,05	117.426.714,84	481.546.527,26	64,69%	
FEOGA*	837.156.000,00	6.052.588,00	7.517.613,05	53.264.610,52	90.900.103,02	111.977.002,13	142.984.893,12	50.125.354,68	462.822.164,52	55,29%	
SFOP	75.991.040,00	1.101.203,10	1.250.675,69	848.766,75	1.359.004,23	9.940.587,92	17.511.327,08	4.729.245,63	36.740.810,40	48,35%	
Totale	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	590.766.174,78	2.603.513.422,16	61,14%	

3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

La tabella che segue espone gli importi erogati al 31.12.2006 dalla Commissione europea e dallo Stato italiano a valere sullo stanziamento del POR Sardegna 2000-2006.

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accreditato - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
FESR	811.437.652,86	596.190.147,92	1.407.627.800,78		
Acc. del 7% 1° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.10.00	28.11.00
Acc. del 7% 2° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.12.00	02.02.01
I pag. int.	34.417.810,78	24.092.467,53	58.510.278,31	29.04.02	05.08.02
II pag. int.	168.722.892,44	118.251.550,94	286.974.443,38	05.02.03	31.07.03
III pag. int.	94.579.043,41	85.407.096,20	179.986.139,61	15.12.03	14.06.04
IV pag. int.	27.638.988,76	15.622.575,03	43.261.563,79	04.05.04	14.06.04
V pag. int.	28.115.569,25	22.376.175,92	50.491.745,17	11.10.04	27.10.04
VI pag. int.	32.987.213,53	20.395.772,24	53.382.985,77	04.12.04	04.12.04
VII pag.int. *	19.151.936,94	17.899.120,00	37.051.056,94	02.09.05	02.09.05
VIII pag.int**	5.397.837,04	11.847.195,00	17.245.032,04	02.09.05	02.09.05
IX pag. int.	22.657.327,91	15.860.129,00	38.517.456,91	11.10.05	17.10.05
X pag. int.	71.524.896,24	50.067.532,21	121.592.428,45	29.11.05	29.11.05
XI pag. int.	22.240.551,89	15.568.375,50	37.808.927,39	15.12.05	15.12.05
XIII pag.int.	12.874.009,75	9.011.822,74	21.885.832,49	11.01.06	11.01.06
XIV pag.int.	34.645.192,56	24.251.655,52	58.896.848,08	22.02.06	22.02.06
XV pag.int.	13.619.528,73	9.533.704,94	23.153.233,67	08.05.06	08.05.06
XVI pag.int.	34.821.656,26	24.375.240,05	59.196.896,31	07.06.06	14.06.06
XVII pag.int.	18.639.530,02	13.047.727,86	31.687.257,88	02.10.06	02.10.06
XVIII pag.int.	88.488.847,35	61.941.787,24	150.430.634,59	01.12.06	01.12.06
FSE	206.710.222,50	144.697.333,57	351.407.556,07		
Acc. del 7% 1° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	15.12.00	14.02.01
Acc. del 7% 2° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	22.12.00	02.03.01
I pag. int.	7.042.480,26	4.929.736,18	11.972.216,44	22.05.2002	29.03.2002
II pag. int.	8.258.572,88	5.781.001,02	14.039.573,90	08.10.2002	16.09.2002
III pag. int.	13.972.469,25	9.780.728,48	23.753.197,73	25.03.2003	18.03.2003
IV pag. int.	8.210.573,33	5.747.401,33	13.957.974,66	02.10.2003	03.10.2003
V pag. int.	24.578.624,69	17.205.037,28	41.783.661,97	19.12.2003	26.11.2003
VI pag. int.	9.081.883,68	6.357.318,56	15.439.202,24	08.03.2004	26.02.2004
VII pag. int.	13.160.942,36	9.212.659,65	22.373.602,01	01.10.2004	22.09.2004
VIII pag. int.	7.755.935,51	5.429.154,86	13.185.090,37	30.11.2004	03.12.2004
IX pag. int.	26.938.397,74	18.856.878,42	45.795.276,16	03.08.2005	03.08.2005
X pag. int.	8.381.470,86	5.867.029,60	14.248.500,46	02.09.2005	02.09.2005
XI pag. int.	4.975.002,57	3.482.501,80	8.457.504,37	13.10.2005	13.10.2005
XII pag. int.	19.092.332,93	13.364.633,05	32.456.965,98	09.12.2005	09.12.2005
XIII pag. int.	15.788.205,73	11.051.907,84	26.840.113,57	14.02.2006	10.03.2006
XIV pag. int.	7.577.287,05	5.304.100,94	12.881.387,99	14.09.2006	14.09.2006
XV pag. int.	6.891.063,66	4.823.744,56	11.714.808,22	12.12.2006	12.12.2006
FEOGA***	247.640.768,35	168.321.534,39	415.962.302,74		
Acc. del 7%	28.425.460,00	19.897.850,00	48.323.310,00	15.12.00	14.12.01
Pag. int.	2.777.949,00	1.944.256,41	4.722.205,41	03.07.02	27.09.02
Pag. int.	3.954.528,00	2.831.076,72	6.785.604,72	04.02.03	11.03.03
Pag. int.	25.721.100,00	18.417.653,34	44.138.753,34	30.04.03	22.07.03

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accredito - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
Pag. int.	2.819.795,00	8.884.086,74	11.703.881,74	22.01.04	27.05.04
Pag. int.	44.724.291,00	18.356.175,35	63.080.466,35	30.04.04	27.05.04
Pag. int.	6.905.957,00	4.834.170,08	11.740.127,08	22.12.04	01.04.05
Pag. int.	5.026.157,00	3.518.309,81	8.544.466,81	22.12.04	06.04.05
Pag. int.	20.181.918,00	14.665.425,53	34.847.343,53	30.12.04	04.04.05
Pag. int.	21.975.572,00	15.382.900,81	37.358.472,81	08.08.05	02.09.05
Pag. int.	8.167.203,00	5.717.042,10	13.884.245,10	05.09.05	05.09.05
Pag. int.	18.745.423,00	13.121.796,75	31.867.219,75	09.12.05	09.12.05
Pag. int.	44.579.819,62	31.205.873,73	75.785.693,35	06.03.06	06.03.06
Pag. int.	10.707.596,82	7.495.317,78	18.202.914,60	10.09.06	14.09.06
Pag. int.	2.927.998,91	2.049.599,24	4.977.598,15	06.12.06	06.12.06
SFOP****	13.190.354,88	9.233.394,61	22.423.749,49		
Acc. del 7%	1.890.770,00	1.323.560,00	3.214.330,00	10.01.01	23.02.01
Pag. int.	682.911,60	1.274.501,90	2.891.077,83	28.05.02	14.11.04
Pag. int.	281.819,52			18.02.03	
Pag. int.	651.844,81			15.03.04	
Pag. int.	920.031,32	501.123,18	1.421.154,50	08.08.05	09.09.05
Pag. int.	2.606.614,90	1.824.630,43	4.431.245,33	08.08.05	09.09.05
Pag. int.	490.303,87	343.337,88	833.641,75	20.12.05	23.12.05
Pag. int.	5.666.058,86	3.966.241,22	9.632.300,08	06.03.06	06.03.06
TOTALE	1.278.978.998,59	918.442.410,49	2.197.421.409,08		

* A fronte di una richiesta pari a € 25.570.172,50 l'U.E. ha trattenuto l'importo di € 6.418.235,56 a compensazione del saldo del contributo POP 1994/1995

** A fronte di una richiesta pari a € 16.924.564,00 l'UE ha rettificato l'importo a € 5.397.837,04, a seguito della sospensione relativa alla Misura 6.1, in attesa dell'approvazione dei "grandi progetti"

*** FEOGA: La quota comunitaria accreditata, a valere sulle domande di pagamento del 7 dicembre 2004, differisce rispetto alla somma effettivamente spettante, di - € 768.689,91.
La quota nazionale accreditata, a valere sulla domanda di pagamento di dicembre 2003, differisce rispetto alla somma richiesta di - € 5.565.116,04.

**** SFOP: Le somme accreditate derivano dal calcolo effettuato dai Servizi Finanziari della Commissione e dal MEF sulle domande di pagamento inoltrate.

Le date di accredito si riferiscono alla quietanza di accreditamento della quota comunitaria, mentre quelle di uscita, quando riportate, sono relative al trasferimento della quota nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Stato di avanzamento degli Assi prioritari e delle Misure

Asse I – Risorse naturali

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	960.368.000,00	480.184.000,00	480.184.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
FEOGA	60.254.000,00	30.127.000,00	30.127.000,00		
Totale	1.044.678.000,00	522.339.000,00	522.339.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	960.368.000,00	892.686.248,05	92,95%	711.512.627,77	74,09%
FSE	24.056.000,00	13.333.383,04	55,43%	9.628.099,44	40,02%
FEOGA	60.254.000,00	41.971.160,88	69,66%	39.157.680,19	64,99%
Totale	1.044.678.000,00	947.990.791,97	90,74%	760.298.407,4	72,77%

Pagamenti certificati al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	960.368.000,00	705.080.379,99	67,49%
FSE	24.056.000,00	9.840.158,17	40,91%
FEOGA	60.254.000,00	39.157.680,18	64,99%
Totale	1.044.678.000,00	754.078.218,34	72,18%

Anche per l'annualità 2006, all'avanzamento finanziario dell'Asse contribuiscono, in prevalenza, le Misure cofinanziate dal FESR che, in termini di impegni, incidono sulla spesa ammissibile dell'intero Asse per oltre il 90%. Gli importi dei pagamenti monitorati e delle spese certificate risentono dell'andamento positivo del FESR: con un ammontare pari a € 711.512.627,77 ed € 705.080.379,99, le erogazioni si attestano rispettivamente al 74,09% e al 67,49% del costo ammissibile.

L'avanzamento dell'Asse, per ciò che concerne il FSE, registra un incremento delle realizzazioni, relative alla Misura 1.8, di circa un milione di euro rispetto all'annualità precedente. La capacità di spesa della succitata Misura si attesta intorno al 40,91% dello stanziamento disponibile.

Per quanto concerne il FEOGA, l'avanzamento dell'Asse, dal punto di vista dell'attuazione finanziaria, è principalmente imputabile alla Misura 1.2, che fa registrare incrementi della capacità di impegno e di spesa rispettivamente del 207,88% e del 209,36% rispetto ai corrispondenti valori rilevati alla fine del 2005. Tale avanzamento è in larga misura ascrivibile alla rendicontazione dei progetti coerenti con l'obiettivo e i criteri di selezione della Misura.

Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti – al miglioramento delle condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
510.653.000,00	255.326.500,00	255.326.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	510.653.000,00	545.316.357,51	106,79%	451.878.658,73	88,49%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	510.653.000,00	449.863.857,08	88,10%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, la misura ha impegnato risorse per complessivi € 545.316.357,51 (106,79% della spesa ammissibile) e i pagamenti ammontano a € 451.878.658,73 (capacità di spesa del 88,49%). Rispetto al 2005, il dato relativo ai pagamenti si incrementa di circa 13 punti percentuali e la *performance* complessiva si colloca a livelli nettamente superiori a quelli medi registrati dal FESR (impegni 86% e pagamenti 63%). Le spese certificate risultano pari a € 449.863.857,08.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Acqua potabile			
Accumulo			
Altre opere d'accumulo			
Interventi	n.	3	1
Capacità impianti	mc	30.000.000	18.073.000
Captazione e adduzione			
Interventi per uso civile			
Lunghezza rete	km	50	129,92
Capacità impianti	mc/sec	2,8	6,37
Interventi	n.	4	13
Interventi per uso agricolo			
Lunghezza rete	km	60	-
Capacità impianti	mc/sec	1	-
Interventi	n.	2	-
Interventi per uso plurimo			
Lunghezza rete	km	100	71,85
Capacità impianti	mc/sec	20	17,50
Interventi	n.	6	4
Rete idrica			
Reti urbane			
Lunghezza rete	km	50	26,02
Grandi schemi idrici			
Lunghezza rete	km	60	
Interventi	n.	8	
Interventi per riduzione perdite			
Lunghezza rete	km	50	103,19
Interventi	n.	2	
Contatori installati			
Utenti interessati per contatori	n.	6.000	
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile			
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile			
Interventi	n.	2	-
Capacità impianti	mc/g	1.200	-
Acque Reflue - Depurazione			
Rete fognaria			
Rete fognaria			
Lunghezza rete	km	300	146,33
Stoccaggio e sollevamento acque reflue			
Stoccaggio e sollevamento acque reflue			
Capacità impianti	mc/g	600.000	-
Trattamento e depurazione			
Trattamento secondario			
Interventi	n.	2	2
Abitanti equivalenti	n.	65.000	56.700
Trattamento terziario			
Interventi	n.	16	14
Abitanti equivalenti	n.	1.000.000	1.244.145
Reflui trattati in impianti resi conformi al DLgs 152/99	mc/a	70.000.000	73.018.934

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'avanzamento fisico al 31.12.2006 mostra risultati significativi per entrambe le categorie UE. L'indicatore "lunghezza rete" per la sottotipologia "interventi di uso civile" supera significativamente il *target* previsto a fine periodo con 29,92 Km di rete riferiti a 13 interventi; si conferma la valorizzazione dell'indicatore "interventi" afferente alla sottotipologia "Altre opere d'accumulo" con una capacità di 18.073.000 mc; i 4 "Interventi per uso plurimo" e gli "Interventi

per riduzione perdite” che interessano una “lunghezza rete” effettiva di 103,19 km evidenziano l’ottima performance per la categoria UE Acqua potabile

Per la categoria UE Acque reflue e Depurazione valgono considerazioni analoghe; in particolare:

- per la tipologia “Rete fognaria”, l’indicatore “Lunghezza rete” registra un ulteriore incremento (146,33 km di rete realizzati);
- la tipologia “Trattamento e depurazione”, con la sottotipologia “Trattamento secondario”, raggiunge il valore atteso a fine programma (due interventi conclusi) e con la sottotipologia “trattamento secondario”, attraverso i 14 interventi ultimati, supera il valore atteso per i due indicatori “Abitanti equivalenti” e “Reflui trattati in impianti resi conformi al DLgs 152/99”.

La valorizzazione degli indicatori relativi alle tipologie “Grandi schemi idrici”, “Interventi per riduzione delle perdite”, “Stoccaggio e sollevamento acqua potabile” “Stoccaggio e sollevamento acque reflue” è subordinata alla conclusione degli interventi che, per la loro complessità, richiedono tempi di esecuzione lunghi. Gli “Interventi per uso agricolo” non sono stati avviati e, infine, il numero dei “Contatori installati” è in corso di ridefinizione da parte di Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato.

4.D Osservazioni generali relative all’attuazione

Alla data di riferimento si evidenzia l’ottima *performance* della misura che dispone, al lordo dei progetti coerenti, di un overbooking del 6% relativamente all’allocazione delle risorse e del 39% rispetto alla sua programmazione.

Le operazioni gestite dagli Assessorati dei LLPP e dell’Ambiente a valere sulla misura sono complessivamente 193 (oltre il 94% sono avviate e 97 concluse).

Tra le 86 operazioni facenti capo all’Assessorato ai Lavori Pubblici l’avanzamento finanziario va imputato:

- ai 9 interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Risorse idriche - Opere fognario depurative” siglato il 26.02.2002, riguardanti completamenti e opere di riqualificazione delle infrastrutture idriche di offerta primaria, gestite direttamente dalla Regione e dai suoi Enti strumentali. Alla data del presente rapporto 7 risultano ultimati.
- Alle 24 operazioni selezionate a seguito del Bando “Riqualificazione reti idriche urbane” pubblicato sul BURAS n. 22 del 29.07.2002 (azioni dirette all’eliminazione delle consistenti perdite idriche, dovute all’inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione), finalizzato all’erogazione di finanziamenti per un importo complessivo pari a € 57.122.720, la cui graduatoria definitiva è stata approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Dighe e Risorse Idriche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici in data 03.12.2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002. Tutti i progetti risultano avviati e tra questi 17 sono conclusi (71%) Tali operazioni risultano coerenti con le previsioni di intervento del Piano d’Ambito, approvato con Ordinanza Commissariale n. 321 del 30.09.2002, e specificatamente con il Progetto Obiettivo n. 1: “Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali”;
- Alle 32 operazioni inserite nel POT e selezionate a seguito delle prescrizioni del QCS Ob. 1 e del POR, per le quali l’Autorità d’Ambito Territoriale, adottando il Programma Operativo Triennale entro il 31.12.2004, ha identificato il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Ai 21 progetti individuati con Determina del Direttore del Servizio del 7 ottobre 2002. Sono stati rendicontati durante il primo triennio del POR tendendo al limite di spesa previsto, pari al 30%; tra questi 7 sono stati inseriti nel POT e prosegue regolarmente la loro

rendicontazione mentre per 14 interventi si registrano modesti avanzamenti dei valori di impegno e spesa. Le operazioni concluse sono 17 (80%).

Per le opere gestite dall'Assessorato all'Ambiente l'avanzamento deve essere ricondotto a:

- 18 operazioni (17 avviate e 3 concluse) inserite nel Programma Operativo Triennale e relativo stralcio annuale 2004 (impegno programmatico predisposto dall'Autorità d'Ambito);
- 41 interventi dell'iter "opere fognario depurative" (22 ultimati per un importo di € 67.471.229,77);
- 14 progetti inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Risorse idriche - Opere fognario depurative" siglato il 26.02.2002, avviati entro il 2005; per 5 di essi si rileva la conclusione dei lavori;
- 7 operazioni conformi agli strumenti generali di programmazione e agli indirizzi generali della Regione di cui alla DGR 50/13 del 30.11.2004 e avviate alla data di riferimento (una delle quali risulta conclusa nel corso del 2006);
- 27 progetti individuati dall'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n. 397 del 27.05.2004, 9 dei quali risultano ultimati a fronte dei 25 avviati.

Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata ad assicurare un'adeguata disponibilità idrica per le attività produttive agricole, sostenendo l'introduzione di meccanismi che possono migliorare la gestione delle risorse idriche. Sono previsti due tipi di interventi: a) acquisto e implementazione di impianti di misurazione, b) razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.254.000,00	24.627.000,00	24.627.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	36.612.639,82	74,33%	33.963.234,90	68,96%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	33.963.234,88	68,96%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

Con riferimento agli impianti di misurazione aziendali e alla loro installazione, l'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR alla Commissione Europea in seguito alla revisione intermedia.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nell'anno di riferimento la Misura ha registrato un notevole incremento sia nei valori di impegno sia nei pagamenti. I primi, in valore assoluto, si attestano a € 36.612.639,82 con un incremento del 207,88%, mentre la spesa si accresce di un'aliquota pari al 209,36%, portandosi a € 33.963.234,88. Le capacità di impegno e di pagamento, triplicate rispetto all'anno precedente, si attestano rispettivamente ai valori di 74,33% e 68,96%. Tale incremento è dovuto in gran parte alla rendicontazione di progetti coerenti, che hanno permesso di raggiungere un livello di spesa certificata di poco inferiore all'obiettivo programmatico di spesa, e solo in maniera marginale all'avanzamento dei progetti finanziati con le risorse del POR.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura			
Reti irrigue interaziendali			
Nessuna sottotipologia			
Rete irrigua interessata	km	400	63,64
Altri interv. gestione risorse idriche			
Nessuna sottotipologia			
Progetti	n	13	1
Impianti di misurazione di consumi idrici installati	n	56.000	3.937

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.2 sono contenuti nella Tabella q Gestione delle risorse idriche in agricoltura (Capitolo IX, art. 33 del Regolamento n. 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella q.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento all'avanzamento fisico, l'indicatore "*Impianti di misurazione di consumi idrici installati*" continua a mantenersi invariato. La situazione dei 5 progetti approvati è la seguente:

- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha concluso l'intervento, con l'installazione di 3.937 impianti idrici pluri aziendali di misurazione nel 2004;
- il Consorzio di Bonifica della Gallura ha portato a termine l'intervento a fine 2006 ma non ha comunicato in tempo utile il dato di monitoraggio (il valore in tabella pertanto non include tale operazione);
- l'intervento dell'Ente Autonomo del Flumendosa è stato revocato;
- le operazioni del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e del Cixerri saranno concluse all'inizio del 2007, in quanto i Consorzi hanno già provveduto all'acquisto dei "contatori" e stanno procedendo all'installazione.

Il valore realizzato si discosta notevolmente dal valore atteso, a causa delle difficoltà di implementazione dei contatori pluri aziendali incontrate da parte dei Consorzi di Bonifica, ma si prevede di raggiungere l'obiettivo a fine programma con l'utilizzo dei contatori aziendali.

Con riferimento all'intervento b), su 12 progetti approvati con il programma 2003, 6 sono stati revocati e due risultano conclusi, mentre dei 15 progetti coerenti individuati e rendicontati, 11 sono stati compiutamente realizzati. Le operazioni attuate hanno interessato una rete irrigua di 63,64 Km.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In relazione al programma di spesa approvato dalla Giunta Regionale nel luglio 2003, con il quale è stato programmato il 58% circa delle risorse della misura, si rileva uno slittamento nella realizzazione degli interventi. Inizialmente sono stati registrati dei ritardi da parte dei Consorzi di Bonifica nella presentazione dei progetti definitivi. In seguito notevoli difficoltà strutturali sono state incontrate nell'attuazione dell'intervento a), per l'installazione dei contatori "pluri aziendali", pertanto con la riprogrammazione di metà periodo è stata introdotta la possibilità di acquisto e utilizzazione da parte dei Consorzi di Bonifica di "contatori aziendali" inizialmente non ammessa dal POR.

Per quanto concerne l'attuazione dell'intervento b) si sono presentati dei problemi tecnici in fase di realizzazione che hanno portato, nel corso del 2006 alla revoca di 6 operazioni.

Nel mese di luglio 2006, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore programma di spesa sull'azione 1.2.a ritenuto prioritario ai fini della politica di risparmio delle risorse idriche, per un importo di € 20.795.171,34, che sarà incrementato dalle risorse disimpegnate a seguito delle procedure di revoca dei progetti finanziati a valere sull'azione 1.2.b.

Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e insediativi regionali, a evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della biodiversità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
275.606.000,00	137.803.000,00	137.803.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	208.785.937,14	75,76%	162.762.661,71	59,06%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	158.733.424,99	57,59%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006 la misura fa registrare una sensibile progressione della spesa dei beneficiari finali che si attesta su € 162.762.661,71, pari al 59,06% del costo totale. L'incremento rispetto all'anno precedente è di 12 punti percentuali. Le spese certificate ammontano a € 158.733.424,99 e gli impegni giuridicamente vincolanti rappresentano il 75,76% della spesa ammissibile (67,61% al 31.12.2005) risultando pari a € 208.785.937,14. Tuttavia, l'aliquota relativa agli impegni si colloca dieci punti al di sotto della media FESR (86%), mentre quella dei pagamenti risulta inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al dato medio di riferimento.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Interventi	n.	100	-
Popolazione beneficiaria potenziale	n.	1.500.000	-
Infrastrutture realizzate. e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	12	-
Messa in sicurezza siti			
Siti a rischio idrogeologico			
Interventi	n.	412	102

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Superfici oggetto di intervento	ha	7.246,67	9,27
<i>Superfici rischio frane messe in sicurezza</i>	<i>ha</i>	<i>595,45</i>	-
<i>Superfici fluviali a rischio idraulico messe in sicurezza</i>	<i>ha</i>	<i>5.207,05</i>	-
Protezione coste			
Protezione coste			
Lunghezza opere	ml	6.110	-
Interventi	n.	1	-
<i>Lunghezza litorale protetto da erosione</i>	<i>ml</i>	<i>6.110</i>	-
Protezione sponde			
Protezione sponde			
Lunghezza opere	ml	97.065,22	92,5
Interventi	n.	41	2
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Superficie oggetto dell'intervento	kmq	186,56	24,36
Miglioramento dell'ambiente			
Protezione patrimonio naturale e culturale			
Superficie	ha	120	6,36
Volumi edifici	mc	30.000	-
<i>Opere sussidiarie</i>	<i>ml</i>	<i>2.500</i>	-
<i>Volume risultante intervento disinterramento (zone umide)</i>	<i>mc</i>	<i>260.000</i>	
<i>Superficie fasce ricostruite (zone umide)</i>	<i>mq</i>	<i>140.000</i>	
<i>Opere realizzate/ristrutturate (zone umide)</i>	<i>n.</i>	<i>18</i>	<i>2</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Sulla misura non si registrano sostanziali variazioni dal punto di vista dei dati fisici i quali, per la gran parte, potranno essere valorizzati soltanto successivamente alla conclusione degli interventi.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 2006 la misura presenta un overbooking di programmazione del 45%. Su un totale di 578 operazioni selezionate sono stati avviati 410 interventi di cui 212 conclusi.

L'attuazione della misura è stata condizionata da alcune criticità riconducibili ai ritardi nella definizione delle progettazioni esecutive e nella fase di indizione delle gare d'appalto da parte dei comuni beneficiari che ne hanno condizionato l'avanzamento finanziario. I ritardi nell'attuazione riguardano in maniera significativa gli interventi selezionati con il bando PIT 2001 e successiva ottimizzazione (spesa ammissibile di € 11.123.044,57) oltre che, per la parte di competenza dell'Assessorato LLPP, le operazioni relative al "Bando di candidatura 2003-2004" pubblicato sul BURAS n. 14 del 2004 e con dotazione finanziaria di € 32.984.259,89 per il quale gli impegni assunti dai beneficiari finali si riferiscono esclusivamente a spese generali (€ 962.241,11).

In relazione ai 12 interventi inseriti nell'elenco dei progetti finanziati con le risorse recate dalla Delibera CIPE n 17/03 e rimodulati nel 2005 per un importo ammissibile di € 11.250.000, alla data di riferimento del documento si registrano impegni per € 2.010.560,31. I comuni beneficiari stanno provvedendo alla definizione delle fasi preliminari alla consegna dei lavori.

L'avanzamento finanziario e procedurale della misura deve pertanto essere ascritto prevalentemente agli 80 "Nuovi interventi Difesa del Suolo" individuati a seguito della DGR n. 1811 del 11.06.2002 (alla data di riferimento sono stati avviati i lavori per 70 progetti la cui spesa ammissibile ammonta a € 39.829.000,00), 16 dei quali risultano conclusi e ai 211 interventi, avviati entro il 2005 e conclusi in misura superiore al 60%, che costituiscono parte integrante della medesima DGR.

In riferimento alla parte di competenza dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente:

Per quanto riguarda l'azione relativa alle Zone umide, con determinazione n.1425/VI del 29.07.2005 del Responsabile di Misura è stato approvato il programma di utilizzo del finanziamento di € 9.600.000,00 per gli esercizi 2005-2006, unitamente all'individuazione degli enti delegati, così come previsto per l'attuazione degli interventi individuati nell'allegato "Zone umide" del PAI, approvato a fine 2004. Gli interventi selezionati sono 4. Si prevede la consegna dei lavori entro il primo semestre 2007.

Un avanzamento in termini finanziari e procedurali è stato registrato a valere sul "Bando di candidatura 2003-2004" (graduatoria pubblicata sul BURAS n. 39 del 4.12.2004). Alla data di riferimento risultano avviati 2 progetti a fronte dei 51 ammessi.

Per quanto attiene al "Completamento opere in corso di realizzazione", al 31.12.2006 risultano avviati 54 dei 66 interventi individuati con Determinazione del Direttore del Servizio n. 19753 del 27.06.2002, e tra questi 41 sono stati conclusi.

In considerazione delle criticità emerse relativamente alla spendita delle risorse, nel corso del 2006 l'AdG del POR, al fine di supportare gli uffici regionali interessati da interventi di rilevanza strategica, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara relativo a un Servizio di Assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna, Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006 comprendente la misura 1.3. Tale servizio, affidato nel corso del 2006, risulta attivato e prevede l'assistenza ai Responsabili di Misura presso le sedi di Cagliari, agli Enti locali dell'intero territorio Regionale nonché l'allestimento di un servizio di help desk presso l'Amministrazione regionale.

Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

4.A Descrizione della Misura

Attraverso la misura, si intende conseguire la progressiva attuazione di un'efficiente gestione integrata dei rifiuti, anche con il coinvolgimento dei privati, e il conseguimento di adeguate condizioni di salubrità ambientali per mezzo del miglioramento del sistema di gestione integrato dei rifiuti e la bonifica, messa in sicurezza e recupero di siti inquinati.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
74.388.000,00	37.194.000,00	37.194.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	75.495.063,72	101,49%	57.844.540,18	77,76%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	57.619.379,44	77,46%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

A fronte di una spesa ammissibile di € 74.388.000,00, al 31.12.2006 la misura presenta impegni per € 75.495.063,72 dei quali € 57.844.540,18 si sono tradotti in spese sostenute dai beneficiari finali. La capacità di spesa risulta essere pertanto del 77,76% con un *overbooking* sulle allocazioni (101,49%). Le spese certificate risultano pressoché allineate (€ 57.619.379,44) ai pagamenti.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rifiuti urbani e industriali			
<i>Impianti di smaltimento rifiuti urbani</i>			
<i>Inceneritori</i>			
Interventi	n.	2	1
Capacità	t/anno	100.000	51.000
Popolazione servita	n.	200.000	100.000
<i>Impianti di stoccaggio e trattamento</i>			
Interventi	n.	30	14
Capacità	t/anno	300.000	314.944
Popolazione servita	n.	700.000	820.406
Rifiuti tal quali	kg	260.000	235.620
Rifiuti differenziati	kg	40.000	87.124
<i>Riassetto e bonifica di zone industriali e militari</i>			
<i>Recupero siti contaminati</i>			
<i>Siti contaminati da attività produttive</i>			
Superficie bonificata	ha	10	369
Sup. siti contaminati da attività produttive	ha	1	-
Sup. siti contaminati da rifiuti urbani	ha	1	-
Sup. siti contaminati da rifiuti industriali	ha	1	-
Sup. siti contaminati da attività mineraria	ha	4	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto alla rilevazione del 2005, per i due inceneritori previsti nella categoria UE "Rifiuti urbani e industriali" non si registra alcun avanzamento, con un intervento concluso e una percentuale di realizzazione effettiva equivalente al 50% del target previsto. Un buon incremento si rileva

invece per il numero degli "impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" ultimati (14 alla data di riferimento). Sui "siti contaminati da attività produttive", categoria UE "Riassetto e bonifica di zone industriali e militari" la superficie bonificata (369 ha) è nettamente superiore al valore atteso a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura, dopo le difficoltà emerse nelle annualità precedenti e connesse all'attuazione di alcuni interventi, nel corso del 2006 ha superato i conseguenti ritardi nell'attuazione ed è ormai indirizzata verso una *performance* molto positiva con un overbooking nelle allocazioni e spese certificate superiori al 77%.

Delle 77 operazioni a valere sulla misura, al 31.12.2006 risultano avviati 45 progetti a fronte dei 27 avviati nelle annualità precedenti e 19 sono stati ultimati. Le operazioni concluse - iniziative volte alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani - rappresentano il 53% delle spese ammissibili (€ 39.912.361,88).

A seguito del "bando per la selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato sul BURAS n. 22 del 15.07.2005, in data 05.04.2006 con Determinazione del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n. 434/II è stata approvata la graduatoria dei 52 interventi ammessi a cofinanziamento per un importo di € 37.009.165,44. Alla data del presente rapporto tutte le operazioni risultano delegate agli Enti locali beneficiari.

Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere, in aree di particolare pregio ambientale, l'avvio o il rafforzamento di attività imprenditoriali eco-compatibili, anche attraverso iniziative di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, che possano favorire lo sviluppo di reddito e occupazione delle comunità delle aree territoriali oggetto degli interventi.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.327.000,00	24.663.500,00	24.663.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	34.539.970,09	70,02%	28.139.958,46	57,05%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	28.138.741,11	57,05%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario dimostra un buon incremento degli impegni e dei pagamenti rispetto al 2005: l'allocazione delle risorse (€ 34.539.970,09) evidenzia una capacità d'impegno del 70% mentre i pagamenti si attestano su un importo di € 28.139.958,46 con una capacità di spesa del 57% rispetto alla spesa ammissibile.

I pagamenti certificati risultano pressoché allineati alla corrispondente quota monitorata.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Servizi complementari			
Interventi	n.	24	8
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Centri informazione e accoglienza			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	365
Interventi	n.	14	7
Strutture e spazi per attività sportive e ricreative			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	180	-
Interventi	n.	5	4
Sup.oggetto intervento	mq	1.400	265
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	240	240
Interventi	n.	10	4
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	29.700
Sentieri			
Interventi	n.	18	4
Lunghezza	km	60	112,6
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi per attività socio-culturali			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	370
Interventi	n.	14	4
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	7.770
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	1	-

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale</i>			
<i>Miglioramento dell'ambiente</i>			
<i>Protezione del patrimonio naturale-culturale</i>			
Specie protette	n.	10	-
Superficie	ha	5.000	1.063,9
Volume edifici	mc	2.500	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

All'avanzamento finanziario, corrispondono progressi anche sotto il profilo delle realizzazioni fisiche. Al 31.12.2006, gli interventi ultimati si riferiscono agli iter procedurali individuati nel CdP ante MTR (programmazione 2000-2003) attuati tramite la Progettazione integrata.

A valere sulle tipologie e sottotipologie afferenti alla misura si evidenziano le seguenti realizzazioni effettive: 8 interventi sulla tipologia "Aiuti alla ricettività e servizi complementari", sottotipologia "Servizi complementari", a fronte di 24 interventi attesi (grado di realizzazione pari al 33%); 7 interventi sulla tipologia "Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale", sottotipologia "Centri di informazione e accoglienza", a fronte di un valore atteso a fine programma di 14; 4 interventi nell'ambito della sottotipologia "Strutture e spazi per attività sportive e ricreative", a fronte dei 5 previsti a fine programma (80% rispetto alle previsioni); 4 interventi afferenti alla sottotipologia "Sentieri", su valori attesi pari a 18; 4 "Aree attrezzate" equivalenti al 40% del valore atteso; 4 interventi conclusi su 14 per la sottotipologia "Strutture e spazi per attività socio-culturali".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura risulta totalmente programmata e dispone, al lordo dei progetti coerenti, di un *overbooking* di programmazione del 40%. Sul totale delle 89 operazioni selezionate nel periodo 2000-2003 risultano avviati 63 interventi (70%) e 38 sono conclusi (42%).

Rispetto all'obiettivo di spesa fissato, la misura risulta aver recuperato il *gap* degli anni precedenti anche se le realizzazioni non sono ancora in linea con le stime iniziali.

Relativamente alla tempistica di attuazione dei diversi iter procedurali si evidenzia che al 31.12.2006 risultano avviati:

- 7 progetti (a fronte dei 12 selezionati) a valere sul bando "Rete ecologica regionale" pubblicato sul supplemento straordinario n. 2 al BURAS n. 31 del 18/10/2001
- 2 dei 6 interventi individuati dalla DGR n. 20/18 del 09.07.03 dei quali 1 risulta concluso;
- 44 operazioni tra le 52 individuate con Determinazione del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio di Attività Venatoria, Istituto Regionale della Fauna n. 2310/V del 4.10.2002. Alla data di riferimento 31 sono ultimate;
- 2 interventi ricadenti in ambito PIT a fronte dei 12 interventi a valere sul bando PIT 2001 e sull'ottimizzazione dell'Accordo originario;
- I 6 interventi strutturali nell'ambito del Parco del Molentergius (DGR n. 28 del 9.08.2002), conclusi al 31.12.2006;
- Il progetto "Recupero – ristrutturazione sede riserva marina Corso Italia –Cabras" transitato alla misura 1.5 a seguito della DGR n. 15/27 del 30.03.2004, previo parere di coerenza del Direttore del Servizio espresso con Determinazione n. 1053/V del 26.04.2004.

Il 21.10.2005 è stato pubblicato un invito a presentare proposte, con scadenza 5.12.2005, per la predisposizione degli strumenti di gestione delle aree della rete Natura 2000 e per la realizzazione degli interventi contenuti all'interno dei Piani di Gestione. Il finanziamento delle operazioni è subordinato alla consegna degli strumenti di gestione, per la predisposizione dei quali, al fine di garantirne l'omogeneità, sono state predisposte apposite linee guida coerenti con quelle previste dal Ministero dell'Ambiente. Il bando unico, per due azioni 1.5.a) e 1.5.b) è comprensivo di una quota di riserva per l'azione 1.5.c) *Azioni economiche sostenibili*, appena inserita nel complemento di programmazione.

Entro il primo semestre del 2007 è prevista la pubblicazione di un ulteriore bando a valere sull'azione c (azioni economiche sostenibili). La finalità che si intende raggiungere è lo sviluppo economico delle aree della "Rete Ecologica Regionale" ed in modo specifico quelle appartenenti alla istituita rete "Natura 2000", mediante la promozione delle iniziative imprenditoriali sostenibili e il rafforzamento delle attività tradizionali compatibili con il patrimonio naturalistico.

Si evidenzia che è stato richiesto l'inserimento di una linea di intervento dedicata alla Rete ecologica nell'APQ "Sviluppo sostenibile".

Misura 1.6 – Energia - FESR

4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo della Misura è quello del raddoppio dell'incidenza delle fonti rinnovabili al 2010 (dal 2 al 4%), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1998.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
21.883.000,00	10.941.500,00	10.941.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	19.129.355,46	87,42%	3.884.494,28	17,75%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	3.884.494,30	17,75%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto all'avanzamento registrato nel precedente anno, a fine 2006 per la misura si rileva un significativo incremento nei valori di impegno che si attestano su € 19.129.355,46, pari al 87,42% della spesa ammissibile. L'avanzamento della spesa (€ 3.884.494,28) pur evidenziando una *performance* al di sotto della media FESR registra un incremento della capacità di spesa di ben 14 punti percentuali.

Gli importi di impegno e spesa sono riferiti alle progettazioni esecutive dell'intervento di mantenimento in esercizio delle attuali centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali e alla realizzazione di due micro-centrali idroelettriche per lo sfruttamento dell'energia potenziale dell'acqua, vettorata dagli acquedotti idropotabili del Campidano.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Fonti energetiche rinnovabili			
Fonti energetiche rinnovabili			
Idroelettrica (mini hydro)			
Interventi	n.	4	-
Potenza installata	mw	44	-
Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie pulite e ridotto consumo energetico			
Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell'ambiente			
Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	25	13

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di riferimento si evidenzia la conclusione dei lavori per 13 imprese beneficiarie a valere sulla tipologia "Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell'ambiente", sottotipologia "Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Le spese certificate si riferiscono all'intervento di mantenimento in esercizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e alla realizzazione di due minicentrali idroelettriche nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari. Relativamente a quest'ultimo intervento, la complessità dell'operazione ha determinato dei ritardi nella fase di progettazione esecutiva e, conseguentemente nell'affidamento dei lavori; ritardi che hanno indotto, nel corso del 2005, l'Autorità di Gestione a richiedere una rigorosa attività di monitoraggio che potesse garantire la coerenza della tempistica attuativa rispetto alla programmazione comunitaria. Tempistica che si può ipotizzare rispettata in quanto, nell'ottobre del 2006, si è proceduto all'erogazione dell'anticipazione del 5% alla ECOSAR, aggiudicataria dei lavori delle Centrali idroelettriche mentre nel gennaio del 2006 sono stati avviati i lavori di realizzazione delle 2 minicentrali di San Lorenzo e Simbirizzi per i quali, alla data di riferimento del presente rapporto, si è giunti alla erogazione del IV SAL.

In relazione alle 29 operazioni selezionate nell'ambito delle attività previste nell'azione b) Aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, a seguito del bando per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici rivolto alle piccole e medie imprese (PMI) (con scadenza al 17.10.2004) risultano assegnati contributi a 13 imprese ed un ulteriore intervento è giunto alla fase conclusiva. Per le restanti 15 operazioni, non avviate entro i termini imposti dal bando o per le quali i soggetti beneficiari hanno espresso formale rinuncia, la struttura assessoriale ha avviato le procedure di verifica e i relativi provvedimenti di revoca.

Misura 1.7 – Monitoraggio - FESR

4.A Descrizione della Misura

Attraverso la misura, si intende sviluppare un sistema integrato di monitoraggio e conoscenza ambientale in grado di rappresentare e simulare con efficacia e continuità la "realtà ambientale" regionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
28.511.000,00	14.255.500,00	14.255.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	9.419.564,13	33,04%	7.002.314,41	24,56%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	6.840.483,08	23,99%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Le somme impegnate a fine 2006 ammontano a € 9.419.564,13 e rappresentano il 33,04% della spesa ammissibile. Le spese certificate sono pari a € 6.840.483,08, corrispondenti al 24% del costo ammesso. La capacità di spesa è del 24,56% con pagamenti, alla data di riferimento, per € 7.002.314,41.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni			
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA			
Sistemi informativi			
Interventi	n.	8	3
			-
			-
Sistemi di comunicazione/controllo			
Interventi	n.	8	
Servizi telematici			
Interventi	n.	1	
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della P.A.			
Informazione e comunicazione nella P.A.			
Nodi di rete	n.	10	
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Banche dati		8	-
Postazioni/terminali installati		7	-
Soggetti attuatori		1	-
Sportelli attivati		7	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 risultano ultimati tre interventi appartenenti alla sottotipologia "Sistemi informativi", tipologia "Sviluppo applicazioni e sistemi informativi della P.A." per un importo di € 928.838,47.

Gli interventi relativi alle sottotipologie "Sistemi di comunicazione/controllo" e "Servizi telematici" e per le tipologie "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA" e "Servizi e applicazioni per il pubblico" non risultano avviati.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista finanziario la performance della misura è stata prevalentemente alimentata dalla rendicontazione del progetto SIRA e dai due interventi "Adeguamento e potenziamento della Rete di monitoraggio meteo-idropluviometrica" della Sardegna" e allo "Studio delle conoscenze qualitative sulle acque". Precisamente, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per tali progetti e i pagamenti (€ 7.613.493,66 e € 5.650.372,61) incidono in misura del 80% sul totale delle risorse allocate e spese. Relativamente alla programmazione residua della misura (40% della spesa ammissibile al 31.12.2006) si evidenzia che, alla data di riferimento del presente documento, è stato pubblicato il bando di gara "Interventi di indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio di siti inquinati: aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres".

Per le diverse azioni si prevede l'attivazione, entro il primo semestre 2007, dei seguenti servizi: azione a): Interventi di Informatizzazione delle sedi ARPAS e delle sue strutture periferiche e di potenziamento dei laboratori di analisi dei PMP; azione b): aggiornamento tecnologico del SIRA; azione c): progettazione e implementazione di sistemi e reti di monitoraggio ambientale, comprendente l'adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera. L'intervento previsto è finalizzato alla tutela della salute pubblica e degli ecosistemi della regione Sardegna; Progettazione e implementazione di sistemi e reti di monitoraggio ambientale Rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	13.333.383,04	55,43%	9.628.099,44	40,02%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	9.840.158,17	40,91%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 05.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della misura è caratterizzato da un incremento sia degli impegni che dei pagamenti che aumentano rispettivamente di circa 6 punti e 4 punti percentuali. Si registrano impegni pari a € 13.333.383,04, a fronte di una capacità di spesa pari a € 9.840.158,17 del costo programmato. Si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati e quelli presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute in fase di caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500	472
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	450
monte ore (concl.)	ore	330.000	347.400
costo (concl.)	euro	6.500.000,00	7.039.381,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	4.120	580
durata media dei progetti (monte ore)	ore	700.400	187.560
durata	giorni	365	315
costo	euro	8.596.000,00	4.365.788,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti	n.	6	
durata media dei progetti	giorni	250	
costo	euro	3.960.000,00	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	333	
durata media dei progetti (monte ore)	ore	200.000	
durata	giorni	300	
costo	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 sono stati valorizzati gli indicatori di realizzazione delle tipologie di progetto "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma" e "Persone: formazione continua". Dai dati esposti nella tabella, emerge che mentre la prima tipologia presenta valori invariati rispetto alla precedente rilevazione, la seconda, pur presentando valori ancora distanti dal *target* previsto a fine programma, rileva valori in crescita rispetto ai dati presenti nel precedente rapporto. Infatti l'indicatore "costo" è cresciuto di circa 11 punti percentuali e l'indicatore relativo ai destinatari è variato di circa 7 punti percentuali.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della misura registra una discreta *performance* dovuta ad incrementi pari al 5% e 4% circa rispettivamente nelle risorse allocate e in quelle erogate rispetto alla precedente rilevazione. Dal punto di vista fisico le realizzazioni presentano un incremento della sola tipologia "Persone: formazione continua" come evidenziato nella tabella 4.C.1. Dal punto di vista procedurale nel corso del 2006 sono stati avviati due iter relativi alla formazione e aggiornamento del personale coinvolto nella gestione delle risorse naturali che produrranno spese a partire dall'inizio del 2007.

Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura si pone a continuazione degli interventi di “Prevenzione e sorveglianza degli incendi” previsti nella prima fase di programmazione (2000-2004) all'interno della Misura 1.3 “Difesa del suolo”. A seguito della riprogrammazione del POR tali interventi sono stati ricondotti alle fattispecie di cui al Reg. CE 1257/1999, articolo 30, 1° comma, prima, seconda e sesta alinea. Nell'attuale fase 2004-2008, la misura integra le azioni di prevenzione e sorveglianza degli incendi con azioni di imboschimento e di miglioramento forestale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	5.358.521,06	48,71%	5.194.445,29	47,22%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	5.194.445,30	47,22%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR alla Commissione Europea in seguito alla revisione intermedia.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non presenta progetti da completare iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'esecuzione finanziaria della Misura al 31.12.2006 mostra un leggero incremento rispetto ai valori registrati a fine 2005. Infatti, a fronte di un impegno finanziario di € 5.358.521,06, si registrano pagamenti pari a € 5.194.445,29, aumentati del 16,01% rispetto all'anno precedente. Tali valori consentono di determinare il *trend* relativo sia alla capacità d'impegno che di spesa rispettivamente al 48,71% e al 47,22% del costo programmato. Buona la capacità di utilizzo che si porta dal 90,63% al 96,94% delle somme impegnate.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione			
Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	140	10
Infrastrutture realizzate e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	140	10
Imboschimento di terreni non agricoli			
Imboschimento superfici non agricole			
Latifoglie			
Superficie imboschita	ha	50	
Piantagioni miste			
Superficie imboschita	ha	50	
Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette			
Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali			
Interventi di mantenimento e ripulitura			
Superficie interessata	ha	300	
Progetti	n.	2	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.9 sono contenuti nella Tabella "i2 Altre misure forestali" (Capo VII, art. 30 e art. 32 del Regolamento 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella i2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

AL 31.12.2006, la misura presenta 10 progetti conclusi:

- la ristrutturazione della base operativa di Bosa (I, II lotto, completamento e acquisto attrezzature);
- la ristrutturazione della base operativa di Sorgono (I e II lotto e acquisto attrezzature);
- l'acquisto delle autobotti e dei fuoristrada per attrezzare le 11 basi operative regionali;
- l'intervento di elettrificazione della base operativa di Bosa.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In linea con quanto previsto dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", si è proceduto all'adeguamento ed alla riqualificazione delle basi Operative di Bosa e di Sorgono e all'acquisto delle occorrenti attrezzature. Inoltre sono stati acquistati le autobotti e i fuoristrada necessarie alle 11 basi operative regionali. A fine 2005 sono stati pubblicati i bandi, rivolti ai comuni, destinati a finanziare gli interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e di adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento. Le graduatorie dei progetti ammessi sono state approvate nel mese di aprile 2006. Per quanto riguarda i sistemi di avvistamento si è già proceduto alla concessione delle deleghe nei confronti dei Beneficiari finali e gli interventi sono in corso di realizzazione, mentre per i punti di attingimento idrico, le deleghe saranno eseguite a partire dal 2007.

Il 27 febbraio 2006 l'Assessorato dell'Ambiente ha stipulato due Convenzioni con l'Ente Foreste regionale per l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e per l'adeguamento e il potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento nell'ambito dei perimetri gestiti dall'Ente Foreste. Entro il 15 marzo l'Ente Foreste

avrebbe dovuto presentare l'elenco dei punti di attingimento idrico e dei siti di avvistamento, per la loro approvazione, ma a tutt'oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (soggetto responsabile dell'attuazione della misura), l'elenco non è stato presentato.

Sempre nel rispetto degli interventi previsti nel Piano regionale contro gli incendi boschivi si procederà all'adeguamento della Base Operativa di Pula, che comporterà il completo utilizzo delle risorse disponibili della misura sull'azione 1.9.a *Riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale*.

L'avanzamento finanziario della misura ha superato ampiamente l'obiettivo di spesa programmato e con la realizzazione delle operazioni a valere sui bandi pubblicati nel corso del 2005 e degli interventi di affidati all'Ente Foreste saranno raggiunti i *target* di realizzazione fisica fissati per la categoria *“Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione”*. Le risorse finanziarie della Misura non sono invece sufficienti al conseguimento degli obiettivi relativi alle categorie *“Imboschimento di terreni non agricoli”*, e *“Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette”*, per cui saranno rivisti i target.

Asse II – Risorse culturali

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	372.914.000,00	186.457.000,00	186.457.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	396.970.000,00	198.485.000,00	198.485.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	372.914.000,00	276.763.914,63	74,22%	203.322.460,66	54,52%
FSE	24.056.000,00	16.362.578,06	68,02%	5.681.980,35	23,62%
Totale	396.970.000,00	293.126.492,69	73,84%	209.004.441,01	52,65%

Pagamenti certificati al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	372.914.000,00	198.575.948,76	53,25%
FSE	24.056.000,00	5.681.980,35	23,62%
Totale	396.970.000,00	204.257.929,11	51,45%

Anche per l'Asse II Risorse culturali sono le misure del FESR a contribuire in larga prevalenza all'avanzamento finanziario dell'Asse. Questo è particolarmente evidente per l'indicatore "capacità di impegno": con un valore pari a € 276.763.914,63, circa il 74% della spesa ammissibile del Fondo risulta allocata e la media dell'Asse si porta al 73,84%. Crescono anche la spesa monitorata e le certificazioni, con valori della "capacità di spesa" che si attestano rispettivamente al 54,52% e al 53,25%.

Per quanto concerne il FSE, è rilevabile un forte incremento degli impegni rispetto all'anno precedente, pari a circa 40 punti percentuali ed attribuibile all'avanzamento della Misura 2.4.

Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a recuperare e valorizzare, mettendo a sistema gli elementi di maggior pregio del patrimonio sardo, itinerari turistici e culturali tematici sui quali incentrare percorsi di fruizione e visita del territorio.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
171.721.068,00	85.860.534,00	85.860.534,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	171.721.068,00	116.374.892,82	67,77%	76.964.054,18	44,82%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	171.721.068,00	73.497.369,61	42,80%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel 2006 la misura, pur presentando ancora delle criticità in termini di allocazioni e spendita delle risorse, registra un avanzamento che si attesta sul 42,80% per le spese certificate (€ 73.497.369,61) e sul 67,77% per gli impegni (che ammontano a € 116.374.892,82) con una variazione percentuale rispettivamente di circa 18 e 13 punti rispetto al 2005. Pur fortemente incrementato, il dato di impegno continua a collocarsi al di sotto dei 18 punti percentuali della media FESR, pari all' 86%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	61	18
Superficie interessata	mq	1.000.000	36.647,30
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	3	-
Recupero antichi abitati abbandonati	n.	2	-
Prodotti multimediali	n	2	-
Restauro, ristrutturazione e allestimento musei			
Interventi	n.	53	14
Superficie interessata	mq	200.000	107.321
Prodotti multimediali	n.	8	-
Aree archeologiche			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	n.	28	6
Superficie interessata	mq	600.000	142.093
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	n.	1	-
<i>Prodotti multimediali</i>	n.	2	-
Archeologia industriale			
Interventi (2005-2008)	n.	2	
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	18	3
Superficie strutture/spazi	mq	17.300	1.222,1
<i>Prodotti multimediali</i>		7	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	10	7
Superficie strutture/spazi	mq	7.000	2.782
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	5	1
Prodotti multimediali			
Interventi	n.	13	1
Studi			
Interventi	n.	8	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto ai valori registrati nel 2005 la misura mostra un sensibile avanzamento sull'attuazione fisica. Nel dettaglio si rileva che a valere sulla tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale" gli interventi di "Restauro architettonico" conclusi al 31.12.2006 sono 18 rispetto agli 11 ultimati nelle annualità precedenti; i progetti di "Restauro, ristrutturazione e allestimento musei" registrano anch'essi un avanzamento, con 2 ulteriori interventi conclusi; le Aree archeologiche valorizzate sono 6 (3 al 31.12.2005).

Le operazioni afferenti alla tipologia "Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale" concluse alla data del presente documento corrispondono a 3 "Centri informazione e accoglienza" aventi una superficie complessiva di 1.222 mq; 7 "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" (70% del valore atteso); 1 intervento appartenente alla sottotipologia "Azioni promozionali"; 1 intervento sulla sottotipologia "Prodotti multimediali"; 1 "Studio".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Su un totale di 221 operazioni selezionate, alla data del presente rapporto risultano avviati 145 progetti (65%), di cui 51 conclusi. Le operazioni finanziate nel settore dei beni culturali sono sottoposte a molteplici fasi autorizzative che, dilatando il processo di definizione dei progetti esecutivi, provocano sovente ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di delega agli Enti Locali; i tempi di istruttoria delle proposte a valere sui bandi hanno rappresentato un'ulteriore criticità sull'attuazione della misura. Al 31.12.2006 sono attivi i seguenti iter procedurali:

- Sviluppo e potenziamento del Parco Grazia Deledda (BURAS n. 30 del 8.10.2001) con 23 interventi selezionati e avviati nel 2004. Si rileva la conclusione di 8 interventi.
- Itinerario delle città regie (BURAS n. 30 del 8.10.2001): risultano avviati 33 progetti e conclusi 7, a fronte dei 39 individuati dalla graduatoria pubblicata sul BURAS 21 del 19/07/2002.
- Itinerario turistico – religioso la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata sul BURAS n. 26 del 06/06/2002. Gli interventi ammessi risultano 33, 18 dei quali avviati e 2 conclusi.
- Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale (BURAS n. 30 del 8.10.2001) la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata in data 14/02/2003; i progetti ammessi a cofinanziamento sono 14, avviati entro il 2004. La percentuale di realizzazione è del 50%.

- Bando libero - Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici (pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002). Le operazioni a valere sul bando sono 41, 17 delle quali avviate e 2 concluse.
- 49 operazioni ricadenti in ambito PIT: si rileva l'avvio dei lavori per 18 interventi e la conclusione per il progetto di Restauro e adeguamento dell'ex carcere e ex Caserma San Michele presentato dal Comune di Alghero.
- 22 progetti per i quali è stato espresso parere di coerenza con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1666 del 30.06.2002 risultano ultimati

Con la rimodulazione del piano finanziario 2006 sono state trasferite risorse per un importo di 20 Meuro dalla misura 2.1 alla misura 2.3.

Nel 2006 l'AdG del POR, al fine di supportare gli uffici regionali interessati da interventi di rilevanza strategica, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara relativo a un servizio di Assistenza Tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna, Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006 comprendente la misura 2.1.

Tale servizio, affidato nel corso del 2006, risulta attivato e prevede l'assistenza ai Responsabili di Misura presso le sedi di Cagliari, agli Enti locali dell'intero territorio Regionale nonché l'allestimento di un servizio di *help desk* presso l'Amministrazione regionale.

Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di beni e aree di notevole interesse nell'ambito della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari tematici.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.576.932,00	24.788.466,00	24.788.466,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	45.552.766,37	91,88%	38.480.049,04	77,62%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	38.278.832,73	77,21%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura è caratterizzata da un avanzamento finanziario che si traduce in una capacità di impegno del 91,88% e in una capacità di spesa di poco inferiore al 78%. Gli impegni e i pagamenti rilevati risultano rispettivamente pari a € 45.552.766,37 e € 38.480.049,04 e l'importo delle spese certificate evidenzia un minimo scostamento rispetto all'ammontare dei pagamenti monitorati, attestandosi su un valore pari a € 38.278.832,73.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	12	5
Superficie interessata	mq	18.000	6.563
Prodotti multimediali	n.	3	
Archeologia Industriale			
Interventi	n.	22	13
Superficie interessata	mq	200.000	50.257
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	1	-
Prodotti multimediali	n	3	-
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	1	1
Superficie strutture/spazi	mq	1.180	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	3	-
Superficie strutture/spazi	mq	1.029	-
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	2	-
Interventi catalogaz. e ricogniz. patrimonio			
Interventi	n.	3	-
Studi			
Interventi	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 risultano conclusi 5 interventi a valere sulla tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale", sottotipologia "Restauro architettonico" (grado di raggiungimento del target pari al 42%) i per una superficie interessata di 6.583 mq; 13 interventi appartenenti alla sottotipologia "Archeologia Industriale" che hanno consentito la valorizzazione dell'indicatore "superficie" per mq 50.257; 1 intervento relativo ai Centri di informazione e accoglienza; 1 studio relativo alla tipologia "Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal 2005 tutte le attività previste dal Complemento di programmazione per la Misura 2.2. sono confluite nella Misura 2.1, ad eccezione di quelle già avviate, che proseguiranno il loro iter fino alla conclusione della spesa. Gli interventi selezionati nel 2002 e nel 2003 sono 41.

Anche la misura 2.2, analogamente alla Misura 2.1, è stata caratterizzata da ritardi soprattutto nel processo di definizione delle progettazioni esecutive degli interventi; tali difficoltà sono state in parte superate nel corso del 2006. Alla data di riferimento si rileva che lo studio sul Parco Dessì è stato regolarmente ultimato; dei 20 interventi selezionati e avviati 11 risultano conclusi; è stato ultimato 1 progetto tra i 5 selezionati in ambito PIT; tutti gli interventi selezionati a seguito dell'invito a presentare proposte a valere sul Bando Libero Archeologia Industriale (BURAS n. 9 del 29/03/2002) sono avviati e risulta prossimo alla conclusione il progetto del Comune di Osilo; gli 8 progetti individuati come coerenti risultano conclusi.

Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione di un sistema articolato di offerta di attività culturali e di spettacolo e al miglioramento delle condizioni di accesso alla conoscenza e all'informazione in connessione con la valorizzazione turistica del territorio.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
131.616.000,00	65.808.000,00	65.808.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	131.616.000,00	114.836.255,44	75,74%	87.878.357,44	57,96%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	131.616.000,00	86.799.746,42	57,25%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

I risultati raggiunti e la crescita manifestata nell'ultimo anno delineano un quadro finanziario soddisfacente con un incremento, rispetto all'annualità precedente, di circa 17 Meuro sulle risorse allocate e di 23 Meuro sulle risorse erogate. Al 31.12.2006 gli impegni ammontano a € 114.836.255,44 (75% della spesa ammissibile) e i pagamenti si attestano su € 87.878.357,44. Tale incremento determina una capacità di spesa del 57,96%. Le spese certificate si posizionano su un livello pressoché simile ai pagamenti con una quota complessiva pari a € 86.799.746,42 (57,25% del costo ammesso).

Con la modifica del piano finanziario del 2006 la dotazione complessiva della misura è stata incrementata di 20 Meuro.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Archivi			
Interventi	n.	6	-
Superficie interessata	mq	6.000	-
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	18	8
Superficie strutture/spazi	mq	15.000	7.679,79
Strutture e spazi destinati a spettacoli			
Interventi	n.	70	29
Superficie strutture/spazi	mq	105.000	49.649,53
Capienza (posti)	n.	35.000	17.661
Strutture per lo spettacolo	n.	50	
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Manifestazioni			
Interventi	n.	34	12
Manifestazioni culturali e di spettacolo		28	

*In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'avanzamento fisico rispecchia il *trend* finanziario. Per la tipologia Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale, sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" i progetti conclusi sono 8 (44% dell'obiettivo previsto) e interessano una superficie di 7.679,79 mq.

Nessun avanzamento fisico si rileva invece per la sottotipologia "Strutture e spazi destinati a spettacolo" per la quale si registrano 29 interventi conclusi (55% dell'obiettivo fisico), una superficie di 49.649,53 mq e una capienza di 17.661 posti.

A valere sulla tipologia "Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale" sottotipologia "Manifestazioni" i 12 interventi conclusi evidenziano un raggiungimento del *target* del 35%. I rimanenti 16 interventi risultano in corso di realizzazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per l'azione 2.3.a) - *Azioni di recupero, restauro, riqualificazione e rifunionalizzazione di Immobili storici per archivi e biblioteche e di immobili e spazi da utilizzare per attività culturali e di spettacolo*, sulla quale risultano avviate 83 operazioni (85% delle operazioni selezionate), 46 risultano concluse inoltre, nel corso del 2006, è stato pubblicato il bando "Interventi di restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici destinati a essere sede di biblioteche" (BURAS del 8.08.2006) rivolto alle Amministrazioni comunali già capofila di sistemi bibliotecari territoriali al fine di migliorarne il funzionamento, con una dotazione finanziaria di 20 Meuro. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il primo bimestre del 2007.

Per l'azione 2.3.b) - *Azioni per l'integrazione e la messa in rete dell'offerta di eventi culturali e di spettacolo regionale* sul BURAS n. 14 del 16 giugno 2005 è stato pubblicato il bando "Costituzione ed attivazione dei modelli di gestione per lo spettacolo". L'aggiudicazione dell'Appalto è avvenuta in data 28.10.2005 per un importo di € 1.119.100,00 più IVA. L'operazione è stata avviata.

Per l'azione 2.3.c) - *Azioni preliminari alla organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione* sono attivi i progetti selezionati nel corso delle annualità precedenti e più precisamente gli interventi selezionati a seguito del bando di gara "Progettazione, realizzazione e gestione della promozione e commercializzazione di eventi culturali e di spettacolo" (BURAS n. 29 del 01.10.2005), sono inoltre attivi i due Studi acquisiti con le Determinazioni del Direttore del Servizio P.I. Sport, Spettacolo e Attività Culturali n. 2125 del 23.07.2004 e n. 2200 del 27.07.2004 funzionali all'individuazione degli eventi e delle manifestazioni di maggior interesse culturale della regione; sono attive le operazioni individuate con le due Determinazioni del Direttore del Servizio n. 3853 del 22.12.2004 e n. 3935 del 30.12.2004 attraverso le quali sono state definite le azioni a regia regionale e selezionati i comuni Beneficiari finali per l'acquisizione di immobili sede di eventi e manifestazioni di maggior interesse culturale.

Nel corso del 2006 l'AdG del POR, al fine di supportare gli uffici regionali interessati da interventi di rilevanza strategica, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara relativo a un Servizio di Assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna, Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006 comprendente la misura 2.3.

Misura 2.4 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	16.362.578,06	68,02%	5.681.980,35	23,62%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	5.681.980,35	23,62%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

A fronte di un costo programmato di € 24.056.000,00, la misura presenta impegni pari a € 16.362.578,06. Per i pagamenti si rileva un incremento che porta la capacità di spesa dal 22% della precedente annualità al 23,62% dell'attuale rilevazione.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma:</i>			
destinatari	n.	1.434	359
durata media dei progetti	giorni	300	390
durata (monte ore)	ore	1.294.810	356.519
costo (approv., concl.)	euro	22.557.000,00	6.233.493,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	1.350	190
monte ore (concl.)	ore	69.000	27520
durata monte ore	ore	2.076.000	2420
durata	giorni	65	143
costo (concl.)	euro	1.500.000,00	506.644,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 è stata valorizzata sia la batteria degli indicatori della tipologia di progetto “Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma” che quella relativa alla tipologia “Persone: formazione continua”, che tuttavia presentano dati pressoché invariati rispetto alla precedente rilevazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2006, l'avanzamento della misura è da ricondurre all'avvio di due iter procedurali, “Programma di interventi formativi su materie inerenti l'Asse II” e il “Programma Parnaso”. L'incremento di circa 40 punti percentuali che si registra nell'allocazione delle risorse è, infatti, dovuto all'aggiudicazione del secondo bando. Sul fronte della spesa si registra, invece, un modesto incremento rispetto al 2005 i cui effetti trovano conferma anche nel mancato avanzamento delle realizzazioni fisiche. Nel corso del 2007 si prevede la pubblicazione di due ulteriori bandi relativi alla formazione nel settore dei beni culturali che determineranno la totale allocazione e spendita delle risorse residue.

Asse III – Risorse umane

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	140.876.000,00	70.438.000,00	70.438.000,00		
FSE	584.054.000,00	292.027.000,00	292.027.000,00		
Totale	724.930.000,00	362.465.000,00	362.465.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	140.876.000,00	54.956.785,66	39,01%	40.255.947,60	28,58%
FSE	584.054.000,00	470.683.517,26	80,59%	294.136.764,96	50,36%
Totale	724.930.000,00	525.640.302,92	72,51%	334.392.712,56	46,13%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	140.876.000,00	42.052.416,08	29,85%
FSE	584.054.000,00	376.025.435,91	64,38%
Totale	724.930.000,00	418.077.851,99	57,67%

L'avanzamento finanziario dell'Asse III è principalmente legato alle operazioni cofinanziate dal FSE il cui quadro finanziario può definirsi soddisfacente in base agli incrementi registrati nel corso di quest'anno di programmazione. Gli incrementi si attestano su una capacità di impegno di circa l'81% del costo programmato e su una capacità di convertire in spesa lo stanziamento disponibile pari al 50%. Tra le Misure che maggiormente hanno contribuito alla buona *performance* dell'Asse è da citare la 3.2 che presenta una situazione di *overbooking* degli impegni, nonostante l'ultima modifica del piano finanziario del Complemento di Programmazione abbia portato il costo programmato da € 89.130.000,00 a € 165.530.091,00 e una situazione dei pagamenti pari al 100% del costo programmato. Da rilevare anche il contributo dato all'avanzamento dell'Asse dalle Misure 3.16 e 3.17 che registrano, per quanto riguarda gli impegni, rispettivamente un incremento di 62 e 38 punti percentuali ed una discreta crescita delle risorse erogate.

Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema in alcune misure del Fondo.

I dati finanziari delle misure cofinanziate dal FESR nell'Asse III si collocano al di sotto del dato medio; infatti, a fronte di un'aliquota media del 86,39%, il FESR impegna solo il 30 dello stanziamento disponibile. Pagamenti e certificazioni coprono quote rispettivamente pari al 28,58% e al 29,85% del costo ammesso.

Misura 3.1 –Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata all'attivazione e implementazione dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro e contrastare la disoccupazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
46.823.758,00	23.411.879,00	23.411.879,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 49.738.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	46.823.758,00	27.074.212,45	57,82%	19.672.101,50	42,01%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	46.823.758,00	24.550.739,41	52,43%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 3.1 presenta un incremento di circa 3 Meuro per le risorse allocate e di 2 Meuro per le risorse erogate rispetto all'annualità precedente in cui gli impegni si attestavano a € 24.266.153,01 e i pagamenti a € 17.653.481,00. Si rileva, quindi, una capacità di allocazione pari al 57,82% ed una capacità di spesa di poco superiore al 52% della dotazione finanziaria. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Politiche per il mercato del lavoro			
<i>Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli</i>			
progetti	n.	1	1
durata	giorni	180	210
costo	euro	500.000,00	508.193,58
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>			
progetti per tipologia di sogg.att./benef.fin. (concl.)	n.	9	7
Sportelli attivati	orientamento	28	26
	accoglienza	28	27
	Per disabili	28	13
Operatori centro per l'impiego	n.	400	410
durata media dei progetti (concl.)	giorni	360	500
costo dei progetti (appr., concl.)	euro	24.370.302,12	9.612.199,93
<i>Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	2	2
durata	giorni	720	1.080
costo (approv., concl.)	euro	14.495.109,08	15.255.170,42
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>			
destinatari	n.	478	
durata	n.	400	
costo	euro	4.687.346,10	
<i>Sistemi: servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio⁵</i>			
Progetti	n.	1	1
durata	giorni	500	500
costo	euro	2.763.000,00	2.763.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

I valori degli indicatori di realizzazione fisica per la tipologia di progetto "Servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli" inseriti nella tabella non sono stati oggetto di modifica, in quanto già conseguiti al termine del 2003. Altresì conseguito risulta essere il *target* della tipologia "Servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio". Nel corso dell'annualità 2006 si registrano, le prime realizzazioni per la tipologia "Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale". Nell'ambito di tale tipologia sono stati attivati 26 sportelli di orientamento, 27 di accoglienza e 13 per i disabili (su un *target* a fine programma di 28 sportelli da attivare). È stato raggiunto e superato l'obiettivo della formazione del personale prevista a fine programma, mentre dal punto di vista finanziario è stato realizzato un costo di €. 9.612.199,93 pari al 39% del costo previsto a fine programma. L'unica tipologia di progetto per la quale non sono ancora disponibili i dati relativi all'avanzamento fisico, non presentando ancora progetti conclusi, è la tipologia "Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Rispetto alla precedente annualità la misura presenta nel suo complesso una *performance* soddisfacente se si considerano le difficoltà iniziali, descritte nel precedente rapporto, legate al ritardo nel recepimento della riforma dei servizi per l'impiego. Superato questo *impasse*, infatti, dal punto di vista finanziario la misura è cresciuta sia per quanto riguarda l'allocazione delle risorse (circa 3 punti percentuali) sia relativamente alla capacità di spesa che supera la precedente rilevazione di circa 15 punti percentuali. Altresì il buon andamento della misura è

riscontrabile dalla *performance* delle realizzazioni fisiche. Infatti tutte le tipologie di progetto presentano valori di realizzazione più che soddisfacenti. Dal punto di vista procedurale nel corso del 2007 si prevede l'allocazione delle rimanenti risorse con la pubblicazione dei bandi relativi alla formazione del personale e al monitoraggio dei servizi per l'impiego, strettamente connesso alla nascita e sviluppo delle nuove 4 province.

Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura, rivolta ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro e agli adulti disoccupati, prevede la realizzazione di iniziative personalizzate per la popolazione giovanile e adulta e dovrà garantire la disponibilità di un'offerta integrata di servizi di formazione, consulenza, orientamento, in relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
165.530.091,00	82.765.045,50	82.765.045,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 89.130.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	165.530.091,00	168.176.609,34	101,60%	96.399.728,04	58,24%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	165.530.091,00	165.530.091,00	100,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 3.2 registra la migliore *performance* finanziaria dell'intero Asse III. Nonostante la modifica del piano finanziario, che ha aumentato il costo programmato della misura, quasi

raddoppiandolo, si registra una situazione di *overbooking* negli impegni e il raggiungimento del 100% dello stanziamento disponibile nelle realizzazioni. Si segnala, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Politiche per il mercato del lavoro			
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone,aziende)</i>			
<i>Persone: work experience, tirocini</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	33	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	150	
costo (concl.)	euro	2.000.000,00	

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone,aziende)			
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo</i>			
destinatari previsti	n.	6.756	5.750
durata media dei progetti	giorni	400	652
monte ore	ore	17.403.105	14.548.556
costo	euro	125.689.091,00	160.070.852,00
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n	2.200	771
durata	giornin	300	251
Durata (monte ore)	ore	1.300.000	615.300
costo	euro	31.341.000,00	14.733.591,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n	567	
durata	giorni	365	
Durata (monte ore)	ore	567.000	
costo	euro	8.500.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura presenta, dal punto di vista fisico, valori di realizzazione per due tipologie di progetto: "Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo" e "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo".

Per quanto riguarda la prima tipologia, come si evidenzia dalla relativa tabella, non tutti i *target* previsti a fine programma sono stati raggiunti. Infatti, l'indicatore "destinatari" rileva realizzazioni pari all'85% circa del valore previsto a fine programma, mentre l'indicatore "monte ore" realizza valori vicini all'80% del valore atteso. La *performance* dell'indicatore "costo" presenta una percentuale di circa il 30% superiore al valore atteso.

In relazione alla seconda tipologia la tabella presenta valori inferiori a quelli attesi a fine programma: i destinatari raggiungono percentuali pari a circa il 35%, il costo evidenzia percentuali di poco inferiori al 48%.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In generale la misura in questione presenta un'ottima *performance* finanziaria presentando un *overbooking* delle risorse allocate e percentuali pari al 100% per le risorse erogate.

Dal punto di vista procedurale la misura è caratterizzata dall'attivazione delle due linee d'azione previste: "Ars et Labor" e "Carlo Magno", con l'avvio di tre iter in entrambe. Nel corso del 2006 è stato pubblicato un ulteriore bando, relativo a interventi formativi di prima qualificazione rivolto ai giovani di età superiore ai 16 anni. L'apprezzabile *performance* finanziaria della misura trova altresì, conferma nei progressi rilevati dall'analisi degli indicatori fisici. A tal proposito, è opportuno evidenziare che le batterie di indicatori non ancora valorizzate verranno alimentate dai progetti finanziati con le risorse liberate dai progetti coerenti.

Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere l'occupabilità di donne e uomini disoccupati, da più di sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel mondo del lavoro e prevede la predisposizione di un'offerta di servizi integrati e personalizzati di orientamento, consulenza e formazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
56.043.000,00	28.021.500,00	28.021.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	63.428.463,19	113,18%	50.222.950,55	89,62%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	50.222.950,55	89,62%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, a fronte di un ammontare di impegni in *overbooking* pari a € 63.428.463,19 si rileva un incremento dei pagamenti effettuati che determina una capacità di spesa pari al 89,62% della dotazione complessiva.

4.C Indicatori di realizzazione

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3.830	2.947
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	309
monteore (approv., concl.) (per le componenti quantificabili in ore)	ore	3.270.000	2.624.391
costo (concl.)	euro	56.043.000,00	54.310.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Dalla tabella sopra esposta si evidenzia un'ottima *performance* dello stato di realizzazione fisica della misura. Infatti, le realizzazioni dell'indicatore "costo" evidenziano percentuali superiori al 96% del costo programmato (pari a €. 56.043.000,00), quelle dell'indicatore destinatari presentano percentuali di poco inferiori al 77% del dato previsionale mentre l'indicatore "monteore" evidenzia valori di realizzazione superiori all'80%.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel suo complesso la misura presenta una buona *performance* sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista delle realizzazioni fisiche. Dal punto di vista finanziario ha concorso al raggiungimento della *performance* la rendicontazione all'interno della misura di progetti coerenti con il POR. Precisamente, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per tali progetti ammontano a € 30.650.094,83 ed incidono nella misura del 54,69% sul totale delle risorse allocate; mentre i pagamenti sono pari a € 28.213.948,58 e corrispondono al 50,34% dei pagamenti effettuati alla data di riferimento.

Alla suddetta *performance* corrisponde un soddisfacente stato di realizzazione fisica della tipologia "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo".

Il buon andamento della misura è confermato anche dal punto di vista procedurale in quanto sono state avviate tutte le linee d'azione.

Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.4 si pone la finalità di promuovere l'inclusione sociale attraverso la realizzazione di interventi che si caratterizzano per l'elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
41.913.764,00	20.956.882,00	20.956.882,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 61.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	41.913.764,00	18.827.199,00	44,92%	12.953.293,48	30,90%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	41.913.764,00	14.314.972,36	34,15%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta un quadro finanziario caratterizzato da impegni pari al 45% circa del costo programmato, e da una capacità di spesa del 34,15%. Tale situazione è in parte da ricondurre alla rimodulazione del piano finanziario che ha ridotto lo stanziamento disponibile per questa misura innalzando le percentuali di attuazione finanziaria. Si segnala, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Integrazione sociale			
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	55	55
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	1260	780
costo (approv., concl.)	euro	18.542.052,69	10.997.310,93
<i>Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	2.658	
destinatari	n	2658	
durata	giorni	1095	
costo (approv., concl.)	euro	6.997.001,01	

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	365
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	245.042,10
<i>Persone: incentivi per il lavoro autonomo</i>			
destinatari	n	380	
progetti	n	380	
durata	giorni	1080	
costo	euro	6.997.001,01	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	14	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	360	
costo (concl.)	euro	1.399.400,20	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Integrazione sociale</i>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n	531	252
durata	giorni	300	312
costo	euro	7.440.196,93	3.719.889,80
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n	70	33
durata	giorni	190	318
durata (monte ore)	ore	22.000	10.065
costo	euro	300.000,00	138.616,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica, divisi in UPB Lavoro e UPB Formazione, sono stati quantificati in relazione a quattro tipologie di progetto. In particolare, con riferimento a quelli che riguardano gli interventi attinenti le politiche del lavoro, si registrano realizzazioni per la tipologia "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati", che registra risultati inferiori a quelli attesi per gli indicatori "durata dei progetti" e "costo" le cui realizzazioni effettive costituiscono il 59% circa di quelle attese, e la tipologia "Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità", che è ascrivibile al Piano di Comunicazione realizzato e concluso negli anni precedenti.

Lo stato di attuazione fisica degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 riconducibili alle tipologie di progetto - "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" e "Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori" - registra realizzazioni effettive, in generale, inferiori rispetto ai risultati attesi a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista dell'attuazione finanziaria si evidenzia un discreto avanzamento della Misura. Infatti, il dato relativo alle realizzazioni, che registra una crescita di circa il doppio rispetto al 2005, va considerato anche alla luce di un decremento nel costo programmato della misura avvenuto in sede di rimodulazione del piano finanziario. Ciò trova conferma nella capacità d'impegno, cresciuta rispetto allo scorso anno di 2 Meuro circa, e nella capacità di erogazione delle risorse, anch'essa cresciuta di 2 Meuro circa, grazie al quasi esclusivo contributo dell'iter attinente i Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Lo stato di realizzazione fisica si rivela distante dallo *standard* fissato nel Complemento di Programmazione infatti, ad eccezione di un'unica tipologia di progetto ("Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità"), la batteria degli indicatori valorizzati a fine anno

2006 si attesta su importi ancora non del tutto soddisfacenti. Dal punto di vista procedurale nel corso del 2006 sono stati avviati diversi iter che porteranno ad esaurimento le risorse della misura, quali i "Progetti di eccellenza finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" ed il "Programma piccoli sussidi".

Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro ed è articolata secondo una pluralità di linee d'azione che vanno dall'accreditamento dei soggetti formativi, allo svolgimento di specifiche azioni formative destinate agli operatori degli enti di formazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	6.206.067,79	68,96%	5.437.606,19	60,42%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	5.437.606,19	60,42%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La Misura conferma gli impegni rilevati nel precedente rapporto che si attestano a circa il 69% dello stanziamento disponibile e registra un incremento dei pagamenti di circa 5 punti percentuali, passando dal 55,91% al 60,42%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	650	365
costo (approv., concl.)	euro	344.000,00	144.000,00
<i>Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	4	3
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	565	802
costo	euro	5.000.000,00	4.512.697,00
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	400	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	600	
Durata (monte ore)	ore	80.000	
costo	euro	2.400.000,00	
<i>Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione</i>			
progetti	n	1	
durata	giorni	1.095	
costo	euro	1.000.000,00	
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti	n	11	1
durata	giorni	600	60
costo	euro	250.000,00	3.800,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006, risultano valorizzati gli indicatori delle tipologie di progetto "Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori", "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati" e "Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione". A tale data le prime due tipologie presentano valori invariati rispetto alla precedente rilevazione, mentre vi è stato un incremento dei valori relativi alla terza tipologia. Infatti, rispetto al precedente rapporto i progetti conclusi sono passati da 2 a 3 e il costo ha raggiunto percentuali di poco superiori al 90% del valore atteso evidenziando un incremento di circa 35 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La buona *performance* trova conferma nei dati esposti nelle tabelle relative all'avanzamento finanziario e alle realizzazioni fisiche. Dal punto di vista finanziario nonostante vi sia stato un incremento nella spesa di soli 5 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione i valori relativi all'allocazione delle risorse e alla capacità di spesa sono superiori al 60%. Dal punto di vista procedurale la misura è stata alimentata dall'avvio delle azioni 3.5.a) – "System" Sistema di Accreditamento, 3.5.b) – "Crediform" Azioni formative per gli operatori degli Enti di Formazione e 3.5.e) – "Interregio". Nel corso del 2007 verranno attivate le restanti azioni con le quali verrà esaurita l'intera dotazione della misura.

Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop-out.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
21.049.558,00	10.524.779,00	10.524.779,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 36.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.049.558,00	14.750.851,49	70,08%	13.011.613,17	61,81%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.049.558,00	13.011.613,17	61,81%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura con l'ultima rimodulazione del piano finanziario ha subito un decremento della dotazione finanziaria, innalzando conseguentemente le percentuali di attuazione. Gli impegni si attestano al 70,08% e i pagamenti al 61,81% della dotazione, determinando una buona *performance* della misura. L'incremento percentuale non è però solo attribuibile alla modifica del piano finanziario, in quanto gli impegni sono passati da € 11.606.986,46 a € 14.750.851,49 e i pagamenti da € 9.326.381,87 a € 13.011.613,17.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
monteore (approv., concl.)	ore	7.500	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
costo (concl.)	euro	7.000.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	912	
monteore	ore	7.500	
costo	euro	12.000.000,00	
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	38.110
Durata (monteore)	ore	7.500	166.204
durata	giorni	912	730
costo (concl.)	euro	12.000.000,00	6.940.000,00
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	300.000	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	912	
durata (monteore)	ore	3.648	
costo (concl.)	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione del presente documento si registra un sensibile incremento dei valori relativi agli indicatori “destinatari” e “costo” della tipologia “Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico”. Infatti, tanto l'indicatore “costo” quanto l'indicatore “destinatari” registrano una crescita di circa 50 punti percentuali. Nello specifico il costo raggiunge il 75% del valore atteso a fine programma. La tipologia “Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori” non presenta valori di realizzazione in quanto i progetti sono ancora in itinere.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della Misura è legato all'avvio di due iter procedurali nell'azione a) - dispersione scolastica, ed uno nell'azione b) - Progetto M@rte/CAMPUS. Quest'ultimo attivato a fine 2005 ha cominciato a produrre spesa nel corso del 2006 contribuendo di conseguenza all'avanzamento finanziario della Misura. Tale avanzamento è riscontrabile anche nelle realizzazioni fisiche, essendo i valori della tipologia “Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico” cresciuti sensibilmente. Dal punto di vista procedurale, nei primi mesi del 2007 si prevede la pubblicazione di un bando sulla dispersione scolastica che consentirà l'esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.7 ha l'obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione post-diploma articolato su due livelli, l'uno dedicato a percorsi rivolti ai diplomati della scuola media superiore (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS - integrati con percorsi universitari,

scolastici e di formazione professionale), l'altro ai laureati (Corsi di laurea on line, Master Post-Laurea, Alta Formazione per Ricerca e Sviluppo).

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
33.467.475,00	16.733.737,50	16.733.737,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 47.200.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	33.467.475,00	36.900.362,93	110,26%	21.256.069,98	63,51%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	33.467.475,00	21.610.783,66	64,57%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente *Rapporto* la situazione finanziaria della misura presenta una situazione di *overbooking* delle risorse allocate e un incremento delle spese. Gli impegni passano, infatti, da € 23.173.947,70 della precedente rilevazione a € 36.900.362,93 superando la dotazione finanziaria, conseguente alla rimodulazione del piano finanziario, mentre i pagamenti passano da € 17.130.637,04 a € 21.610.783,66, attestandosi al 64,57% della dotazione. Si segnala, che l'esiguo scostamento tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)			

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)				
destinatari		n.	1134	2.438
durata		Giorni	360	360
Durata (monteore)		Ore	8508	222.270
costo (concl.)		Euro	14.522.189,7	14.522.189,70
Persone: alta formazione				
destinatari	master	N	1.133	
	Borse di studio		40	
	Formazione manager		75	
	Formaz. Op. liason office		12	
	Formaz. Spin-off		135	
durata	master	Giorni	720	
	Borse di studio		14.600	
	Formazione manager		35	
	Formaz. Op. liason office		240	
	Formaz. Spin-off		63	
Durata (monte ore)	master	Ore	680.000	
	Borse di studio			
	Formazione manager		210	
	Formaz. Op. liason office		1.440	
	Formaz. Spin-off		378	
costo (concl.)		Euro	18.000.000,00	
Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma				
destinatari		n.	480	
durata		Giorni	730	
Durata (monteore)		Ore	720.000	
costo (concl.)		Euro	9.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 i *target* previsti per gli indicatori di realizzazione fisica della tipologia di progetto "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)" risultano raggiunti e in alcuni casi superati. Infatti come si evince dalla tabella su esposta, sono stati formati il doppio dei destinatari previsti, con l'utilizzo totale delle risorse programmate.

Le altre tipologie di progetto previste nella Misura non sono ancora state valorizzate in quanto afferenti a linee d'azione che sono state attivate tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 e pertanto non presentano ancora valori di realizzazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura presenta nel suo complesso una buona *performance*. Infatti, dal punto di vista finanziario registra una capacità di allocazione delle risorse in *overbooking* (*pari al 110%*) mentre la capacità di spesa si attesta su percentuali di poco inferiori al 65%. Come si evince anche dalla tabella relativa alle realizzazioni fisiche l'avanzamento è tuttavia da ricondurre alla buona *performance* ottenuta dalla tipologia "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)".

Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta (con particolare riferimento alla componente femminile), indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di recuperare un titolo di studio ovvero le competenze necessarie ai fini dell'occupabilità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
21.500.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	10.393.435,52	48,34%	7.962.240,20	37,03%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	7.348.492,42	34,18%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta un incremento finanziario di circa 1 Meuro per quanto riguarda gli impegni e di circa 3 Meuro per i pagamenti. La capacità di spesa si attesta quindi al 48,34% per le risorse allocate e al 34,18% per le risorse erogate.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Linea Azione A) "Diogene"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3030	1.756
durata	giorni	11.363	135
durata (monteore)	ore	45.450	214

Descrizione indicatore Linea Azione A) "Diogene"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
costo (concl.)	euro	10.543.000,00	1.495.149,48

Descrizione indicatore Linee Azione B) Vulcano", C), "Diana", D) "Ellade"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	1.237	771
durata	giorni	300	236
durata (monteore)	ore	482,56	438.619
costo	euro	8.657.259,23	7.280.997,00
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari	n.	3.500	
durata	giorni	7	
durata (monteore)	ore	70.000	
costo	euro	299.740,77	
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	8000	
costo	euro	2.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Trattandosi di una misura condivisa tra l'Assessorato della Pubblica Istruzione e l'Assessorato del Lavoro, in sede di programmazione, sono stati opportunamente distinti gli indicatori di realizzazione fisica pertinenti alla linea d'azione "Diogene", di competenza del primo dei due Assessorati citati, da quelli che attengono agli interventi di responsabilità del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale dell'Assessorato del Lavoro. La prima batteria di indicatori presenta valori di realizzazione ancora distanti dai quelli attesi a fine programma. Infatti, a fronte di valori dell'indicatore "destinatari" di poco inferiore al 60% del risultato atteso, si registrano valori dell'indicatore "costo" che si attestano su percentuali pari al 14%. Ottima appare invece la performance della tipologia "Persone: formazione permanente" di competenza dell'Assessorato del lavoro che registra percentuali di realizzazione rispetto al *target* di fine periodo pari rispettivamente al 62% e 84% per gli indicatori "destinatari" e "costo".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2006 sono state attivate le azioni "Diogene", "Vulcano" e "Diana". Tutte e tre hanno contribuito alla buona *performance* della misura. Tra queste si deve menzionare l'azione Diogene che avendo superato le difficoltà rilevate nel precedente rapporto si avvia a spendere tutte le risorse anche attraverso la pubblicazione, nel corso del 2007, di un ulteriore bando. Nel corso del medesimo anno verrà, altresì, attivata l'azione "Ellade" che permetterà di esaurire l'intera dotazione della misura. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2006 e la data della scadenza di monitoraggio (31.12.2006).

Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di progettare e implementare le politiche pubbliche. Al centro della misura sono gli operatori della Pubblica Amministrazione regionale e locale, inclusi coloro che rivestono cariche politiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
26.009.975,00	13.004.987,50	13.004.987,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 33.700.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	26.009.975,00	28.007.357,83	107,68%	13.218.729,73	50,82%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	26.009.975,00	13.218.729,73	50,82%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data di riferimento, si evidenzia l'ottima *performance* della misura nella capacità di allocare le risorse che determina un *overbooking* di impegni e una buona capacità di spesa pari a poco meno del 51%. I pagamenti risultano infatti, essere pari a € 13.218.729,73.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti	n.	10.428	2.062
durata (media)	giorni	20	434
durata (monte ore)	ore	1.421.310	154.650
costo	euro	26.009.975,00	6.290.277,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 l'attuazione fisica presenta un incremento rispetto alla precedente rilevazione. Infatti, per l'indicatore relativo al costo si registra una crescita di circa 20 punti percentuali, e per l'indicatore "destinatari" di circa 12 punti percentuali.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data di riferimento del presente documento la Misura presenta una *performance* soddisfacente sia dal punto di vista impegni che sono in *overbooking* (ancorché tale circostanza sia dovuta al decremento del costo programmato), sia dal punto di vista dei pagamenti che presentano una crescita rispetto alla precedente rilevazione di circa il 20%. Appaiono di conseguenza superate le criticità evidenziate lo scorso anno relative alla difficoltà delle amministrazioni pubbliche (destinatari degli interventi) nella spendita delle risorse.

Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell'assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (cosiddetti "nuovi bacini d'impiego").

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
69.253.000,00	34.626.500,00	34.626.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	53.284.612,20	76,94%	36.856.267,71	53,22%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	41.641.768,24	60,13%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura registra impegni di poco inferiori al 77% della spesa ammissibile e valori di realizzazione che si attestano al 60,13% della dotazione finanziaria, determinando una buona *performance* finanziaria. Si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	825	715
destinatari previsti (approv.)	n.	825	715
durata media dei progetti (concl.)	giorni	1.080	1080
costo (approv., concl.)	euro	29.657.132,83	22.941.339,93
<i>Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	5	5
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	242.812,21
<i>Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati</i>			
Destinatari	n	15	
Durata	giorni	365	
Costi	euro	3.400.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per la creazione d'impresa all'interno dei nuovi bacini d'impiego</i>			
Destinatari	n	580	
Durata	giorni	360	
Costi	euro	29.000.000,00	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione per la creazione d'impresa</i>			
destinatari	n.	2.042	2.936
durata	giorni	90	121
durata (monteore)	ore	271.587	312.120
costo	euro	3.500.000,00	6.343.754,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

In sede di programmazione, gli indicatori di realizzazione fisica sono stati opportunamente distinti tra UPB Formazione e UPB Lavoro.

Sebbene tali indicatori non risultino quantificati nella loro totalità per la tipologia di progetto "Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa", si evidenzia la buona *performance* raggiunta, circostanza peraltro sottolineata anche nel RAE 2005. Difatti, focalizzando l'attenzione sulle realizzazioni effettive, entrambi gli indicatori "progetti" e "destinatari" registrano valori pari all'87% del *target* previsto a fine programma, mentre in relazione al costo, la percentuale realizzata è pari al 77%. In relazione alla tipologia "Persone: formazione per la creazione d'impresa" afferente alla UPB Formazione si evidenzia il pressoché totale raggiungimento dei *target* di fine periodo.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

I risultati raggiunti e la crescita manifestata nell'ultimo anno delineano un quadro finanziario della misura soddisfacente, visto il traguardo dell'investimento totale pari a € 69.253.000,00. Le realizzazioni, infatti, presentano percentuali di poco superiori al 60%. È da mettere in evidenza che alla fine del 2006 si è chiusa la procedura relativa al nuovo corso della Progettazione Integrata che prevede l'utilizzo delle risorse residue della Misura nei primi mesi del 2007.

Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione di lavoro autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
41.169.822,00	20.584.911,00	20.584.911,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 43.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	41.169.822,00	18.560.273,67	45,08%	14.925.591,87	36,25%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	41.169.822,00	16.652.588,44	40,45%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, la Misura 3.11 mostra un incremento delle realizzazioni di circa 5 punti percentuali, attestandosi intorno al 40% della dotazione finanziaria, rispetto al 35% del precedente rapporto. I pagamenti certificati passano da € 15.303.373,62 a € 16.652.588,44. Rispetto a questi ultimi, si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
progetti	n.	1	1
costo (concl.)	euro	377.079,74	377.079,74
<i>Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	10	1
destinatari	n.	750	564
durata	giorni	680	680
costo	ore	30.294.814,52	16.247.013,13
<i>Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	20	
destinatari previsti (approv.)	n.	3000	
costo (approv., concl.)	euro	10.497.927,74	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006, risultano valorizzati gli indicatori di realizzazione fisica delle tipologie "Persone: orientamento e consulenza e informazione" (che già aveva trovato realizzazione nel corso del 2004) e "Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo". Per quest'ultima tipologia dai dati in tabella emerge che, per il 2006, i progetti avviati costituiscono il 10% del *target* di fine programma, il costo realizzato si caratterizza per essere il 54% di quello atteso, mentre i soggetti destinatari ammontano al 75% circa di quelli previsti.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data del presente documento la *performance* della misura dimostra una lieve crescita. Ciò trova conferma nei dati finanziari che registrano un incremento di 5 punti percentuali rispetto al 2005. Dal punto di vista procedurale va detto che nel corso del 2006 è stato pubblicato il bando per l'individuazione del Soggetto Gestore per i Prestiti d'onore cui seguirà nel 2007 quello relativo ai destinatari. Inoltre, sempre nel 2007, è prevista la pubblicazione del nuovo bando relativo alla "Conciliazione famiglia-lavoro", circostanza che, unitamente a quanto prospettato in tema di prestiti d'onore, dovrebbe portare al completo utilizzo delle risorse residue della Misura.

Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell'offerta di istruzione, in stretta correlazione con gli interventi educativi e formativi previsti dalla Misura 3.6 *Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, e al potenziamento dei servizi per l'impiego.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
62.752.000,00	31.376.000,00	31.376.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	62.752.000,00	47.657.275,98	75,95%	33.745.178,57	53,78%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	62.752.000,00	35.541.647,05	56,64%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La programmazione della misura ha raggiunto, nel corso del 2006, l'82% della spesa ammissibile e risulta significativa la *performance* degli impegni che si incrementa, rispetto all'annualità precedente, di € 10.683.703,82. L'importo complessivo delle allocazioni ammonta pertanto a € 47.657.275,98 (circa il 76% della spesa ammissibile) e i pagamenti si attestano su € 33.745.178,57 (capacità di spesa del 53,78%). Le spese certificate risultano superiori ai pagamenti e rappresentano il 56,64%. Tale disallineamento è da ascrivere a ritardi nell'alimentazione del sistema di monitoraggio.

Il dato di impegno è comunque inferiore di circa 10 punti alla media del FESR (86%) così come le spese certificate (7 punti percentuali).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociale e sanità pubblica			
Strutture scolastiche			
Laboratori			
Capienza	n.	1.400	701
Dotazione hw e cablaggi	n.	250	99
Interventi	n.	50	15
Superfici strutture	mq	5.600	1.624
Utenti base	n.	7.000	2.370
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>55</i>	<i>14</i>
Aule informatiche			
Capienza	n.	712	-
Dotazione hw e cablaggi	n.	712	-
Interventi	n.	75	-
Superfici strutture	mq	2.315	-
Utenti base	n.	3.560	-
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>80</i>	<i>3</i>
Altre strutture			
Capienza	n.	5.300	1.215
Dotazione hw e cablaggi	n.	35	64
Interventi	n.	70	18
Superfici strutture	mq	70.000	8.905,44
Utenti base	n.	18.000	292.519
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>75</i>	<i>41</i>
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di informazione e sportelli			
Capienza	n.	110	33
Interventi	n.	16	6
Superficie strutture	mq	6.000	912

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al 2005 non si registrano incrementi nei valori degli indicatori relativi alla tipologia "Strutture Scolastiche" sottotipologia "Laboratori", con 15 interventi conclusi e un valore relativo alla capienza di 701 unità (50% del valore atteso); conseguentemente la "Dotazione hw e cablaggi" e la "Superficie delle strutture" rimangono invariate rispetto all'annualità precedente (rispettivamente 99 unità e 1624 mq).

Analogamente per la sottotipologia "Aule informatiche" si registra la valorizzazione del solo indicatore "Sedi scolastiche oggetto d'intervento" con un valore di realizzazione effettiva equivalente a 3 unità.

Per la sottotipologia "Altre strutture", all'interno della tipologia "Strutture Scolastiche", i 18 "Interventi" conclusi riguardano 41 "Sedi scolastiche oggetto d'intervento" e hanno interessato una "Superficie strutture" di 8.905,44 mq.

Nell'ambito della tipologia "Infrastrutture per attività socio-assistenziali", sottotipologia "Centri di informazione e sportelli" (Centri per l'impiego), a fine 2006 risultano ultimati 7 interventi.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Le operazioni attraverso le quali si è data attuazione alla misura sono 139 così individuate:

- 35 a valere sul bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica - bando 2001" pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/10/2001; alla data di riferimento tutti i progetti sono stati avviati e il 72% (25 progetti) risultano conclusi;
- 40 selezionate a seguito del bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica - bando 2002/2004" pubblicato sul BURAS n. 9 del 25/03/2003 (38 avviate e 8 concluse);
- 3 interventi ricadenti in ambito PIT, tutti avviati e 1 concluso;
- Progetto CAMPUS, avviato nel corso del 2005 e finalizzato a *Interventi infrastrutturali innovativi rivolti all'estensione del progetto M@rte e servizi ad esso connessi*. E' attuato dall'Assessorato della Pubblica Istruzione nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa";
- 40 operazioni finanziate ai sensi della L. 23/96 sull'Edilizia scolastica. Si registra l'avvio dei lavori per tutte le operazioni e la conclusione dei lavori per 33 di esse;
- 16 Centri per l'impiego (tra i quali 7 conclusi) selezionati a seguito all'invito alla manifestazione d'interesse per accedere allo stanziamento dei fondi finalizzati alla *Ristrutturazione dei locali già sede di SCICA* (DGR 27/83 del 7.08.2001), trasmesso a Province e Comuni nel 2001. Nel corso del 2005, un ulteriore stanziamento di € 7.500.000,00 ha consentito il finanziamento di quei comuni che, non avendo aderito al primo invito, hanno manifestato interesse circa l'attribuzione delle risorse disponibili nel 2005.

Nell'annualità in corso risulta avviato un ulteriore iter. Sul BURAS n. 22 del 10.07.2006 è stato pubblicato il bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica – bando 2005/2006". Le risorse disponibili ammontano a € 7.390.670,91 ripartite per ambiti provinciali, secondo i nuovi indici percentuali stabiliti per le otto Province dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n° 7 del 22.04.2002, art. 1, comma 14, con Delibera n. 23720 del 20.05.2004. Lo stanziamento complessivo potrà subire variazioni in aumento, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie. Alla data del presente rapporto è in corso la disamina delle istanze e si prevede la conclusione della fase istruttoria entro il primo semestre 2007.

3.13. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di accompagnamento e di promozione volti alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, attraverso la realizzazione di attività di animazione, marketing territoriale e cooperazione internazionale, di progetti cluster/pilota, di un osservatorio della domanda e dell'offerta e di collegamenti tra ricerca e impresa.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
78.124.000,00	39.062.000,00	39.062.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	78.124.000,00	7.299.509,68	9,34%	6.510.769,03	8,33%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	78.124.000,00	6.510.769,03	8,33%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, l'avanzamento della misura, si attesta su valori di impegno pari a € 7.299.509,68, che corrispondono al 9,34% della spesa ammissibile e presenta pagamenti per € 6.510.769,03, la capacità di spesa della misura risulta pertanto del 8,33%. Le spese certificate sono perfettamente in linea con i pagamenti.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca			
Progetti di ricerca			
Progetti di ricerca			
Beneficiari	n.	10	19
Interventi	n.	8	19
Servizi comuni per le imprese			
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	60	-
Imprese interessate	n.	600	-
Marketing territoriale			
Interventi	n.	8	-

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Imprese interessate	n.	40	-
Conferenze			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	400	-
Centri informazione/servizi			
Interventi	n.	8	-
Azioni di cooperazione internazionale			
Interventi	n.	4	-
Imprese interessate	n.	20	-
Infrastrutture di RSTI			
Infrastrutture di RSTI			
Centri di ricerca			
Interventi	n.	3	-
Superficie infrastrutturata	mq	3.500	-
Centri di competenza tecnologica			
Interventi	n.	1	-
Superficie infrastrutturata	mq	100	-
Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione reti e collaborazione tra aziende e/o istituti di ricerca			
Aiuti alla R & S			
Aiuti alla R & S			
Imprese beneficiarie complessive	n.	375	-
- per progetti di ricerca	n.	200	-
- per servizi	n.	175	-
Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST			
Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	40	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n..	50	-
Reti/clusters per l'innovazione			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	10	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	10	-
Check-up audit tecnologici			
Imprese coinvolte	n.	100	-
Interventi	n.	100	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 . gli interventi conclusi sono 19 e si riferiscono progetti finanziati a centri di ricerca che, tuttavia, non prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca e sviluppo tecnologico; di conseguenza, l'indicatore "Centri di ricerca" della tipologia "Infrastrutture di RSTI" non risulta valorizzato. La Misura sconta un forte ritardo poiché nel 2006, l'Amministrazione Regionale ha deciso di dotarsi di apposito strumento legislativo volto a disciplinare l'intera materia della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, ivi compresi l'unificazione delle competenze per l'attuazione degli interventi nel settore⁸, i rapporti tra Regione e Università e i metodi e le modalità per la predisposizione e aggiornamento del Piano regionale per la ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione della legge costituisce presupposto per l'avvio degli interventi previsti dalla Strategia Regionale per la Ricerca e l'innovazione tecnologica e per la realizzazione dei Servizi e delle Azioni per il Trasferimento tecnologico, previsti dalla Misura del POR.

⁸ La legge Regionale n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" è stata approvata il 7 Agosto 2007

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Le spese certificate alla data del presente rapporto si riferiscono prevalentemente ai 23 interventi individuati entro l'annualità 2002.

Relativamente agli iter in corso alla data di riferimento, si evidenzia quanto segue:

- Nell'anno 2004 l'Amministrazione Regionale ha attivato un programma per la realizzazione di attività di ricerca e innovazione tecnologica, al di sotto della soglia *de minimis* (100.000 Euro), a favore di imprese ed enti di ricerca operanti in Sardegna attraverso un invito a presentare proposte pubblicato sul BURAS n. 7 del 28/02/2004. Il 7 luglio 2005, con Determinazione n. 20/CRP, è stata approvata la graduatoria attraverso la quale sono state selezionate 106 proposte ammissibili a finanziamento. A seguito delle controdeduzioni presentate dai soggetti esclusi, con Determinazione n. 7/CRP del 19.01.2006 sono state ritirate le valutazioni di esclusione e i progetti risultati non ammissibili sono stati riproposti all'esame della Commissione di Valutazione che, in data 14.02.2006, ha concluso la procedura con l'approvazione della graduatoria definitiva (Determinazione n. 60/CRP del 1.03.2006). I progetti *de minimis*, presentati da imprese ed enti di ricerca operanti nella regione e risultati ammissibili sono 132, per un importo complessivo del contributo di € 14.289.402,00, corrispondente al 75% del costo totale degli interventi. Al 31.12.2006 sono stati assunti impegni con tre imprese beneficiarie per un importo di €1.177.817,00. Tutte le fasi di attuazione del bando sono state affidate al Consorzio 21, quale Agenzia *in-house*.
- Sul supplemento straordinario al BURAS n. 26 del 23.08.2005 è stato pubblicato il bando "Laboratori Tecnologici del Distretto della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute" (approvato con Determinazione n. 176 del 17 agosto 2005) con scadenza al 30 settembre 2005. La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 16.800.000,00 di risorse pubbliche a cui dovrà aggiungersi una quota di cofinanziamento privato stimato in € 5.600.000,00.

Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
642.887,00	321.443,50	321.443,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 1.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	642.887,00	0.00	0%	0.00	0%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	642.887,00	0.00	0%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	194	
durata	giorni	365	
durata (monte ore)	ore	33.118	
costo (concl.)	euro	642.887,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura non presenta realizzazioni effettive in quanto non ancora avviata nel corso del 2006. Essa vedrà il suo avvio nel 2007 a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie della misura 1.8.

Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
3.214.770,00	1.607.385,00	1.607.385,00		

Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 5.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	3.214.770,00	342.259,40	10,65%	170.807,81	5,31%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	3.214.770,00	404.180,39	12,57%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura è stata avviata nel corso dell'anno di riferimento del presente rapporto ed è per questo motivo che presenta valori di attuazione finanziaria di poco superiori al 10% per gli impegni e al 5% per i pagamenti. Si segnala, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	214	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	28.590	
costo (approv., concl.)	euro	3.214.770,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche da registrare.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione della misura è da ricondurre all'attivazione dell'iter "Programma *Master and Back*" che ha prodotto impegni per € 342.259,40 e pagamenti per € 404.180,39, contribuendo all'avvio della misura, la quale ha subito un decremento del costo programmato in virtù del nuovo Piano Finanziario. Sebbene a livello di attuazione fisica non vi siano ancora delle realizzazioni, nel corso del 2007 è prevista la pubblicazione di un secondo Avviso del "Programma *Master and Back*" che porterà alla totale erogazione delle risorse previste.

Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
29.834.053,00	14.917.026,50	14.917.026,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 36.690.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	29.834.053,00	18.552.559,11	62,19%	936.474,27	3,14%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	29.834.053,00	988.184,63	3,31%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avvio della misura nel corso del 2004 ha portato ad un'ottima *performance* nella capacità di allocare le risorse che nel corso del 2006 si attestano intorno al 62% dello stanziamento disponibile. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti	n.	678	
durata	giorni	365	
durata (monteore)	ore	406.924	
costo (approv., concl.)	euro	10.173.110,22	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.323	44
durata	giorni	200	47
durata (monteore)	ore	71.747	2.440
costo	euro	5.808.544,09	30.375
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.042	
Durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	710.379	
costo	euro	13.852.398,69	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione sono valorizzati gli indicatori relativi alla tipologia di progetto "Persone: formazione per occupati (o formazione continua)". I risultati, seppure inferiori al *target* di fine programma, sono da tenere in considerazione, dovendosi osservare che i valori di realizzazione evidenziati sono relativi a progetti avviati nel corso del 2005.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Rispetto alla precedente rilevazione la misura, che presentava impegni e pagamenti pari a zero, realizza una *performance* positiva in relazione alla capacità di allocazione delle risorse. Non altrettanto positiva appare la capacità di spesa che tuttavia è da imputarsi al ritardo nell'avvio dei progetti. La *performance* delle realizzazioni fisiche, ancora lontana dai *targets* di fine programma, è diretta conseguenza di quanto sopra affermato circa l'attuazione finanziaria della misura. Nel corso del 2007 è prevista la pubblicazione dei bandi che porteranno ad esaurimento la dotazione finanziaria della misura.

Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione, in ambito regionale, di una qualificata e adeguata rete di operatori esperti di tecniche e metodologie della formazione nel settore socio-sanitario. Inoltre, la Misura è diretta a favorire, da parte degli operatori socio-sanitari, l'acquisizione/miglioramento di competenze ed abilità al fine di meglio rispondere ai bisogni dell'utenza.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
13.300.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	5.078.551,02	38,18%	245.724,83	1,85%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	225.169,84	1,69%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario della misura presenta una buona *performance* riguardo all'allocazione delle risorse, con impegni che sono passati da un importo uguale a zero nel precedente rapporto a € 5.078.551,02, pari al 38,18% della dotazione finanziaria. I pagamenti in considerazione dell'avvio degli interventi nel corso del 2006 sono di € 245.724,83.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.690	
durata	giorni	365	
durata (monte ore)	ore	1.614.286	
costo (approv., concl.)	euro	11.300.00,00	
<i>Persona: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	8.000	
costo	euro	2.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento della misura è da ricondurre a tre linee d'azione, tra le quali, in merito alle risorse allocate, un ruolo importante ha giocato sicuramente la linea "Ippocrate". Da evidenziare invece, in tema di risorse erogate, la linea d'azione "Auxilium" che con il Programma "Master and Back" rappresenta l'intero ammontare dei pagamenti finora effettuati dalla misura. Gli indicatori di realizzazione fisica, come già sottolineato nel paragrafo precedente sono privi della quantificazione, in quanto gli iter di riferimento hanno iniziato a produrre spesa solo alla fine del 2006. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata il 22.12.2006 e la data della scadenza di monitoraggio (31.12.2006).

Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
5.301.847,00	2.650.923,50	2.650.923,50		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione valido fino al 1 dicembre 2006 il costo totale della Misura era pari a € 12.500.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	5.301.847,00	1.100.702,32	20,76%	867.565,88	16,36%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	5.301.847,00	867.565,88	16,36%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della misura è stata oggetto di una rimodulazione, in occasione della modifica del piano finanziario avvenuta nel corso del 2006 che ha portato come per altre misure all'innalzamento delle percentuali di attuazione. Gli impegni sono equivalenti al 20,76% dello stanziamento disponibile e i pagamenti allo 16,36%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	541.666	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	4.333.333	
costo	euro	6.500.000,00	
<i>Persone:alta formazione</i>			
destinatari	n.	400	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	240.000	
costo	euro	6.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura non presenta ancora realizzazioni fisiche in quanto gli interventi sono in fase di attuazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione della misura, dal punto di vista finanziario, evidenzia una discreta *performance*, ascrivibile alla rimodulazione del costo programmato. Il bando "Tecnocom", che insiste anche sulla corrispondente Misura 6.4, contribuisce al 98% circa dei pagamenti effettuati fino alla data di rilevazione, fungendo così da elemento trainante dell'intera misura.

Non sono disponibili i dati relativi alle realizzazioni effettive, in quanto la misura ha da poco iniziato a produrre spesa, poiché si è provveduto prima all'esaurimento delle risorse nella corrispondente misura 6.4. Nei primi mesi del 2007 è prevista la pubblicazione dei bandi relativi al programma strategico regionale afferente al campo dell'innovazione, della creatività e del *design* che porterà all'utilizzo dell'intera dotazione della misura.

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	349.042.000,00	174.521.000,00	174.521.000,00		124.290.000,00
FSE	64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00		
FEOGA	776.902.000,00	388.451.000,00	388.451.000,00		443.848.000,00
SFOP	75.991.040,00	27.011.000,00	27.011.000,00	21.969.040,00	
Totale	1.266.085.040,00	622.058.000,00	622.058.000,00	21.969.040,00	568.138.000,00

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	349.042.000,00	381.290.923,00	109,24%	240.705.243,13	68,96%
FSE	64.150.000,00	67.869.978,41	105,80%	52.754.024,84	82,24%
FEOGA	776.902.000,00	592.354.487,19	76,25%	482.444.970,95	62,10%
SFOP	75.991.040,00	49.082.303,17	64,59	36.740.830,41	48,35%
Totale	1.266.085.040,00	1.090.597.691,77	86,14%	812.645.069,33	64,19%

Pagamenti certificati al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	349.042.000,00	235.324.481,21	67,42%
FSE	64.150.000,00	52.754.024,84	82,24%
FEOGA	776.902.000,00	423.664.484,34	54,53%
SFOP	75.991.040,00	36.740.810,40	48,35%
Totale	1.266.085.040,00	748.483.800,79	59,12%

Anche per il 2006 è stata confermata, per l'Asse, la strategia delineata per il settore di sviluppo delle azioni più innovative, quali, l'innovazione tecnologica, la crescita di filiera, l'attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese, cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in campo, per evitare taluni effetti di sovrapposizione.

Il contributo delle Misure FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse IV è significativo sia in termini di capacità di impegno che di capacità di spesa: con una quota relativa agli impegni di € 381.290.923,00 pari al 109,24% della propria dotazione finanziaria e di una quota relativa ai pagamenti pari a € 240.705.243,13 equivalente al 68,96% della propria dotazione finanziaria – le misure FESR si collocano, insieme alla misura 4.6 dell' FSE, al di sopra della media dell'Asse.

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse, dal punto di vista dell'attuazione finanziaria, deriva dall'ottima *performance* della Misura 4.6 che si traduce in una situazione di *overbooking* di impegni con percentuali che superano il 105%, ed in una capacità di spesa che registra percentuali di poco superiori al 82%.

Il contributo delle Misure FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse IV è ancora sostenuto per quanto attiene alla capacità di impegno: con una quota di € 270.883.792,34 – pari al 77,61% della propria dotazione – dette misure si collocano, insieme a quelle del FSE, al di sopra della media dell'Asse. Meno incisivo è il contributo alla spesa che, con il 38,76%, si colloca sotto la media del Fondo, calcolata al 48,69%.

Le Misure dell'Asse IV cofinanziate dal FEOGA, che rappresentano il 62% circa della dotazione finanziaria complessiva, dimostrano, rispetto al precedente anno, un modesto avanzamento: le risorse impegnate passano da € 522.493.000,69 a € 592.354.487,19, mentre quelle erogate da € 399.634.004,82 a € 482.444.970,95 e certificate € 423.664.484,34.

In termini percentuali, tali incrementi si traducono in una capacità di impegno che dal 67% si porta al 76% della dotazione complessiva e in una capacità di spesa monitorata che dal 51% passa al 62% del *budget* totale.

A fronte di una spesa pubblica programmata di € 75.991.040,00, al 31.12.2006, le misure cofinanziate dallo SFOP, entrambe allocate nell'Asse IV del POR Sardegna, presentano impegni giuridicamente vincolanti pari a € 49.082.303,17 e pagamenti per € 36.740.810,40, facendo attestare la capacità di impegno, di spesa e di utilizzo delle risorse pubbliche programmate rispettivamente al 65%, 48% e 48%. Se all'avanzamento degli impegni hanno contribuito entrambe le misure, l'incremento dei pagamenti registrato nell'anno di riferimento è principalmente prodotto dalla Misura 4.7.

Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura mira a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione di una cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e attraverso servizi reali avanzati.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
179.586.000,00	89.793.000,00	89.793.000,00		183.586.000,00

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 183.586.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	179.586.000,00	294.269.726,61	163,86%	187.147.307,08	104,21%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	179.586.000,00	185.635.245,91	103,37%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, a fronte di una quota di impegni di € 294.269.726,61 pari al 163,86% della spesa complessiva di misura (+77,46% rispetto alla media del FESR), i pagamenti si attestano su un valore di € 187.147.307,08, pari al 104,21% del costo complessivo (+40,79% rispetto alla media FESR). Le realizzazioni in termini di spesa certificata raggiungono € 185.635.245,91 con un incremento del 68,25% del valore rilevato lo scorso anno.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (PMI)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	5.000	2.666
Industria			
Imprese beneficiarie	n.	270	98
Infrastrutture produttive			
Aree attrezzate			
Interventi	n.	5	-
Ingegneria finanziaria (nelle PMI)			
Strumenti finanziari di sostegno			
Capitale di rischio			
Operazioni effettuate	n.	10	-
Studi			
Studi di fattibilità			
Altri settori			
Interventi	n.	1	-
Area interessata	Kmq.	180	-
Agglomerato industriale	n.	24	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato modificato il set di indicatori di misura con l'inserimento della categoria UE "studi", tipologia di progetto "altri studi" a cui sono

associati gli indicatori nazionali "*interventi*" e "*area interessata*" oltre che l'indicatore locale "*agglomerato industriale*". Al 2006 tali indicatori non risultano valorizzati.

Al 31.12.2006 si registra un aumento delle imprese beneficiarie che hanno ultimato progetti afferenti alla tipologia "*Aiuti all'industria, all'artigianato e commercio*", sottotipologia "*Artigianato*" attestatosi a 2.666 unità. Si rileva un aumento anche per il numero delle imprese del settore "*industria*" che passa da 93 a 98.

Dal raffronto con i valori-obiettivo a fine Programma, il dato relativo al grado di conseguimento del *target* è significativo unicamente per l'indicatore riferito al numero delle imprese beneficiarie del settore artigianato che raggiunge il 53% dell'obiettivo previsionale. Va tuttavia rilevato che l'*overbooking* registrato dalla spesa riguarda complessivamente 5.049 interventi finanziati alle imprese artigiane, tutti avviati entro il 2005 e, per un buon numero, ancora in corso realizzazione, nonché 202 progetti delle imprese operanti nel settore "Industria, di cui 104 non ancora ultimati.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento nell'attuazione della misura e il relativo overbooking di pagamenti registrati al 2006 è dovuto sostanzialmente all'incremento nella rendicontazione delle operazioni ultimate nel mese di dicembre per le attività della linea d'azione a) "*Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti di impresa nel settore industriale, artigianale e dei servizi*", già azione c). Gli impegni per l'azione ammontano a € 155.996.959,52 (pari all'87% del costo della misura) i pagamenti al 31.12.2006 risultano pari a € 62.222.415,38.

Con la determinazione del direttore del Servizio Coordinamento degli Incentivi dell'Assessorato dell'Industria n. 451 del 20.07.2005, pubblicata sul BURAS n. 23 del 25.07.2005, è stato indetto il Bando "anno 2005" della L.R. 15/1994 per € 41.000.000,00 con termine finale per la presentazione delle domande fissato al 30.11.2005. Con determinazione n. 124 del 28.04.2006 è stata approvata la graduatoria per un importo pari a € 33.823.630,00 relativa a 60 operazioni selezionate.

Con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l'Impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 138 del 05.05.2006, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 15 del 13.05.2006, è stato indetto un ulteriore bando a valere della L.R. 15/94 relativo all'annualità 2006, per € 24.500.000,00 con termine finale per la presentazione delle domande fissato al 12.07.2006; con determinazione n. 653 del 01.12.2006 è stata approvata la graduatoria per € 19.101.643,00 afferenti a 43 iniziative imprenditoriali.

Per quanto riguarda l'azione b) *Fondi per la capitalizzazione delle PMI*, in data 08.01.2006 è stato pubblicato il bando per l'affidamento in appalto del servizio di gestione dei Fondi dell'azione per un importo pari a € 3.000.000,00. Sono stati inoltre pubblicati nella stessa data i bandi a valere sull'azione d) *Prestiti partecipativi alle PMI* per un importo di € 5.500.000,00 e sull'azione e) *Fondi di seed capital per l'avviamento di nuove imprese* per un importo di € 1.500.000,00. Per le attività dell'azione g) *Monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutture funzionali alle attività produttive* si registrano 14 operazioni avviate e 9 operazioni concluse per una spesa di € 10.975.513,17 pari al 74% del costo programmato e un incremento della spesa pari al 61% rispetto al valore di pagamento dichiarato al 2005. Si registra un significativo avanzamento nell'attuazione e nella spesa per le 5 operazioni PIT di cui 3 concluse e una spesa prodotta al 2006 pari all'86% del costo totale ammesso a rendicontazione con un incremento rispetto alla spesa dichiarata al 2005 pari al 33%.

Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura sostiene il rafforzamento strutturale della base produttiva regionale, mirando ad innalzare i livelli occupazionali, attraverso la diffusione di una cultura tecnico aziendale in grado di accrescere la competitività delle imprese e dei servizi reali avanzati e di favorire l'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 5.000.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	2.194.752,26	24,39%	1.666.865,84	18,52%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	1.667.566,82	18,53%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura mostra rispetto allo scorso anno un significativo incremento sia dei dati di impegno che di pagamento rispettivamente pari a € 2.194.752,26 e a € 1.666.865,84.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi di consulenza alle imprese (PMI)			
Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Gestione/Organizzazione/Certificazione</i>			
Imprese beneficiarie	n.	230	-
<i>Internazionalizzazione/esportazione</i>			
Imprese beneficiarie	n.	34	-
Interventi	n.	3	-
<i>Servizi comuni per le imprese (PMI)</i>			
<i>Servizi comuni per le PMI e l'artigianato</i>			
<i>Animazione</i>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	500	-
<i>Marketing territoriale</i>			
Interventi	n.	12	10
<i>Centri informazione e servizi</i>			
Imprese interessate	n.	6.000	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

In seguito alla riprogrammazione di metà periodo si è provveduto all'aggiornamento dei *target* di fine programma per entrambe le categorie UE programmate sulla misura. Nell'ambito della tipologia di progetto "Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato", sottotipologia "Gestione/Organizzazione/Certificazione", il *target* dell'indicatore "imprese beneficiarie" passa da 100 al valore 230 mentre per la sottotipologia "internazionalizzazione/esportazione" il *target* dei due indicatori associati diminuisce passando, per "imprese beneficiarie e/o partecipanti" dal valore 40 al valore 34 e per "interventi" dal valore 5 a 3.

Relativamente alla categoria UE "servizi comuni per le imprese (PMI)", tipologia "servizi comuni per le PMI e l'artigianato" il *target* dell'indicatore "interventi" associato alla sottotipologia "Marketing territoriale" passa dal valore 10 al valore 12 mentre il *target* dell'indicatore "imprese interessate" associato alla sottotipologia "centri informazione/Servizi" passa da 4.000 a 6.000 unità.

Tuttavia, nonostante la revisione dei *target* per i valori attesi della Misura dal punto di vista della realizzazione fisica, al 2006 non si rileva un avanzamento significativo. Rispetto al *target* di fine programma, la tipologia "Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato" non fa registrare variazioni rispetto alla scorsa annualità, poiché l'azione 4.2.a "Animazione economica" non è stata attivata.

Nell'ambito delle valorizzazioni sulla misura per la tipologia "Servizi comuni per le PMI e l'artigianato", sottotipologia "Marketing territoriale" sono stati realizzati 10 interventi, come classificati con determinazione n. 459 del 4 ottobre 2002. Nella stessa tipologia di progetto inoltre il valore realizzato dell'indicatore "imprese interessate", pari a 1, associato alla sottotipologia "centri informazione/servizi" è scarsamente significativo, a fronte di un valore atteso pari a 6.000; quest'ultimo indicatore è infatti correlato al completamento delle procedure di attuazione dell'azione 4.2.c "Sportelli unici per le imprese" che, per la loro complessità, stanno procrastinando ulteriormente la piena operatività delle strutture e, conseguentemente, l'accesso ai servizi da parte delle imprese.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'azione a) – *Animazione economica* non è stata programmata.

In riferimento all'azione b) *Servizi reali alle PMI* Con determinazione n. 452 del 22.07.2005 è stato approvato il bando "Servizi per il potenziamento delle imprese" per € 2.400.000,00 relativo

all'erogazione di servizi reali finalizzati ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese, singole o associate, operanti nel sistema economico regionale attraverso il miglioramento del loro assetto gestionale, produttivo, tecnologico e/o organizzativo. L'attuazione del bando è stata affidata al Consorzio 21, che ai sensi della LR n. 23/2002 e del DPGR n. 13 del 20.02.2004 è l'Agenzia Governativa Regionale incaricata di dare attuazione alla linea d'azione. Con determinazione n. 395 del 31.12.2006 si è provveduto al disimpegno di € 1.352.197,80 quale differenza tra le somme precedentemente impegnate e i contributi concedibili alle imprese ammesse ad agevolazione. Con determinazioni n. 709 del 29.12.2005 e n. 26 del 09.02.2006 si è provveduto alla nomina della Commissione Tecnica per l'effettuazione delle valutazioni di merito. Inoltre con determinazione 477,478, 479, 480 del 27.09.2006 si è provveduto all'impegno e pagamento delle somme dovute ai componenti Commissione Tecnica pari a € 19.190,94. Con determinazione n. 521 del 16.10.2006 si è proceduto all'impegno di € 100.000,00 a favore del Consorzio 21 nonché al pagamento di € 63.035,54 a fronte di spese sostenute e rendicontate al 31.03.2006. . Con determinazione n. 238 del 16.05.2006 (successivamente rettificata dalla n. 379 del 25.07.2006) è stata approvata la graduatoria del bando per un importo riconosciuto pari a € 1.048.802,20 corrispondente alla selezione di 104 operazioni le quali, tuttavia, non hanno prodotto spese entro il 2006. Le rendicontazioni si riferiscono esclusivamente alle procedure di attuazione del bando.

Per l'azione c) *Sportelli unici per l'impresa*, nel corso del 2006 è stato sottoscritto l'accordo per l'attuazione del procedimento unico con gli enti terzi e i servizi degli Assessorati regionali coinvolti e rafforzata la rete tra le amministrazioni pubbliche grazie all'attività di sensibilizzazione svolta dal coordinamento regionale. Con l'aggiudicazione del 15.06.2005 e la consegna dei lavori avvenuta il 17.10.2005, è stato realizzato il "Sistema informativo per l'aggregazione e l'accesso alle informazioni amministrative di supporto agli sportelli unici per le attività produttive". Alla data del presente rapporto l'operazione risulta conclusa per un importo pari a € 97.430,40.

Nel 2006 è stato sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna il Protocollo d'Intesa tra Province ed enti terzi finalizzato all'individuazione delle procedure per la costituzione di una rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

Da tale protocollo è disceso infatti l'accordo con l'Anci Sardegna al fine di attuare le attività di supporto tecnico al partenariato istituzionale e pertanto nel corso del 2006 sono state impegnate somme per € 84.000,00, per le quali la rendicontazione avverrà nel 2007.

Nel medesimo protocollo è previsto che le province predispongano i Piani Prioritari di Intervento volti a verificare le esigenze per lo sviluppo e diffusione degli Sportelli unici nella provincia nonché l'individuazione, in accordo con i comuni, dei bacini ottimali per l'allocazione degli Sportelli preferibilmente in forma associata.

Entro dicembre 2007, si provvederà ad impegnare e pagare una somma pari a € 1.026.100,00 a favore delle Province per l'attuazione dei Piani Prioritari di Intervento presentati.

Con determinazione n. 606 del 21.11.2006 è stato autorizzato l'impegno di spesa a favore del CRS4 di €. 603.031,20 per l'attuazione del progetto di realizzazione del software gestionale della pratica di competenza degli Sportelli unici con il coinvolgimento di tutti gli enti terzi firmatari dell'accordo e il software del coordinamento a supporto delle attività di supporto agli Sportelli Unici.

Relativamente all'azione d) *Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale*, con determinazione n. 70 del 15.03.2006 è stato approvato il Bando "Azioni di supporto alla promozione nei mercati esteri delle filiere produttive regionali" e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa sul bilancio regionale per €. 2.300.000,00; con determinazione n. 407 del 18.08.2006 è stata approvata la graduatoria con importo pari a € 515.861,50 e sono stati ammessi a contributo 4 progetti.

In data 01.09.2006, in seguito alla firma dell'intesa operativa 2006 – 2007 tra l'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) e la Regione Autonoma della Sardegna sono stati inoltre programmati € 58.000,00 per la realizzazione del progetto interregionale denominato

“promozione del settore lapideo” che si inquadra nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all’estero del settore con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della pietra italiana e potenziare i livelli di competitività del mercato estero in Russia, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso che ha portato all’approvazione del nuovo piano finanziario avvenuta con decisione della Commissione C(2004)5191 del 15.12.2004.

Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d’Area – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura assume il carattere di una tipologia attuativa “integrata” di altre misure del POR, attraverso connessioni che sono curate, anche a seguito degli indirizzi dell’Autorità di Gestione, dal Responsabile di Misura.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		15.000.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	20.000.000,00	3.625.854,73	18,13%	2.861.952,93	14,31%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	20.000.000,00	2.084.456,65	10,42%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006 per la misura in oggetto l'avanzamento finanziario è attribuibile in gran parte alla rendicontazione delle attività di supporto alla Progettazione Integrata, per le quali è stato registrato un avanzamento degli impegni pari a € 3.625.854,73 e dei pagamenti pari a € 2.861.952,93. Le spese complessivamente rendicontate dall'Autorità di pagamento, si attestano su € 2.084.456,65.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Servizi comuni per le imprese (PMI)			
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	22	4
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Servizi promozionali			
Interventi	n.	28	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Conferenze			
Interventi	n.	12	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Centri informaz./servizi			
Interventi	n.	3	29
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	2
Reti di imprese			
Interventi	n.	5	-
Imprese interessate	n.	80	-
Soggetti attuatori	n.	1	-
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	10	-
Imprese interessate	n.	1500	-
Postazioni/terminali installati	n.	60	-
Soggetti attuatori	n.	2	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel corso del 2006, globalmente, non sono stati raggiunti risultati significativi dal punto di vista della realizzazione fisica; per la tipologia "Centri informazione/servizi" è stato valorizzato l'indicatore "soggetti attuatori" col raggiungimento, al 2006, del *target* programmato.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

A seguito della verifica sulle condizioni di fattibilità degli interventi previsti dalla misura nell'ambito del POR nel corso del 2005 si è provveduto all'adeguamento delle azioni alla luce del nuovo percorso avviato per l'attuazione della progettazione integrata. Per tali motivi con l'azione di promozione e sostegno dei progetti integrati anche nel corso del 2006 sono state finanziate le attività svolte nell'ambito dei Laboratori di Progettazione Integrata Territoriale che hanno prodotto effetti positivi sulla spesa soprattutto nel 2006. Si registra inoltre un incremento della spesa legato anche alle azioni di informazione a sostegno della Progettazione Integrata.

Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura sostiene la riqualificazione e il potenziamento dell'apparato strutturale e infrastrutturale turistico e la promozione e commercializzazione del prodotto turistico "Sardegna", con l'obiettivo di accrescerne la fruizione e la riconoscibilità sui mercati interni e ed esteri.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
140.456.000,00	70.228.000,00	70.228.000,00		82.715.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	140.456.000,00	81.200.589,40	57,81%	49.029.117,28	34,91%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	140.456.000,00	45.937.211,83	32,71%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Con un valore pari a € 81.200.589,40 gli impegni rilevati al 31.12.2006 risultano pressoché raddoppiati rispetto allo scorso anno e coprono il 57,81 % della spesa ammissibile. I pagamenti, che rappresentano il 34,91% dello stanziamento, sono pari a € 49.029.117,28.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	35	8
Interventi	n.	35	8
Posti letto	n.	250	-
Coperti in posti di ristoro	n.	350	-
Servizi complementari			
Imprese beneficiarie	n.	10	6
Interventi	n.	10	7
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	6.000	-
Interventi	n.	60	8
Sup.oggetto interventi	mq	600.000	1.004.000
Sentieri			
Interventi	n.	25	1
Lunghezza interventi	km	30	-
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Imprese interessate	n.	6	-
Interventi	n.	6	-
Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**			
Interventi	n.	16	-
Manifestazioni			
Enti pubblici	n.	90	52
Interventi	n.	90	73
Prodotti multimediali			
Imprese interessate	n.	2.000	1
Interventi	n.	5	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi.

Nell'ambito della tipologia di progetto "iniziative per la valorizzazione turistica del territorio" i *target* degli indicatori "imprese interessate" e "interventi" relativi entrambi alla sottotipologia di progetto "azioni promozionali" è stato incrementato da 4 a 6.

Con riferimento all'avanzamento fisico la tabella sopra riportata mostra significativi incrementi rispetto alla precedente annualità per la quasi totalità delle tipologie di intervento. In tal senso per la tipologia di progetto "aiuti alla ricettività e servizi complementari" il valore dell'indicatore "imprese beneficiarie" relativo alla sottotipologia di progetto "strutture ricettive" passa da 4 a 8 mentre il valore dell'indicatore "interventi" passa da 5 a 8.

Per la sottotipologia "servizi complementari" il valore dell'indicatore "imprese beneficiarie" passa da 2 a 6 e l'indicatore "interventi" passa da 2 a 7.

Per la tipologia di progetto "strutture per la fruizione del patrimonio ambientale" in riferimento alla sottotipologia "aree attrezzate" l'indicatore "interventi" passa da 1 a 8; l'indicatore "superficie oggetto degli interventi" passa da 4.000 a 1.004.000. In riferimento alla sottotipologia "sentieri" l'indicatore "interventi", valorizzato a partire dal 2006, registra il valore 1.

Per la tipologia di progetto "iniziative per la valorizzazione turistica del territorio" sono stati aggiornati i valori dei *target* per gli indicatori associati alla tipologia "azioni promozionali"; gli indicatori associati hanno un *target* a fine programma che passa dal valore 4 al valore 6. Nell'ambito dell'attuazione della misura, in riferimento alla sottotipologia "manifestazioni" l'indicatore "enti pubblici" attestandosi sul valore 52 incrementa il dato al 2005 di una unità; l'indicatore "interventi" passa dal valore 37 a 73. In particolare, il finanziamento delle manifestazioni culturali ha contribuito positivamente a creare le condizioni per il prolungamento della stagione turistica oltre i mesi estivi: il 40% degli eventi finanziati si è concentrato negli ultimi tre mesi dell'anno, coinvolgendo, in alcuni casi, comunità e luoghi che in passato erano estranei ai circuiti turistici ufficiali e il valore delle presenze turistiche nei mesi non estivi si è incrementato del 13%. Per la sottotipologia "prodotti multimediali" gli indicatori associati vengono valorizzati entrambi a partire dal 2006 entrambi con valore unitario. Tuttavia complessivamente i valori *target* di fine periodo sono ancora lontani dall'essere conseguiti.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Anche per il 2006 sono state registrate difficoltà di ordine procedurale che hanno riguardato in prevalenza i Beneficiari Finali (diversi dalla Regione) che, sovente, non hanno garantito il rispetto della stringente tempistica prevista per l'espletamento delle fasi preliminari all'avvio dei lavori. Per accelerare le operazioni da finanziare nel corso del 2006 l'AdG del POR, al fine di supportare gli uffici regionali interessati da interventi di rilevanza strategica, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara relativo a un Servizio di Assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna quali Beneficiari Finali nell'ambito di 6 Misure del POR, tra le quali la 4.5.⁹.

Tale servizio, avviato soltanto nel corso 2006, risulta attivato e prevede l'assistenza ai Responsabili di Misura presso le sedi di Cagliari, agli Enti Locali dell'intero territorio regionale nonché l'allestimento di un servizio di *help desk* presso l'Amministrazione regionale.

Al 31.12.2006 l'attuazione delle azioni previste dalla misura è quella di seguito descritta:

- per l'azione a) *Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari*, risultano selezionati 12 interventi corrispondenti a € 993.046,32; i pagamenti effettuati al 31.12.2006 risultano pari a € 471.759,32 di cui € 100.000,00 riguardano un intervento ultimato nel corso dell'anno; rispetto all'importo di € 8.330.588,00 messo a bando il 20.05.2003, sono state realizzate economie pari a € 7.337.541,68 riprogrammate per progetti finanziati nell'ambito della Progettazione Integrata.
- per l'azione b) *Programma di attività culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo libero*, che finanzia prevalentemente manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a seguito di ulteriori verifiche sull'ammissibilità, le proposte portate a rendicontazione si sono ridotte a 74 rispetto alle 83 approvate con le graduatorie delle tre annualità dal 2001 al 2003, producendo pagamenti per € 17.231.122,73. Al 31.12.2006 i progetti rendicontati per le tre annualità risultano conclusi.

⁹ Le altre Misure sono la 1.3 – Difesa del Suolo - parte Lavori Pubblici; la Misura 2.1 – Archeologia, Percorsi Religiosi e Museali, Recupero dei Centri Storici in stato di abbandono a fini Culturali e Turistici; la Misura 2.3 - Strutture e Servizi per Attività Culturali e di Spettacolo; la Misura 4.14 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali; la Misura 5.1 - Politiche per le Aree Urbane

- per l'azione c) *Itinerari turistici integrati* è tuttora in esecuzione il bando 2002/2003 "I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia, la cui graduatoria ha finanziato 7 progetti per un importo pari a € 8.761.310,70. Al 2006 si registrano 3 operazioni concluse e un buon livello di avanzamento in termini di impegni e pagamenti pari rispettivamente a € 8.254.020,83 e € 7.293.967,62 equivalenti al 94,21% e 83,25% dell'importo totale delle operazioni rendicontate.

Al 2006 l'unico progetto approvato a valere sul bando "Itinerari turistici integrati – Archeologia mineraria" di importo pari a € 775.000,00 risulta concluso.

Per i 27 progetti del bando "Itinerari turistici integrati – itinerario turistico religioso – Progetto Cattedrali di Sardegna" di importo pari a € 11.284.943,09, si registra un significativo avanzamento nell'attuazione con un numero di operazioni avviate pari a 17 contro le 3 avviate nel 2005, un incremento del dato di impegno del 54,96% e un incremento del dato di spesa del 15,21% rispetto all'avanzamento finanziario registrato al 2005.

In data 24.04.2003 è stato indetto il 2° Bando 2002/2003 "Itinerari turistici integrati – Archeologia mineraria" tramite il quale è stato selezionato 1 intervento per un importo pari a € 4.218.094,15. Al 2006 non si rileva alcun avanzamento nell'attuazione dell'operazione.

Per il bando "I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia" per il quale, in data 07.10.2005 sono stati selezionati 10 interventi per un importo complessivo pari a 5.354.826,61, si registra l'avvio di 4 operazioni con un incremento del 16,73% del dato di impegno rispetto al 2005 e l'avanzamento della spesa per € 578.279,04.

Relativamente al bando 2004 "Itinerari turistici integrati – Le Città regie" per il quale, in data 24.03.2005 sono state selezionate 4 operazioni con importo complessivo pari a € 4.984.245,12, al 2006, non è stato rilevato alcun avanzamento della spesa.

Relativamente alle 73 operazioni PIT selezionate il numero di operazioni avviate passa da 19 al 2005 a 53 al 2006 tuttavia si registra un modesto incremento nell'attuazione finanziaria.

- per l'azione d) *Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna*, in data 30.11.2001 è stato pubblicato il bando di gara d'appalto per la progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del sistema integrato "Promo-Prenotazione Prodotto Turistico Regione Sarda - Sistema Visit Sardinia"; il 03.03.2006 è stato stipulato il contratto tra l'Assessorato Turismo e l'impresa aggiudicataria un importo pari ad € 2.118.317,36 con una economia da utilizzare per la nuova programmazione pari ad € 359.915,24. Al 2006 l'operazione è stata conclusa.

In data 16.10.2006 sono scaduti i termini per il bando relativo all'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario per un importo a valere sulle risorse POR pari a € 11.926.000,00.

- per l'azione e), *Assistenza per la definizione dei "Sistemi Turistici Locali"* introdotta con la riprogrammazione di metà percorso, in data 26.09.05 è stata pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica funzionale alla programmazione operativa, all'avvio, al consolidamento, al monitoraggio e alla valutazione dei Sistemi Turistici Locali a supporto della programmazione della Regione Sardegna per un importo complessivo pari a € 551.992,20. In data 08.05.2006 è stata selezionata una proposta per un importo pari a € 534.000,00. In riferimento all'attuazione dell'intervento si registra un livello di spesa pari al 12,93% del costo programmato.

Nel corso del 2007 la misura è destinata a registrare un significativo avanzamento in termini fisici e finanziari grazie all'attuazione dei progetti che saranno selezionati attraverso i nuovi bandi a valere sulle azioni a) e d) che seguiranno il nuovo percorso procedurale dei Progetti Integrati, disciplinati dalle Direttive di attuazione del "Pacchetto Integrato di Agevolazione Turismo, Beni Culturali ed Ambientali" approvate con DGR n. 37/17 del 13 settembre 2006".

Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	67.869.978,41	105,80%	52.754.024,84	82,24%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	52.754.024,84	82,24%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il trend positivo della misura prosegue come evidenziato nel precedente rapporto, determinando un aumento di circa 2 Meuro nell'*overbooking* di impegni e una crescita della capacità di spesa di circa 1 Meuro, i pagamenti equivalgono all'82,24% dello stanziamento disponibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari previsti	n.	2.080	66
durata	giorni	200	111
durata (monte ore)	ore	332.800	22.100
costo per destinatario (appr., concl.)	euro	5.200.000,00	607.930,00
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.350	1.275
durata	giorni	300	289
durata (monte ore)	ore	1.066.666,66	949.813
costo	euro	20.800.000,00	22.816.167,00
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari	n.	2.293	2.264
durata	giorni	300	290
durata (monte ore)	ore	1.742.857	1.562.150
costo	euro	30.500.000,00	29.952.300,00
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	2.295	1.655
durata	giorni	75	152
durata (monte ore)	ore	344.262	248.250
costo	euro	7.000.000,00	4.326.045,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	200	107
durata media dei progetti (concl.)	giorni	150	145
durata (monte ore)	ore	32.000	12.102
costo	euro	650.000,00	331.700,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006, sono state valorizzate tutte le tipologie di progetto. La tipologia "Persone: formazione per occupati (o formazione continua)" che nella precedente rilevazione non era stata valorizzata evidenzia valori rispettivamente corrispondenti al 3% circa per i destinatari e all'11% del valore atteso per l'indicatore "costo". Per quanto riguarda la tipologia "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" si rileva un incremento dell'indicatore "costo" di circa 1 Meuro. Altresì presentano un aumento i valori relativi alla tipologia "Persone: alta formazione" in cui i destinatari passano da 76 della precedente rilevazione a 107, mentre il costo si attesta su percentuali pari a circa il 50% del valore previsto a fine programma.

Risultano invariati i valori relativi alle tipologie di progetto "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma" e "Persone: formazione permanente".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura evidenzia un avanzamento finanziario più che positivo con un *overbooking* di impegni ed una capacità di spesa pari all'82%. Un ruolo fondamentale sull'avanzamento finanziario è svolto dagli iter della linea d'azione 4.6a, finalizzati alla formazione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale. Altresì positiva è la rilevazione delle realizzazioni fisiche, che presentano valori molto prossimi ai risultati attesi nelle tipologie di progetto "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" e "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma". Dal punto di vista procedurale non si registra l'attivazione di nuovi iter in quanto tutte le linee d'azione hanno trovato attuazione nelle annualità precedenti.

Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP

4.A *Descrizione della Misura*

La misura è diretta al rafforzamento competitivo del comparto ittico. Il perseguimento di tale obiettivo sarà attuato attraverso la realizzazione sinergica di varie azioni: la tutela delle risorse acquatiche, il potenziamento, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture produttive, di trasformazione e commercializzazione e dei porti da pesca.

4.B *Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
62.810.160,00	21.609.000,00	21.609.000,00	19.592.160,00	

4.B.1 *Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	41.475.922,49	66,03%	31.234.580,74	49,73%

4.B.2 *Pagamenti certificati al 31.12.2006*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	31.234.560,73	49,73%

4.B.3 *Decorrenza ammissibilità delle spese*

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 *Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999*

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 *Stato di avanzamento finanziario*

Rispetto alla precedente annualità, si rileva un modesto incremento delle risorse impegnate (+1,51%) e una più consistente, seppur ridotta, crescita delle risorse erogate, che aumentano del 15,24% circa. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano quindi i seguenti valori: la capacità di impegno si attesta al 66,03% e la capacità di spesa al 49,73% del costo programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca			
Trasformazione e commercializzazione			
Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione			
Mercati ittici ammodernati/ampliati	n.	1	0
Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione			
Unità di trasformazione e/o commercializzazione ammodernate/ampliate	n.	8	7
Costruzione nuovi impianti			
Impianti di trasformazione e/o commercializzazione realizzati	n.	8	8
Mercati ittici realizzati	n.	1	1
Acquicoltura			
Acquicoltura			
Costruzione nuovi impianti			
Unità acquicole realizzate	n.	4	3
Ammodernamento/ampliamento unità acquicole			
Unità acquicole ammodernate/ampliate	n.	15	8
Acquicoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari			
Interventi di riqualificazione degli stagni	n.	4	7
Impianti di peschiera realizzati	n.	5	1
Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche			
Protezione evoluzione risorse acquatiche			
Protezione evoluzione risorse acquatiche			
Superficie di zona marina protetta	Km	50	
Moduli posizionati	n	5	
Attrezzatura dei porti da pesca			
Attrezzatura dei porti da pesca			
Banchina da pesca adeguata	m	600	140
Locali attrezzati, deposito pescato, ecc.	n	12	
Impianti alaggio	n.	5	
Stazioni di rifornimento	n	5	
Altri impianti	n.	3	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

In Allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione* si riporta, in conformità all'art.1 del Reg. CE 366/01, lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione delle opere e si è provveduto all'erogazione del saldo. Pertanto al 31.12.2006 risultano conclusi:

- 19 progetti sulla sottomisura "acquicoltura", con il superamento del *target* per l'indicatore relativo alla sottotipologia "Acquicoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari" e il raggiungimento del 53% del valore previsto per l'indicatore "unità acquicole ammodernate/ampliate";
- 16 progetti sulla sottomisura "Trasformazione e commercializzazione", con la realizzazione dei 9 interventi fissati come *target* di fine programmazione per la sottotipologia *Costruzione nuovi impianti* e di 7 degli 8 programmati per la sottotipologia *ammodernamento/ampliamento unità trasformazione*;
- 1 progetto sulla sottomisura "Attrezzature dei porti da pesca" con 140 metri di banchina adeguata pari al 23% circa dell'obiettivo fissato a fine programma.

Risultano ancora nulli i valori fisici degli indicatori afferenti alla tipologia e sottotipologia *“Protezione evoluzione risorse acquatiche”* in quanto la sottomisura 4.7 A) *“Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche”* non è stata ancora attuata.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La prima fase di programmazione (bandi del 2001 e del 2002) è stata caratterizzata da notevoli ritardi nell'attuazione degli interventi dovuti principalmente all'allungamento dei tempi occorrenti per l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e la conclusione delle istruttorie. Tali ritardi, sono stati in parte superati grazie al supporto fornito dagli esperti selezionati attraverso la Misura 7.1 – Assistenza Tecnica, che collaborano nel Servizio alla valutazione dei progetti presentati. Infatti i tempi di approvazione e pubblicazione delle graduatorie si sono notevolmente ridotti per i progetti selezionati con il bando del 2004 a valere sulle sottomisure 4.7 B) *Acquicoltura* e 4.7 D) *Trasformazione e commercializzazione*, passando da 17 a 5 mesi circa dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Non è stato invece possibile ridurre i tempi necessari alla selezione e approvazione dei progetti sulla sottomisura 4.7 C) *Attrezzature dei porti da pesca*, pertanto la graduatoria è stata pubblicata dopo 14 mesi circa dalla pubblicazione del bando (giugno 2005). Ulteriori ritardi nell'attuazione degli interventi sono stati determinati dalle difficoltà incontrate dalle imprese per la stipula con le banche e/o le assicurazioni della fideiussione a garanzia dell'anticipazione richiesta, e nel caso della sottomisura *“Attrezzature dei porti da pesca”*, dai tempi eccessivamente lunghi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (es. tutela del paesaggio).

Il 29 agosto 2006, con un certo slittamento rispetto ai tempi preventivati, è stato pubblicato un nuovo bando relativo alle sottomisure *“Acquicoltura”*, *“Attrezzature dei porti da pesca”* e *Trasformazione e commercializzazione*. La programmazione degli interventi sulle sopracitate sottomisure è stata così conclusa, le domande di contributo sono state presentate entro l'8 novembre e attualmente si sta procedendo all'istruttoria dei progetti pervenuti. Rimane da attuare la sottomisura 4.7 A) *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche* a cui sono destinate risorse pari a circa 3.800.00 Euro.

Sul versante della spesa, si registra il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto per il 2006 al quale ha contribuito in maniera significativa la sospensione di sei progetti, (per un importo totale pubblico di € 3.475.122,08 di cui 1.737.560,38 di quota SFOP) di cui quattro a causa di ricorsi amministrativi e due per effetto di normativa sopravvenuta (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). A tal proposito l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha chiesto la sospensione dell'applicazione del disimpegno automatico previsto dall'art. 31 punto 2 cpv. 3 del Reg. (CE) 1260/99. Non essendo pervenute osservazioni contrarie da parte della Commissione, la richiesta di sospensione si ritiene accettata.

Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)- SFOP

4.A Descrizione della Misura

La misura si propone di valorizzare il sistema pesca in un'ottica di sviluppo sostenibile attraverso studi e progetti pilota. Prevede aiuti diretti agli operatori per incrementare il livello associativo, per incentivare il ricambio generazionale e la riconversione professionale. Sostiene inoltre iniziative di valorizzazione e promozione commerciale delle produzioni tipiche e di qualità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
13.180.880,00	5.402.000,00	5.402.000,00	2.376.880,00	

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	7.606.380,68	57,71%	5.506.249,67	41,77%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	5.506.249,67	41,77%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, la misura registra impegni per complessivi € 7.606.380,68, pari al 57,71% della spesa ammissibile, e pagamenti per € 5.506.249,67 che assorbono il 41,77% del budget complessivo. I dati relativi agli impegni ed ai pagamenti fanno attestare un incremento rispettivamente di circa 11 e 12 punti percentuali rispetto ai valori rilevati al termine del 2005. All'avanzamento degli impegni ha contribuito per la prima volta la sottomisura 4.8 C) *Promozione e ricerca di nuovi sbocchi*, che ha superato la situazione di stallo rilevata negli anni precedenti grazie alla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità dei progetti presentati a valere sul bando del 2004.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Misure socioeconomiche			
Misure di carattere socioeconomico			
Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori			
Beneficiari	N	40	17
Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna			
Piccola pesca costiera			
Premio a un progetto collettivo integrato			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Persone partecipanti al progetto	n.	300	308
<i>Progetti integrati finanziati</i>	n.	20	16
Azioni realizzate dagli operatori			
Aiuti all'avviamento delle organizzazioni			
OP beneficiarie	n.	2	
Aiuti al piano qualità delle OP			
OP beneficiarie	n.	2	
Altre azioni			
Progetti	n.	100	14
Addetti coinvolti	n.	300	179
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca			
Promozione			
Campagne di promozione			
Campagne generiche	n.	5	
Campagne IGP/DOP	n.	2	
Operazioni certificazione qualità			
Operazioni	N	10	
Azioni innovative			
Misure innovative			
Misure innovative			
Progetti	N	4	2

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

In Allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione* si riporta, in conformità all'art.1 del Reg. CE 366/01, lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta i valori delle operazioni selezionate attraverso il bando del 2004 e per le quali si è provveduto all'erogazione degli aiuti. Con riferimento alla tipologia "Misure socioeconomiche" abbiamo: 2 beneficiari sulla sottotipologia "Aiuti ai giovani pescatori", 9 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione" e 6 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per riconversione".

Nell'ambito della tipologia "Piccola pesca costiera" sono stati realizzati 16 progetti integrati ai quali hanno preso parte 308 pescatori. Il numero dei progetti integrati risulta inferiore al *target* di fine programma, ma l'elevato numero di partecipanti indica sia una maggiore capacità associativa che una sempre più pressante necessità per gli addetti del settore di sviluppare e ammodernare questa attività di pesca.

La tipologia "Azioni realizzate dagli operatori", sottotipologia "Altre azioni" presenta 14 progetti conclusi che hanno coinvolto 179 addetti.

Un risultato apprezzabile è infine rappresentato dalle "Azioni innovative", su un *target* di 4 ne sono stati realizzati 2 per un importo pari a € 142.576,02.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Fino al 2003, non è stato possibile attuare la gran parte delle sottomisure di cui è composta la Misura 4.8 per la complessità tecnico-giuridica della materia, superata grazie all'emanazione da parte della Commissione di una serie di circolari esplicative.

Attualmente, l'avanzamento della misura è principalmente riconducibile al finanziamento dei progetti selezionati attraverso i bandi del 2004 e al "Piano di riconversione della pesca a sciabica e a strascico", dichiarato coerente con l'obiettivo della misura.

Nel 2006 un importante elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione della graduatoria relativa al bando 2004 che ha permesso l'attuazione e l'avanzamento finanziario della sottomisura 4.8.C *Promozione e ricerca di nuovi sbocchi*, che fino all'anno precedente presentava impegni nulli.

Inoltre, nel mese di dicembre, è stato pubblicato un nuovo bando relativo alle sottomisure" 4.8 A) *Piccola pesca costiera* e 4.8 B) *Misure di carattere socioeconomico*. Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30 aprile 2007. Per quanto concerne la sottomisura 4.8 A), trattandosi dell'erogazione di un premio forfetario, al 31.12.2006 risultano già impegnati ed erogati 256.289,79 euro.

Nonostante gli interventi siano partiti con tre anni di ritardo rispetto alla tempistica fissata dal Programma Operativo, il livello di spesa si attesta al 66% circa dell'obiettivo di spesa pubblica fissato per il 2006.

Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole operanti in diversi comparti produttivi. L'obiettivo è il miglioramento della competitività, l'introduzione di innovazioni strutturali, la riduzione dei costi di produzione, il rafforzamento delle funzioni commerciali, la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza ed ambiente.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
216.302.000,00	108.151.000,00	108.151.000,00		164.988.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	145.740.303,83	67,38%	111.125.972,38	51,38%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	90.177.251,60	41,69%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla fine dell'anno in esame, la Misura 4.9 presenta un ammontare di impegni pari a € 145.740.303,83, con un incremento di appena lo 0,66% rispetto a dicembre 2005. Significativa la diminuzione delle spese certificate rispetto all'annualità precedente, imputabile principalmente dalla scarsa liquidità delle aziende agricole che compromette la realizzazione delle opere nei tempi previsti, comporta la mancata erogazione dei saldi e in numerosi casi ha portato alla rinuncia del finanziamento da parte della stessa azienda, oppure alla revoca da parte dell'Amministrazione regionale (l'analisi effettuata sui tempi di realizzazione dei progetti finanziati ha rilevato che il periodo medio necessario per la realizzazione di un progetto di investimento aziendale è di quasi 3 anni).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti nelle aziende agricole			
Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	725	295
Superficie agricola interessata	Ha	3.885	1.872,74
H) Olivicolo - Aziende interessate**	n.	430	224
H) Olivicolo - Superficie agricola interessata**	Ha	3.100	1423,76
H) Olivicolo-oleario - Aziende interessate	n.	50	37
H) Olivicolo-oleario - Superficie agricola interessata	Ha	250	243,17
O.c) Olive da mensa - Aziende interessate	n.	20	1
O.c) Olive da mensa - Superficie agricola interessata	Ha	100	4
O.a) Frutta fresca - Aziende interessate	n.	150	16
O.a) Frutta fresca - Superficie agricola interessata	Ha	240	110,86
O.b) Agrumicoltura - Aziende interessate	n.	60	17
O.b) Agrumicoltura - Superficie agricola interessata	Ha	120	90,95
O.d) Mandorlicoltura - Aziende interessate	n.	15	
O.d) Mandorlicoltura - Superficie agricola interessata	Ha	75	
Edifici aziendali ad uso produttivi			
Stalle bovini			
Aziende agricole beneficiarie	n.	500	431
Edifici oggetto di intervento	n.	500	285
A) Bovino da latte – Aziende adeguate	n.	180	123
B) Bovino da carne – Aziende ristrutturate	n.	320	308
Ricoveri per animali			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)	n.	2.000	1.738
Edifici oggetto di intervento (Intervento E Ovicaprino)	n.	1.700	1.233
Interventi per la sistemazione dei terreni			
Sistemazioni idraulico agrarie			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento N Bieticolo)	n.	100	116
Superficie agricola interessata (Intervento N Bieticolo)	Ha	2.500	2.828,75
Interventi per la diversificazione delle attività aziendali			
Allevamenti e coltivazioni alternativi			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.232	889
Progetti avviati	n.	1.232	889
C) Apicoltura – Laboratori realizzati e/o adeguati	n.	40	15
D) Valorizzazione del cavallo Anglo Arabo Sardo – Aziende di 1° e 2° livello	n.	80	63
F) Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori - Imprese agrituristiche venatorie interessate	n.	30	10
G) Attività zootecniche complementari e alternative –	n.	300	133

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Aziende suinicole ammodernate</i>			
<i>G) Attività zootecniche complementari e alternative – Nuovi allevamenti ritticolati creati</i>	<i>n.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo ed in coltura protetta – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva</i>	<i>n.</i>	<i>500</i>	<i>530</i>
<i>L) Colture florovivaistiche – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva</i>	<i>n.</i>	<i>130</i>	<i>78</i>
<i>M) Piante aromatiche ed officinali – Aziende interessate al potenziamento delle produzioni di piante officinali o di riconversione produttiva verso il comparto</i>	<i>n.</i>	<i>150</i>	<i>57</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

** Indicatore fisico che fa riferimento all'intervento H del CdP prima della revisione intermedia.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.9 sono contenuti nelle Tabelle a.1 & a.2: a. Investimenti nelle aziende agricole (Capitolo I, art. 4-7 del Reg. CE 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X) e nelle Tabelle a.1 & a.2 sono riportati i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. In particolare, con riferimento agli interventi finanziati sui bandi 2001, sugli avvisi 2003 e attraverso la rendicontazione dei progetti coerenti di seconda fase, al 31.12.2006 la situazione risulta la seguente:

- sulla tipologia "Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole", le Aziende agricole beneficiarie che hanno ultimato gli interventi sono 262 con riferimento all'intervento H "Olivicolo-oleario" e 33 con riferimento all'intervento O.a Frutta fresca e O.c Agrumicoltura. I progetti realizzati hanno interessato una superficie di 1.872,74 ettari pari al 48,% del *target* a fine programma;
- con riferimento alla tipologia "Edifici aziendali ad uso produttivo" risultano conclusi 123 interventi sul bovino da latte e 308 sul bovino da carne;
- la tipologia "Ricoveri per animali" presenta 1.738 "Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)" che hanno concluso i lavori (pari all'87% del *target* finale);
- nella tipologia "Interventi per la sistemazione dei terreni" gli indicatori "aziende agricole beneficiarie" e "superficie agricola interessata" superano gli obiettivi di fine programma;
- la tipologia "Interventi per la diversificazione delle attività aziendali" presenta progetti conclusi pari a 889 (72% circa del valore atteso) di cui 15 sull'intervento C), 63 sull'intervento D), 10 su F), 133 su G), 530 su I), 78 su L), 57 su M).

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per le diverse tipologie d'intervento sono stati pubblicati tre tornate di bandi/avvisi: la prima nel 2001, la seconda nel 2003 e la terza nel 2006, con i quali è stato programmato circa il 95% della dotazione finanziaria della misura (206.302.000,00 Euro), la quota restante andrà a finanziare i progetti presentati e approvati con la Progettazione integrata.

Alla fine del 2006 il livello delle spese certificate raggiunge il 54% circa dell'obiettivo atteso. Le cause sono imputabili in parte, come già sottolineato, alle rinunce e revoche del finanziamento

per la scarsa liquidità delle aziende agricole aggravata dall'abbassamento dei prezzi all'origine delle principali produzioni regionali (es. latte ovino) e in maniera determinante alla sospensione, a causa dei numerosissimi ricorsi amministrativi, delle procedure di gara relative all'ultimo bando, che ha realmente impedito l'avanzamento dei pagamenti.

Infatti, il terzo bando, pubblicato il 26.03.2006, avrebbe consentito una decisiva accelerazione della spesa in quanto:

- tra le spese ammissibili è stato inserito l'acquisto di macchine agricole, escluso dal POR fino alla riprogrammazione intermedia del 2004 e finanziato esclusivamente con fondi regionali;
- i lavori in economia e le prestazioni volontarie non retribuite (nei limiti concessi dalle disposizioni comunitarie) sarebbero state realisticamente realizzate entro l'anno.

Sul bando sono state presentate 5.590 domande e nel mese di luglio sono state pubblicate le graduatorie. A partire da tale data e fino al 07.09.2006 gli interessati avevano la possibilità di presentare ricorso gerarchico avverso le graduatorie. Alla scadenza del termine risultavano presentati 1631 ricorsi gerarchici. L'esame dei ricorsi presentati è avvenuto nel rispetto dei novanta giorni disponibili per la chiusura dei procedimenti, così come disposto all'art. 6 del DPR n. 1199/1971, ma l'elevato livello del contenzioso, che ha rappresentato un'anomalia rispetto all'andamento fisiologico delle procedure di selezione, ha determinato la sospensione delle procedure selettive, l'erogazione dei conseguenti contributi e ovviamente lo slittamento dell'avvio degli interventi. La definizione del quadro delle nuove graduatorie derivanti dall'accoglimento dei ricorsi gerarchici ha determinato la necessità di approvare delle graduatorie rivedute e corrette. Al momento le stesse sono in fase di elaborazione e se ne prevede la pubblicazione nel primo trimestre del 2007.

I ritardi causati dal notevole numero di ricorsi è stato comunicato alla Commissione UE con nota del 22.12.2006 prot. n. 21930, con cui ai sensi dell'articolo 31 n. 2 del Regolamento CE 1260/99 è stata chiesta la sospensione del termine di disimpegno automatico per la parte di impegno corrispondente allo stanziamento previsto nel bando, pari ad un contributo pubblico di € 72.710.678,94 di cui € 36.355.339,47 di quota FEOGA.

Per quanto riguarda invece lo stato di realizzazione fisica, considerando la totalità dei progetti in corso di realizzazione, le procedure attivate e in corso di attivazione, non appare difficile il raggiungimento dei *target* fisici a fine programma.

Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede investimenti tecnologici e strutturali diretti al miglioramento della raccolta, della conservazione, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei loro derivati. Le azioni mirano ad aumentare la competitività ed il valore aggiunto di tali prodotti assicurando che ai vantaggi economici derivanti partecipino gli agricoltori.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
136.600.000,00	68.300.000,00	68.300.000,00		136.600.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	134.824.236,58	98,70%	96.315.423,25	70,51%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	68.383.218,88	50,06%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, l'esecuzione finanziaria della Misura mostra un buon incremento della performance. Gli impegni passano da € 95.116.732,48 a € 134.824.236,58 e i pagamenti da € 60.746.126,74 a € 96.315.423,25 facendo registrare un incremento rispettivamente del 41,75% e del 58,55% rispetto ai valori relativi all'annualità precedente. L'avanzamento degli impegni e della spesa è stata in larga misura determinato dalla rendicontazione di progetti coerenti con l'obiettivo e con i criteri di selezione della misura.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli			
Interventi su impianti produttivi			
Lavorazione e trasformazione			
Imprese beneficiarie	n.	232	91
Lattiero – caseario	n.	65	28
Carni	n.	15	4
Ortofrutticolo	n.	44	20
Olivicolo – oleario	n.	56	22
Vitivinicolo	n.	52	17
Stoccaggio prodotti finiti			
Imprese beneficiarie	n.	25	11
Cereali	n.	25	11
Introduzione nuove tecnologie			
Nessuna sottotipologia			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Imprese beneficiarie	n.	11	1
<i>Piante officinali e aromatiche</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>	<i>1</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.10 sono contenuti nelle Tabelle g.1 & g.2: g. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Capitolo VII, artt. 25-28 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori delle operazioni approvate sono riportati nelle Tabelle g.1 & g.2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella colonna delle "realizzazioni effettive" della tabella 4.C, sono riportati i valori delle operazioni relative al bando 2001 ed agli avvisi 2003 per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo

Alla data del presente Rapporto risultano conclusi:

- 28 progetti nel comparto "lattiero caseario" (43% del *target*);
- 4 progetti nel comparto "carne" (27% del *target*);
- 20 progetti nel comparto "ortofrutticolo" (45% del *target*);
- 22 progetti nel comparto "olivicolo-oleario" (39% del *target*);
- 17 progetti nel comparto "vitivinicolo" (33% del *target*);
- 11 progetti nel comparto "cerealicolo" (44% del *target*);
- 1 progetto nel comparto "piante aromatiche e officinali" (9% del *target*)

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista procedurale, nel primo periodo di programmazione sono rilevabili dei rallentamenti riferibili in particolar modo al bando 2001, per quanto concerne le fasi di istruttoria e di concessione del finanziamento. Per la fase istruttoria, lo slittamento dei tempi previsti è stato determinato dalla complessità delle procedure adottate, mentre i ritardi nell'erogazione del contributo ai singoli destinatari sono in parte attribuibili alla decisione, presa nel corso del 2002, di delegare all'ERSAT l'attuazione della misura. La convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura, con la quale sono state stabilite le condizioni di affidamento delle competenze è stata firmata nell'agosto del 2002 e divenuta efficace il mese successivo. Lo snellimento delle procedure avvenuto nel corso del 2002, ha invece permesso, per l'avviso del 2003 e del 2004, il sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie.

Con la pubblicazione dell'ultimo bando, il 2 luglio del 2006, la cui dotazione finanziaria ammonta a circa 30 Meuro, è stata programmata l'intera dotazione finanziaria della misura. La graduatoria dei progetti ammissibili è in corso di predisposizione e sarà pubblicata nei primi mesi del 2007.

Con riferimento all'avanzamento finanziario, nonostante la crescita manifestata nell'ultimo anno, il livello delle spese certificate non ha portato al conseguimento dell'obiettivo di spesa previsto per il 2006, raggiunto per il 76% circa.

Per quanto concerne invece i valori di realizzazione fisica, con il progressivo completamento delle operazioni e la realizzazione degli interventi finanziati con l'ultimo bando non si dimostrerà difficile il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fisica individuati dal Complemento di Programmazione per la fine del programma.

Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di riqualificazione dell'offerta e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale e in nuovi mercati. Promuove la certificazione di processo e di prodotto quale strumento per differenziare, tutelare e valorizzare le produzioni tipiche di qualità aventi reali potenzialità di sviluppo.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
30.491.000,00	15.245.500,00	15.245.500,00		17.560.038,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	23.207.384,62	76,11%	17.049.911,96	55,92%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	13.750.198,00	45,10%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2006 gli impegni sono aumentati dell'1,61% mentre le spese certificate risultano diminuite di circa il 2%, passando così da un valore assoluto di € 14.037.791,92 a € 13.750.198,00. Il rallentamento, sia dal lato degli impegni che della spesa, è imputabile in larga misura alle revoche e alle rinunce dei progetti selezionati con il primo bando (annualità 2002).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità			
Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità			
Nessuna sottotipologia			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Studi	n.	597	126
DOP/IGP	n.	34	14
Rintracciabilità	n.	318	48
Altro	n.	245	64
Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti			
ISO 9000			
Progetti ISO 9000	n.	300	173
Aziende certificate ISO 9000	n.	300	173
HACCP			
Progetti HACCP	n.	150	16
Aziende certificate HACCP	n.	150	16
Altro			
Progetti	n.	200	67
Aziende certificate	n.	200	67
ISO 14000	n.	100	29
Altre certificazioni	n.	50	9
<i>Imprese e Consorzi di imprese sottoposti al sistema di controllo nell'uso delle denominazioni di origine, dei marchi biologici e di qualità</i>	n.	50	29

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.11 sono contenuti nella Tabella m. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.O.2 - Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella m.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C i valori delle operazioni concluse e riportati nella colonna "realizzazioni effettive" si riferiscono ai progetti selezionati e finanziati con l'annualità 2000 – 2001, 2002, 2003 ed in minor misura con il bando del 2004:

- per quanto riguarda la tipologia "*Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità*" risultano conclusi 126 progetti, pari al 21% del valore atteso;
- sulla tipologia "*Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti*" 173 aziende hanno ottenuto la certificazione ISO 9000, 16 la certificazione HACCP e 67 altre certificazioni, con valori percentuali rispettivamente del 58%, 11% e 33% dei *target* previsti a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per la misura 4.11 si è conclusa la fase di programmazione. Con la pubblicazione dell'ultimo bando, nell'agosto del 2006, sono state infatti programmate le ultime risorse, pari a 2.600.000,00 euro. E' stato inoltre previsto che potranno essere utilizzate le risorse finanziarie già impegnate a favore dell'ERSAT per il finanziamento dei progetti presentati a valere sui precedenti bandi eventualmente risultati eccedenti a seguito degli accertamenti di regolare esecuzione dei progetti, ancora non esattamente quantificabili. La graduatoria è in fase di predisposizione e sarà pubblicata nei primi mesi del 2007.

Dal punto di vista procedurale si registrano dei ritardi nelle fasi di istruttoria dei progetti e di approvazione delle graduatorie in relazione al bando pubblicato nel 2004; infatti, l'elevato numero di istanze pervenute (circa 850) ha determinato uno straordinario carico di lavoro per lo svolgimento della procedura di selezione delle proposte progettuali. L'allungamento dei tempi amministrativi necessari per l'approvazione delle graduatorie ha conseguentemente provocato lo slittamento dell'avvio degli interventi.

Ulteriori ritardi riguardano i tempi di realizzazione dei progetti selezionati a valere sul primo bando, pubblicato nel 2001, numerose operazioni, soprattutto quelle dell'annualità 2003, non risultano ancora concluse a causa delle numerose proroghe richieste dalle aziende.

Al fine di accelerare l'attuazione della misura, per i progetti finanziati a valere sul bando del 2006 sono stati ridotti i tempi concessi per la realizzazione delle operazioni, pertanto si è passati dai 18 mesi precedentemente previsti a 12 mesi, ed è stata inoltre esclusa la concessione di eventuali proroghe.

Complessivamente, al 31.12.2006, su 1.274 operazioni selezionate, ne risultano concluse 382, la maggior parte degli interventi risulta ancora in corso di esecuzione, si prevede, per la fine del 2007, con la scadenza dei termini per l'attuazione delle operazioni finanziate a valere sul bando 2004, una forte accelerazione della spesa e dei *target* di realizzazione.

Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a sostenere interventi che favoriscano la pluriattività e la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo. Gli investimenti promossi sono rivolti all'attività agrituristica, didattica e divulgativa e alle azioni dirette alla realizzazione ed al recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.001.558,00	12.000.779,00	12.000.779,00		24.000.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	12.352.232,94	51,46%	6.249.946,91	26,04%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	2.530.643,38	10,54%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999 e per l'Azione 4.12.c *Fattorie didattiche*, dal 26 giugno 2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, il quadro finanziario che caratterizza la misura evidenzia un incremento sia per quanto attiene le risorse allocate che le risorse erogate. Infatti, gli impegni passano da € 10.276.365,91 a € 12.352.232,94 e i pagamenti da € 3.431.107,38 a € 6.249.946,91, determinando così percentuali pari, rispettivamente, al 51,46% e 26,04% del costo ammesso. Si registra un decremento delle spese certificate imputabile anche alle difficoltà di ottenere le prescritte autorizzazioni per la realizzazione delle opere che hanno indotto numerose aziende alla rinuncia del finanziamento oppure al ridimensionamento delle opere inizialmente previste.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative</i>			
<i>Edifici aziendali ad uso agriturismo</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	320	51
Edifici oggetto di intervento	n.	320	44
Posti letto	n.	2.160	290
<i>Altri investimenti per la pluriattività dell'azienda agricola</i>			
<i>Spaccio di prodotti aziendali</i>			
Aziende beneficiarie	n.	140	16
Progetti	n.	140	16
<i>Str. Servizi attività ricreative didattiche</i>			
<i>Attività didattiche</i>			
Progetti	n.	10	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.12 sono contenuti nella Tabella p. Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito (Capitolo IX, art. 33 del Reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella p.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

I valori raggiunti dagli indicatori di realizzazione fisica si dimostrano piuttosto modesti in particolare:

- per l'azione 4.12.a, "attività agrituristica", su 241 operazioni avviate, ne risultano concluse 51;
- per l'azione 4.12.b, "Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato", delle 74 operazioni avviate ne risultano concluse 16.

Nessun progetto è stato realizzato per quanto attiene la sottotipologia "attività didattiche" in quanto l'azione è stata attivata con il bando del 2006.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario, lontano dall'obiettivo previsionale di spesa, risente dei ritardi ascrivibili:

- alla tardiva attivazione della misura che risale al 2003, determinata, per quanto concerne l'azione a) al prolungamento dei tempi occorsi all'Autorità di Gestione, per il parere di coerenza alle direttive e agli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'azione, non condividendo le restrizioni poste dall'Assessorato all'Agricoltura alle nuove costruzioni previste dal POR;
- alle carenze di organico dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, ai quali compete la gestione degli interventi;
- ai tempi eccessivamente lunghi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie (ad es. la concessione edilizia);

Nel mese di giugno 2006 è stato infine emanato l'ultimo bando con il quale è stata attivata anche l'azione 4.12.c ed ha determinato la completa programmazione della Misura e l'esaurimento della dotazione finanziaria. Si prevede la pubblicazione della graduatoria nei primi mesi del 2007.

Sempre nel corso 2006, per potenziare il personale dei Servizi Ripartimentali di Cagliari, Oristano e Nuoro, si è fatto ricorso ad un'assistenza tecnica dedicata, con l'individuazione di un *task force* di agronomi preposti al supporto del personale dell'Amministrazione nell'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati a valere sulla misura. Per tutto il 2007, il gruppo di lavoro garantirà il proprio supporto con la possibilità di proseguire le attività anche nel 2008.

Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOPA

4.A Descrizione della Misura

La misura è diretta a migliorare l'economia e la qualità della vita nelle aree rurali. Sono previste quattro linee d'intervento che favoriscono lo sviluppo delle aziende zootecniche in termini di redditività e di miglioramento della qualità della materia prima e iniziative di primario interesse per la popolazione quali la creazione di sportelli informativi e delle reti telematiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
15.659.000,00	7.829.500,00	7.829.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	6.305.350,66	40,27%	6.067.337,96	38,75%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	4.295.110,54	27,43%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della misura, sia in termini di impegni che di pagamenti, risulta immutato rispetto all'anno precedente, le spese effettivamente sostenute e certificate risultano notevolmente inferiori al dato di monitoraggio, che comprende le anticipazioni erogate per le spese inerenti la stipula, la registrazione degli atti e l'acquisto delle sedi operative dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi di base per l'economia e la popolazione rurale			
Servizi essenziali all'economia rurale			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	2	2
Sportelli informativi	n.	21	
Sedi operative e uffici di coordinamento	n.	21	
Analisi di campioni massali di latte	n.	60.000	60.000
Capi in lattazione monitorati	n.	3.240.000	3.240.000
Laboratori potenziati	n.	1	1
Servizi assistenziali			
Assistenza anziani e infanzia			
Progetti avviati	n.	7	
Altro			
Progetti avviati	n.	3	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.13 del POR Sardegna sono contenuti nella Tabella n. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta applicabile e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella contrassegnata con la lettera n.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Risultano conclusi due interventi: il potenziamento del laboratorio dell'ARAS per un importo di € 3.404.062,86 e il "Progetto qualità e igiene alimentare" per un importo di € 521.161,08.

L'indicatore di realizzazione effettiva "*Sedi operative e uffici di coordinamento*" non è quantificato poiché gli interventi non sono stati completati.

Per quanto concerne gli indicatori "*Analisi di campioni massali di latte*" e "*Capi in lattazione monitorati*" è stato raggiunto il pieno conseguimento dei risultati attesi a fine programma.

Non risultano ancora realizzazioni nella tipologia *Servizi assistenziali*, in quanto l'Azione 4.13.c "*Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale*" non è stata ancora attuata.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista procedurale si registra una buona performance in relazione all'attuazione dell'azione b) *Realizzazione di infrastrutture fisiche, compreso il potenziamento del laboratorio regionale per l'analisi microbiologica e igienico-sanitario del latte e dei prodotti da questo derivati* i cui programmi di investimento risultano oramai conclusi già dal 2004. Alcune difficoltà sono state invece incontrate per l'Azione a) *Creazione di una rete di servizi all'economia* che hanno determinato un prolungamento dei tempi di attuazione dell'intervento. Le difficoltà di acquisizione degli immobili per la realizzazione delle sedi logistiche dei tecnici dell'ARAS e la rivisitazione del ruolo dell'ARAS nell'ambito delle attività di assistenza tecnica in campo agricolo avviata dall'Assessorato dell'Agricoltura, hanno portato la stessa ARAS a richiedere una variante e pertanto una proroga dei termini di conclusione dell'operazione previsti per la prima metà del 2007.

Dopo un'attenta verifica di coerenza con il POR, in occasione del Comitato di Sorveglianza del 1° febbraio 2006 è stata presentata ed approvata l'eliminazione dell'azione c) *Creazione di sportelli informativi e di reti telematiche*, in quanto è risultata più opportuna la collocazione delle operazioni in essa previste all'interno della Misura 6.3, che prevede specifiche azioni sull'e-government.

Per quanto riguarda l'attuale azione c) *Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale*, nel 2005 l'azione è stata assegnata alla competenza dell'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza sociale, che sta procedendo all'elaborazione di due bandi che saranno pubblicati nella prima metà del 2007. Il primo bando per un importo di 7 Meuro (sarà un bando multimisura che riguarderà anche la Misura 5.2, "*La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali*", cofinanziato dal FESR), sarà diretto alla concessione di contributi finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità e in condizioni di non autosufficienza (domotica), mentre il secondo, per un importo di circa 2 Meuro, prevede il finanziamento di attività di supporto a processi terapeutico riabilitativi in ambiente rurale, anche attraverso attività sperimentali di socializzazione, equestri e sportive in genere.

Misura 4.14 – Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura promuove l'attivazione, nell'ambito di progetti a dimensione locale, di interventi che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività produttive agricole, con il fine di generare sia conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione. La misura riguarderà i centri minori e verrà attuata mediante specifiche azioni volte prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale a fini turistici e culturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
34.497.065,00	17.248.533,00	17.248.532,00		3.166.684,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	0,00	0,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006, la Misura 4.14 presenta impegni e pagamenti nulli in quanto la misura è stata attivata nel mese di giugno del 2006.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ristrutturazione edifici, abitazioni rurali e borghi rurali			
Nessuna sottotipologia			
Immobili ristrutturati	n.	129	
Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale			
Altro			
Progetti	n.	15	
Incentivazione di attività turistiche			
Creazione centri attiv. Artigianali			
Nessuna sottotipologia			
Centri realizzati	n.	22	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.14 sono contenuti nella Tabella o. Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale (Capitolo IX, art. 33 del Reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della misura (Tabella o.) risultano ancora nulli (pari a zero).

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione effettiva non sono quantificati in quanto la misura è stata attivata nel giugno del 2006 e la realizzazione degli interventi avrà inizio nel 2007.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura ha trovato attuazione solo nel 2006 a causa di ritardi imputabili:

- fino alla "Riprogrammazione intermedia", alle carenze di contenuti sotto il profilo programmatico-procedurale della scheda di misura del POR e del CdP che hanno impedito di superare le difficoltà incontrate nella soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.
- dal 2004 al luglio 2005, al processo di riorganizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura che ha consentito la designazione del nuovo Responsabile di Misura solo a fine luglio 2005.

Con la riprogrammazione intermedia, le Misure 4.15 e 4.16, potenzialmente confliggenti con azioni simili cofinanziate dal FESR, sono state eliminate e alcune tipologie di interventi sono stati aggregati all'interno della Misura 4.14, per una maggiore coerenza, anche a seguito del nuovo regolamento di attuazione del Reg. CE 1257/99, che ha permesso di individuare misure che integrassero diverse linee di intervento dell'articolo 33. In tal modo si è voluto da una parte, migliorare l'efficacia degli interventi attraverso il finanziamento di progetti a dimensione locale, e dall'altra, garantire una maggiore flessibilità finanziaria (possibilità di articolare il piano finanziario su una misura piuttosto che su tre).

Dopo la riorganizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, il nuovo Responsabile ha apportato alcuni lievi adattamenti procedurali alla scheda di misura del Complemento di Programmazione, modifiche approvate con la procedura scritta avviata a novembre 2005.

Nel maggio del 2006 è stato pubblicato l'Avviso rivolto ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per la presentazione dei progetti locali di cui all'Azione 4.14.a. La graduatoria dei progetti ammessi è stata approvata e pubblicata a fine novembre: su 86 progetti presentati ne sono stati selezionati 39, di cui solo 10 risultano finanziabili sulla base delle risorse disponibili. Si prevede l'emanazione dei decreti di concessione del contributo a favore dei beneficiari finali nei primi mesi del 2007.

Nel mese di giugno 2006 l'Autorità di Gestione ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica dedicata agli Enti Locali, beneficiari finali di alcune azioni/misure finanziate dal POR, tra i quali sono compresi anche i Comuni e i Consorzi di Comuni finanziati con l'Azione 4.14.a. Si tratta della realizzazione di piccoli progetti di sviluppo locale che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività produttive, agricole e no, al fine di generare sia conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione, partendo dalle vocazioni del territorio di riferimento. L'AdG, tenuto conto della complessità delle attività a cui sono chiamati a rispondere i Beneficiari, ha ritenuto necessario accompagnarli con una forte azione di Assistenza. Per quanto concerne l'azione 4.14.b, gli interventi saranno attuati dall'Ente Foreste sulla base di un Programma di interventi attualmente in fase di definizione.

Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.15 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

Misura 4.16 – Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.16 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a sostenere la ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito alle alluvioni del novembre 1999, del dicembre 2004 e aprile 2005. E' inoltre prevista l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, attuati attraverso interventi straordinari sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende danneggiate.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
22.781.565,00	11.390.782,00	11.390.783,00		4.500.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	12.541.530,44	55,05%	10.798.181,59	47,40%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	10.345.052,66	45,41%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Lo stato di attuazione presenta un lieve decremento degli impegni (- 3,31%) e dei pagamenti (- 0,44%) rispetto ai valori registrati nell'anno precedente. La riduzione dei dati finanziari è causata dalla revoca di due progetti. La capacità di allocazione delle risorse risulta pari al 55,05% e quella di erogazione si attesta al 47,40% della dotazione finanziaria, mentre la capacità di utilizzo passa all'86,09%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione			
Interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.550	958
Superficie	Ha	19.000	14.404,68
Domande liquidate in provincia di Oristano	n.	56	56
Domande liquidate in provincia di Nuoro	n.	150	72
Domande liquidate in provincia di Cagliari	n.	886	830
Domande liquidate in provincia dell'Ogliastra	n.	458	
Introduzione strumenti di prevenzione			
Nessuna sottotipologia			
Superficie	Ha	263.203	263.203
Progetti	n.	2	1
Consorzi di Bonifica interessati	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.17 sono contenuti nella Tabella u. "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione" (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella u.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella degli indicatori fisici, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. Pertanto, su un *target* previsto di 1.550 aziende beneficiarie, al 31.12.2006 ne risultano 958, la "superficie interessata" ammonta a 14.404,68 ettari (76% circa del *target*).

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto riguarda l'azione a) "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali", sono pressoché conclusi gli interventi di ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito ai nubifragi del novembre 1999. Nel mese di febbraio 2006 è stato pubblicato il bando rivolto alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del dicembre 2004 (Provincia Nuoro e Ogliastra) e da quella dell'aprile 2005 (Basso Campidano, Provincia di Cagliari). Nel mese di aprile, in seguito alla Delibera della Giunta Regionale con la quale si riconosce l'eccezionalità del nubifragio verificatosi a Castiadas nel settembre del 2005, sono state approvate le integrazioni e modifiche al bando per consentire alle aziende danneggiate da tale evento calamitoso di presentare le domande d'aiuto. Anche per l'Azione 4.17.a, di competenza dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, al fine di potenziare alcuni di questi Servizi particolarmente carenti di personale, è stata selezionata una *task force* di agronomi per le fasi di istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati. La durata del contratto per il gruppo di lavoro è di un anno, con possibilità di rinnovo per un altro anno, in maniera tale da assicurare all'Amministrazione regionale un consistente supporto nella parte finale della programmazione 2000-2006 in cui si concentrano maggiori incombenze.

L'azione b) "Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione", è in fase completamento: sono stati acquistati i mezzi meccanici necessari per le opere di prevenzione sulle reti e sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende ricadenti del Comprensorio consortile della Sardegna meridionale soggetto all'alluvione del 1999 e nel mese di marzo del 2005 il Consorzio ha ricevuto la delega dall'Assessorato dell'Agricoltura per l'esecuzione degli interventi che a tutt'oggi dal punto di vista fisico risultano pressoché conclusi.

In relazione al conseguimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione fisica, con il finanziamento delle aziende danneggiate dai nubifragi del 2004 e 2005 saranno senz'altro conseguiti i *target* previsti a fine programma.

Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è rivolta a garantire agli agricoltori e alle altre persone a vario titolo connesse allo sviluppo rurale il miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali. La

formazione riguarda sia le innovazioni derivanti dall'applicazione di metodi produttivi sostenibili con l'ambiente che l'aggiornamento sull'applicazione in azienda della normativa vigente.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	578.542,13	9,64%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	418.129,28	6,97%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto all'anno precedente, caratterizzato da un avanzamento finanziario nullo, la misura presenta un ammontare di impegni pari all'intero costo programmato (€ 6.000.000,00) e un incremento della spesa di € 578.542,13, corrispondente al 9,64% della dotazione finanziaria complessiva.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Agricoltura – Formazione professionale specifica			
Corsi			
Qualità produzione			
Corsi	n.	100	
Allievi	n.	1.500	
Produzioni ecocompatibili			
Corsi	n.	80	
Allievi	n.	1.200	
Efficienza gestionale			
Corsi	n.	66	
Allievi	n.	1.000	

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Gestione forestale</i>			
Corsi	n.	46	
Allievi	n.	700	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.18 sono contenuti nella Tabella c. Formazione (Capitolo III, art. 9 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati Tabella c.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La batteria di indicatori non è valorizzata in quanto al 31.12.2006 i corsi di formazione hanno appena avuto inizio.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Con la riprogrammazione di metà periodo, la gestione della misura, prima in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, è stata affidata all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, avvalendosi delle specifiche competenze nel campo della formazione.

L'intera dotazione della misura è stata programmata con il bando pubblicato il 24 luglio 2005 finalizzato alla selezione degli Enti di formazione che hanno presentato progetti relativi alla formazione professionale in agricoltura, nello specifico:

- interventi formativi di aggiornamento finalizzati alla promozione di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore dell'ambiente e dei sistemi qualità (ISO 14.000);
- promozione di specifiche competenze attinenti all'obiettivo generale di qualificare professionalmente imprenditori agricoli singoli o associati operanti nel settore agrituristico;
- formazione di giovani imprenditori agricoli;
- formazione su metodi di zootecnia biologica agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai dipendenti di imprese agricole;
- promozione di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore della sostenibilità ambientale e delle tecnologie eco-compatibili.

La graduatoria è stata approvata nel marzo 2006 ed ha determinato l'impegno dell'intero costo programmato. Ad oggi, risultano avviati 12 corsi, dei quali, 9 destinati alla formazione di giovani imprenditori del settore agricolo, uno in materia di sistemi di qualità, uno rivolto agli operatori agrituristici e uno riguardante le metodologie di zootecnia biologica.

Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura tende a porre rimedio all'eccessiva frammentazione e polverizzazione fondiaria al fine di migliorare la redditività delle imprese e favorire la nascita di nuove aziende. Le operazioni di riordino fondiario si attueranno attraverso le procedure del leasing immobiliare previste dall'Organismo fondiario nazionale, tramite il proprio Fondo di rotazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
64.957.278,00	32.478.639,00	32.478.639,00		64.957.278,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	64.957.278,00	59.950.143,27	92,29%	59.950.143,27	92,29%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	64.957.278,00	59.950.143,28	92,29%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

I valori registrati dalla Misura in esame risultano pressoché immutati rispetto ai dati rilevati nell'anno precedente, si è registrato solo un piccolo avanzamento nei pagamenti dovuto al saldo erogato all'ISMEA (Organismo Fondiario Nazionale) in relazione al Piano di ricomposizione fondiaria.

Le capacità di impegno e di spesa si attestano entrambe al 92,29% del costo totale programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ricomposizione fondiaria			
Ricomposizione di particelle			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	130	74
Superficie agricola interessata	Ha	5.500	2.652,35
Studi, indagini e progetti di fattibilità			
Nessuna sottotipologia			
Studi	n.	1	1
Progetti	n.	1	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.19 sono contenuti nella Tabella k. "Ricomposizione fondiaria" (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 – Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X).

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per quanto riguarda la tipologia *Ricomposizione di particelle*, su un *target* previsto di 130 aziende beneficiarie, al 31.12.2006 ne risultano 74 con una superficie agricola interessata che ammonta a 2.652,35 ettari (48% del *target*). Mentre sulla tipologia *Studi, indagini e progetti di fattibilità* è stato completato lo Studio e il Piano di ricomposizione fondiaria della Sardegna.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In data 26.09.2003 fu stipulata una convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'ISMEA (Organismo Fondiario Nazionale) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla misura relativi alle due attività: a) *Piano di Ricomposizione Fondiaria Regionale*, b) *Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole*.

La presenza di numerose aziende con superficie estremamente ridotte, insieme alla difficoltà di ricorso all'affitto di terreni sono una delle cause del mancato avvio dei processi di ammodernamento delle imprese agricole sarde, con conseguente perdita di competitività delle stesse. Attraverso un processo di ampliamento e/o con la costituzione di unità aventi una dimensione aziendale adeguata si dovrebbe consentire una migliore organizzazione dei fattori di produzione con conseguenti vantaggi sia sui costi di produzione che sulla competitività giacché sono soprattutto le aziende medio – grandi che introducono più facilmente innovazioni e nuovi sistemi di produzione che consentono di norma di migliorare la qualità e di ridurre i costi di produzione. Pertanto attraverso la misura della ricomposizione fondiaria si tende sia ad avviare a soluzione i problemi della frammentazione (attraverso accorpamenti) e della polverizzazione (attraverso ampliamenti) della proprietà fondiaria che alla formazione di nuove imprese agricole favorendo soprattutto l'insediamento di giovani agricoltori.

Alla fine del 2005, conclusa la fase di *start-up*, prevista nella convenzione, per un importo totale di circa 14.000.000,00 Euro, è stato pubblicato il bando di importo pari a € 50.807.007,21 per la selezione degli investimenti fondiari e sono stati versati al relativo fondo di rotazione € 41.830.143,28. Gli interventi selezionati tramite il bando del 2005 andranno a sommarsi al primo gruppo di interventi (*start-up*) già realizzati dall'ISMEA. Poiché le domande di finanziamento ammesse non esauriscono la dotazione finanziaria disponibile, in data 21.06.2006 è stato pubblicato un secondo avviso per la presentazione di ulteriori domande di finanziamento. La graduatoria delle istanze ammesse è stata approvata in data 31.10.2006. Infine, nel mese di novembre, su sollecitazione da parte di numerosi imprenditori agricoli, è stata accolta la richiesta, avanzata dalla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Sardegna di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, posticipandola quindi al 14 dicembre 2006. Alla data del presente Rapporto è in corso l'istruttoria delle domande presentate per la predisposizione della graduatoria.

Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede il finanziamento della realizzazione degli acquedotti rurali, del potenziamento dell'elettrificazione rurale e della manutenzione e costruzione della viabilità rurale. Si tratta di interventi volti a garantire alle imprese le infrastrutture primarie indispensabili per poter raggiungere migliori livelli di sviluppo.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
143.612.534,00	71.806.267,00	71.806.267,00		28.076.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	124.983.304,85	87,03%	116.479.511,50	81,11%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	116.024.736,72	80,79%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un incremento sia degli impegni che dei pagamenti, rispettivamente dell'11,17% e del 13,64% dei corrispondenti valori al 31.12.2005. Si conferma pertanto anche nel 2006 la buona *performance* finanziaria della misura: la capacità di impegno si attesta all'87,03% della dotazione complessiva; la capacità di spesa passa all'81,11%, e la capacità di utilizzo al 93,20% delle risorse allocate.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura			
Interventi sulla rete idrica			
Nessuna sottotipologia			
Rete idrica realizzata e/o potenziata	Km	250	76,77
Interventi sulle strade rurali			
Nessuna sottotipologia			
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	2.800	3.046,47
Interventi sulla rete elettrica			
Nessuna sottotipologia			
Elettrodotti realizzati e/o potenziati	Km	500	400,78

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.20 sono contenuti nella Tabella r. Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (Capitolo IX, art.33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella r.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento alla tipologia "Interventi sulle strade rurali" il *target* previsto a fine programma risulta ampiamente superato, con una realizzazione effettiva di strade rurali realizzate e/o migliorate pari a 3.046,47 km. Sui 250 km di Rete idrica realizzata e/o potenziata previsti ne sono stati realizzati 76,77 km, mentre gli interventi conclusi sulla rete elettrica riguardano 400,78 km di elettrodotti realizzati e/o potenziati, l'80% circa del valore atteso.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Buona la *performance* anche dal punto di vista procedurale. Al 31.12.2006 risultano praticamente concluse le operazioni del programma di elettrificazione e di viabilità rurale coerenti POR, del programma di strade e acquedotti rurali 2002 e del 1° e 2° programma di viabilità rurale 2003. Sono in corso di completamento le operazioni finanziate con i PIT 2001 e il programma strade rurali 2004. Ancora in corso di realizzazione risultano invece, gli interventi finanziati con l'ottimizzazione PIT. A novembre 2006 è stato pubblicato un bando di circa 5.000.000 di Euro per il finanziamento di ulteriori interventi di viabilità rurale, le domande pervenute e selezionate superano ampiamente le risorse bandite, si sta pertanto valutando l'opportunità di utilizzare le risorse rimanenti, pari a circa 10 Meuro, per pagare gli interventi ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse, andando così a chiudere l'intera programmazione della misura.

Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura consiste nell'erogazione di un premio dell'importo di € 25.000 per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo in un'azienda in grado di dimostrare un'adeguata redditività. I destinatari devono avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni ed essere in possesso di un'adeguata competenza professionale agricola.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
82.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	82.000.000,00	66.450.000,00	81,04%	57.830.000,00	70,52%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	82.000.000,00	57.790.000,00	70,48%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'esecuzione finanziaria che caratterizza la Misura evidenzia un incremento sia degli impegni che dei pagamenti. Gli indicatori di avanzamento risultano i seguenti: la capacità di impegno si attesta al 81,04% e la capacità di spesa al 70,52% dello stanziamento programmato. La capacità di utilizzo rappresenta l'87,03% della dotazione pubblica impegnata.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Insedimento dei giovani agricoltori</i>			
<i>Premi per insediamento giovani agricoltori</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Giovani insediati	n.	3.280	2.692

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.21 sono contenuti nelle Tabelle b. Insediamento di giovani agricoltori (Capitolo II, art.8 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nelle Tabelle b.1 & b.2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Si riscontra una buona *performance* fisica, su un *target* di 3.280 da raggiungere a fine programma, risultano già insediati 2.692 giovani agricoltori.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto concerne la tempistica di attuazione si registrano dei ritardi, da parte dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, dovuti al prolungarsi delle procedure di controllo propedeutiche all'erogazione della 2° quota sui primi tre bandi, che di fatto hanno rallentato l'avanzamento della spesa. Infatti con i due bandi pubblicati nel 2001 e con il bando del 2003 era prevista l'erogazione di una quota del premio pari a € 15.000 al momento dell'insediamento, mentre la parte restante pari a € 10.000 poteva essere erogata solo dopo i tre anni dall'insediamento, con la verifica in azienda del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Con il bando del 2005 è stata programmata la dotazione finanziaria residua della misura ed è stata prevista l'erogazione del premio di 25.000 euro in un'unica soluzione. Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato a gennaio 2006 e la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel mese di ottobre.

Attualmente, i Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura stanno procedendo all'espletamento dei controlli propedeutici all'erogazione della seconda quota sui primi tre bandi, mentre per quanto concerne l'ultimo bando, sono in corso le procedure di concessione dei premi. Al fine di velocizzare le procedure di controllo, gestione e monitoraggio dei progetti, nel 2006 è stata avviata la procedura di selezione per l'assistenza tecnica dedicata, con l'individuazione di un *task force* di agronomi preposti al supporto del personale dei Servizi Ripartimentali di Cagliari, Oristano e Nuoro. La durata del contratto per il gruppo di lavoro è di un anno, con possibilità di rinnovo per un altro anno, l'affidamento degli incarichi è avvenuto al termine dell'anno, pertanto, il supporto all'Amministrazione potrà essere garantito fin quasi la chiusura del Programma.

L'analisi quantitativa della realizzazione fisica e gli insediamenti previsti con l'ultima graduatoria fanno prevedere che saranno sicuramente soddisfatte le previsioni fissate a fine programma.

Asse V– Città

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	347.846.000,00	173.923.000,00	173.923.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	371.902.000,00	185.951.000,00	185.951.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	347.846.000,00	224.048.164,14	64,41%	147.497.993,67	42,40%
FSE	24.056.000,00	25.234.318,27	104,90%	13.188.927,99	54,83%
Totale	371.902.000,00	249.282.482,41	67,02%	160.686.921,66	43,21%

Pagamenti certificati al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	347.846.000,00	144.653.550,17	41,59%
FSE	24.056.000,00	13.188.927,99	54,83%
Totale	371.902.000,00	157.842.478,16	42,44%

Seppure significativamente più rilevante in termini di spesa ammissibile sull'intero Asse, la *performance* delle due misure FESR, si colloca subito dopo le misure del FSE, per quanto riguarda la capacità di impegno, e la capacità di spesa.

Il FSE insiste sull'avanzamento dell'Asse con l'attuazione finanziaria della Misura 5.3. Prosegue la crescita positiva della misura con le risorse allocate che passano da € 15.313.565,64 ad una situazione di *overbooking* pari a € 25.234.318,27 e le risorse erogate che da € 11.876.666,56 si portano a € 13.188.927,99.

Misura 5.1 – Politiche urbane - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata al miglioramento della qualità del sistema urbano della Sardegna, alla riqualificazione del contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti ambientali e al contrasto del degrado e dello spopolamento della aree interne, attraverso cinque azioni: Politiche per le aree urbane maggiori, Politiche per le aree urbane di medie dimensioni, Rafforzamento dei centri minori, Rafforzamento del capitale sociale e Nuovi strumenti di governance.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
319.068.000,00	159.534.000,00	159.534.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 287.160.741,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	209.044.934,35	65,52%	135.209.871,29	42,38%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	132.620.036,06	41,56%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2006 la quota di impegni rilevata per la misura è di € 209.044.934,35 corrispondente al 65,52% della spesa ammissibile. L'importo delle certificazioni (€ 132.620.036,06) rappresenta un traguardo destinato a incrementarsi ulteriormente nel 2007.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Risanamento di aree urbane			
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative			
Interventi	n.	19	7
Superficie strutture/spazi	mq	31.000	-
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.500	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	42	17
Superficie strutture/spazi	mq	37.200	3.900
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.640	3.900
Strutture e spazi destinati a spettacoli			
Interventi	n.	6	-
Superficie strutture/spazi	mq	2.500	90
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.790	-

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Riqualificazione urbana			
Verde pubblico			
Interventi	n.	48	1
Superficie oggetto d'intervento	mq	105.000	-
Arredo urbano			
Interventi	n.	240	144
Superficie oggetto d'intervento	mq	348.000	762.723,60
<i>Interventi di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	n.	24	-
<i>Strutture di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	mq	55.500	-
<i>Interventi per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	n.	7	-
<i>Strutture per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	mq	49.119	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2006 gli interventi conclusi afferenti alla tipologia "Riqualificazione Urbana", sottotipologia "Arredo urbano" risultano 144 con un incremento di 17 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2005 (il grado di conseguimento dell'obiettivo previsto è del 60%), mentre per la sottotipologia "Verde pubblico" risulta concluso un intervento. La valorizzazione degli altri indicatori è subordinata alla conclusione degli interventi in corso di realizzazione.

Nella tipologia "Strutture per il turismo e il tempo libero", sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative" risultano ultimati 7 interventi (37% rispetto al *target* previsto).

L'avanzamento della sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" si attesta su una percentuale del 40% rispetto al valore atteso.

Il mancato allineamento riscontrato rispetto ai dati ufficiali è da ascrivere a ritardi nell'alimentazione del sistema di monitoraggio e/o a un'errata imputazione degli stessi.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data di riferimento si rileva una buona *performance* nella capacità di allocare le risorse con una percentuale del 66% rispetto alla dotazione finanziaria. La capacità di spesa si attesta su percentuali di poco inferiori al 43% con pagamenti per € 135.209.871,29 e la programmazione della misura raggiunge il 96% della spesa ammissibile.

Per le singole azioni si evidenzia quanto segue:

Per l'azione 5.1.a) con determinazione n. 73/CS del del Direttore del Servizio Centri Storici datata 03.02.2005 e pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 4 il 7.02.2005, è stato approvato il bando "Progetti di Qualità" la cui graduatoria definitiva (determinazione n. 193/CS del 22.03.2005) ha individuato, sulla scorta delle risorse disponibili, i progetti dei comuni di Castelsardo, Carbonia, Cagliari e Alghero per un importo complessivo di € 37.304.381,32. Alla data di riferimento del presente rapporto si rileva l'avvio dei lavori per il Progetto di Qualità "Itinerari storico-culturali del moderno (comune di Carbonia)"; per le restanti operazioni i comuni beneficiari stanno provvedendo alla redazione delle progettazioni definitive.

Per l'azione 5.1.b) in data 27.5.2005, con deliberazioni CIPE n. 34/2005 e n. 25/2005, sono state assegnate ulteriori risorse alla Sardegna attraverso i fondi FAS da destinarsi, in

consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione definiti nel Tavolo inter-istituzionale, alla realizzazione di "progetti di qualità" di rilievo strategico ricompresi in strumenti di programmazione, anche integrata, di tipo settoriale, comunale o intercomunale. La Giunta Regionale con le delibere n. 42/13 del 6.09.2005 e n. 46/4 del 30.09.2005 ha stabilito gli indirizzi per la programmazione delle risorse residue della misura e previsto la pubblicazione di un ulteriore bando per i "progetti di qualità".

Con determinazione n. 961/CS del 28 dicembre 2005 pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 2 del 17 gennaio 2006 è stato approvato il bando POLIS - "Progetti di qualità 2005-2006". L'importo totale delle risorse disponibili è stato determinato in 50 Meuro, così ripartite:

- POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.1 "Politiche per le aree urbane" per 10 Meuro
- Riserva Aree Urbane dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) delibera CIPE 35/2005 per 24,84 Meuro
- Risorse Regionali rinvenienti per 15,16 Meuro

La graduatoria definitiva è stata approvata con determinazione n. 477 / CS del 03 luglio 2006.

Entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle proposte progettuali sono pervenute 28 istanze dichiarate ammissibili alla fase di valutazione tra le quali sono risultate finanziabili, in ordine di graduatoria, le operazioni ricadenti nei comuni di Nuoro, Villacidro, Olbia, Sanluri, Sassari, Selargius e Quartucciu. Tutti gli interventi sono stati delegati.

Per l'azione 5.1.c) il 07.07.2006 è stato pubblicato il bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori", approvato con determinazione n. 473/CS del 30 giugno 2006 e scadenza al 10.10.2006. La dotazione finanziaria del bando è di 90.256.477,60 euro; ad essa si provvede con le risorse regionali rinvenienti per effetto delle operazioni coerenti del POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.1 "Politiche per le aree urbane". A seguito dell'esigenza manifestata dall'Autorità di Gestione di prorogare la scadenza del bando, in modo da consentire un maggior approfondimento delle sinergie tra le proposte dei comuni sul bando medesimo e la Progettazione Integrata, la nuova data di presentazione delle istanze a valere sul bando è stata prorogata al 06.11.2006.

Per l'azione 5.1 e) trova realizzazione mediante il finanziamento della redazione di "Piani Strategici" nei centri urbani maggiori dell'isola. Il 17.03.2005 sono state fissate le Linee Guida per la redazioni di Piani nei 28 comuni che hanno presentato regolare richiesta di ammissione a finanziamento. Per 8 interventi si rileva l'avvio dei lavori.

L'attuazione della misura deve inoltre ricondursi ai 106 interventi ricadenti in ambito PIT, 82 dei quali avviati e 23 conclusi; alle 49 operazioni a valere sul bando 2003 "Politiche Urbane" (avviate in misura del 63% al 31.12.2006); ai 138 progetti selezionati nel corso della programmazione 2000-2001 e individuati dalla DGR 5/19 del 18.02.2002; alle 70 operazioni ricadenti nei centri storici, 29 delle quali risultano concluse.

Nel corso del 2006 l'AdG del POR Sardegna, al fine di supportare gli uffici regionali interessati da interventi di rilevanza strategica e accelerarne i processi di spesa, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara relativo a un Servizio di Assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna, Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006 nell'ambito delle misure del POR, tra le quali la 5.1.

Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede l'adeguamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, al fine di incrementare le infrastrutture per i servizi alla persona e alla comunità, laddove maggiore è il disagio sociale. Le tipologie di intervento previste dalla Misura sono: a) centri

diurni semiresidenziali destinati ad ospitare minori, adulti ed anziani svantaggiati; b) centri di pronto intervento a carattere residenziale rivolti a vittime della violenza, c) centri di autogestione per i giovani; d) centri ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
28.778.000,00	14.389.000,00	14.389.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 25.900.159,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	15.003.229,79	52,13%	12.288.122,38	42,70%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	12.033.514,11	41,81%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario della misura mostra un sensibile incremento in termini di impegni rispetto allo scorso anno passando da € 11.031.006,50 ad € 15.003.229,79, con una percentuale pari al 52,13% della spesa ammissibile; i pagamenti dei beneficiari finali risultano pari a € 12.288.122,38 e rappresentano il 61,21% della spesa ammessa a rendicontazione.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di accoglienza			
Capienza	n.	250	-
Interventi	n.	12	-
Superficie strutture	mq	6.000	-
Utenti di base	n.	2.538	-

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Altre strutture			
Capienza	n.	4.500	4.331
Interventi	n.	84	76
Superficie strutture	mq	41.000	36.350,34
Utenti di base	n.	361.000	10.333
Centri ricreativi socializzazione prima infanzia	n.	12	-
Centri di aggregazione sociale	n.	87	72
Centri diurni semiresidenziali	n.	25	-
Progetti pilota	n.	19	-
Studi			
Piani e programmi settoriali			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	500	-
Area interessata	mq	23.813	-
Interventi	n.	24	-
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
Banche dati	n.	1	-
Area interessata	mq	23.813	-
Interventi	n.	1	-
Servizi a sostegno dell'economia sociale			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
Imprese beneficiarie	n.	47	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per le operazioni legate al bando "La qualità della vita nelle città - miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali" si rileva un significativo avanzamento dal punto di vista procedurale con un numero di operazioni avviate pari a 12 rispetto alle 5 avviate nel 2005 su un totale di 23 e la conclusione, al 2006, di 4 interventi. Per le altre tipologie di interventi nessuna opera è stata ultimata.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Il dato di spesa al 31.12.2006, attestatosi a € 12.288.122,38, se rapportato al dato rilevato al 31.12.2005, indica un *trend* positivo per la misura. In riferimento all'azione a) per il bando "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali" pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 32 del 4/11/2002, sono stati finanziati interventi di ristrutturazione, adeguamento, completamento e acquisizione di strutture dismesse, sottoutilizzate o inutilizzate, da destinare a centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani; interventi di adeguamento funzionale di spazi nell'ambito di strutture, funzionanti o in via di attivazione, finalizzati alla realizzazione di servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia. Le 23 operazioni selezionate, nel corso del 2006, hanno contribuito in maniera sostanziale all'avanzamento della misura. I dati di pagamento dal 2005 al 2006 hanno registrato un incremento pari a € 2.201.475,95 corrispondente al 29,59% del costo ammesso a finanziamento (attestatosi nello scorso anno al 6,92%).

Per 2 dei 3 progetti PIT ammessi a finanziamento sulla misura si segnala un valore di impegno pari al 98,06% e di pagamento pari a 90,28% rispetto al costo totale programmato.

Inoltre dei 77 progetti individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 44/10 del 30.12.2002, 76 risultano avviati e 69 conclusi con un livello di spesa pari al 90,37% rispetto al costo programmato.

In data 16.05.2006 per l'attuazione dell'azione a) è stato pubblicato il bando "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali" con scadenza in data 11.08.2006 e importo pari € 9.200.000,00.

Nell'ambito dell'azione b) in data 06.07.2006 è stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica all'elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e all'attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali" per un importo pari a € 1.400.000,00.

Per il completamento della programmazione e attuazione della misura è previsto quanto segue:

- finanziamento di uno studio di fattibilità per la progettazione di un centro per l'autonomia e la vita indipendente (domotica). Importo programmato pari a € 60.000,00.
- pubblicazione di un bando multimisura (5.2 e 4.13) per la concessione di contributi finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità e in condizioni di non autosufficienza (domotica). Importo programmato a valere sulla misura pari a € 2.440.000,00;
- selezione, promozione e divulgazione delle migliori azioni proposte nei PLUS. Importo programmato pari a € 300.000,00;
- pubblicazione del bando per la promozione della cooperazione sociale di tipo B. Importo programmato pari a € 2.501.884,00;
- pubblicazione del bando per il finanziamento delle attività previste nei Patti per il sociale. Importo programmato pari a € 2.000.000,00;
- estensione dell'assistenza tecnica già aggiudicata sul bando "Affidamento del servizio di assistenza tecnica alla elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e l'attivazione e gestione di osservatori provinciali delle politiche sociali". Importo pari a € 119.129,00.

Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE

44.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione, in ambito regionale, di una qualificata e adeguata rete di operatori esperti di tecniche e metodologie della formazione nel settore socio-sanitario. Inoltre, la misura è diretta a favorire, l'acquisizione/miglioramento di competenze ed abilità da parte degli operatori socio-sanitari al fine di meglio rispondere ai bisogni dell'utenza.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	25.234.318,27	104,90%	13.188.927,99	54,83%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	13.188.927,99	54,83%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto alla precedente rilevazione annuale, l'incremento più importante si rileva nella capacità di allocare risorse. Infatti gli impegni superano il 100% della spesa ammissibile, attestandosi intorno al 104,90%. I pagamenti, hanno un discreto incremento, passando dal 49,37% della dotazione finanziaria al 54,83% con un aumento di 5 punti percentuali.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	8.675	3.684
durata media dei progetti (concl.)	giorni	365	258
durata (monteore)	ore	2.255.600	1.075.220
costo	euro	22.556.000,00	9.270.718,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	100	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	300	
durata (monteore)	ore	60.000	
costo	euro	1.500.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione risulta valorizzata la batteria di indicatori della tipologia di progetto "Persone, formazione per occupati (o formazione continua)", i quali evidenziano che i destinatari dei progetti coinvolti sono 3.684 a fronte degli 8.675 previsti, la durata è di poco inferiore al valore previsionale e che, il valore relativo all'indicatore "costo" copre circa il 41% del *target* previsto.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura, presenta una *performance* molto positiva con impegni che superano il costo programmato e pagamenti che si attestano intorno ad una percentuale superiore alla metà delle risorse disponibili.

Tale *performance* trova in parte corrispondenza nell'attuazione fisica con la valorizzazione di una delle due batterie di indicatori previste, che si attesta a circa la metà dei valori attesi. Dal punto di vista procedurale è da evidenziare che i due iter avviati nel precedente anno (*Programma Master and Back e Bando Carlo Urbani*) hanno consentito l'intera programmazione della dotazione della misura ma non hanno ancora contribuito all'avanzamento finanziario.

Asse VI– Reti e nodi di servizio

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	406.484.000,00	203.242.000,00	203.242.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	430.540.000,00	215.270.000,00	215.270.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	406.484.000,00	401.114.838,05	98,68%	293.240.157,07	72,14%
FSE	24.056.000,00	25.355.193,56	105,40%	24.056.000,00	100,00%
Totale	430.540.000,00	426.470.031,61	99,05%	317.296.157,07	73,70%

Pagamenti certificati al 31.12.2006

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	406.484.000,00	285.457.998,21	70,23%
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00%
Totale	430.540.000,00	309.513.998,21	71,89%

La strategia dell'Asse si sviluppa intorno all'esigenza di assicurare i collegamenti materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo dell'Isola e la valorizzazione dei fattori di competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le modalità economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti. Anche per l'anni in corso, nell'ambito del FESR, per il settore dei Trasporti, l'attuazione delle misure è stata orientata soprattutto al proseguimento delle attività già in atto che interessano la rete infrastrutturale di base. Si prosegue infatti negli interventi già avviati per il completamento del Corridoio plurimodale Sardegna-Continente, concentrando l'attenzione sulla semplificazione delle fasi procedurali.

L'avanzamento del FSE presenta una situazione invariata rispetto al precedente rapporto in quanto si è raggiunto il 100% della spesa ammissibile, già alla fine del 2005.

Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata nelle azioni "Viabilità" e "Intermodalità", è finalizzata al ridimensionamento del deficit infrastrutturale dell'intera regione attraverso interventi rivolti al completamento della maglia viaria fondamentale e al riequilibrio modale ferro-gomma.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
201.572.566,00	100.786.283,00	100.786.283,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 167.055.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	234.300.213,41	116,24%	191.364.027,12	94,94%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	185.554.250,44	92,05%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

Informazioni richieste	Progetti		
	SS 125 Capo Boi – San Priamo 1° lotto	SS 125 Capo Boi – San Priamo 3° lotto, 2° stralcio	SS 125 Tertenia – Tortoli 2° lotto, 2° stralcio
Costo totale del Progetto* (a)	22.081.211,89	26.596.935,54	12.970.880,84
Costo totale finale, comprensivo di riserve	23.940.456,73	26.596.935,54	12.970.880,84
Impegni al 31.12.1999	22.081.211,89	26.596.935,54	12.970.880,84
Spesa certificata al 31.12.2001 (b)	15.563.672,54	13.997.018,61	8.372.279,22
Spesa da effettuare sul POR Sardegna**	7.776.200,07	12.200.726,71	4.086.860,91
Impegni al 31.12.2006 al netto dell'IVA	7.776.200,07	12.200.726,71	4.086.860,91
Pagamenti al 31.12.2006 (c)	5.783.898,47	12.006.468,51	2.788.460,48
Stato di avanzamento	Operativo dal dicembre 2003, da ultimare nel 2008	Operativo dal 30.11.2002, da ultimare nel 2008	Operativo dal 12.07.2002 da ultimare nel 2008
Operatività	SI	SI	SI
Percentuale di esecuzione***	97,68%	97,77%	86,04%
Eventuali sospensioni lavori	-	-	-
Eventuale variazioni dei costi****	-	-	-

* Si intende il costo totale ammesso a valere sul POP 1994-99

** Si intende il costo totale ammesso a valere sul POR 2000-2006

*** Si intende il rapporto (b+c)/a

**** Si fa riferimento a variazioni rispetto ai costi dichiarati nelle schede presentate alla Commissione

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Anche per il 2006 la misura presenta un *overbooking* in termini di impegni che aumenta rispetto allo scorso anno. Cresce la quota dei pagamenti che ora è pari € 191.364.027,12 (94,94% della spesa ammissibile).

La *performance* della misura risulta, nell'insieme, nettamente superiore a quella media registrata a livello di FESR.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti multimodali			
Trasporti multimodali			
Connessione multimodale			
Superficie infrastrutturata	mq	93.785	
Strade nazionali			
Strade nazionali			
Rete viaria nazionale			
Lunghezza rete	km	18,56	
Interventi	n.	5	
Rete stradale tipo ex III CNR	km	18,56	
Messa in sicurezza (barriere)	km	100	
Strade regionali/locali			
Strade regionali/locali			
Rete viaria regionale/locale			
Lunghezza rete	km	20	5,81
Interventi	n.	3	1
Rete stradale tipo ex IV CNR	km	20	5,81

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori della misura risulta invariata rispetto al 2005 che, in considerazione della portata degli interventi, si modificheranno presumibilmente a chiusura del programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2006 la misura è stata totalmente programmata e dispone di un *overbooking* del 116,24%.

Le certificazioni sono relative ai progetti finanziati con la linea di azione a) *Completamento della maglia viaria fondamentale*.

L'avvio dell'unico intervento dell'azione b), peraltro inserito nei PIT, è subordinato all'individuazione di una soluzione tecnica che dovrà essere istruita dall'Assessorato ai Trasporti, in merito alla localizzazione del Centro intermodale su due poli: Macomer e Borore.

Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede il finanziamento della generalità delle azioni rivolte allo sviluppo e alla innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
98.251.434,00	49.125.717,00	49.125.717,00		

*

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	58.183.840,34	59,22%	42.959.895,71	43,72%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	41.612.641,93	42,35%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese per l'acquisto dei mezzi mobili decorre dal 15.07.2003, data della seduta del Comitato di Sorveglianza che ha approvato la modifica della scheda di misura.

L'ammissibilità delle altre spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Già nel 2005 gli indicatori finanziari della Misura avevano registrato un significativo incremento rispetto all'anno precedente seppure ancora sottodimensionato rispetto alle reali potenzialità. In particolare per il progetto "integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari", presentato dal CTM si registra un discreto incremento sia in termini di impegno che di pagamento; per l'operazione al 2006 gli impegni ammontano a € 3.977.385,00 corrispondenti al 40,28% del costo programmato raddoppiati rispetto al 20,1% del 2005. Per i pagamenti si rileva un tasso di realizzazione non elevato ma triplicato rispetto allo scorso anno e pari a 9,74%.

Un avanzamento significativo interessa l'operazioni PIT per la quale si è giunti quasi a completamento con un valore impegnato pari al 81,18% del costo totale e un tasso di realizzazione pari all'80,58%.

In generale nell'annualità di riferimento del presente documento gli impegni coprono con € 58.183.840,34 il 59,22% della spesa ammissibile e con € 42.959.895,71 di pagamento si raggiunge un tasso di realizzazione pari a 43,72% doppio rispetto al 24,94% dello scorso anno. Si incrementano anche le certificazioni che, con un importo di € 41.612.641,93 rappresentano circa il 42,35% del costo programmato per 12 punti percentuali in crescita dal 2005.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti urbani			
Trasporti urbani			
Mezzi e attrezzature di superficie			
Interventi	n.	6	-
Popolazione utente di riferimento	n.	400.000	-
Lunghezza (rete metropolitana)	Km	10	-
Superficie (parcheggi)	Mq	12.000	-
Parcheggi di scambio (posti auto)	n.	800	-
Mezzi di superficie	n.	10	-
Capacità mezzi (posti)	n.	2.800	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi. In particolare, nell'ambito della tipologia di progetto "trasporti urbani", sottotipologia "mezzi e attrezzature di superficie", il *target* dell'indicatore "lunghezza (rete metropolitana)" è stato ridotto da 26 a 10; è stato modificato inoltre i *target* a fine programma dell'indicatore locale "mezzi di superficie" che passa da 19 a 10 e l'indicatore "capacità mezzi(posti)" che passa da 3.800 a 2.800. Nell'ambito dell'attuazione nessun indicatore, al 2006, risulta ancora valorizzato. La complessità di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nella misura non ne ha consentito l'ultimazione entro il 31.12.2006.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Come già evidenziato nella sezione di commento agli indicatori di realizzazione fisica, nessuna opera è stata portata a compimento nel corso del 2006 tuttavia risultano avviati 4 dei 5 progetti finanziati dalla misura che riguardano prevalentemente gli interventi sulle metropolitane di Cagliari e Sassari e altri interventi di sviluppo tecnologico per il controllo della mobilità.

Misura 6.3 – Società dell'informazione - FESR

4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo prioritario della misura è quello di sostenere e diffondere la Società dell'Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
94.660.000,00	47.330.000,00	47.330.000,00		

.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	107.614.784,30	113,69%	58.343.434,24	61,63%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	57.718.305,84	60,97%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta al 2006 un'ottima *performance* dal lato degli impegni che, con una quota pari a € 107.614.784,30, coprono ormai il 113,69% della spesa ammissibile. Altrettanto significativi risultano pagamenti e certificazioni che coprono circa il 60% del costo ammesso della misura.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture di base			
Infrastrutture di base della società dell'informazione			
Infrastrutture per la società dell'informazione			
Nodi di rete	n.	150	128
Enti collegati	n.	400	58
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni			
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA			
Sistemi informativi			
Interventi	n.	400	18
Sistemi di comunicazione e controllo			
Interventi	n.	400	2

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Servizi telematici			
Interventi	n.	400	2
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA			
Informazione e comunicazione nella PA			
Nodi di rete	n.	150	-
Enti collegati	n.	400	-
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Banche dati	n.	50	102
Postazioni/terminali installati	n.	200	616
Soggetti attuatori	n.	100	364
Sportelli attivati	n.	60	156
Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati	n.	180	124
Posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi	n.	600	582
Servizi mediatecari e aggiuntivi a disposizione degli utenti	n.	100	212
Fondi documentali digitalizzati	n.	5	19
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	50	-
Imprese interessate	n.	20	-
Postazioni/terminali installati	n.	3.000	-
Soggetti attuatori	n.	40	-
Sportelli attivati	n.	200	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi.

Nell'ambito della tipologia di progetto "infrastrutture di base della società dell'informazione" sottotipologia "infrastrutture per la società dell'informazione", il *target* dell'indicatore "enti collegati" è stato ridotto da 2.500 a 400. Nell'ambito dell'attuazione delle operazioni della misura, per la stessa sottotipologia, si segnala un incremento nella valorizzazione dell'indicatore "nodi di rete" che passa dal valore 26 a 128 pari all'85% del *target* programmato a fine programma. L'indicatore "enti collegati" incrementa di 6 unità il valore registrato al 2005.

Un modesto avanzamento riguarda la sottotipologia "sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA" mentre risulta significativa la valorizzazione degli indicatori relativi alla tipologia "servizi telematici", sottotipologia "servizi e applicazioni per il pubblico". Per 6 degli 8 indicatori associati si supera il *target* programmato a fine programma mentre per gli indicatori locali "Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati" e "Posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi" il tasso di raggiungimento del *target* risulta al 2006 rispettivamente del 69% e 97%. Riguardo alle categorie UE "servizi e applicazioni per le PMI" e "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA" si confermano i dati dello scorso anno, poiché le azioni delle relative linee di intervento del Complemento di Programmazione al 31.12.2006 non risultano avviate.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2006 la spesa ha registrato un incremento significativo poiché la Regione nell'ultimo anno, oltre alla prosecuzione nell'attuazione dei progetti coerenti, ha dato notevole impulso alle tematiche relative alla Società dell'Informazione. Rispetto a ciascuna linea d'azione, in particolare, è stato perfezionato il complesso iter di alcuni processi di attuazione in particolare:

- per la linea d'azione a) *Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale*, risultano in attuazione 6 interventi, di cui 4 avviati e 3 conclusi, che hanno consentito pagamenti per € 13.892.555,65.
In riferimento alla manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di iniziativa degli enti locali funzionali alla realizzazione della rete telematica dell'amministrazione regionale tramite i quali vengono finanziati investimenti per la realizzazione delle infrastrutture e l'acquisizione di forniture e servizi, al 2006, per i 4 interventi ammessi a rendicontazione, il dato di impegno passa da € 7.715.523,07 € 9.611.597,23 corrispondente al 90,3% del costo totale con un tasso di realizzazione del 66,69% rispetto al 42,61% registrato al 2005.

Si segnala un significativo avanzamento nell'attuazione finanziaria per l'intervento "rete telematica regionale - infrastrutture e servizi per la connettività", avviato il 30.01.2006 e rendicontato per un importo pari a € 11.750.000,00 per il quale si registra a fine anno un valore di impegno corrispondente al 99,6% del costo totale e un tasso di realizzazione del 49,8%; in merito agli interventi nell'ambito della Società dell'Informazione con D.G.R. n. 54/12 del 22.11.2005 è stato approvato il Piano d'Azione per il superamento del digital-divide nelle aree svantaggiate della Sardegna. In riferimento alle soluzioni identificate nell'ambito del Piano d'Azione si prevede l'attivazione di un intervento per un importo pari a € 7.967.630,80.
- la linea d'azione b) *Interventi per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività e cooperazione regionale* non è stata programmata, ritenendo che le finalità possano essere attuate dalla linea a), pertanto si prevede che nessun intervento venga attivato sulla linea.
- per la linea d'azione c) *"Interventi per la diffusione della banda larga"*, nel corso del 2006 si è registrato un avanzamento nella rendicontazione dell'intervento "connettività regionale" connesso all'APQ Società dell'informazione". Per esso si registra un valore di impegno pari a € 5.999.251,04 ed un valore di pagamento pari a € 4.642.532,52 corrispondenti rispettivamente al 99% e 77% del costo programmato;
- per la linea d'azione d) *Interventi per la realizzazione dell'E-Government* proseguono gli interventi dei progetti Next, E-Gos. Nel corso del 2006 è stato ridefinito il costo dell'operazione E-Gos che passa da € 7.223.262,87 a € 5.717.929,04. Il progetto, al 2006, risulta concluso. Per l'operazione Next si registra un dato di impegno che rispetto al costo dell'operazione passa dal 61,68% al 66,44% e una variazione dei pagamenti dal 9,39% al 12,57%.

In riferimento all'Accordo di Programma Quadro "Società dell'Informazione", firmato in data 28.04.2004, quale strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 21 aprile 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna avente come oggetto programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità offerte dall'uso delle tecnologie ICT si rendicontano attualmente 10 operazioni. Nello specifico:

- Intervento "Centro Servizi Regionali" - Il CSR costituisce la struttura preposta alla progettazione, coordinamento, gestione di tutti gli interventi nel campo della Società

dell'Informazione. Al 2006 si registrano pagamenti pari al 32,94% del costo totale programmato pari a € 1.197.681,34.

- CAPSDA (Centro di Accesso Pubblico a Servizi Digitali Avanzati) prevede la creazione di centri pubblici di accesso presso 90 biblioteche comunali. Per l'operazione, entro il 2006, si sono raggiunti livelli di impegno e pagamento pari rispettivamente a € 1.142.527,62 e € 396.270,42. corrispondenti al 66% e al 2,95% del costo totale.
- SAX (Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale) prevede contributi a organizzazioni *no-profit* per la creazione di centri di accesso assistiti in situazioni di particolare degrado sociale.
- In riferimento agli interventi relativi al Sistema Integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale (SICPAC) approvato il 16.09.2005 per € 4.275.000,00 si registrano al 2006 impegni per € 3.332.212,12 e pagamenti per € 843.648,39 pari rispettivamente all'77,95% e al 19,73% del costo programmato.
- L'intervento CST (Centri di Servizio Territoriali) ha come obiettivo quello di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-government, attraverso la formazione di Centri di Servizio Territoriali. Le risorse finanziarie, finalizzate alla copertura dei costi di progettazione, realizzazione e avviamento all'esercizio, ammontano a € 2.520.000,00. Al 2006 sono stati rendicontati impegni per il 85,09% e pagamenti per l'8,49% del costo totale.
- In riferimento ai "Progetti di Sanità Elettronica" sono stati individuati 2 interventi: un progetto di "Telemedicina Specializzata" che renderà possibile l'interazione delle strutture oncologiche sarde con i centri d'eccellenza nazionali ed internazionali, riducendo così il gap che deriva dall'insularità. L'importo totale dell'operazione rendicontato è pari a € 2.000.000,00; al 2006 si registrano impegni per € 1.617.198,79 e pagamenti per € 165.590,70.
- Un progetto di "Rete dei Medici di Medicina Generale" che si pone l'obiettivo di favorire forme associative all'interno del modello organizzativo adottato a livello regionale che renda più stabile, efficace ed efficiente il rapporto medico-paziente prevedendo l'interconnessione in rete del personale medico e forme di integrazione dei sistemi informativi esistenti verso un modello omogeneo di Sistema Informativo Sanitario regionale.
- Il progetto (CAT) - Centri Territoriali per l'Aggregazione dei processi di Acquisto degli Enti Locali delle Regioni del Mezzogiorno avente come l'obiettivo di far evolvere le attuali modalità di acquisto delle Amministrazioni delle Regioni coinvolte verso modalità innovative che prevedano un consistente ricorso all'utilizzo delle tecnologie informatiche (e-procurement). L'operazione, rendicontata per un importo pari a € 1.500.000,00, al 2006 registra impegni per € 1.499.920,37 e pagamenti per € 262.772,19 equivalenti rispettivamente al 99,9% e 17,52% del costo totale.
- In riferimento al progetto "ANAGS", servizio finalizzato alla realizzazione dell'Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale, al 2006 si registrano impegni per € 2.331.153,43 e pagamenti per € 1.045.437,43.
- Per il progetto SISTAR - "Sistema per la gestione delle informazioni statistiche" per € 580.000,00 al 2006 il dato di impegno raggiunge il 100% dell'importo rendicontato mentre i pagamenti al 44,46%.
- Per il progetto "Sistemi informativi di base dell'Amministrazione Regionale", per € 9.525.000,00 gli importi programmati sono stati completamente impegnati, mentre con € 5.828.355,56 di pagamento si raggiunge il 61,19% della spesa totale prevista.

- Sull'azione si rendiconteranno gli interventi "nuove funzionalità e licenze SIBAR Regione" per € 1.100.000,00 e " estensione SIBAR Agenzie e Enti Regionali" per € 6.000.000,00.
- per l'azione e) *Interventi di creazione del sistema informativo territoriale e cartografico della Sardegna*, gli impegni corrispondono al 98,89% del costo totale degli interventi mentre i pagamenti, con € 6.895.254,91 fanno registrare un avanzamento della spesa, al 2006, del 12,33% rispetto all'annualità precedente. Sull'azione si rendiconterà l'intervento "Completamento digitalizzazione dei dati catastali" per € 6.000.000,00;
- Per l'azione f) *"Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici"*, sono in fase di attuazione interventi attivati in anni precedenti. Sull'azione, su un totale di 107 operazioni selezionate, si registrano 105 operazioni avviate e 77 concluse per un costo totale di € 15.186.327,40; gli impegni con € 14.750.470,69 e i pagamenti con € 13.844.795,35 rendicontati corrispondono rispettivamente al 97,13% e al 91,17% del costo totale delle operazioni dell'azione.
- Per l'azione g) *"Elaborazione e aggiornamento della Strategia e del Piano d'Azione per la Società dell'Informazione"* si rendiconta l'operazione relativa allo studio di fattibilità elaborato dall' Università di Pisa per la strategia S.I. per un importo complessivo di € 459.233,57; al 2006 l'operazione risulta conclusa.
- Per l'azione h) *"Interventi per favorire l'impatto delle nuove tecnologie nella cultura e nei contenuti"* si prevede la rendicontazione dell'operazione " contenuti digitali" tramite la quale si intende favorire il consolidamento delle attività tecniche e redazionali attualmente in corso per lo sviluppo di contenuti digitali nell'ambito della gestione dei portali tematici regionali dedicati alla cultura, e prevedere inoltre l'avvio di centri territoriali di cultura digitale coerenti e integrati con le attività svolte a livello centrale, da collocarsi nei punti di accesso a internet in corso di realizzazione nelle biblioteche comunali. Le risorse disponibili ammontano a € 6.000.000,00.
- Le finalità previste dalla linea di azione 6.3 i) *Interventi per lo sviluppo dell'E-learning/ICT training/Life-long learning* sono state realizzate a valere su altre misure focalizzate sulla formazione in senso lato, dunque si è deciso di non programmare la linea e si ritiene che nessun intervento sarà attuato.
- La linea di azione j) *Interventi per lo sviluppo dell'E-business* non è stata programmata in quanto considerata, stante lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi in questo settore, non più strategica per le finalità regionali, pertanto si ritiene che nessun intervento sarà attuato su questa linea.
- Per l'azione k) *"Interventi per lo sviluppo dell'E-health "* si rendiconterà l'intervento "polo sanità" per un importo pari a € 2.490.000,00.
- Sull'azione l) *"Interventi per la realizzazione del sistema informativo agricolo della Sardegna"* verrà rendicontata la realizzazione del Sistema Informativo dell'Agricoltura, finalizzato a rendere più veloce e snello il rapporto fra gli utenti e la Regione. Nello stesso ambito sarà avviata l'Anagrafe delle Aziende Agricole allo scopo di semplificare l'accesso agli aiuti destinati. L'importo programmato ammonta a € 5.000.000,00.

Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione delle

condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	25.355.193,57	105,40%	24.056.000,00	100,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura, come evidenziato nel precedente rapporto, ha raggiunto il 100% della spesa ammissibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	24.056	28.702
durata	giorni	365	340
durata (monteore)	ore	1.124.112	1.245.523
costo	euro	24.056.000,00	24.056.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel presente rapporto viene confermata l'ottima prestazione fisica della misura, avendo la stessa già raggiunto il risultato atteso a fine programma nelle precedenti annualità.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione procedurale della misura è ascrivibile esclusivamente alla realizzazione della linea relativa alla formazione specifica sull'ICT che ha consentito al volgere del 2005 l'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria nonché il raggiungimento dei *target* di realizzazione fisica. Pertanto nel presente rapporto si confermano i dati presenti nella scorsa rilevazione.

Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura promuove condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio regionale e all'interno dei sistemi socio economici, attraverso l'attuazione di interventi tesi a realizzare la diffusione e la divulgazione della cultura della legalità e il miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	1.016.000,00	8,47%	572.800,00	4,77%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	572.800,00	4,77%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 15.12.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

In considerazione del fatto che l'inserimento della misura nel Complemento di Programmazione è avvenuto soltanto a fine 2004, l'avanzamento finanziario ha fatto registrare un incremento significativo nel corso del 2006: gli impegni risultano pari a € 1.016.000,00 e hanno consentito pagamenti dei beneficiari finali per € 572.800,00.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	60	
Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
Imprese beneficiarie	n.	15	
Attività culturali			
Imprese beneficiarie	n.	25	
Tempo libero			
Imprese beneficiarie	n.	15	
Investimenti immateriali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	30	
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Strutture attività socio-assistenziali			
Altre strutture			
Interventi	n.	20	
Utenti base	n.	8.000	
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
Interventi	n.	4	
Informazioni al pubblico			
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	400	
Interventi	n.	32	
Popolazione di riferimento	n.	500.000	
Manifestazioni/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	150	
Interventi	n.	5	
Popolazione di riferimento	n.	150.000	
Audiovisivi/materiali			
Altri settori			
Popolazione di riferimento	n.	1.500.000	
Prodotti informativi e pubblicitari	n.	3	
Siti/reti informative			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	50	
Interventi	n.	12	
Popolazione di riferimento	n.	70.000	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel corso del 2006 non è stato ultimato alcun intervento. Tale risultato è attribuibile al fatto che la Misura è stata inserita nel programma soltanto nel 2005.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per l'azione a) nel 2005 è stata sottoscritta la Convenzione con il Dipartimento di Economia, Istruzione e Società dell'Università di Sassari allo scopo di avviare le attività connesse al Piano Regionale d'Azione per la tutela dell'integrità e della legalità nelle differenti fasi della realizzazione degli interventi del POR. Nel Piano sono comprese le iniziative di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti degli enti locali sui temi della legalità e dei reati contro la Pubblica Amministrazione e iniziative per costituire una rete organica di rapporti istituzionali con i soggetti centrali o territoriali deputati alla sicurezza attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa. Per l'operazione, nel corso del 2006, si è raggiunto il 100% degli impegni programmati e i pagamenti con € 172.800,00 si attestano all'80% del costo totale dell'intervento.

Per l'azione b) si procede con la rendicontazione del Progetto SO.LE (Società e Legalità) finalizzato a prevenire reati e frodi nell'ambito della spendita delle risorse del POR 2000-2006, prevede una serie di attività a favore dei dipendenti degli Enti Locali, delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri), Corpo di Vigilanza Ambientale, Compagnie Barracellari, alcuni rappresentanti degli Enti Locali (Comuni, Province, Comunità Montane). Al 2006 i pagamenti effettuati ammontano a € 400.000,00 pari al 50% delle risorse totali rendicontate per l'intervento.

La misura prevede inoltre una capillare attività di sensibilizzazione e animazione nei confronti di enti locali di amministrazioni periferiche dello Stato, delle associazioni imprenditoriali, delle rappresentanze dei lavoratori e delle associazioni di cittadini sui temi della legalità. Tale attività di sensibilizzazione è stata avviata attraverso il progetto SO.LE. – Società e legalità.

E' altresì in programma, nell'ambito della progettazione integrata, l'avvio di Progetti Pilota che si articoleranno su alcuni temi rilevanti quali:

- il riordino degli usi civici sulla base di criteri di individuazione decisi con gli enti locali;
- la riqualificazione e valorizzazione dell'esperienza di polizia locale;
- la rimozione di alcuni fattori criminogeni all'interno delle famiglie e delle comunità locali quali alcolismo, dispersione scolastica, bullismo, ecc.

Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata in due sottomisure “Assistenza tecnica” e “Azioni di supporto dell'attività del Comitato di Sorveglianza”, è di supporto all'Amministrazione Regionale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore efficienza ed efficacia del Programma.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
23.450.000,00	11.725.000,00	11.725.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	16.323.042,65	69,61%	13.127.824,38	55,98%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2006

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	11.259.165,56	48,01%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto allo scorso anno lo stato di attuazione finanziaria della misura al 31.12.2006 fa registrare un significativo incremento. Per la misura si registrano impegni per € 16.323.042,65 (nel 2005 € 10.470.305,52) e pagamenti per € 13.0127.824,38 (nel 2005 € 7.901.374,78) con una capacità d'impegno e una capacità di spesa valutati rispetto al costo pubblico pari rispettivamente al 69,71% e al 55,98%.

Considerata la necessità di supportare i Servizi responsabili in relazione alle attività connesse alla programmazione, progettazione, gestione e controllo delle operazioni nell'ambito dell'attuazione delle misure, nel corso del 2006 l'AdG del POR Sardegna ha provveduto a

pubblicare un bando di gara relativo al Servizio di Assistenza tecnica specialistica agli Enti Locali della Sardegna, Beneficiari finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006 nell'ambito delle seguenti misure: Misura 1.3 – Difesa del Suolo - parte Lavori Pubblici; Misura 2.1 – Archeologia, Percorsi Religiosi e Museali, Recupero dei Centri Storici in stato di abbandono a fini Culturali e Turistici; Misura 2.3 - Strutture e Servizi per Attività Culturali e di Spettacolo; Misura 4.5 – Potenziare e Qualificare l'Industria Turistica della Sardegna; Misura 4.14 - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali; Misura 5.1 - Politiche per le Aree Urbane.

Nel corso dell'anno inoltre si è proceduto alla rendicontazione sulla misura delle operazioni legate al programma *Master and Back* il cui obiettivo è il finanziamento di percorsi di alta formazione o tirocini/stage presso organismi di riconosciuto prestigio internazionale per giovani laureati residenti in Sardegna da almeno 3 anni.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Preparazione, realizzazione, sorveglianza			
Strumenti per l'attuazione dei Programmi Operativi			
Monitoraggio			
Contratti	n.	3	3
Assistenza tecnica			
Contratti		50	72
Giornate uomo	n.	8.500	3.786
Workstations installate		16	-
Pubblicità			
Contratti	n.	4	4
Controllo			
Contratti	n.	7	11
Giornate uomo	n.	1.200	260
Valutazione			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Contratti	n.	3	2
Giornate uomo	n.	2.510	-
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Innovazione e trasferimento tecnologico			
Interventi	n.	2	1
Informazione al pubblico			
Audiovisivi/materiali			
Altri settori			
Interventi	n.	15	13
Imprese interessate	n.	402.000	606.000
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Interventi	n.	10	9
Imprese interessate	n.	231.000	920.000

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi.

Nell'ambito della tipologia di progetto "strumenti per l'attuazione dei programmi operativi" il *target* dell'indicatore "contratti" relativo sottotipologia di progetto "monitoraggio" è stato incrementato da 2 a 3; relativamente alle realizzazioni effettive si conferma il dato dello scorso anno. Il *target* dell'indicatore "contratti" relativo alla sottotipologia di progetto "assistenza tecnica" è stato ridefinito passando dal valore 24 a 50; relativamente alle realizzazioni effettive

si rileva un sensibile incremento dell'indicatore che passa dal valore 11 al 2005 al valore 72 al 2006. Il *target* dell'indicatore "contratti" relativo alla sottotipologia di progetto "pubblicità" è stato ridotto al valore 4 da 64. Il *target* dell'indicatore "contratti" relativo alla sottotipologia di progetto "controllo" è stato ridotto al valore 7 da 11; relativamente alle realizzazioni effettive si rileva un sensibile incremento dell'indicatore che passa dal valore 1 al 2005 al valore 11 al 2006.

Nell'ambito della tipologia di progetto "valutazione dei programmi operativi" il *target* dell'indicatore "contratti" relativo sottotipologia di progetto "valutazione dei programmi operativi" è stato incrementato da 2 a 3. relativamente alle realizzazioni effettive si conferma il dato dello scorso anno.

Nell'ambito della tipologia di progetto "studi e ricerche di settore" il *target* dell'indicatore "interventi" relativo sottotipologia di progetto "innovazione e trasferimento tecnologico" è stato ridotto al valore 2 da 10; relativamente alle realizzazioni effettive si rileva la valorizzazione, al 2006, dell'indicatore per un valore pari a 1.

Nell'ambito della tipologia di progetto "audiovisivi/materiali" il *target* dell'indicatore "interventi" relativo sottotipologia di progetto "altri settori" è stato incrementato da 8 a 15; relativamente alle realizzazioni effettive si rileva l'incremento dell'indicatore che passa dal valore 8 al 2005 al valore 13 al 2006.

Nell'ambito della tipologia di progetto "altri settori" il *target* dell'indicatore "interventi" relativo sottotipologia di progetto "diffusione attività/eventi" è stato ridotto al valore 10 da 15; relativamente alle realizzazioni effettive si rileva l'incremento dell'indicatore che passa dal valore 4 al 2005 al valore 9 al 2006.

Con riferimento ai valori registrati nel 2005 e tenuto conto della riformulazione dei *target* di fine periodo, la misura mostra globalmente un sensibile avanzamento nell'attuazione fisica.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura, nel corso del 2006, ha registrato un forte avanzamento sia in fase di programmazione che di individuazione delle operazioni. In tal senso si registrano 138 operazioni avviate e 104 operazioni concluse.

5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI

La prima esperienza di progettazione integrata in Sardegna, avviata nell'Estate del 2001 con l'emanazione del primo Bando regionale, si è conclusa nel secondo semestre del 2004 al perfezionarsi della cosiddetta fase di "ottimizzazione" dei 13 P.I.T. approvati. I risultati sinora conseguiti hanno evidenziato la difficoltà del territorio nel recepire gli indirizzi e gli orientamenti della programmazione ed a predisporre una progettualità di livello qualitativo adeguato. Allo stesso tempo, una governance non consolidata non ha favorito l'efficiente gestione delle procedure.

La nuova fase della progettazione integrata, avviata nel corso del 2005 ed il cui percorso è in fase di svolgimento, ridisegna in parte lo scenario strategico dei P.I.T ponendo l'attenzione verso l'attivazione di meccanismi finanziari a sostegno del settore imprenditoriale per l'avvio di iniziative sinergiche all'ampia infrastrutturazione del territorio sinora prevista - e solo in parte realizzata - attraverso i P.I.T. L'approvazione dello strumento dei Pacchetti Integrati di Agevolazione (deliberazione della Giunta regionale 49/22 del 28/11/2006) è il primo significativo passo in questa direzione.

Il Bando 2001 e fase di ottimizzazione

La prima esperienza di progettazione integrata in Sardegna, avviata nell'estate del 2001 con l'emanazione del primo Bando regionale, si è conclusa all'inizio del 2005, con risultati non del tutto soddisfacenti, al perfezionarsi della cosiddetta fase di "ottimizzazione". Le difficoltà del territorio nel recepire gli indirizzi e gli orientamenti della programmazione e a predisporre una progettualità di livello qualitativo adeguato, ha fatto sì che delle 30 proposte presentate, soltanto 13 siano state valutate positivamente dalla Regione.

I P.I.T. finanziano attualmente 455 progetti di natura infrastrutturale - materiali e, pur in minima parte, immateriali - per un ammontare di risorse pubbliche pari ad oltre 440 milioni di euro. Attraverso i P.I.T. sono state finanziate inoltre poco più di cento iniziative imprenditoriali comportanti l'attivazione di regimi di aiuto, concentrate su risorse FEOGA ed in misura minore su misure che prevedono incentivi all'artigianato ed alla piccola industria.

Benché le risorse che finanziano i P.I.T. - Bando 2001- siano distribuite su 23 misure, il solo fondo FESR contribuisce per ben il 90% del totale, in particolare attraverso le Misure 5.1 - *Politiche per le aree urbane*, la linea c "Itinerari turistici integrati" della Misura 4.5 - *Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna* e la Misura 2.1 (ex 2.1 e 2.2) - *Archeologia, percorsi religiosi e museali*, per un totale di 250 operazioni, pari ad oltre il 50% del totale delle operazioni P.I.T.. Il restante 10% delle risorse è ripartito tra fondo FEOGA, all'interno del quale la sola Misura 4.20 - *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali* finanzia 121 operazioni e, in misura di poco superiore al 1% del totale, dal Fondo Sociale Europeo. Nessuna operazione è stata finanziata attraverso lo SFOP.

Le operazioni presentate sulle Misure FEOGA 4.14 e 4.16 (ora riunite nella Misura 4.14) non hanno avuto avvio a causa della loro mancata attivazione per il periodo 2000-2003.

Sotto il profilo dell'avanzamento della spesa, i dati del sistema di monitoraggio Monitweb al 31/12/2006 evidenziano un'accelerazione considerevole rispetto al periodo precedente: gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari finali ammontano a 186,28 Meuro, pari a circa il 47% del costo pubblico totale, mentre la quota relativa ai pagamenti sale a 95,663 Meuro (contro i 37,84 Meuro al 31/10/2005), pari al 24,12% del totale.

Il dettaglio dell'avanzamento finanziario alla data del 31/12/2006 è riportato nella tabella seguente.

MISURA	Operazioni PIT attive	Costo ammesso (quota POR + cof. beneficiario finale)	Impegni		Pagamenti	
			valore assoluto	% su costo ammesso	valore assoluto	% su costo ammesso
1.3 a	8	11.123.044,57	408.815,16	3,68	91.755,30	0,82
1.4	5	6.163.600,84	2.542.724,72	41,25	1.283.851,27	20,83
1.5	12	23.040.457,53	2.269.826,21	9,85	743.828,52	3,23
2.1	49	52.454.928,30	22.792.010,02	43,45	8.776.980,60	16,73
2.2	5	22.060.270,42	10.908.709,18	49,45	9.548.307,00	43,28
2.3	9	26.303.447,79	3.735.083,07	14,20	2.580.132,16	9,81
3.10	2	643.677,57	308.513,11	47,93	241.774,58	37,56
3.12 a	5	3.883.267,33	2.161.532,69	55,66	362.596,89	9,34
3.16 (ex 4.6)	2	4.689.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18 (ex 6.4)	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1	57.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1	362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	4	1.002.278,00	637.200,00	63,58	611.424,16	61,00
4.1 G *	29	3.641.535,96	3.361.111,65	92,30	2.866.394,57	78,71
4.14**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20	121	32.799.701,92	19.329.465,69	58,93	14.231.608,44	43,39
4.5	71	68.853.175,21	31.474.347,64	45,71	13.290.651,42	19,30
5.1	114	130.710.664,80	82.222.119,74	62,90	37.051.138,11	28,35
5.2	3	1.844.433,60	1.612.546,30	87,43	1.484.641,43	80,49
6.1	1	2.840.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	1	3.100.000,00	2.516.559,81	81,18	2.498.050,79	80,58
6.3	12	938.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	456	396.538.025,79	186.280.564,99	46,98	95.663.135,24	24,12

* di cui n.23 operazioni finanziate con fondi CIPE - FAS (costo totale ammesso € 44.973.975,08)

** Misure non attivate nel periodo di programmazione 2000-2003

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale si osserva che sommando le percentuali riferite ai lavori avviati ed a quelli conclusi, rispettivamente il 33,19% ed il 25,05%, si oltrepassa la metà del totale delle operazioni. In valore assoluto, le migliori performance di avanzamento sono rappresentate dalla Misura 5.1 - *Politiche per le aree urbane* con 47 operazioni concluse sulle 114 attive, la Misura 4.20 - *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali* con 30 operazioni concluse su 121 complessive, e la linea c) della Misura 4.5 "Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna" con 20 operazioni concluse sulle 71 attive. I valori percentuali premiano altre misure, ma a determinare queste situazioni è il ridotto numero delle operazioni finanziate. Resta ancora elevato il numero delle operazioni per le quali non si è ancora dato avvio ai lavori (circa un terzo del totale), situazione sulla quale influiscono le procedure amministrative di definizione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari. Al riguardo, va segnalato che la nuova disciplina in materia di edificabilità introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale di recente approvazione interessa diverse operazioni inserite negli accordi di programma P.I.T., determinando ritardi ed incertezze sulla realizzazione di alcune opere di particolare interesse locale e, in alcuni casi, per importi elevati.

La situazione di dettaglio sullo stato di avanzamento è illustrata nella tabella che segue.

FONDO	MISURA	TOTALE	DI CUI REVOCATE O INATTUABILI	DI CUI NON DELEGATE	IN PROGETTAZIONE O ISTRUTTORIA AMM.VA		PROCEDURE D'APPALTO ESPLETATE		LAVORI AVVIATI		LAVORI CONCLUSI	
					n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
FESR	1.3 a	8	0	0	7	87,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00
FESR	1.4	6	1	0	0	0,00	1	16,67	2	33,33	2	33,33
FESR	1.5	12	0	0	5	41,67	2	16,67	5	41,67	0	0,00
FESR	2.1	49	0	2	22	44,90	8	16,33	17	34,69	2	4,08
FESR	2.2	5	0	1	1	20,00	0	0,00	3	60,00	1	20,00
FESR	2.3	9	0	1	2	22,22	3	33,33	3	33,33	1	11,11
FSE	3.2	1	0	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FSE	3.4	1	0	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FSE	3.6	4	0	3	3	75,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00
FSE	3.10	2	0	0	0	0,00	0	0,00	1	50,00	1	50,00
FESR	3.12 a	5	0	2	1	20,00	0	0,00	2	40,00	2	40,00
FSE	3.16 (ex 4.6)	2	0	2	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FSE	3.18 (ex 6.4)	1	0	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FESR	4.1 G *	29	1	17	16	55,17	5	0,00	2	6,90	5	17,24
FESR	4.5	73	2	4	12	16,44	5	6,85	34	46,58	20	27,40
FEOGA	4.14	3	3	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FEOGA	4.16	4	4	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FEOGA	4.20	121	0	0	36	29,75	22	18,18	33	27,27	30	24,79
FESR	5.1	115	1	6	6	5,22	13	11,30	48	41,74	47	40,87
FESR	5.2	3	0	0	0	0,00	1	33,33	0	0,00	2	66,67
FESR	6.1	1	0	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FESR	6.2	1	0	0	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
FESR	6.3	13	1	1	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale		468	13	50	129	27,56	61	13,03	151	32,26	114	24,36

La "nuova" progettazione integrata

Il POR Sardegna 2000-2006 approvato a seguito della revisione di metà periodo, recependo integralmente gli indirizzi del QCS 2000/2006 in materia di attuazione dei Progetti Integrati, ha apportato una modifica sostanziale al processo di attuazione dei P.I.T., fissando al 31/12/2004 il termine ultimo per le Regioni per l'approvazione e il finanziamento di ciascun progetto integrato. I contenuti della nuova progettazione integrata sono descritti nel paragrafo 1.6 del Complemento di Programmazione; come anticipato nella premessa, i risultati attesi mirano alla mobilitazione del potenziale di sviluppo non adeguatamente utilizzato, attraverso operazioni di integrazione e valorizzazione delle infrastrutture realizzate, attività finalizzata alla valorizzazione integrata ed alla messa a reddito delle risorse ai fini dello sviluppo.

Avviata attraverso la creazione di "Laboratori progettuali" a livello provinciale, la nuova strategia di programmazione è stata attuata sinora attraverso l'ascolto dei territori finalizzato a raccogliere i fabbisogni da essi espressi. I nuovi progetti che nasceranno a seguito dell'intensa attività partenariale limiteranno il ricorso a nuove operazioni infrastrutturali ai soli ambiti territoriali sinora esclusi dalla precedente fase di progettazione integrata. Come accennato, lo sforzo maggiore sarà concentrato sulla messa a reddito delle iniziative imprenditoriali sinora escluse dal processo di programmazione.

Il nuovo percorso della progettazione integrata prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti fasi:

- Fase A l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni prioritarie (territoriali e settoriali) che costituiscono il quadro logico di riferimento per la successiva attuazione dei Progetti Integrati;
- Fase B le delibere della Giunta regionale per il finanziamento delle operazioni, inserite nei Progetti Integrati di Sviluppo da attuare con risorse finanziarie diverse dal POR Sardegna 2000-2006 (Fondi per le Aree Sottoutilizzate: Delibera CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005, Fondo per la Programmazione Negoziata, Fondi Regionali di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2006);
- Fase C la presentazione, valutazione, negoziazione e approvazione dei Progetti Integrati di Sviluppo che meglio implementano gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie (territoriali e settoriali) definiti nei relativi quadri logici di riferimento di cui alla Fase A;
- Fase D la pubblicazione dei Bandi di Gara per la selezione delle operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo approvati da ammettere a finanziamento.

La conclusione della prima fase ha portato all'approvazione, da parte dei Tavoli di Partenariato Provinciali e alla presa d'atto da parte del Tavolo di Partenariato Regionale, dei Rapporti d'Area Provinciali della Progettazione Integrata; tali documenti definiscono puntualmente, per ciascun territorio provinciale, gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie (territoriali e settoriali).

I Rapporti d'Area elaborati dai Laboratori Territoriali di Progettazione attraverso un processo condiviso e strutturato, analizzano in maniera approfondita i punti di forza, le criticità, le opportunità e i rischi dei sistemi territoriali e dei settori di intervento con l'obiettivo di verificare gli indirizzi delle strategie in atto e lo stato di attuazione delle operazioni finanziate, così favorendo l'emersione dei fabbisogni di sviluppo da parte degli Attori locali.

A seguito dell'approvazione dei Rapporti d'Area, e a partire dai quadri logici territoriali e settoriali da essi desunti, è stato costruito il Quadro Unitario Regionale della Progettazione Integrata, che ha portato all'individuazione di un insieme di Progetti Integrati di Sviluppo Regionali e di un insieme di Progetti Integrati di Sviluppo Territoriali.

Il nuovo corso avviato per la progettazione integrata è stato incentrato sul coinvolgimento diretto e continuo del partenariato istituzionale ed economico e sociale nell'individuazione dei fabbisogni del territorio, nella scelta delle metodologie e degli strumenti, nell'elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo volte a soddisfarle.

Come già evidenziato, i laboratori territoriali hanno avuto il compito di coordinare e accompagnare la progettualità regionale e territoriale, l'identificazione di percorsi di sviluppo territoriale, la verifica della coerenza e della fattibilità delle operazioni proposte, il loro raccordo con la progettualità pregressa o in via di formazione. Tale lavoro, insieme al metodo di lavoro partenariale, ha contribuito ad identificare, per la definizione della programmazione 2007-2013, le azioni più rispondenti ai fabbisogni territoriali.

6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI

SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro

Nella Misura 6.1 *Corridoio plurimodale Sardegna-Continente*, Azione 1 - *Completamento della maglia viaria fondamentale* - è stato identificato quale "Grande Progetto", l'intervento "SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro", per un importo complessivo ammissibile di € 91.192.008,00, articolato in due lotti funzionali contigui, come di seguito indicato.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR
SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro	91.192.008,00	91.192.008,00
4° lotto	62.011.003,00	62.011.003,00
5° lotto	29.181.005,00	29.181.005,00

L'intervento, finalizzato alla costruzione dell'ultimo tratto dell'itinerario Cagliari-Abbasanta-Nuoro-Olbia, consente il completamento di una essenziale direttrice della maglia viaria fondamentale della Sardegna, la S.S. 131 DCN – Diramazione Centrale Nuorese, contribuendo in tal modo al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare l'accessibilità ai nodi strategici nella rete degli scambi nazionale e internazionali, e, in particolare, al porto e all'aeroporto di Olbia;
- agevolare l'intermodalità, riducendo i vincoli da congestione nei collegamenti tra i nodi strategici di Olbia e le aree interne e costiere;
- aumentare la qualità ed efficienza del servizio, in termini di riduzione dell'incidentalità e del suo costo sociale;
- contenere l'impatto ambientale, attraverso il miglior inserimento dell'opera nel paesaggio;
- ridurre le emissioni inquinanti rimuovendo le condizioni di congestione (rispetto degli accordi di Kyoto).

L'intervento concerne una tratta viaria a scorrimento veloce della lunghezza di 7,465 km, con sezione tipo III CNR, per un importo complessivo di spesa ammissibile di € 91 Meuro, che tiene conto dei ribassi d'asta intervenuti in sede di gara e della quota di IVA ammissibile solamente per i primi due anni di investimento, in quanto fino al dicembre 2002 l'IVA rientra tra i costi sostenuti dall'Ente ANAS e considerati ammissibili. Con la trasformazione in SpA l'IVA ha cessato di rappresentare un costo, in quanto successivamente recuperabile. Il totale della spesa è pertanto riferito ai dispositivi ANAS di approvazione del progetto esecutivo, comprese le perizie intervenute successivamente, e alla quota dell'IVA ammissibile attinente solamente agli anni 2001-2002.

La scheda Grandi Progetti è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna e inviata il 17 ottobre 2005 ai Servizi della Commissione. In data 28 febbraio 2006 è stato trasmesso un ultimo complemento d'informazione in merito a tale proposta e con Decisione (2005)1907 del 04.05.2006 la Commissione ha confermato il livello della partecipazione finanziaria della Comunità a € 45.596.083,14, pari al 50,00% del costo ammissibile totale del progetto.

Al 31.12.2006 lo stato dei lavori risulta il seguente:

- per il 4° lotto sono stati ultimati il 29.04.2005; restano da effettuare alcune attività accessorie;
- per il 5° lotto sono stati ultimati il 18.05.2005; restano da effettuare alcuni lavori accessori.

La tratta stradale è stata provvisoriamente aperta al pubblico il 27.05.2005.

Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario

Nella Misura 6.2 *Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani* è stato individuato come Grande Progetto l'intervento "Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica-Gottardo-Policlinico". L'azione finanziata dal POR prevede il riutilizzo dei tracciati ferroviari esistenti per collegare un'area centrale di Cagliari (Piazza Repubblica) con il suo *hinterland* (Pirri e Monserrato) e con due centri di rilevante interesse pubblico: il Policlinico e la cittadella Universitaria. Si prevede l'utilizzo delle linee ferroviarie secondarie FdS, opportunamente ammodernate, per l'esecuzione della Linea 1, lotto 1, Repubblica Gottardo e la costruzione di una nuova tratta per la Linea 3, lotto 1, Gottardo-Policlinico.

L'azione si inquadra in un più ampio progetto teso a realizzare il sistema di mobilità sostenibile entro l'intera area vasta di Cagliari, che prevede:

- l'estensione della rete all'intero hinterland;
- l'attivazione di servizi con frequenza di metropolitana sulle linee FS (Cagliari-Aeroporto-Decimo-Serramanna-San Gavino; Cagliari-Aeroporto-Decimo-Iglesias/Carbonia).

Tale progetto di *light rail* contribuisce ad attuare l'obiettivo di riequilibrio modale poiché il trasporto rapido e regolare su sede riservata renderà desiderabile utilizzare la metropolitana piuttosto che l'auto privata lungo le direttrici interessate dalla rete. Anche l'accessibilità nell'area urbana di Cagliari risulterà agevolata dal sistema di metropolitana leggera, che risponderà alla crescente domanda di mobilità nell'*hinterland*.

Nella tavola che segue è rappresentata la fonte di finanziamento per ciascun lotto dell'opera.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR	Finanziamento da risorse rinvenienti
Rete metropolitana di superficie nell'area vasta di Cagliari	57.214.893,21	41.408.580,95	19.898.589,05
Linea 1 - 1° lotto	32.902.393,21	32.902.393,21	-
Linea 3 - 1° lotto	24.312.500,00	24.312.500,00	19.898.589,05

Con Decisione (2006)5743 del 23.11.2006 la Commissione ha confermato il livello della partecipazione finanziaria della Comunità, pari al 50,00% del costo ammissibile totale del progetto.
