



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Informativa 2014 della Giunta al Consiglio Regionale predisposta ai sensi della L.R. n. 13 del 30.06.2010, art. 9 lettera f) (stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei Programmi della Regione cofinanziati dall'Unione Europea)

30 Aprile 2014



Introduzione	4
Sezione 1: Lo scenario di riferimento - lo stato di attuazione della politica di coesione	6
Sezione 2: Informativa sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione Europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale.....	12
Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013	12
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - PO FESR Sardegna 2007-2013	21
Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013	31
Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013	40
Sezione 3: Disposizioni procedurali adottate per l'attuazione dei programmi e principali criticità riscontrate	54
Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013	54
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sardegna 2007-2013	55
Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013	58
Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013	61
Sezione 4: Iniziative che si intendono adottare per ottimizzare l'attuazione dei programmi nel corso dell'anno 2014	67
Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013	67
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - PO FESR Sardegna 2007-2013	68
Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013	70
Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013	71
Appendice Statistica	73
PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza	75
PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza	80
PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza	85
PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza	90

Introduzione

L'organizzazione del ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi comunitari, avvenuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 7.6.2007, ha dato avvio alla programmazione regionale unitaria e ne ha definito il quadro organizzativo per la Regione Sardegna.

In particolare, con riferimento ai singoli Programmi Operativi, sono state individuate le seguenti Autorità di Gestione:

- il Centro Regionale di Programmazione, per il PO FESR;
- la Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il PO FSE;
- la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per il Programma di Sviluppo Rurale;
- Il Servizio Pesca e Acquacoltura, Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione per il PO FEP.

Le funzioni dell'Autorità di Certificazione per il POR FESR e per il POR FSE sono state attribuite al Servizio Autorità di Certificazione della Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, mentre le funzioni dell'Autorità di Audit della spesa comunitaria sono state ricondotte al Servizio dell'Autorità di Audit e dei supporti direzionali, presso la Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, operante presso la Presidenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 5.3.2013.

A cadenza periodica, la stessa Direzione Generale predispone relazioni e studi sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei Programmi della Regione cofinanziati dall'Unione Europea, attraverso il Servizio della Programmazione Unitaria, studi, monitoraggio e valutazione.

Il presente documento contiene la proposta di informativa della Giunta al Consiglio Regionale, predisposta ai sensi dell'art. 9, lett. F della Legge Regionale n. 13 del 30.06.2010, sulla base delle informazioni di dettaglio trasmesse dalle Autorità di Gestione dei singoli fondi nel mese di aprile 2014.

La prima sezione analizza i dati, aggiornati al 31 dicembre 2013, relativi alla spesa certificata presentata dall'Italia a Bruxelles, che misura lo stato di attuazione della politica di coesione per il complesso dei programmi operativi FSE e FESR gestiti dalle regioni italiane. I dati presentati e commentati in questa sezione, resi disponibili dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica¹, permettono di confrontare lo stato di avanzamento della spesa dei due principali programmi operativi nella Regione Sardegna, con quello delle altre regioni e con il dato nazionale.

Le successive tre sezioni della relazione inquadrano la situazione relativa alla Regione Sardegna, sulla base delle informazioni trasmesse dalle competenti Autorità di Gestione del PO FSE, PO FESR, PSR e PO FEP.

Nella seconda sezione viene descritto lo stato di avanzamento fisico e procedurale dei programmi

¹ La legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha previsto il trasferimento delle funzioni alla nuova Agenzia per la Coesione Territoriale

cofinanziati dall'Unione Europea, con tabelle esplicative che, relativamente a ciascun programma operativo, descrivono la ripartizione del fondo per origine della contribuzione e l'avanzamento temporale della spesa programmata, degli impegni e dei pagamenti caricati sul sistema di monitoraggio.

La terza sezione contiene informazioni di natura qualitativa sulle disposizioni procedurali attuate dalle Autorità di Gestione e sulle criticità riscontrate nel corso del periodo esaminato e costituisce un utile strumento per comprendere quali siano stati gli elementi che hanno rallentato l'esecuzione dei programmi in relazione alle procedure avviate.

Nella quarta parte della relazione vengono indicate le iniziative che le diverse Autorità di Gestione intendono adottare per aumentare il livello di efficienza nell'attuazione dei programmi, tenendo in considerazione le principali criticità riscontrate.

Nell'Appendice Statistica sono presentate ed opportunamente elaborate le principali informazioni quantitative sui fondi oggetto di analisi, rese disponibili dalle Autorità di Gestione competenti. Questa sezione consente di verificare l'andamento del singolo fondo attraverso una serie di indicatori che focalizzano diversi aspetti dell'avanzamento della programmazione.

Sezione 1: Lo scenario di riferimento - lo stato di attuazione della politica di coesione

I dati² aggiornati al 31.12.2013, relativi ai Programmi Operativi FSE e FESR gestiti dalle regioni italiane, evidenziano che tutti i 52 programmi hanno raggiunto il target previsto per la spesa certificata al 31.12.2013, facendo registrare un miglioramento della performance rispetto al mese di dicembre 2012³ e al dato registrato al 31 ottobre 2013.

I dati⁴ regionali relativi al PO FSE segnalano che, a fronte di un Target ministeriale di 436,9 milioni di euro⁵, il Risultato conseguito al 31.12.2013 è stato di 468,5 milioni di euro, con uno scostamento positivo tra la seconda e la prima componente di 31,6 milioni di euro.

I dati relativi alla Sardegna segnalano che per il PO FESR, a fronte di un Target di 779,6 milioni di euro, si è registrato un risultato di 784,8 milioni di euro, con un differenziale positivo di 5,2 milioni di euro.


Il *grafico 1* riporta i valori regionali dei Target e dei Risultati del PO FSE e del PO FESR, rapportati alla corrispondente Dotazione Finanziaria.

Per il PO FSE il Target al 31.12.2013 è pari al 64,7% della Dotazione, mentre il Risultato conseguito alla stessa data è pari al 69,4%, con un margine positivo di 4,7 punti percentuali.

Il Target al 31.12.2013 relativo al PO FESR è pari al 57,3% della Dotazione Finanziaria, mentre il Risultato (spesa certificata) raggiunge il 57,7%, con un differenziale positivo dello 0,4%.

Grafico 1

Target e Risultati al 31.12.2013 – PO FSE e PO FESR Sardegna - valori percentuali⁵

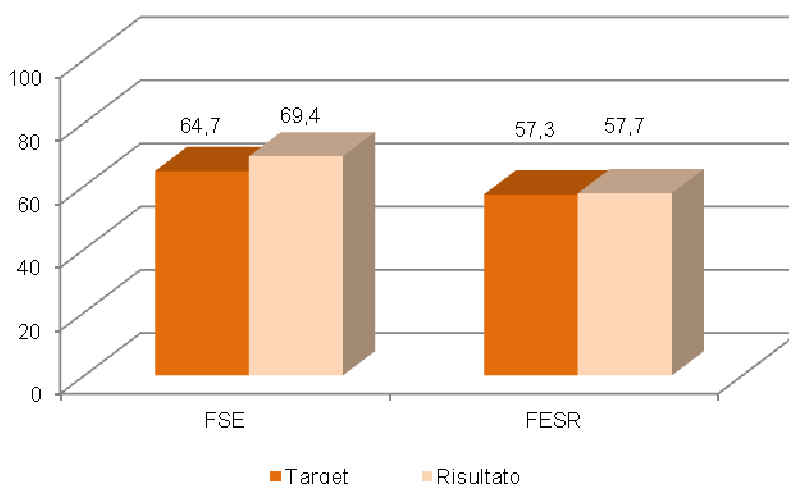

² I dati riportati nel presente paragrafo hanno come fonte il sito www.coesioneterritoriale.gov.it.


³ Nel mese di dicembre 2012 erano 51 i programmi che avevano raggiunto il target previsto.

⁴ I valori considerati per il raffronto nazionale dei dati di monitoraggio sono riferiti alla spesa totale, inclusiva del cofinanziamento nazionale.

⁵ Fonte: www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi-europei-litalia-raggiunge-il-475-della-spesa-certificata/

Nel *grafico 2* sono riportate, suddivise per regione, le differenze tra Risultati e Target per il PO FSE al 31.12.2013. I differenziali più elevati sono relativi all'Emilia Romagna (104,1 milioni di euro), al Piemonte (58,5 milioni), al Veneto (43,2 milioni), alla Provincia Autonoma di Trento (40,5 milioni) alla Toscana (36 milioni), e al Friuli Venezia Giulia (32,7 milioni). La Sardegna registra il settimo migliore risultato a livello nazionale con un differenziale di 31,6 milioni di euro. Le altre regioni sono caratterizzate da scostamenti inferiori ai venti milioni di euro.

Grafico 2
Differenza tra Risultati e Target intermedio al 31.12.2013 per regione - PO FSE - valori in milioni di euro⁶

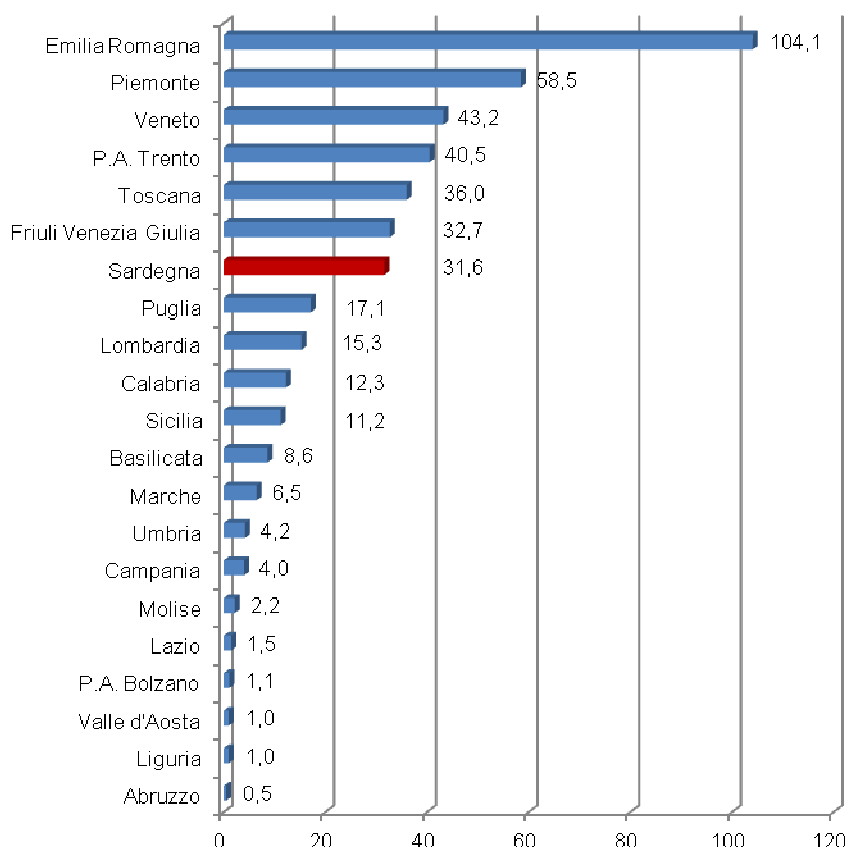


⁶ Fonte: www.coesioneterritoriale.gov.it

Il *grafico 3* mette a confronto la differenza per regione in milioni di euro, al 31.12.2013, tra Risultati conseguiti e Target, relativamente al PO FESR. Gli scarti positivi più elevati si osservano in Campania (446,5 milioni), in Sicilia (234,3 milioni di euro), Puglia (175,8 milioni di euro) e Calabria (145,9 milioni). Differenze significative ma caratterizzate da importi minori sono osservabili per Toscana (63 milioni di euro) ed Emilia Romagna (51,2 milioni).

Le restanti regioni presentano uno scostamento positivo inferiore tra Risultati e Target. La Sardegna presenta un saldo pari a 5,2 milioni di euro.

Grafico 3

Differenza tra Risultati e Target al 31.12.2013 per regione - PO FESR - valori in milioni di euro⁷

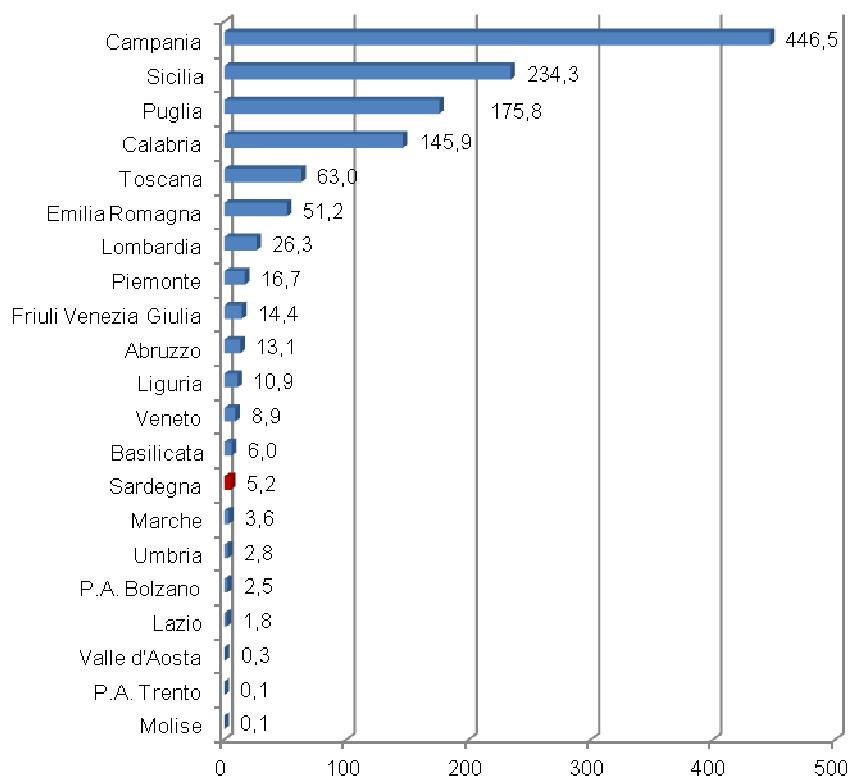


⁷ Fonte: www.coesioneterritoriale.gov.it

Nel *grafico 4* sono riportati i Target complessivi previsti per il 2014 e 2015 per il PO FSE e il PO FESR.

Grafico 4

Target PO FSE e PO FESR - Sardegna - valori percentuali⁸

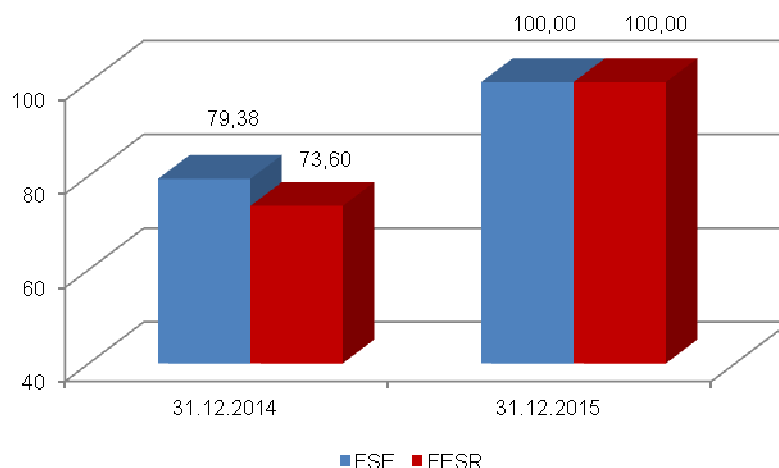

Al 31.12.2014 il Target N+2 (espresso come percentuale della Spesa da Certificare rispetto alla Dotazione Finanziaria) è pari al 79,38% per il PO FSE e al 73,6% per il PO FESR; per entrambi i programmi coinciderà con il 100% della Dotazione Finanziaria al 31.12.2015.

⁸ Fonte: Elaborazione su dati forniti dalle Autorità di Gestione.

Le *tabelle a* e *b* riportano i valori al 31.12.2013 relativi ai Target e ai Risultati conseguiti dalle singole regioni, con riferimento ai fondi FSE e FESR 2007-2013.

Tabella a

Target e Risultati al 31.12.2013 per il PO FSE 2007-2013 - valori percentuali e in mln euro⁹

Programma Operativo	Fondo	Target		Risultato		Esito
		Mln di euro	(%)	Mln di euro	(%)	
Convergenza						
Programmi Regionali						
- Basilicata	FSE	221,9	68,8	230,5	71,5	superato
- Calabria	FSE	464,4	58,0	476,7	59,6	superato
- Campania	FSE	435,5	50,2	439,5	50,6	superato
- Puglia	FSE	682,7	53,4	699,8	54,7	superato
- Sicilia	FSE	870,3	53,3	881,5	54,0	superato
Programmi nazionali						
- Governance e AS	FSE	248,3	58,0	265,1	61,9	superato
- Istruzione	FSE	862,1	58,0	973,2	65,5	superato
Competitività						
Programmi Regionali						
- Abruzzo	FSE	183,7	58,0	184,2	58,2	superato
- Emilia Romagna	FSE	475,3	56,1	579,4	68,4	superato
- Friuli Venezia Giulia	FSE	186,1	58,8	218,8	69,1	superato
- Lazio	FSE	427,0	58,5	428,5	58,7	superato
- Liguria	FSE	229,2	58,5	230,2	58,8	superato
- Lombardia	FSE	463,3	58,2	478,6	60,1	superato
- Marche	FSE	163,3	58,6	169,8	60,9	superato
- Molise	FSE	59,7	58,0	61,9	60,2	superato
- P.A. Bolzano	FSE	87,9	58,5	89,0	59,3	superato
- P.A. Trento	FSE	129,4	59,5	169,9	78,2	superato
- Piemonte	FSE	584,7	58,4	643,2	64,2	superato
- Sardegna	FSE	436,9	64,7	468,5	69,4	superato
- Toscana	FSE	385,6	58,5	421,6	63,9	superato
- Umbria	FSE	133,7	58,8	137,9	60,6	superato
- Valle d'Aosta	FSE	38,2	59,4	39,2	61,0	superato
- Veneto	FSE	415,8	58,4	459,0	64,5	superato
Programmi Nazionali						
- Azioni di Sistema	FSE	41,8	58,1	50,0	69,4	superato

⁹ Spesa totale inclusiva dei cofinanziamenti nazionali. Fonte: www.coesioneterritoriale.gov.it

Tabella b

Target e Risultati al 31.12.2013 per il PO FESR 2007-2013 - valori percentuali e in mln euro¹⁰

Programma Operativo	Fondo	Target		Risultato		Esito
		Mln di euro	(%)	Mln di euro	(%)	
Convergenza						
Programmi Regionali						
- Basilicata	FESR	439,4	58,4	445,4	59,2	superato
- Calabria	FESR	583,4	29,2	729,3	36,5	superato
- Campania	FESR	1008,1	22,0	1.454,6	31,8	superato
- Puglia	FESR	2.308,8	51,4	2.484,6	55,3	superato
- Sicilia	FESR	1.405,6	32,2	1.639,9	37,6	superato
Programmi interregionali						
- Attrattori	FESR	254,9	40,0	255,1	40,1	superato
- Energie	FESR	587,5	54,8	589,0	54,9	superato
Programmi nazionali						
- Governance e AT	FESR	131,2	58,0	132,5	58,6	superato
- Istruzione	FESR	243,1	47,6	248,2	48,6	superato
- Reti e Mobilità	FESR	512,9	28,0	679,4	37,1	superato
- Ricerca e Competitività	FESR	2.548,2	57,6	2.584,8	58,4	superato
- Sicurezza	FESR	494,4	58,0	497,9	58,4	superato
Competitività						
Programmi Regionali						
- Abruzzo	FESR	179,2	56,4	192,3	60,5	superato
- Emilia Romagna	FESR	198,8	51,9	250,0	65,2	superato
- Friuli Venezia Giulia	FESR	135,2	58,0	149,6	64,2	superato
- Lazio	FESR	431,4	58,5	433,2	58,8	superato
- Liguria	FESR	307,6	58,5	318,5	60,6	superato
- Lombardia	FESR	308,4	58,0	334,7	62,9	superato
- Marche	FESR	167,6	58,6	171,2	59,9	superato
- Molise	FESR	111,7	58,0	111,8	58,1	superato
- P.A. Bolzano	FESR	43,5	58,9	46,0	62,2	superato
- P.A. Trento	FESR	37,3	59,7	37,4	59,8	superato
- Piemonte	FESR	624,8	58,5	641,5	60,0	superato
- Sardegna	FESR	779,6	57,3	784,8	57,7	superato
- Toscana	FESR	582,1	56,9	645,1	63,1	superato
- Umbria	FESR	202,0	58,8	204,8	59,6	superato
- Valle d'Aosta	FESR	28,3	58,4	28,6	59,0	superato
- Veneto	FESR	262,6	58,6	271,5	60,5	superato

¹⁰ Spesa totale inclusiva dei cofinanziamenti nazionali. Fonte: www.coesioneterritoriale.gov.it

Sezione 2: Informativa sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione Europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale.

Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013

La proposta di revisione del POR FSE Sardegna 2007/2013, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2013)4582 del 19/07/2013, ha portato la dotazione finanziaria del programma da € 729.291.176 a € 675.053.206. Di seguito si presenta la ripartizione per Asse individuando per ciascuno di essi la quota di contributo comunitario, statale e regionale:

Tab. 1a


PO FSE - Fondo per origine della contribuzione – Riparto per Assi (Decisione C(2013) n.4582 del 19.07.2013)

Assi	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
Asse I Adattabilità	123.049.518	49.219.807	59.063.769	14.765.942
Asse II Occupabilità	174.963.009	69.985.204	83.982.244	20.995.561
Asse III Inclusione sociale	89.832.455	35.932.982	43.119.578	10.779.895
Asse IV Capitale Umano	249.564.324	121.520.855	91.587.112	36.456.357
Asse V Transnazionalità e Interregionalità	11.280.104	4.512.042	5.414.450	1.353.613
Asse VI Assistenza tecnica	26.363.796	10.545.518	12.654.622	3.163.656
Totale FSE	675.053.206	291.716.408	295.821.776	87.515.022
Composizione percentuale per origine della contribuzione*	100%	Assi al 40% tranne Asse IV al 48,69%	Assi al 48% tranne Asse IV al 36,70%	Assi al 12% tranne Asse IV al 14,61%

* la riprogrammazione complessiva del PO FSE 2007-2013, con una dotazione finanziaria che è passata da € 729.291.176 a € 675.053.206, è stata effettuata con la riduzione della quota del cofinanziamento nazionale totale, passata dal 60% al 56,79%, è la conseguente rimodulazione del tasso di cofinanziamento comunitario totale, passato dal 40% al 43,21%. Le quote di cofinanziamento nazionale e cofinanziamento comunitario sono rimaste invariate per gli assi I, II, III, V e VI, mentre per l'asse IV sono diventate rispettivamente 51,31% e 48,69%

Figura 1a

PO FSE - Composizione percentuale della Dotazione Finanziaria per origine della Contribuzione (Decisione C(2013) n.4582 del 19.07.2013) e per Asse

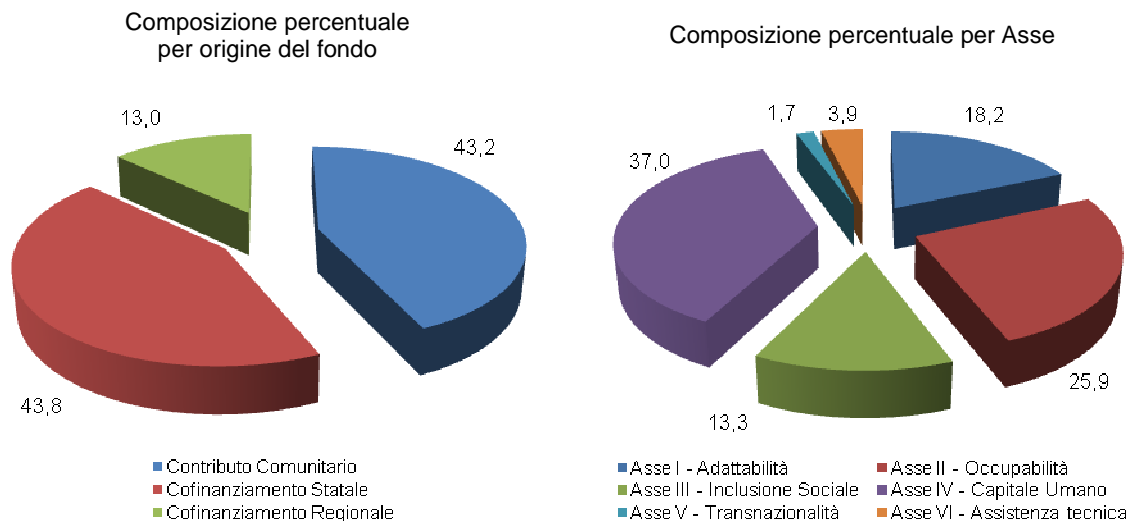

Di seguito si illustra l'andamento del Fondo al 31/12/2013 indicando distintamente e per Asse, gli importi relativi all'ammontare delle risorse Programmate, Impegnate, Pagate e Certificate:

Tab. 2a

PO FSE - Storico - Andamento del Fondo al 31.12.2013

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 31.12.2013	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 31.12.2013	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 31.12.2013	Spesa Certificata al 31.12.2013
Asse I Adattabilità	120.410.431	82.831.515	73.949.670	71.577.653
Asse II Occupabilità	170.223.454	105.767.999	97.092.952	87.533.327
Asse III Inclusione sociale	85.204.396	72.322.957	66.721.081	63.467.706
Asse IV Capitale Umano	336.866.236	316.148.442	250.417.440	235.301.263
Asse V Transnazionalità e Interregionalità	10.867.694	6.863.789	4.177.450	3.859.337
Asse VI Assistenza tecnica	19.182.028	12.218.831	6.768.024	6.717.849
Totale FSE	742.754.239	596.153.533	499.126.616	468.457.133

Le comunicazioni periodiche dei Responsabili di Linea all'Autorità di Gestione sullo stato di attuazione

finanziaria del Programma Operativo evidenziano che il Programma presenta "in realtà" un livello di spesa cumulata (da intendersi come spesa del beneficiario) pari a € 505.626.418 a fronte di un livello di impegni cumulati pari a € 660.754.239. La differenza è da attribuirsi al fatto che i Responsabili di Linea stanno procedendo ad allineare il dato reale con il caricamento sul Sistema Informativo e che a tale operazione non è stata conclusa nel mese di dicembre 2013.

La capacità di pianificazione complessiva è pari al 110% in quanto le risorse programmate includono anche i progetti "retrospettivi", che ammontano a circa 116 Milioni di euro; al netto di tali progetti, l'effettiva capacità di pianificazione del PO FSE è pari a quasi il 93%.

La velocità di spesa, data dal rapporto tra le risorse certificate e quelle impegnate, si attesta al 71%.

La spesa certificata ammonta a € 468.457.133. Il target N+2 del mese di dicembre 2013, pari a € 448.519.431, è stato pertanto raggiunto e superato di € 19.937.702.

In data 21/03/2013 è stata fatta un'extrapolazione dal Sistema Informativo, che viene riportata nella tabella che segue. Si precisa che i dati relativi alla spesa programmata e all'ultima spesa certificata risalgono al 31/12/2013, pertanto il relativo dato non sarà di seguito replicato.

Tab. 2a bis


PO FSE - Andamento del Fondo al 21.03.2014

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 21.03.2014	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 21.03.2014	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 21.03.2014
Asse I Adattabilità	-	90.002.424	76.817.647
Asse II Occupabilità	-	108.432.369	99.897.431
Asse III Inclusione sociale	-	71.170.748	66.536.312
Asse IV Capitale Umano	-	314.302.305	244.759.412
Asse V Transnazionalità e Interregionalità	-	5.828.278	4.054.104
Asse VI Assistenza tecnica	-	12.218.831	6.816.826
Totale FSE	-	601.954.956	498.881.730

Figura 2a

PO FSE - Capacità di Impegno (percentuale degli Impegni sulla Dotazione Finanziaria)

Andamento storico

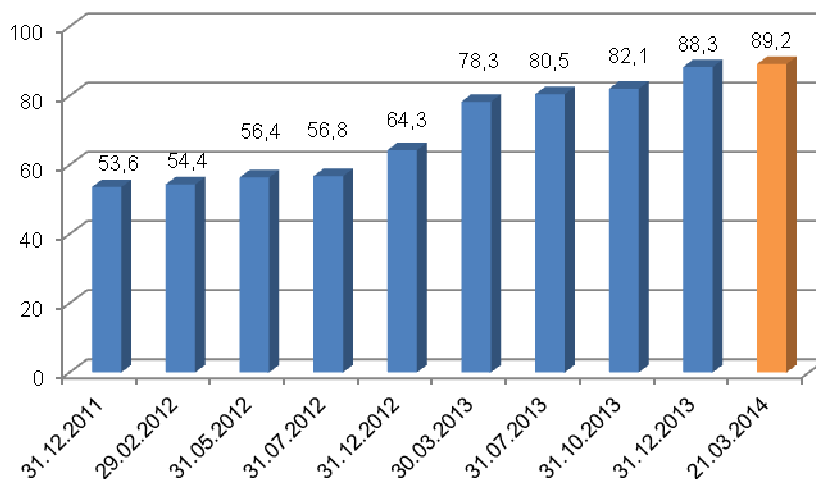

Valori al 21.03.2014 per Asse


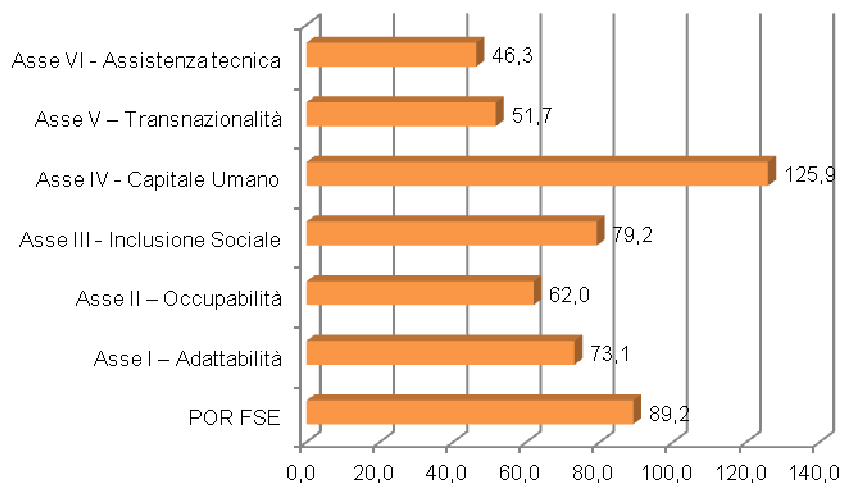


Figura 3a**PO FSE - Percentuale della Spesa Certificata sulla Dotazione Finanziaria**

Andamento storico

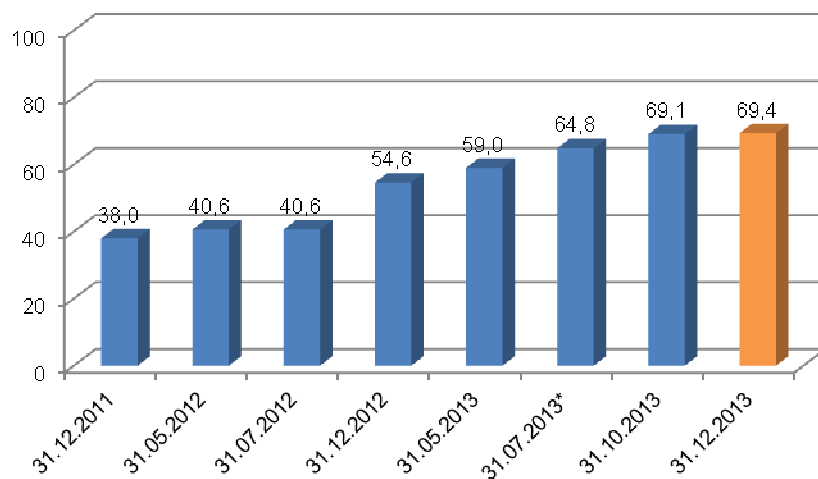

* Dotazione finanziaria rimodulata

Valori al 31.12.2013 per Asse


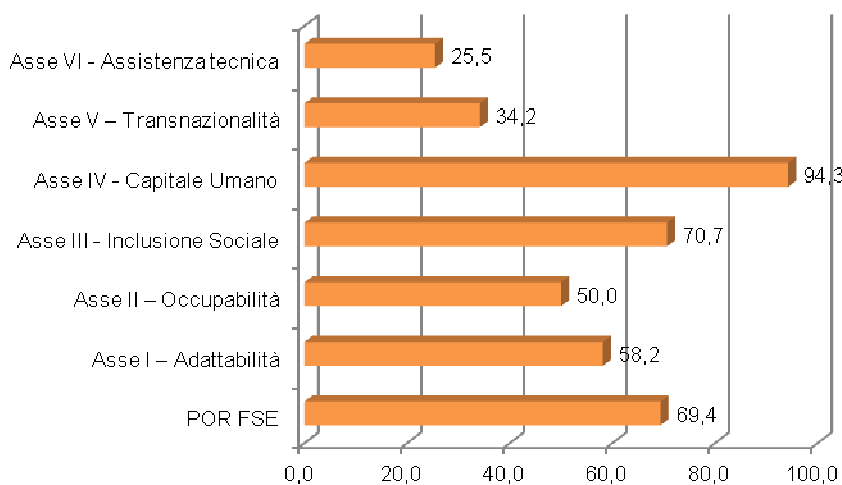


Figura 4a
PO FSE - Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Finanziaria

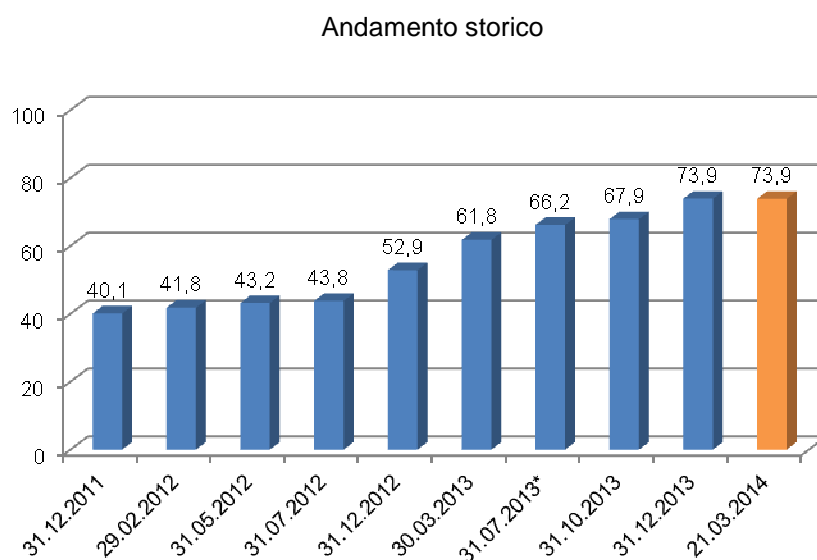

* Dotazione finanziaria rimodulata

Valori al 21.03.2014 per Asse



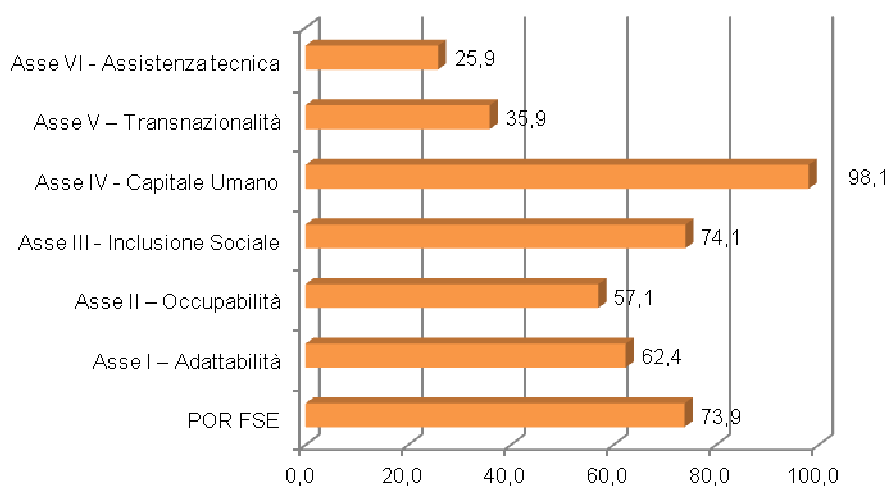


Figura 5a
PO FSE - Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni

Andamento storico

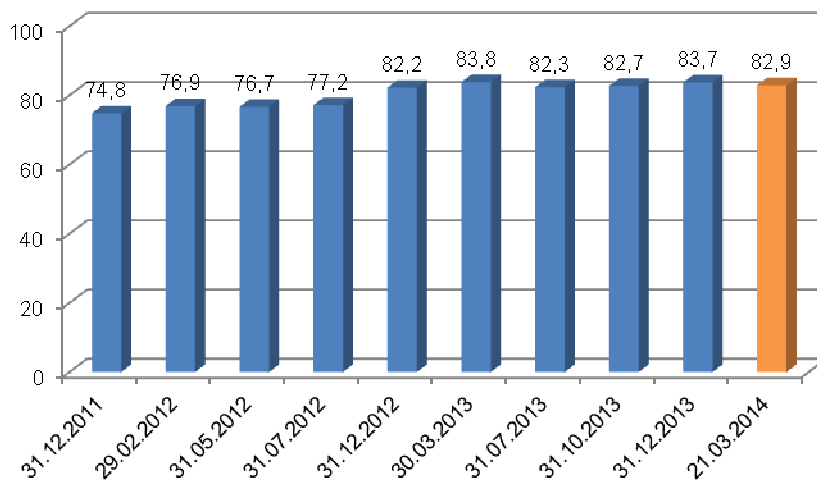

Valori al 21.03.2014 per Asse

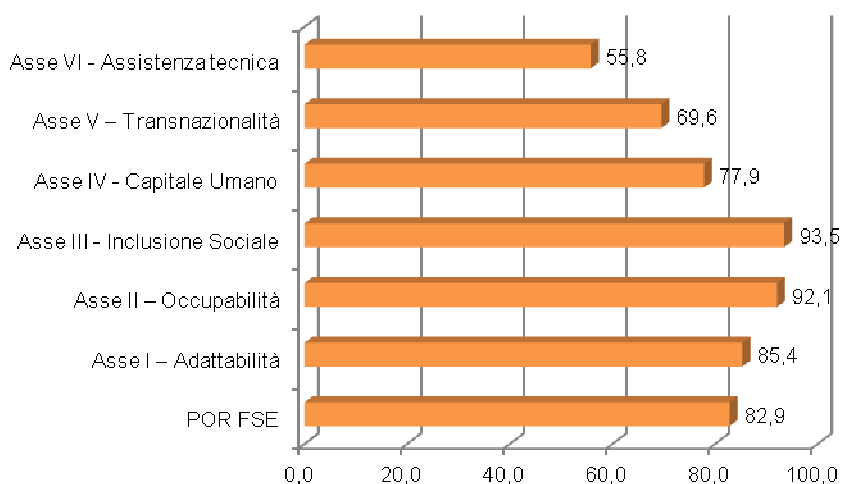

Tab. 3a

PO FSE - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)

Assi	Previsioni di Spesa al 31.05.2014	Target al 31.05.2014	Previsioni di Spesa al 31.10.2014	Target al 31.10.2014
Asse I Adattabilità	90.204.311	-	nd	-
Asse II Occupabilità	98.896.260	-	nd	-
Asse III Inclusione sociale	64.293.656	-	nd	-
Asse IV Capitale Umano	240.679.764	-	nd	-
Asse V Transnazionalità e Interregionalità	4.405.898	-	nd	-
Asse VI Assistenza tecnica	7.800.353	-	nd	-
Totale FSE	506.298.242	485.122.820	nd	498.046.062

Il target di maggio 2014 è stabilito in € 485.122.820. Dalle previsioni di spesa, trasmesse lo scorso mese di gennaio all'Autorità di Gestione dai Responsabili di Linea, emerge un possibile incremento della spesa certificabile pari a € 37.823.109, importo che, sommato alla spesa certificata al 31/12/2013 porterebbe al raggiungimento del target ed al suo netto superamento. La Domanda di Pagamento di Maggio 2014 andrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema informatico: tale modalità potrebbe comportare un rallentamento degli step della certificazione e una conseguente riduzione dell'importo certificabile; nonostante questo è assicurato il raggiungimento e superamento del target fissato dal DPS per il mese di maggio.

Nel corso del 2013 sono stati pubblicati 20 avvisi/bandi pubblici, per un importo complessivo di oltre 99 Milioni di euro e che mirano al raggiungimento di un target di oltre 4700 destinatari.

Di seguito si elencano tutti gli interventi pubblicati nel 2013:

- Progetti d'impresa per i Mestieri e l'Ambiente € 3.500.000
- Life Long Learning - Ripetizione lotto 2 € 660.805
- Avviso PISL Fase II - Avviso POIC Fase II (Gruppo A) € 31.000.000
- Avviso pubblico "Lunga Estate" contributi 2013 € 3.600.000
- Avviso formazione per disoccupati per le professioni del mare, per la sostenibilità ambientale (MACISTE) € 4.200.000
- Fondo Microcredito FSE (Avviso III) € 25.000.000
- Avviso pubblico "Lav...Ora" Progetti per l'inclusione sociale € 8.500.000
- Avviso pubblico "Romani" – Progetti per l'accesso alla formazione, all'occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna € 314.000
- Avviso diritto-dovere istruzione e formazione (ARDISCO) € 4.000.000
- Programma Master and Back Percorsi di rientro € 11.700.000
- Programma Master and Back – Procedura integrativa all'Avviso pubblico 2012 - Alta Formazione €

1.750.000

- Borse di Dottorato per gli Atenei di Cagliari e Sassari € 2.574.110
- Gara con procedura aperta per i servizi di realizzazione di una rete stabile di operatori nel territorio regionale nel settore dell'immigrazione in Regione Sardegna € 450.000
- Catalogo interregionale Alta Formazione 2013 € 767.320
- Progetto interregionale su semplificazione dei costi POR FSE - organizzazione tecnica dell'evento seminariale del 16/09/2013 € 5.200
- Progetto interregionale su semplificazione dei costi POR FSE - servizi di ristorazione € 1.600
- Selezione co.co.co. Autorità di Certificazione € 120.000
- Assistenza tecnica per l'elaborazione del nuovo POR FSE 2014/2020 € 199.000
- Piano di comunicazione del POR FSE - Fase finale (2013/2015) € 1.004.300
- Servizi di editoria e comunicazione esterna POR FSE € 21.141

Tab. 3a bis**PO FSE - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)**

Assi	Previsioni di Spesa al 31.12.2014	Target ministeriale al 31.12.2014	Target n+2 al 31.12.2014
Asse I Adattabilità	nd	-	-
Asse II Occupabilità	nd	-	-
Asse III Inclusione sociale	nd	-	-
Asse IV Capitale Umano	nd	-	-
Asse V Transnazionalità e Interregionalità	nd	-	-
Asse VI Assistenza tecnica	nd	-	-
Totale FSE	nd	553.583.881	535.864.337

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - PO FESR Sardegna 2007-2013

La riprogrammazione approvata con Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012 ha modificato la dotazione finanziaria complessiva del POR, che è passata da 1.701.679.413 euro a 1.361.343.530 euro, attraverso la riduzione della quota di Cofinanziamento Nazionale a valere sul Fondo di Rotazione ex legge 183/87 (da 1.021.007.648 a 680.671.765 euro la cui differenza rappresenta il valore del contributo al PAC) e il conseguente innalzamento del tasso medio di Cofinanziamento Comunitario (dal 40% al 50%). Nella *tabella 1b* e nella *figura 1b* viene riportato il Piano finanziario vigente del POR FESR.


Tabella 1b

PO FESR - Fondo per Origine della Contribuzione - Riparto per Assi (Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012)

Assi	Dotazione Finanziaria	Contributo comunitario	Cofinanziamento statale	Cofinanziamento regionale
Asse I Società dell'Informazione	177.737.408	88.868.704	59.549.117	29.319.586
Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	54.702.254	13.675.564	27.491.154	13.535.536
Asse III Energia	164.674.100	88.924.014	50.758.597	24.991.488
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale	273.858.391	68.464.598	137.630.217	67.763.575
Asse V Sviluppo Urbano	196.836.921	88.576.614	72.543.037	35.717.269
Asse VI Competitività	457.815.434	323.232.516	90.181.285	44.401.632
Asse VII Assistenza tecnica	35.719.021	8.929.755	17.950.944	8.838.321
Totale FESR	1.361.343.530	680.671.765	456.104.353	224.567.412
Composizione percentuale per origine della contribuzione	100,0%	50,0%	33,5%	16,5%

Figura 1b

PO FESR - Composizione percentuale della Dotazione Finanziaria per Origine della Contribuzione (Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012) e per Asse

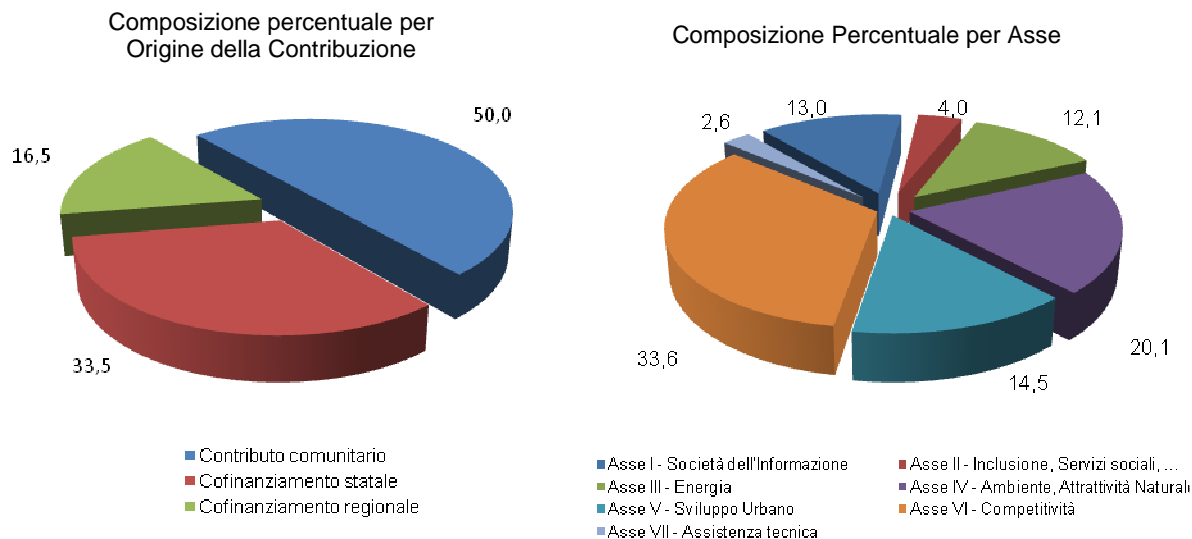

La riprogrammazione approvata con Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012 ha modificato la dotazione finanziaria complessiva del POR, che è passata da 1.701.679.413 euro a 1.361.343.530 euro, attraverso la riduzione della quota di Cofinanziamento Nazionale a valere sul Fondo di Rotazione *ex legge* 183/87 (da 1.021.007.648 a 680.671.765 euro; la differenza rappresenta il valore del contributo al PAC) e il conseguente innalzamento del tasso medio di Cofinanziamento Comunitario (dal 40% al 50%). Nella *tabella* 1 viene riportato il Piano finanziario vigente del POR FESR.

Rispetto allo stato di attuazione del POR FESR 2007-2013, le misure di accelerazione della spesa adottate hanno consentito alla Regione di conseguire, nelle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 i *target* stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e rispettare quindi il vincolo dell'n+2.

Nello specifico, la situazione al 31 dicembre 2013 in termini di avanzamento finanziario è riportata nella *tabella 2*.

Tab. 2b

PO FESR - Storico - Andamento del Fondo al 31.12.2013¹¹

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 31.12.2013	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 31.12.2013	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 31.12.2013	Spesa certificata al 31.12.2013
Asse I Società dell'Informazione	179.341.780	108.354.258	78.395.484	73.414.565
Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	68.992.776	60.184.825	47.065.470	39.131.800
Asse III Energia	179.147.471	126.845.101	85.654.540	46.882.044
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale	303.153.632	186.866.220	114.863.482	104.908.117
Asse V Sviluppo Urbano	300.306.710	214.456.178	173.140.533	148.392.738
Asse VI Competitività	447.426.291	409.362.052	359.201.449	350.928.467
Asse VII Assistenza tecnica	32.092.763	31.977.708	21.548.980	21.181.162
Totale FESR	1.510.461.423	1.138.046.344	879.869.939	784.838.892

¹¹ Successivamente alla data del 31.12.2013, i dati caricati su SMEC sono stati verificati e validati e pertanto lo stato di avanzamento alla data del 28 febbraio 2014 può far registrare scostamenti anche significativi, rispetto al dicembre 2013.

Nella *tabella 2 bis* è invece illustrato l'aggiornamento dei dati al 28 febbraio 2014, sulla base dei dati caricati sul Sistema di Monitoraggio e Controllo (SMEC).


Tab. 2b bis

PO FESR - Andamento del Fondo al 28.02.2014

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 28.02.2014	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 28.02.2014	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 28.02.2014
Asse I Società dell'Informazione	187.720.371	116.337.997	79.222.083
Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	68.992.776	60.275.479	47.436.446
Asse III Energia	179.119.497	127.234.961	86.653.144
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale Turismo	372.831.105	188.734.332	115.925.735
Asse V Sviluppo Urbano	250.267.517	215.608.395	174.764.239
Asse VI Competitività	447.996.947	413.001.858	360.711.75
Asse VII Assistenza tecnica	32.110.186	31.856.486	21.643.087
Totale FESR	1.539.038.401	1.153.049.508	886.356.487

Figura 2b
PO FESR - Capacità di Impegno (percentuale degli Impegni sulla Dotazione Finanziaria)

Andamento storico

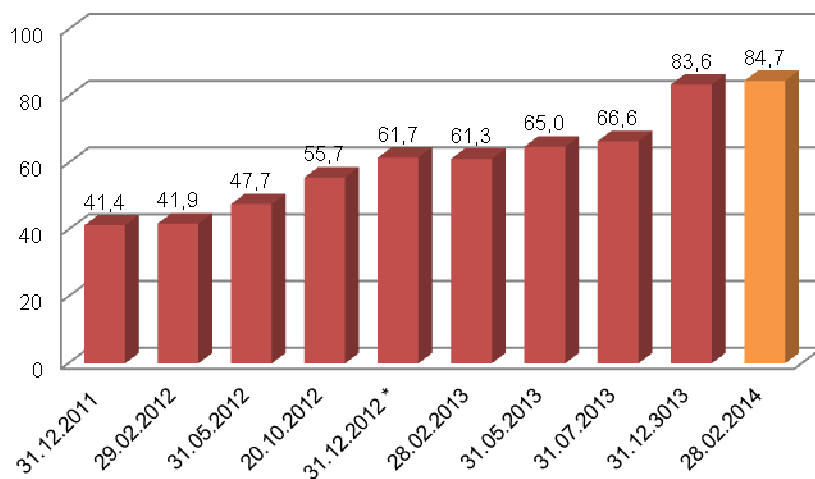

* I dati degli Impegni dal 31.12.2012 sono al netto degli importi PAC

Valori al 28.02.2014 per Asse


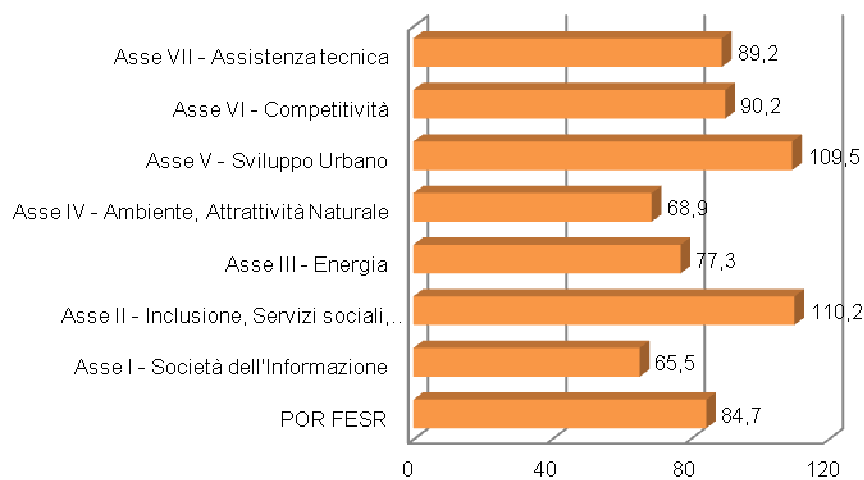


Figura 3b
PO FESR - Percentuale della Spesa Certificata sulla Dotazione Finanziaria)

Andamento storico

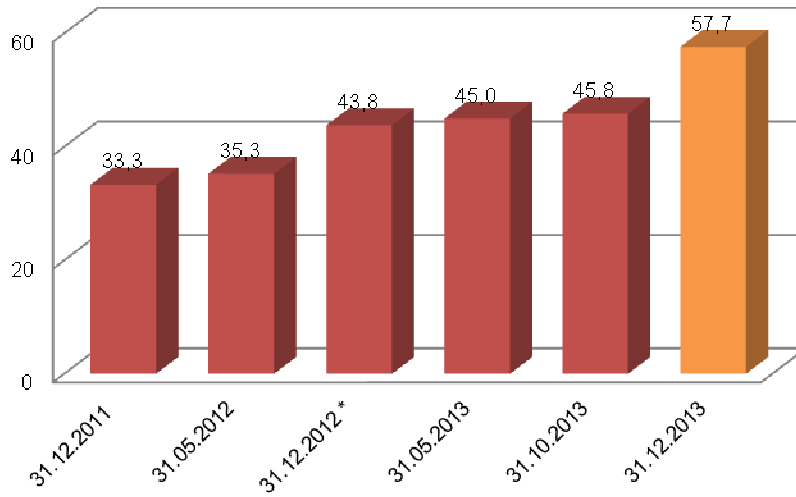

* Il dato della Spesa Certificata dal 31.12.2012 è al netto degli importi PAC

Valori al 28.02.2014 per Asse


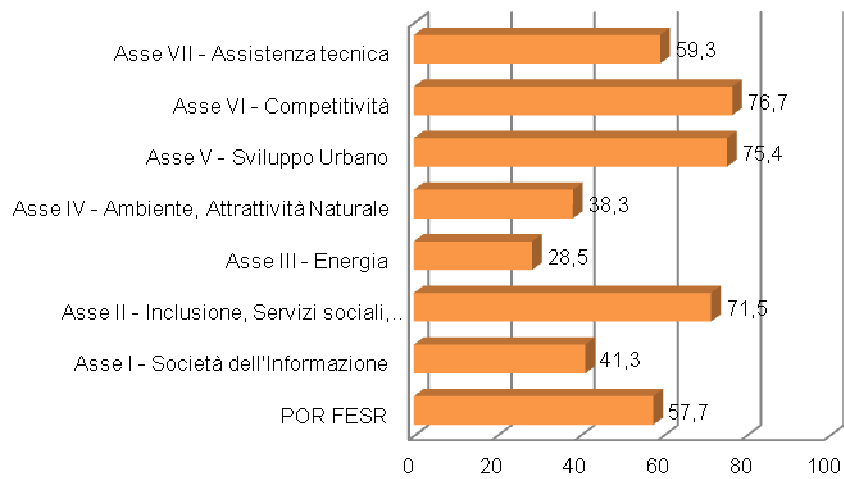


Figura 4b

PO FESR - Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Finanziaria

Andamento storico

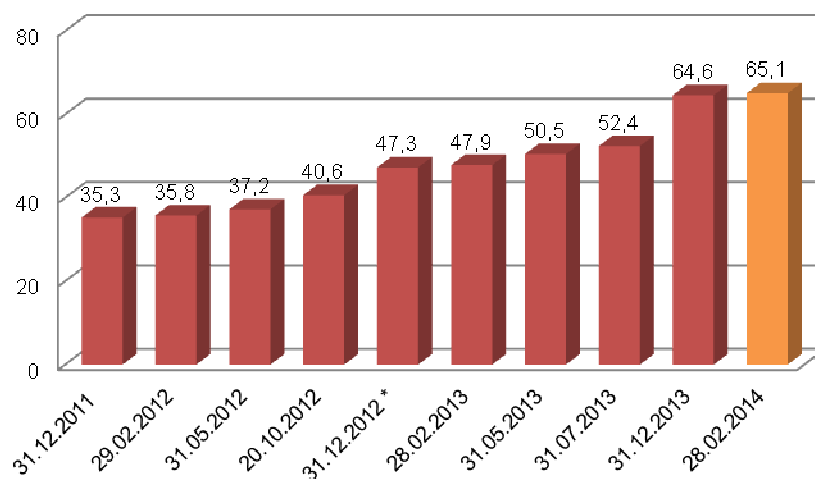

* I dati dei Pagamenti dal 31.12.2012 sono al netto degli importi PAC

Valori al 28.02.2014 per Asse


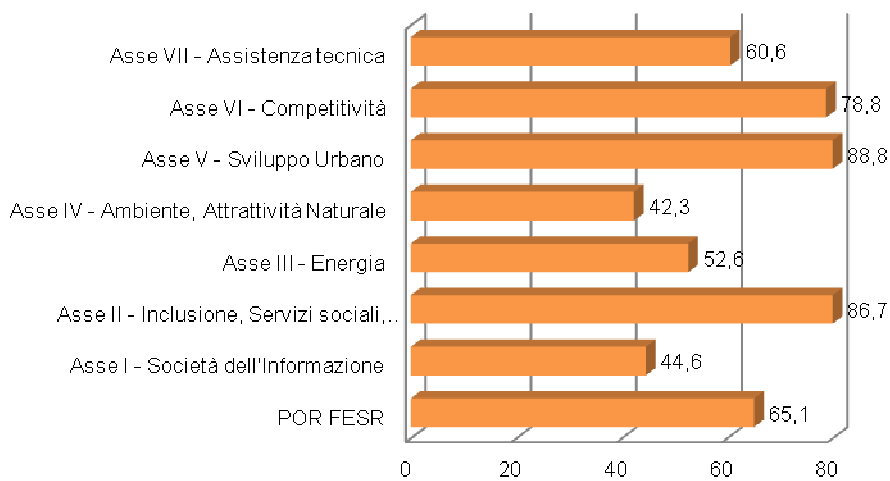



Figura 5b
PO FESR - Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni

Andamento storico

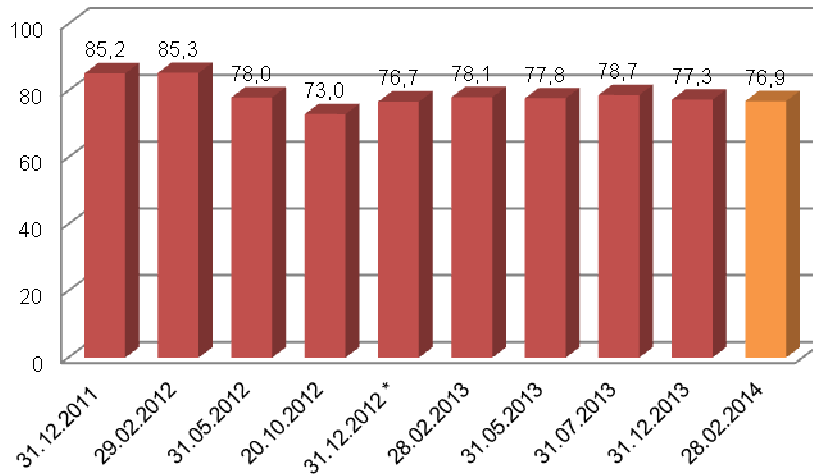

* I dati dei Pagamenti e degli Impegni dal 31.12.2012 sono al netto degli importi PAC

Valori al 28.02.2014 per Asse

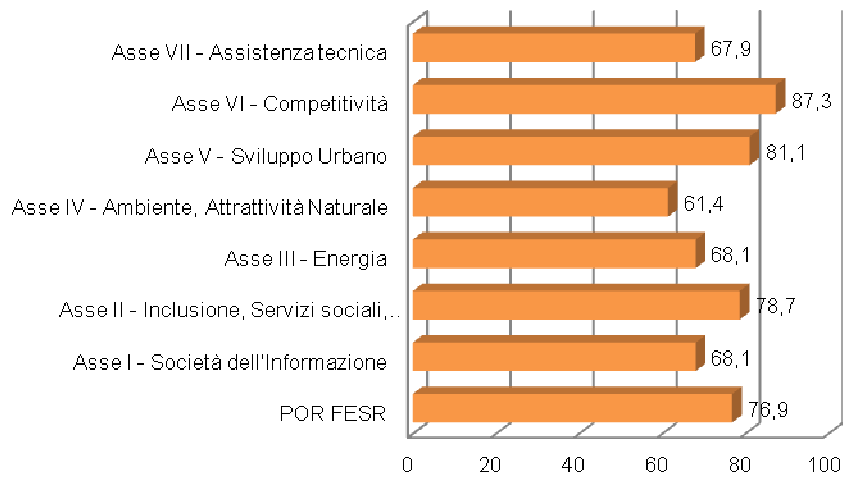

Il dato al 28.02.2014 segnala un livello di impegni di 1.153 Milioni di euro, che equivale all'84,7% della dotazione finanziaria del Fondo (tab. 1). Gli assi caratterizzati da valori più elevati sono l'Asse II – Inclusione Sociale (110,2%), l'Asse V – Sviluppo Urbano (110 %) e l'Asse VI - Competitività (90,2%).

La Spesa Certificata al 31.12.2013 ammonta al 57,6% della dotazione del Fondo (tab. 1); per quanto concerne le performance a livello di Asse prioritario, si rileva che il valore più elevato del dato di certificazione è quello relativo all'Asse VI - Competitività (76,6%).

Se si analizzano invece i valori della quota percentuale dei pagamenti dei beneficiari caricati sul Sistema di Monitoraggio, rispetto alla dotazione finanziaria (tab. 1), il dato disponibile al 28.02.2014, segnala che tale valore percentuale si attesta per il programma nel suo complesso al 65,1%. La ripartizione per Asse indica che i valori più significativi sono quelli che caratterizzano l'Asse II - Inclusione, Servizi sociale, Istruzione e Legalità (86,7%), l'Asse V – Sviluppo urbano (88,8%) e l'Asse VI - Competitività (78,7%).

Infine uno sguardo all'andamento del rapporto percentuale tra Pagamenti e Impegni caricati sul Sistema di Monitoraggio SMEC. Il dato aggiornato al 28.02.2014 segnala che a livello complessivo il rapporto ammonta 76,9%. Gli assi più rilevanti sono l'Asse VI - Competitività (87,3%) seguito dall'Asse V - Sviluppo Urbano (81,1%) e dall'Asse II - Inclusione, Servizi sociale, Istruzione e Legalità (78,7%).

Tab. 3b

PO FESR - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)

Assi	Previsioni di Spesa al 31.05.2014	Target al 31.05.2014	Previsioni di Spesa al 31.10.2014	Target al 31.10.2014
Asse I Società dell'Informazione	n.d.	122.105.167	n.d.	132.357.070
Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	n.d.	37.580.316	n.d.	40.735.545
Asse III Energia	n.d.	113.130.707	n.d.	122.629.117
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale Turismo	n.d.	188.140.049	n.d.	203.936.214
Asse V Sviluppo Urbano	n.d.	135.226.486	n.d.	146.580.050
Asse VI Competitività	n.d.	314.518.091	n.d.	340.924.907
Asse VII Assistenza tecnica	n.d.	24.538.881	n.d.	26.599.155
Totale FESR	n.d.	935.239.697	n.d.	1.013.762.058

Come si evince dalla *tabella 3*, non sono disponibili i dati al 31.05.2014 e al 31.10.2014 relativi alle Previsioni di Spesa, in quanto non presenti in SMEC.

La *tabella 3bis* evidenzia infine come le previsioni di spesa formulate al 31.12.2014 risultino lievemente

inferiori (€ 34.135.726, circa il 3,4%) al *target* da rispettare per non incorrere nel disimpegno automatico ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento CE 1083/2006 (cosiddetto meccanismo dell'n+2), nonché al *target* ministeriale di spesa definito dal MISE - DPS.

In particolare il *gap* più consistente tra previsioni e *target* si registra per gli Assi: IV - "Ambiente, Attrattività naturale, Culturale e Turismo" e III - "Energia".

Tab. 3b bis

PO FESR - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)

Assi	Previsioni di Spesa al 31.12.2014	Target ministeriale al 31.12.2014	Target n+2 al 31.12.2014
Asse I Società dell'Informazione	93.094.618	139.079.957	62.430.866
Asse II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	56.092.002	42.804.649	43.423.177
Asse III Energia	92.520.024	128.857.887	130.719.886
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale Turismo	148.472.170	214.294.862	217.391.427
Asse V Sviluppo Urbano	192.852.384	154.025.373	156.251.043
Asse VI Competitività	362.687.714	358.241.699	363.418.299
Asse VII Assistenza tecnica	22.134.163	27.950.221	28.354.103
Totale FESR	967.853.074	1.065.254.647	1.001.988.800

A fronte di tali criticità rilevate per alcuni Assi e Linee di Attività, l'Autorità di Gestione è impegnata con una sorveglianza specifica, adottata come descritto nel paragrafo successivo, attraverso incontri bilaterali, richiesta di dati di avanzamento e previsioni di spesa al fine di verificare le condizioni per una riprogrammazione finanziaria mirata al completo utilizzo delle risorse del fondo FESR.

Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013

L'Autorità di Gestione, nel corso del 2012, ha elaborato una revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (PSR) prevedendo una rimodulazione del piano finanziario e ulteriori modifiche al programma, coerenti con gli obiettivi del PSR 2007/2013. Tra queste si richiama in particolare lo storno di un ammontare pari al 4% del contributo FEASR dell'annualità 2013, da destinare ai PSR delle Regioni Emilia Romagna e Abruzzo colpite dal terremoto del 20 maggio 2012. Tale decurtazione è stata disposta in osservanza alla decisione adottata dalla Conferenza Stato Regioni il 6 giugno 2012.

La Commissione Europea, con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012, ha approvato la rimodulazione soprarichiamata. Pertanto la dotazione finanziaria del PSR, fissata inizialmente in 1.292.253.806 euro, è stata rimodulata per un ammontare pari a 1.284.746.987 euro come riportato nella *tabella 1*.

Tab. 1c

PSR - Fondo per origine della contribuzione - Riparto per Assi (Decisione C(2012) n.8541 del 26.11.2012)

Assi	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	318.764.940	140.256.574	124.955.856	53.552.510
Asse II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	769.890.909	338.752.000	431.138.909	0
Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	22.327.989	9.824.315	8.752.572	3.751.102
Asse IV Leader	162.419.318	71.464.500	63.668.373	27.286.445
Asse V Assistenza Tecnica	11.343.831	4.991.286	4.446.782	1.905.764
Totale PSR	1.284.746.987	565.288.674	632.962.492	86.495.821

A seguito degli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013, l'Autorità di Gestione ha proposto una nuova rimodulazione finanziaria delle misure del Programma al fine di introdurre la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" e altre modifiche del piano finanziario per implementare la dotazione finanziaria delle misure più performanti. L' Autorità di Gestione ha provveduto ad avviare il 3 dicembre 2013 la consultazione scritta con procedura urgenza, per l'esame e l'approvazione della rimodulazione finanziaria del Programma che si è chiusa il 10 dicembre 2013.

Nella *tabella 1 bis* il Piano finanziario del PSR Sardegna 2007/2013 a seguito della riprogrammazione

Tab. 1c bis


PSR - Fondo per origine della contribuzione - Riparto per Assi

(Rimodulazione 10.12.2013)

Assi	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	341.000.983	154.124.859	130.813.287	56.062.837
Asse II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	769.890.909	338.752.000	431.138.909	0
Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	22.327.989	12.047.214	7.196.543	3.084.233
Asse IV Leader	140.183.275	61.680.641	46.421.589	32.081.045
Asse V Assistenza Tecnica	11.343.831	4.991.286	4.446.782	1.905.764
Totale PSR	1.284.746.987	571.596.000	620.017.109	93.133.878

Figura 1c

PSR - Composizione percentuale della Dotazione Finanziaria per Origine della Contribuzione e per Asse (Rimodulazione 10.12.2013)

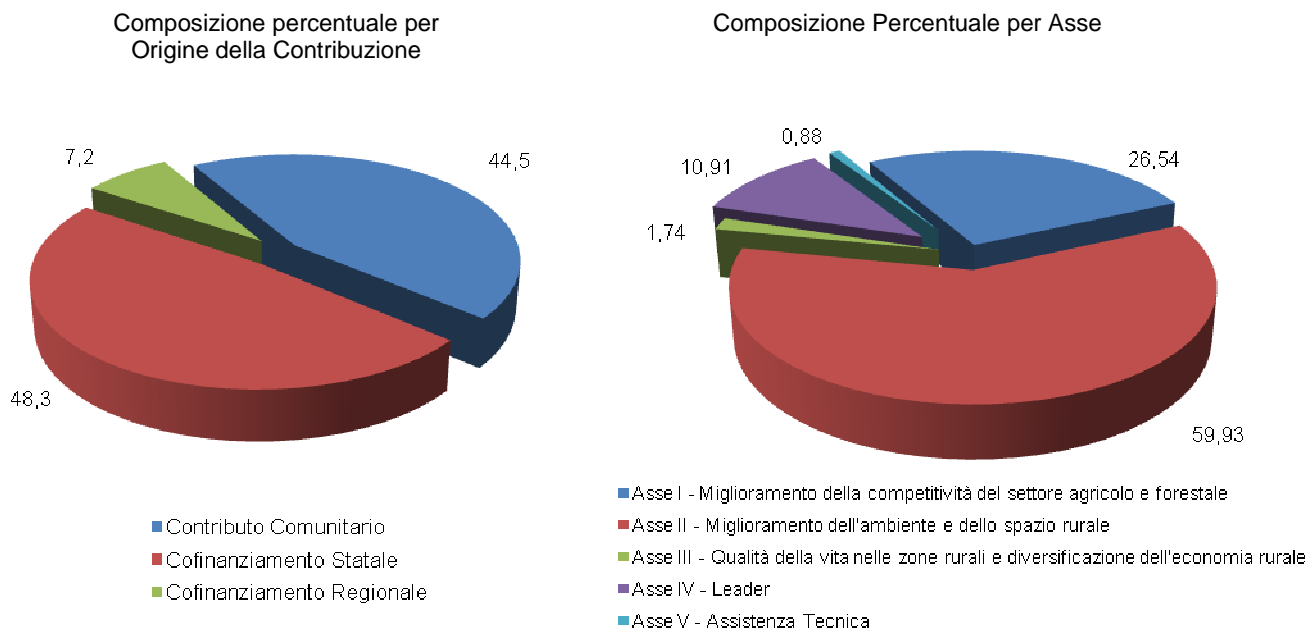

Tab. 2c
PSR - Storico - Andamento del Fondo al 31.12.2013

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 31.12.2013	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 31.12.2013	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 31.12.2013	Spesa Certificata al 31.12.2013
Asse I				
Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	330.377.866	220.237.190	133.904.462	133.861.827
Asse II				
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	769.890.909	769.815.517	674.913.363	674.722.828
Asse III				
Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	22.327.989	17.398.704	10.976.594	10.976.594
Asse IV				
Leader	140.183.275	44.645.608	11.833.198	11.833.198
Asse V				
Assistenza Tecnica	8.619.012	8.549.162	4.415.969	4.415.969
Totale PSR	1.271.399.051	1.060.646.181	836.043.586	835.810.417

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario del Programma, articolato per Assi, come risulta dalla *tabella 2 – Storico – Andamento del fondo al 31 dicembre 2013*, si evince una capacità di impegno pari al 83%, mentre i livelli di spesa si attestano a circa il 65% del totale delle risorse finanziarie del Programma, con differenti performance tra gli Assi.

Con riferimento agli impegni a valere sull' Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, tale importo, trattandosi di misure a carattere pluriennale, comprende anche la quota di impegni che saranno liquidati nelle annualità successive rispetto all'approvazione della domanda di aiuto.

Le misure dell'Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale del PSR, contribuiscono a perseguire l'obiettivo generale definito dall'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005 di "Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione". Con riferimento alle misure dell'Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, si evidenzia che nel corso del 2013, si è registrato un avanzamento della spesa pari a 43.697.856 euro, determinato principalmente dai pagamenti della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" e 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Le misure 121 e 123 avanzano con difficoltà, in quanto le imprese del comparto agricolo risentono del particolare momento di crisi economico-finanziaria che rende difficoltoso intraprendere nuovi investimenti. Le criticità che si sono presentate inizialmente sulla Misura 125 sono state in parte superate, permettendo di imprimere una forte accelerazione dei pagamenti soprattutto nel secondo semestre 2013. Per quanto riguarda le Misure 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" e 133 "Attività di informazione e promozione", in attinenza con quanto riscontrato a livello nazionale, si conferma il limitato trend di spesa evidenziato nelle annualità precedenti. Le principali cause dello scarso livello attuativo della misura sono attribuibili all'onerosità burocratica e di istruttoria delle domande a fronte di contributi esigui.

L'Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, come dettato dal Reg. (CE) n. 1698/2005, si propone di *“Valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio”*, esigenze divenute quanto mai importanti di fronte ai cambiamenti climatici e alle modifiche degli ambienti rurali, frutto dell'intervento massiccio dell'uomo attraverso attività industriali e agricole intensive. L'obiettivo principale è invertire una simile tendenza, cercando allo stesso tempo di rendere le zone rurali più competitive, in modo da consentire la permanenza della popolazione in aree che oggi non presentano alcuna attrattiva e non garantiscono la possibilità di svolgere attività lavorative redditizie.

Sull'Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - converge il livello di spesa più consistente dell'intero programma, per effetto sia dei pagamenti relativi alle misure derivanti dalla precedente programmazione, sia dai bandi della corrente programmazione. La spesa pubblica complessivamente liquidata sull' Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale al 31 dicembre 2013 ammonta a 674.913.363 euro, di cui 116.918.058 euro erogati nel corso del 2013. L'Asse I risulta essere quindi il più performante, con una capacità di spesa pari al 87,66%.


L' Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale, ha come obiettivo la *diversificazione dell'economia rurale*. La Regione Sardegna ha previsto di attuare con il metodo Leader (lotta allo spopolamento) e quindi attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL), la gran parte delle misure dell' Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale, oltre a quelle dell' Asse IV - Leader. I GAL in Sardegna sono 13, comprendono 281 comuni (74% dei comuni della Sardegna). Gli interventi si concentrano soprattutto in 229 comuni classificati C1 o D1 ovvero in “stato di malessere demografico grave, gravissimo o precario”. Per quanto riguarda la forma giuridica, i GAL sono soggetti di diritto privato con un proprio statuto e propria autonomia, cui compete la gestione di fondi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. L'avanzamento procedurale è diversificato per misura e per GAL, che dimostrano un buon livello di programmazione. L' Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale e l' Asse 4 - Leader, presentano livelli di spesa molto contenuti.

La misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” introdotta nel PSR 2007-2013 a seguito dell'alluvione del 18 - 19 novembre 2013, è stata, in parte, implementata, con risorse della misura 413, pertanto i GAL dovranno provvedere alla rimodulazione dei rispettivi piani finanziari dei Piani di sviluppo locale.

L'avanzamento finanziario delle misure dell' Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali è rappresentato dai pagamenti erogati sulla Misura 321 per la realizzazione dell'azione 5 “Infrastruttura in fibra ottica per Internet a banda larga nelle zone rurali” (attuata a regia regionale), mentre i pagamenti sulla Misura 431 riguardano gli anticipi erogati per la gestione dei GAL.

Anche nell'annualità 2013 il PSR Sardegna 2007/2013 ha raggiunto l'obiettivo dell'N+2 per evitare il disimpegno automatico, registrando un volume complessivo di spesa pubblica pari a 836.043.586 euro, di cui 372.088.721 euro in quota FEASR.

Figura 2c
PSR - Capacità di Impegno (percentuale degli Impegni sulla Dotazione Finanziaria)

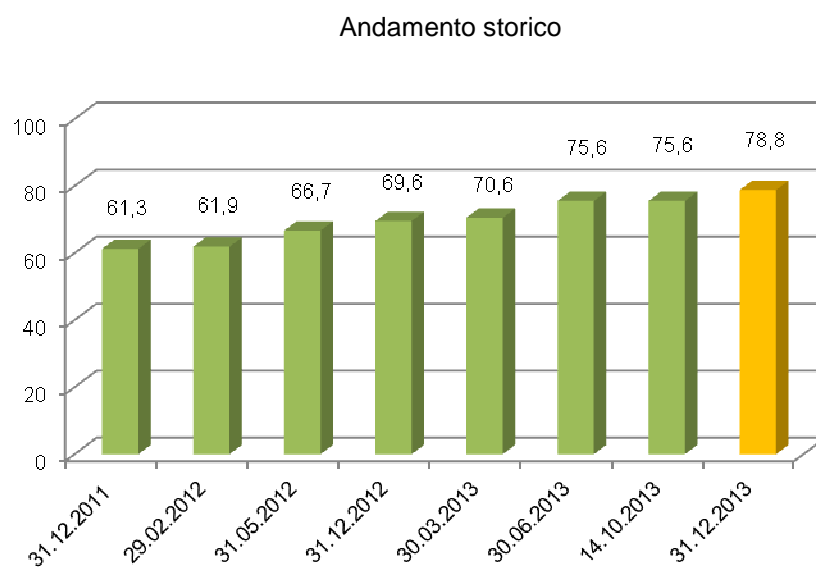

Valori al 31.12.2013 per Asse


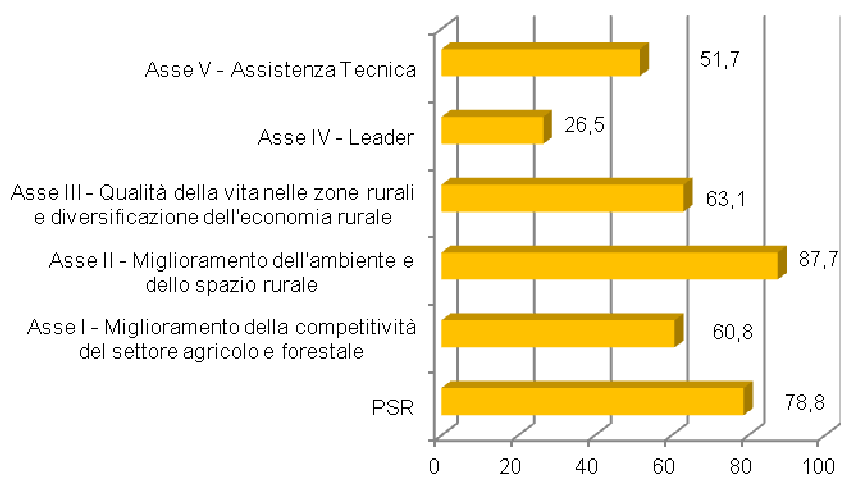


Figura 3c**PSR – Percentuale della Spesa Certificata sulla Dotazione Finanziaria**

Andamento storico

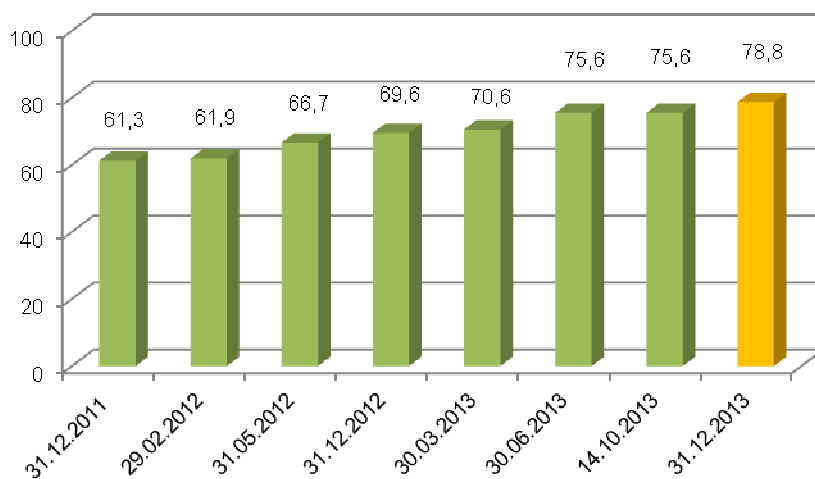

Valori al 31.12.2013 per Asse


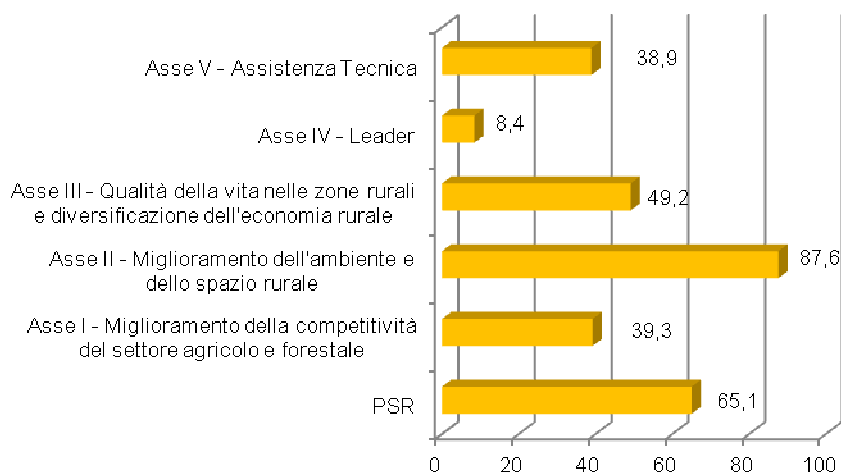


Figura 4c
PSR - Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Finanziaria

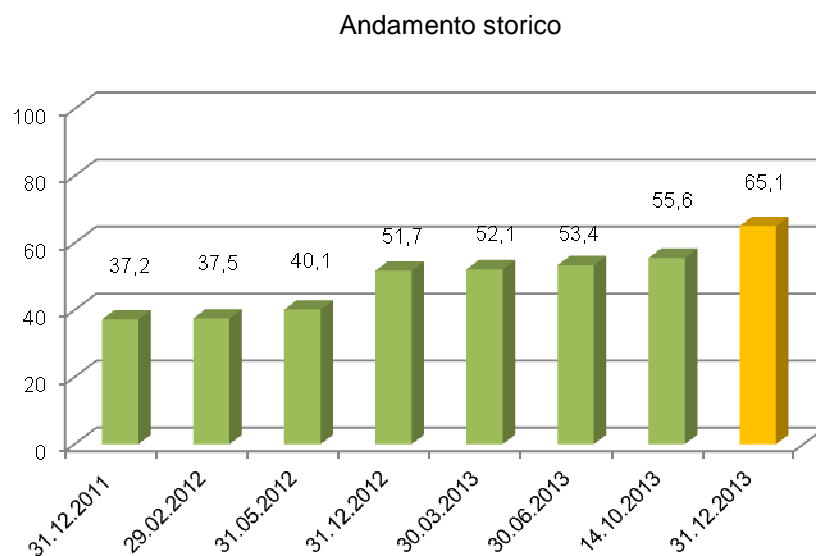

Valori al 31.12.2013 per Asse



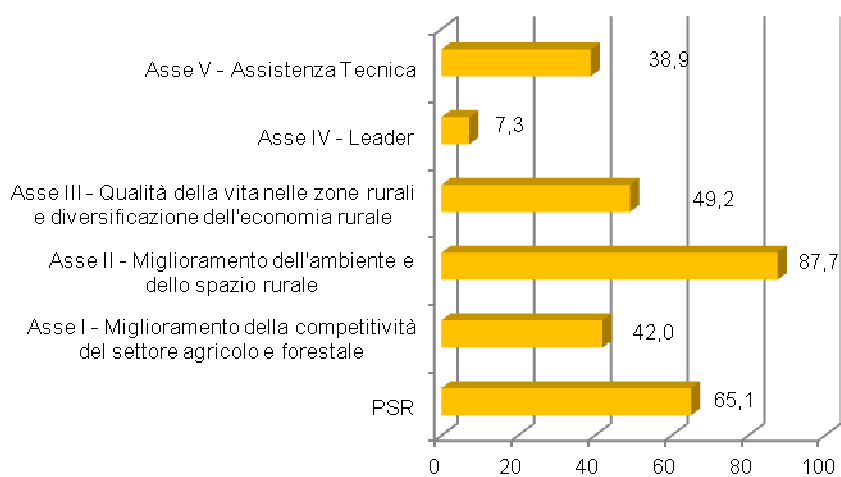


Figura 5c
PSR - Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni

Andamento storico

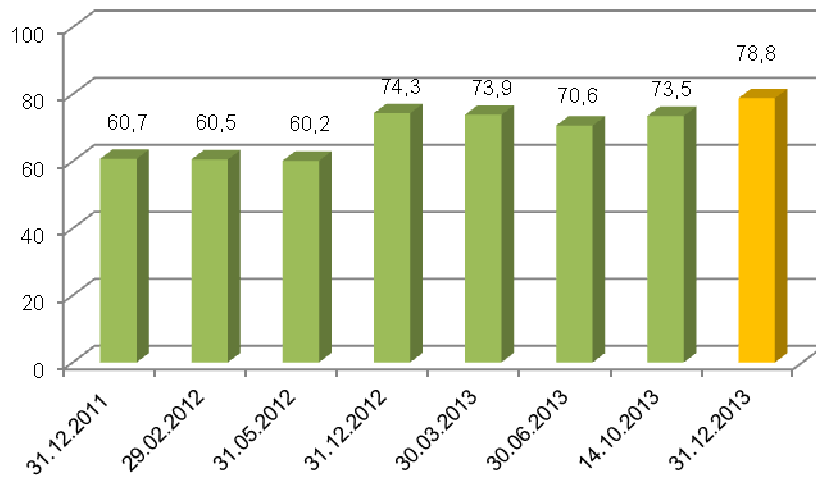

Valori al 31.12.2013 per Asse

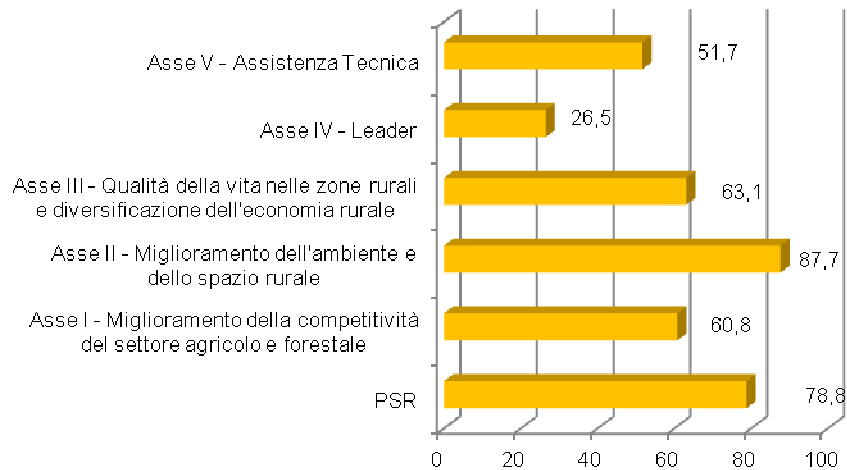

Nella *tabella 3c bis* vengono riportati i valori del Target e delle Previsioni di spesa del PSR al 31.12.2014.

Tab. 3c bis

PSR - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)

Assi	Previsioni di Spesa al 31.12.2014	Target n+2 al 31.12.2014
Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	208.934.471	-
Asse II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	756.319.593	-
Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	14.567.951	-
Asse IV Leader	31.933.198	-
Asse V Assistenza Tecnica	5.915.969	-
Totale PSR	1.017.671.182	1.017.350.287

Come evidenziato in *Tabella 3 bis*), la previsione di spesa complessiva stimata al 31 dicembre 2014 pari a € 1.017.671.182 consente il superamento del target N+2 stabilito per il 2014 in € 1.017.350.287.

Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013

Il Fondo Europeo per la Pesca è uno strumento finanziario comunitario gestito a livello nazionale.

Per la Regione Autonoma della Sardegna, la dotazione finanziaria, tenuto conto di quanto contenuto nell'ultima modifica del Programma Operativo presentata alla Commissione Europea, attualmente in fase di riesame, e delle ulteriori proposte di modifica presentate al Comitato di Sorveglianza dell'11 marzo 2014, è pari a € 15.180.664, di cui € 7.590.332 di quota UE, € 6.072.266 di risorse nazionali e € 1.518.066 di quota regionale.

Come disposto con Delibera 18/33 del 23.4.2013, la dotazione iniziale di 15.894.892 è stata interessata da una riduzione iniziale di euro 300.000, risorse che sono state destinate – analogamente a quanto avvenuto in tutte le altre regioni dell'Obiettivo fuori Convergenza - all'attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e successivamente da una riduzione dovuta al disimpegno automatico.

Nel 2013, nonostante gli sforzi profusi soprattutto nel secondo semestre del 2013 da parte di tutte le Amministrazioni a livello nazionale, per la prima volta il programma è stato interessato da un disimpegno complessivo pari a euro 10.281.859 (euro 9.913.548 per le Regioni convergenza e euro 368.311 per le Regioni fuori Convergenza), comunicato dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2014)425842 - 20/02/2014. La quota di disimpegno è stata ripartita tra le Regioni che non hanno raggiunto i propri obiettivi sulla base dell'importo delle risorse assegnate e della performance del triennio 2011-2013.

Alla Regione Sardegna è stata assegnata una quota di disimpegno pari a euro € 207.114 di quota comunitaria, € 414.228 totale.


Per le diverse problematiche illustrate nelle precedenti relazioni e riportate in sintesi nella sezione 3, la performance della Regione Sardegna è stata piuttosto bassa.

La seguente tabella illustra l'attuale ripartizione finanziaria della dotazione del FEP per singolo Asse prioritario, relativa all'Organismo Intermedio (O.I.) Sardegna.

Tab. 1d

PO FEP - Fondo per origine della contribuzione - Riparto per Assi

Assi	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
Asse I Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	3.168.924	1.584.462	1.267.569	316.892
Asse II Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	4.150.618	2.075.309	1.660.247	415.062
Asse III Misure di interesse comune	4.835.196	2.417.598	1.934.078	483.520
Asse IV Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	2.730.652	1.365.326	1.092.261	273.065
Asse V Assistenza Tecnica	295.274	47.637	118.110	29.527
Totale FEP (O.I. - SARDEGNA)	15.180.664	7.590.332	6.072.266	1.518.066
Composizione percentuale per origine della contribuzione	100,0%	50,0%	40,0%	10,0%

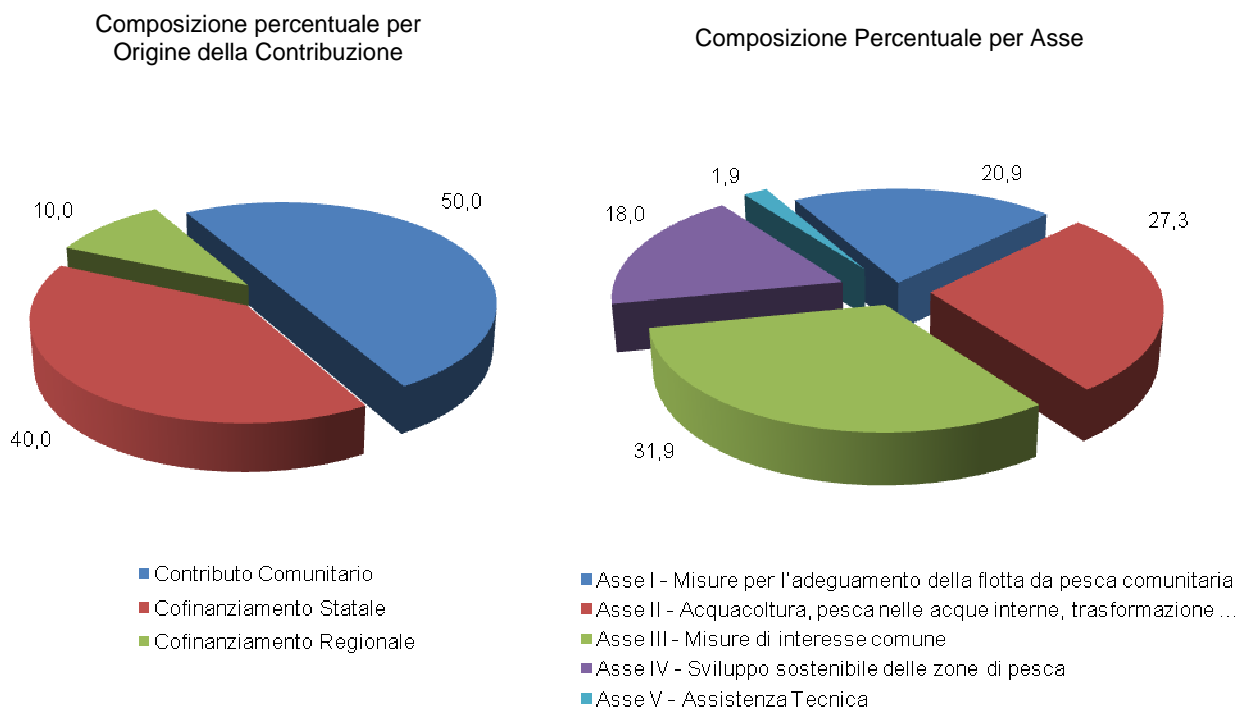Figura 1d**PO FEP - Composizione percentuale della Dotazione Finanziaria per origine della Contribuzione e per Asse****Tab. 2d****PO FEP - Storico - Andamento del Fondo al 31.12.2013**

Assi	Spesa Programmata (delibere e avvisi) al 31.12.2013	Impegni caricati sul sistema di monitoraggio al 31.12.2013	Pagamenti caricati sul sistema di Monitoraggio al 31.12.2013	Spesa Certificata al 31.12.2013
Asse I Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	3.168.924	864.446	107.873	107.873
Asse II Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	4.150.618	3.117.780	1.625.841	1.625.841
Asse III Misure di interesse comune	4.835.196	1.191.619	0	0
Asse IV Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	2.730.652	2.730.651	0	0
Asse V Assistenza Tecnica	295.274	104.548	104.548	78.226
Totale FEP (O.I. - SARDEGNA)	15.180.664	8.009.044	1.838.262	1.811.940

Per la rendicontazione prevista a dicembre 2013 ci si è avvalsi di quanto disposto dall'art. 53, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, la spesa sostenuta è stata pertanto rendicontata con il tasso massimo imputabile al sostegno delle operazioni erogato dal FEP (95%).

La quota UE certificata al 31.12.2013 è pari a euro 1.279.150.

Si riporta di seguito la descrizione dello stato di avanzamento delle singole misure del programma.

Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria.

Misura 1.1

La misura è gestita dall'Amministrazione centrale ed è attuata, ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 1198/06 attraverso Piani di Adeguamento dello sforzo di pesca adottati a livello nazionale. Con Delibera 18/33 del 23.4.2013, la Giunta regionale ha disposto di destinare le risorse residue delle misure 1.4 e 1.5, per un totale di euro 1.621.015, all'attivazione della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle navi da pesca" a livello regionale da parte dell'Autorità di Gestione. Tale decisione è stata presa a seguito delle richieste delle Associazioni di categoria, che hanno sottolineato la situazione di crisi del settore ed il conseguente rinnovato interesse per la misura da parte degli operatori. Questo, tenuto conto anche del fatto che dalle elaborazioni dei dati della flotta sarda effettuata dal Servizio è risultato che il livello di riduzione ottimale previsto dal piano di disarmo della flotta a strascico non è stato ancora raggiunto. Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 646/DecA/31 del 09.05.2013 ha autorizzato il Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG) a richiedere l'attivazione da parte dell'Autorità di Gestione del FEP della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle navi da pesca", ai sensi degli artt. 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006, proponendo le modalità specificate nello stesso decreto. La richiesta di attivazione della misura da parte del RAdG è stata presentata nel mese di maggio del 2013. La misura non è stata ancora attivata da parte dell'Autorità di gestione del FEP. Con nota prot. n. 59/Gab/2 del 17.04.2014, l'Assessore, considerato l'ammontare delle risorse finanziarie destinate e l'importanza dell'attivazione della misura per supportare l'avanzamento della spesa e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma Operativo, ha chiesto l'attivazione urgente della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle navi da pesca" per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.

Misura 1.2

Analogamente a quanto avvenuto in tutte le altre Regioni dell'Obiettivo fuori Convergenza, la somma di euro 300.000 è stata già destinati all'attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2013.

In occasione dell'incontro della Cabina di Regia del 12 febbraio 2014 l'Autorità di Gestione del FEP ha chiesto alle Regioni la disponibilità a trasferire risorse per l'attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" (la misura viene gestita direttamente dall'Autorità di gestione)

per il 2014. Mediante apposita comunicazione inviata per le vie brevi in data 28.2.2014 agli Organismi Intermedi delle Regioni fuori convergenza, l'Autorità di Gestione del FEP ha trasmesso la tabella relativa al fabbisogno di quota comunitaria necessario per l'attivazione della misura. Il fabbisogno della Regione Sardegna ammonta a euro 133.389 (pari ad euro 66.695 di quota comunitaria). Il Piano finanziario dovrà pertanto essere rivisto tenendo conto delle risorse da trasferire per l'attivazione della misura.

Misura 1.3

La dotazione finanziaria per l'attuazione del bando della Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" è di euro 1.585.156, di cui euro 792.578 di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 634.063 di cofinanziamento di risorse nazionali ed euro 158.516 a carico del bilancio regionale. Nonostante l'entusiasmo inizialmente manifestato a livello nazionale dagli operatori del settore, la misura 1.3 ha evidenziato un livello di partecipazione alle iniziative di discreta entità. Ciò è imputabile a diversi fattori: la percentuale di cofinanziamento privato prevista per la realizzazione degli interventi che si colloca in una congiuntura economica di crisi persistente; la complessità e numerosità delle prescrizioni stabilite per la partecipazione e per l'attuazione delle iniziative. Al 31.12.2013 risulta un contributo totale impegnato pari a € 733.620 e un progetto liquidato per un totale pagato e certificato di euro 6.000. Le iniziative che interessano questa misura riguardano progetti di piccolo importo, ma numerosi.

Misura 1.4

Per la misura 1.4 "Piccola Pesca Costiera" è stata prevista una dotazione finanziaria pari a euro 880.642, di cui euro 440.321 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul FEP, euro 352.257 di cofinanziamento di risorse nazionali e euro 88.064 a carico del Bilancio regionale. Le domande presentate nell'ambito della misura 1.4 sono state 9, di cui solo 3 ricevibili per un totale del contributo concedibile di circa 21.500 euro. Al 31.12.2013 risulta un contributo impegnato pari a € 2.000.

Misura 1.5

Per la misura 1.5 "Compensazioni socio-economiche" è stata prevista una dotazione finanziaria pari a euro 1.056.771 di cui euro 528.385 di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 422.708 di cofinanziamento di risorse nazionali e euro 105.677 a carico del Bilancio regionale. Sono state presentate 20 domande di cui 18 ammissibili. Alla data di redazione del presente documento sono stati liquidati 8 progetti, per un totale contributo pagato e certificato pari a euro 101.873. Gli impegni totali sono pari a euro 128.827. In particolare, sono stati erogati premi per indennità una tantum ai pescatori imbarcati su natanti che hanno aderito all'arresto definitivo.

Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Dopo una prima pubblicazione nel 2009, i bandi delle misure 2.1 e 2.3 sono stati ripubblicati rispettivamente nel mese di marzo e di aprile 2012.

Misura 2.1 - Bando 2009

La dotazione finanziaria prevista per il bando della misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)" pubblicato nel 2009 era pari ad euro 884.549, di cui euro 442.274 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 353.820 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione e euro 88.455 a carico del Bilancio regionale. Sono state presentate 17 domande, ad 8 delle quali è stato concesso il contributo per un totale di 766.438. Sono stati liquidati sei progetti per un totale contributo pagato e certificato pari a € 274.797. Gli impegni totali a valere sul bando sono pari a € 766.438 di contributo.

Misura 2.1 - Bando 2012

In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011, nel mese di aprile del 2012 è stato ripubblicato il bando della misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006), annualità 2010-2012", la dotazione finanziaria è pari a euro 953.924. Sono state presentate 8 domande, di cui 2 ammissibili, per un totale di contributo concedibile pari a circa euro 106.000. È stato liquidato un progetto per un importo pagato e certificato totale di 6.000 euro. Gli impegni totali ammontano a euro 6.000.

Misura 2.3 - Bando 2009

La dotazione finanziaria prevista per il bando della misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006) pubblicato nel 2009 era pari ad euro 884.549, di cui euro 442.274 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 353.820 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione e euro 88.455 a carico del Bilancio regionale. Sono state presentate 19 domande, ad 11 delle quali è stato concesso il contributo. Sono stati liquidati sette progetti per un totale pagato e certificato di euro 715.111.

Misura 2.3 - Bando 2012

In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di GR n. 49/38 del 7.12.2011, nel mese di maggio 2012 è stato pubblicato il nuovo bando della misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006), annualità 2010-2012" con una dotazione finanziaria pari a euro 953.924. Sono state presentate 13 domande, di cui 11 ritenute ammissibili. Sono stati liquidati 2 progetti per un totale pagato e certificato pari a euro 629.934. La misura 2.3 è tra le misure che hanno riscontrato maggior interesse. Ciò è in linea con quanto verificatosi a livello nazionale; in particolare, la misura in esame presenta le migliori performance del Programma a livello nazionale anche per l'annualità 2013. Nella Regione Sardegna è stato quindi disposto lo scorrimento delle graduatorie della misura in esame, al fine di finanziare tutte le domande inserite nelle graduatorie stesse, inizialmente non finanziate a causa della carenza delle risorse dapprima destinate alla misura. A

tal fine, sono state utilizzate le risorse previste dai bandi di attuazione della misura 2.1, pubblicati nel 2009 e nel 2012, non utilizzate per via delle poche domande ammesse a finanziamento (soprattutto per il bando 2012) e le risorse residue destinate all'attuazione delle misure 2.1 e 2.3 non ancora messe a bando

Asse III - Misure di interesse comune

Misura 3.1

Con Determinazione del direttore del servizio pesca n. 19674/Det/529 del 12/08/2011 è stato approvato il Bando di attuazione della Misura 3.1 "Azioni collettive art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006", prevedendo la scadenza del 3 ottobre 2011 per la presentazione della dichiarazione d'impegno a formulare una proposta di Piani Locali di Gestione (termine successivamente prorogato al 10 ottobre 2011). Sono state ricevute n. 12 proposte di Piani di gestione locale. Con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento di ARGEA Sardegna n. 0001456 del 22.03.2012 sono stati approvati gli elenchi delle dichiarazioni d'impegno ricevibili e non ricevibili: le domande ricevibili sono risultate in numero pari a 7. A seguito di ricorso presentato al T.A.R. è stata riammessa una domanda ritenuta inizialmente non ricevibile; la graduatoria è stata rettificata con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento di ARGEA Sardegna n. 3018 del 20/06/2012. Il 18 novembre 2012 è scaduto il termine per la presentazione dei Piani di Gestione Locale definitivi. Sono stati presentati 7 Piani di gestione locale, 5 dei quali ritenuti ammissibili. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 all'attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) sono state assegnate risorse previste nel Piano Operativo del FEP per un importo complessivo pari a euro 996.396, di cui euro 498.198, di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.559 di Assegnazioni Statali ed euro 99.640 a carico del bilancio regionale. Il Servizio Pesca sta attualmente procedendo alla valutazione dei Piani di Gestione Locale presentati.

Misura 3.4

Con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 20909/Det/540 del 2 settembre 2011 è stato approvato il bando di attuazione della misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori". Alla misura 3.4 è stato assegnato il 25% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione per l'Asse III per un importo complessivo pari ad euro 1.245.495, di cui euro 622.748 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 498.198 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione ed euro 124.549 a carico del Bilancio regionale. Sono state presentate 8 domande, 5 delle quali ammissibili. Con Determinazione n. 0002260 del 11/05/2012 è stata approvata la graduatoria di merito, tutte le 5 domande sono state ammesse a finanziamento per un totale di euro 1.750.346. Alla misura sono state pertanto assegnate ulteriori risorse finanziarie (per un importo di euro 498.198), a seguito di una modifica del piano


finanziario, al fine di accogliere tutte le domande presenti nella graduatoria della misura.

Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Relativamente all'Asse IV, in particolare per la misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", la graduatoria delle domande ammissibili è stata approvata con determinazione n.3088/2011 del 22 luglio 2011. Ad oggi sono stati firmati i protocolli d'intesa con due Gruppi di azioni costiera (GAC), il GAC Sardegna Orientale e il GAC Nord Sardegna. I GAC hanno recentemente avviato i rispettivi Piani di sviluppo locale. Il contributo totale impegnato a favore dei gruppi è pari a euro 2.730.651.

Figura 2d
PO FEP - Capacità di Impegno (percentuale degli Impegni sulla Dotazione Finanziaria)

Andamento storico

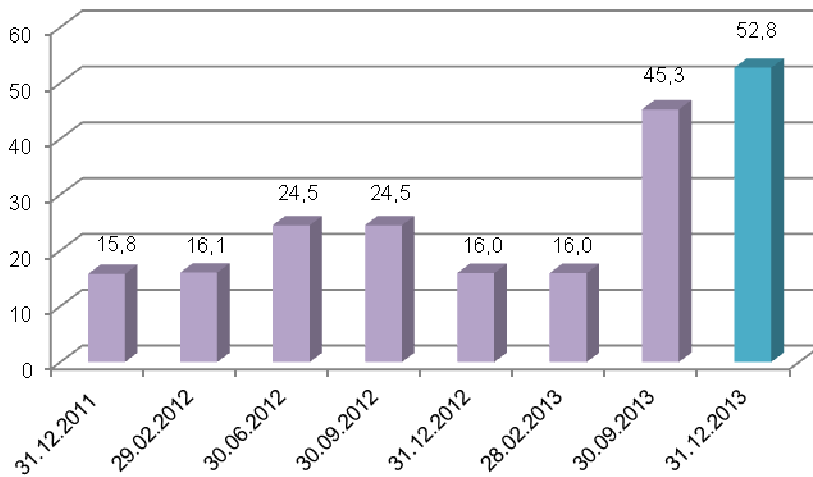

Valori al 31.12.2013 per Asse


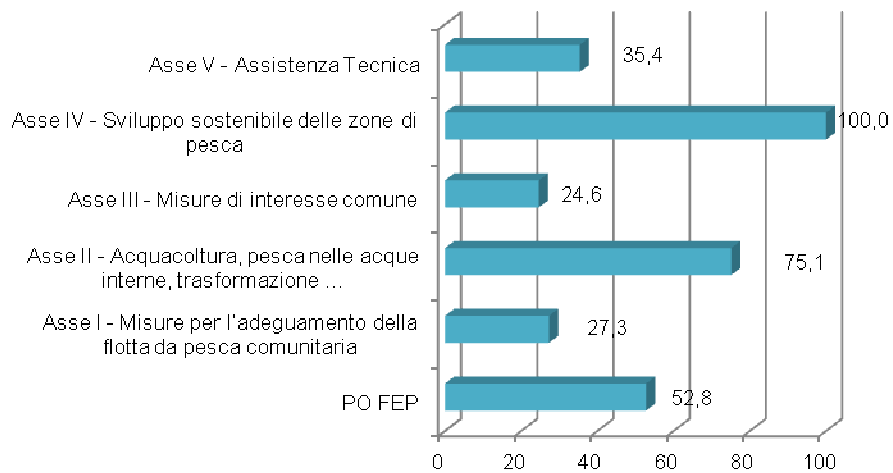


Figura 3d
PO FEP - Percentuale della Spesa Certificata sulla Dotazione Finanziaria

Andamento storico

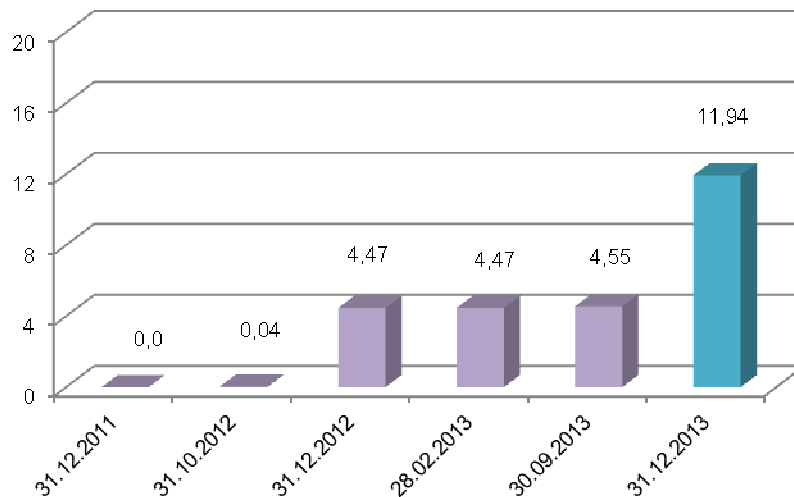

Valori al 31.12.2013 per Asse


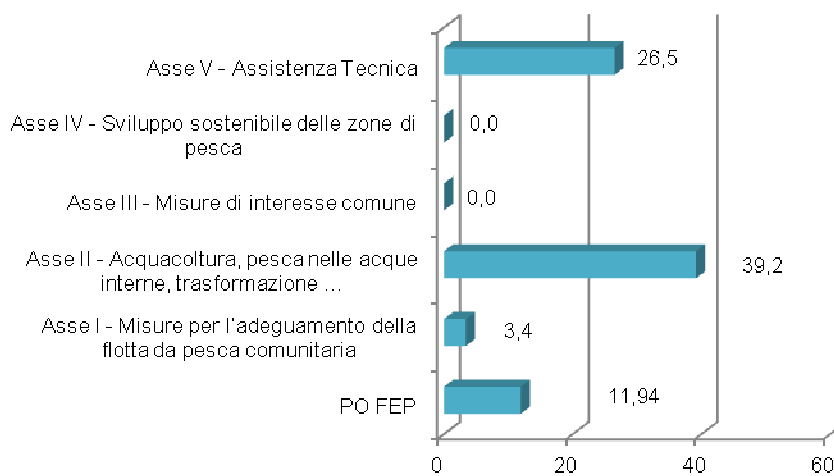


Figura 4d
PO FEP - Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Finanziaria

Andamento storico

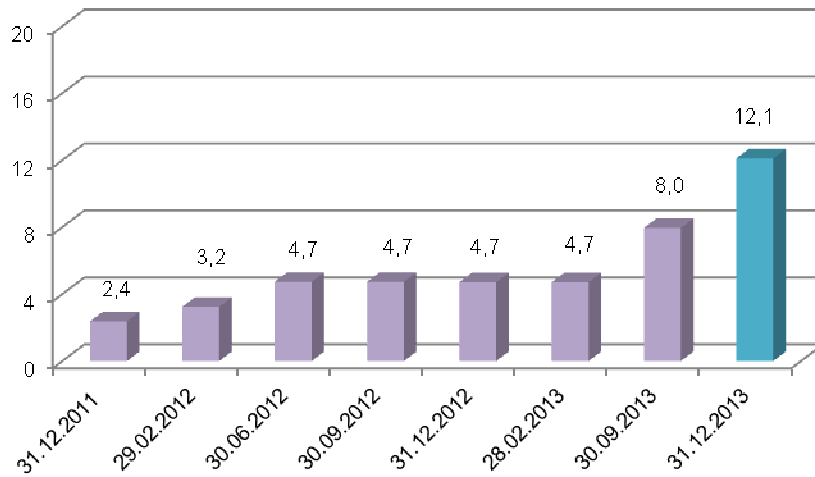

Valori al 31.12.2013 per Asse



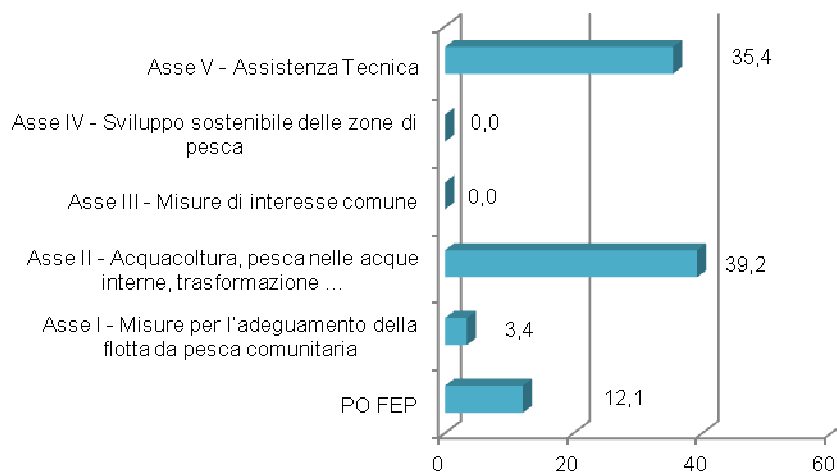


Figura 5d
PO FEP - Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni

Andamento storico

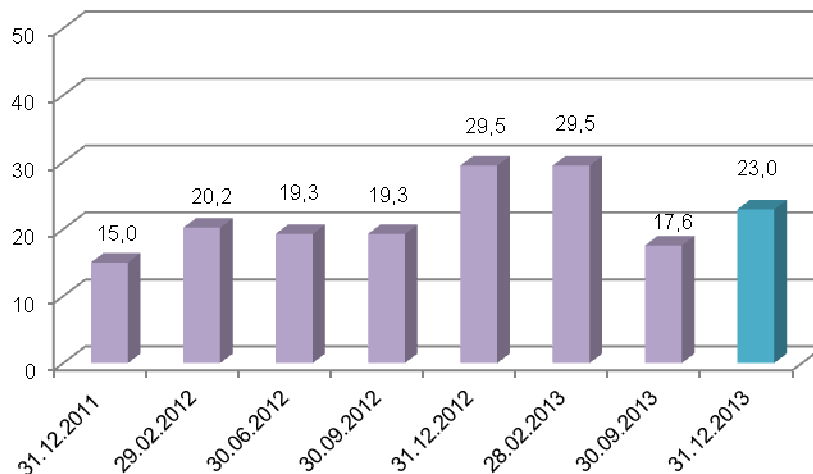

Valori al 31.12.2013 per Asse

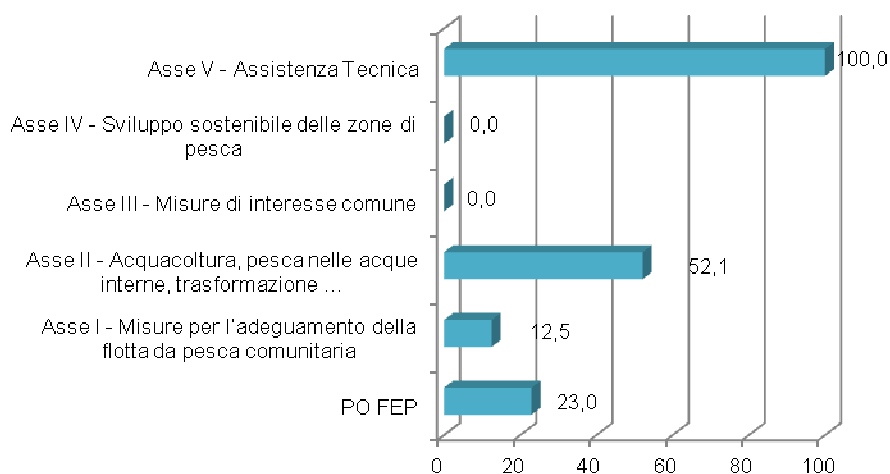

Tab. 3d

PO FEP - Previsioni e Target (contributo comunitario + cofinanziamento statale e regionale)

Assi	Previsioni di Spesa al 31.05.2014	Previsioni di Spesa al 31.10.2014	Previsioni di Spesa al 31.12.2014	Target n+2 al 31.12.2014 ¹²
Asse I				
Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	269.873	529.873	678.297	
Asse II				
Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	2.377.541	2.780.091	2.803.691	
Asse III				
Misure di interesse comune	0	300.000	601.150	
Asse IV				
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	0	400.000	700.000	
Asse V				
Assistenza Tecnica	78.226	83.226	83.226	
Totale FEP (O.I. - SARDEGNA)	2.725.640	4.116.790	4.866.364	7.800.000

I dati sulle previsioni di spesa sono stati comunicati dall'Agenzia regionale ARGEA Sardegna, responsabile della gestione amministrativa di tutte le misure del PO FEP.

Gli importi previsionali indicati da ARGEA sono stati sommati agli importi di spesa già sostenuta e certificata. Le previsioni sono basate sulle domande già ricevute da ARGEA che non sono interessate da particolari criticità e per le quali l'Agenzia ritiene che sia possibile procedere all'erogazione dei contributi entro le date indicate. In particolare gli importi si riferiscono per l'Asse I, a numerosi progetti della misura 1.3 per un importo di circa 500.000,00 euro e ad alcuni progetti delle misure 1.4 e 1.5; per l'Asse II, a 2 progetti della misura 2.1 per un importo totale di euro 220.000 circa e a diversi progetti della misura 2.3, per un importo totale di euro 934.250; per l'Asse III, ai progetti della misura 3.4. Per quanto riguarda la misura 4.1, le previsioni sono basate anche su quanto comunicato dai Gruppi di azioni Costiera (GAC) riguardo le azioni prossime all'attivazione.

Relativamente al target al 31.12.2014, l'Autorità di gestione del FEP ha comunicato che l'obiettivo di spesa per la Regione Sardegna al 31.12.2014, è pari a euro 7.800.000 complessivi e comprende euro 3.900.000 di quota comunitaria. Il dato evidenzia una notevole differenza negativa con le previsioni di

¹² Come Target si è inteso l'obiettivo di spesa comunicato dall'Autorità di Gestione, che viene comunicato solo con riferimento al 31.12.2014.

spesa (€ 2.933.636, circa il 37,6%), con il conseguente rischio di disimpegno automatico.

Sezione 3: Disposizioni procedurali adottate per l'attuazione dei programmi e principali criticità riscontrate

Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013

Nel corso del 2013 l'Autorità di Gestione del PO FSE ha continuato a portare avanti una serie di azioni per attuare le politiche per l'occupazione e la formazione e per migliorare l'efficienza realizzativa del Programma.

In riferimento all'aumento dei fenomeni legati alla disoccupazione, come già descritto nella sezione precedente sono state avviate nuove misure per un importo complessivo di poco inferiore a 100 milioni di euro.

In riferimento all'accelerazione della spesa, anche per il 2013 il Programma FSE ha raggiunto e superato tutti i target, dimostrandosi tra le regioni con la più alta capacità di spesa.

La criticità più rilevante è legata alle comunicazioni della Commissione Europea, che con note Ares n. 3719540 del 13 dicembre 2013 e Ares n. 395007 del 18 febbraio 2014 ha interrotto i termini di pagamento (ex art. 91 del Reg. 1083/2006) relativamente alle domande di pagamento di ottobre e dicembre 2013.

Le carenze, rilevate durante la missione di audit¹³, attengono prevalentemente alle attività dell'Autorità di Audit, tuttavia una parte dei rilievi (relativi a sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati) è di competenza dell'Autorità di Gestione.

Dal verbale in inglese¹⁴ dei servizi della Commissione si desume che uno dei compiti più rilevanti dell'Autorità di Gestione sarà quello di completare la messa a regime del Sistema Informativo del Programma (SIL FSE).

¹³ Audit di sistema della Commissione Europea del settembre 2013.

¹⁴ Il verbale in lingua inglese precede l'invio da parte della Commissione Europea del verbale in lingua italiana. L'Autorità di Gestione sarà tenuta a fornire le proprie osservazioni e le misure adottate entro due mesi dal ricevimento di tale ultimo verbale.

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sardegna 2007-2013

L'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna ha assunto, nel corso dell'implementazione del Programma, numerosi provvedimenti e misure volte a superare criticità procedurali ed attuative. Nel corso del 2013 si è provveduto a:

- organizzare 20 incontri bilaterali su criticità specifiche con funzionari interni alla RAS (Direttori Generali e Responsabili di Linea di Attività); incontri tra RAS e Beneficiari (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi di bonifica e Consorzi industriali, Enti strumentali della Regione, Autorità portuale, ARST, CTM) ;
- esaminare 50 Linee di Attività a fronte delle complessive 80 del Programma;
- organizzare incontri bilaterali periodici con i Rappresentanti della Commissione Europea su argomenti specifici (Patto di Stabilità, Strumenti di ingegneria finanziaria, Sistemi di gestione e controllo, Grande Progetto Bulgas) ;
- aggiornare con periodicità più frequente le previsioni di spesa;
- effettuare una ricognizione annuale sui progetti ammissibili alla Programmazione Regionale Unitaria (cosiddetti "retrospettivi" ai sensi della nota COCOF 12 -0050 -00);
- rafforzare le strutture regionali preposte ai controlli di I livello;
- fornire assistenza tecnica ai soggetti pubblici diversi dalla RAS per l'implementazione del Sistema Informativo SMEC, con l'estensione ai Beneficiari della possibilità di rendicontare la spesa, accelerando i tempi di certificazione;
- fornire assistenza tecnica ai Beneficiari dell'Asse V come supporto alla gestione delle operazioni, all'implementazione degli strumenti pianificazione integrata (PISU/PIT) e facilitazione all'utilizzo dello strumento JESSICA e del Fondo di Sviluppo Urbano.
- richiedere ai Responsabili di Linea di Attività di provvedere tempestivamente al caricamento sul sistema Informativo SMEC dei dati relativi all'attuazione delle operazioni, con particolare riferimento all'avanzamento finanziario, nonché al caricamento delle previsioni di spesa;
- richiedere ai Responsabili di Linea di Attività di verificare lo scarto tra "pagamenti ammessi" e "pagamenti controllati". Laddove opportuno procedere all'immediata richiesta di assistenza all'Ufficio Controlli di I livello presso l'Autorità di Gestione;
- richiedere ai Responsabili di Linea di Attività di procedere, ove non già provveduto, all'erogazione delle anticipazioni sugli aiuti concessi e portare le relative spese in attestazione, anche mediante apposita sollecitazione da parte del Responsabili di Linea di Attività ad eventuali Organismi Intermedi e/o Istituti di credito;
- richiedere ai Responsabili di Linea di Attività di procedere, ove non già provveduto, all'erogazione delle anticipazioni di legge all'appaltatore di lavori, servizi e forniture, a fronte di presentazione di polizza fideiussoria e dell'emissione di regolare fattura, anche mediante apposita sollecitazione da parte del Responsabili di Linea di Attività ai Beneficiari in caso di operazioni "a regia" regionale.

La Giunta regionale, infine, con Delibera della Giunta Regionale n. 50/25 del 03.12.2013 ha dato mandato all'Autorità di Gestione di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il target di spesa per l'annualità 2013 ed imprimere una ulteriore accelerazione della spesa, in particolare di:

1. esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli uffici di controllo di 1° livello delle Direzioni generali che presentano maggiori criticità, finalizzato al completo svolgimento delle attività di verifica funzionali alla rendicontazione delle spese;
2. effettuare una ricognizione tesa ad individuare operazioni cantierabili originariamente finanziate con fonti riconducibili alla politica regionale unitaria e che rispondano ai requisiti di ammissibilità al POR FESR, richiesti dalla Nota del COCOF 12 – 0050 – 00 e recepita tramite modifica QSN con nota del MISE-DPS n.13523 dell'8 novembre 2013;
3. valutare l'inserimento di possibili nuove iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi in linea con le proposte che il Ministero dello Sviluppo Economico sta portando avanti nell'ambito della programmazione 2007/2013
4. valutare l'ipotesi di riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 tenendo conto della necessità di rafforzare gli Assi maggiormente in grado di sostenere l'accelerazione della spesa richiesta.

Tali iniziative hanno consentito il conseguimento del target di spesa N+2 fissato in quota UE a euro 415.081.317 (il valore in quota UE della Spesa Certificata è pari infatti a euro 417.872.445).

Se in parte l'obiettivo è stato raggiunto grazie all'accelerazione della spesa, dall'altro è stato imprescindibile il ricorso ai cosiddetti progetti "retrospettivi"¹⁵, progetti originariamente finanziati a valere su altre fonti di finanziamento. Il ricorso alla certificazione di progetti retrospettivi, avviato già a partire dal 2010, ha generato una quota consistente dell'ammontare di spesa finora realizzata, il cui valore cumulato ad oggi è pari a 165 milioni di euro. Tali progetti sono stati inseriti nella Certificazione di Spesa dall'Autorità di Certificazione dopo le opportune verifiche eseguite ai sensi della nota COCOF 12-005-00 in materia di operazioni retrospettive e dell'art. 61 (B) (ii) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che richiede di verificare che le spese siano conformi alle norme dell'Unione Europea e nazionali applicabili e siano state sostenute in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al programma e conformi alle norme dell'Unione europea e nazionale.

Si segnala che la Commissione Europea, con nota Ares(2014) 1104501 del 08.04.2014, ha trasmesso al Rappresentante d'Italia presso l'Unione europea la procedura per l'interruzione dei pagamenti intermedi

¹⁵ Progetti c.d. retrospettivi ai sensi della nota COCOF 12-005-00 in materia di operazioni retrospettive e successiva nota MiSE 6333-U del 15.05.2012 che ne recepisce norme e indirizzi. Tali progetti sono esaminati attraverso opportune *check list* mirate a verificarne l'ammissibilità al Programma, inseriti in rendicontazione attraverso Determinazioni dirigenziali e successivamente ratificati con Deliberazione di Giunta Regionale.

del POR FESR 2007-2013. La Commissione, sulla base della Relazione Annuale di Controllo (RAC) dell'Autorità di Audit, ha individuato alcune carenze nel sistema di gestione e controllo del programma che influiscono sull'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti.

Tale carenza relativa ai controlli di I livello ha determinato l'applicazione dell'art. 92 del Regolamento (CE) n. 1883/2006 di interruzione dei pagamenti.

L'Autorità di Gestione del PO FESR sarà tenuta a fornire, entro due mesi dal ricevimento della nota, le proprie osservazioni e le misure adottate per migliorare il funzionamento del sistema di gestione e controllo di I livello.

Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013

Le Autorità competenti e responsabili all'attuazione del programma sono:

- l'Autorità di Gestione, soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma. La funzione è attribuita al direttore generale pro-tempore dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- l'Organismo Pagatore, riceve i fondi comunitari, nazionali e regionali ed eroga gli aiuti. La funzione è svolta dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA;
- l'Organismo di Certificazione, indipendente dall'Organismo Pagatore, provvede alla certificazione dei conti relativamente alla loro veridicità, completezza e correttezza.

Lo Schema Gestionale prevede una ripartizione delle funzioni corrispondente a quella prevista nel Regolamento (CE) n. 1698/2005 (art. 74) per ciò che concerne le competenze dell'Autorità di Gestione e nel Regolamento (CE) n. 1290/2005 (artt. 6 e 7) relativamente alle competenze dell'Organismo Pagatore e dell'Organismo di Certificazione. I principali elementi di novità introdotti dalla Regione Sardegna con la Programmazione Unitaria dello Sviluppo Rurale (rispetto a quanto avvenuto nella programmazione 2000-06) riguardano i seguenti aspetti:

- l'attribuzione delle funzioni di programmazione e gestione alla Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR;
- la realizzazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);
- l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Gestione e la Erogazione in Agricoltura (ARGEA Sardegna).

All'Agenzia ARGEA Sardegna, istituita con la legge regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 e articolata in quattro aree di coordinamento e otto servizi territoriali, sono stati attribuiti compiti operativi connessi non solo alla erogazione degli aiuti pubblici, ma anche alla gestione tecnico-amministrativa delle domande di aiuto. In particolare i servizi territoriali curano le fasi di ricezione, gestione e proposta di liquidazione delle domande di adesione alle Misure, predispongono i monitoraggi fisici e finanziari su base territoriale, aggiornano l'anagrafe delle aziende agricole, il registro degli aiuti e altri albi ed elenchi di competenza di ARGEA. Fra l'Autorità di Gestione e l'ARGEA, incaricata della ricezione, istruttoria e proposta di liquidazione, un apposito atto dell'Autorità di Gestione definisce i rispettivi ambiti di responsabilità; per lo stesso motivo i rapporti fra l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore AGEA sono regolati da una convenzione.

L'Organismo pagatore AGEA è responsabile dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, necessari

ai fini del pagamento degli aiuti concessi. AGEA effettua i controlli di II livello su tutte le attività delegate alle Regioni.

A supporto delle attività di controllo e gestione, la Direzione generale ha predisposto il progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR Sardegna), approvato con DGR n. 37/18 del 13.09.2006, che consente, da un lato, di semplificare le procedure amministrative di richiesta, verifica e controllo dei dati e, dall'altro, agli agricoltori di presentare on-line le domande di finanziamento, consultare la propria posizione, aggiornare i dati aziendali, etc. accelerando i tempi di risposta della pubblica amministrazione.

La gestione dei procedimenti inerenti al PSR consente inoltre di ricavare le informazioni necessarie al monitoraggio del programma, e fornisce il supporto informativo alla redazione delle Relazioni annuali sullo stato di attuazione per quanto riguarda l'andamento e l'esecuzione finanziaria del programma.

Con riferimento all'Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale e all'Asse 4 - Leader, per le misure attuate con approccio Leader, è da segnalare che, rispetto all'impostazione originaria, i Gruppi di Azione Locale (GAL) su delega dell'Autorità di Gestione sono responsabili della predisposizione dei bandi e dell'istruttoria delle domande di aiuto. Per quanto riguarda invece l'istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento, tale attività, di competenza dell'Organismo Pagatore, non è stata delegata ai GAL.

Con riferimento all'Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, le principali criticità riscontrate sono rappresentate dalle difficoltà, da parte delle imprese del settore agricolo, di reperire risorse finanziarie presso il sistema bancario. In particolare, per quanto riguarda le Misure 121 e 123, si sottolinea che i limitati livelli di spesa sono dovuti, oltre che al forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, alle difficoltà delle imprese di presentare progetti tecnicamente validi, con continue richieste di concessioni di proroghe e varianti che rallentano la realizzazione degli investimenti. Inoltre la mancata capacità delle imprese agricole di finanziare la propria quota di partecipazione, per le difficoltà sopradescritte, ha fatto registrare un elevato tasso di rinunce.

Con riferimento all'Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale e all'Asse 4 - Leader, nonostante tutti i PSL siano stati approvati nel mese di luglio del 2010, la pubblicazione dei primi bandi da parte dei GAL è avvenuta a partire da maggio 2011. I GAL, prima di procedere all'emanazione dei bandi, hanno espletato le procedure di selezione del personale per dotarsi delle necessarie strutture tecnico-amministrative.

Anche nell'Asse 4 – Leader si riscontrano le stesse criticità evidenziate nell'Asse 1.

L'attuale scenario economico-finanziario determina una minore propensione agli investimenti da parte degli operatori per i quali spesso è precluso l'accesso al credito presso il sistema bancario.

A causa di questa difficoltà si riscontrano molte rinunce a realizzare investimenti già approvati.

Ulteriore criticità da segnalare riguarda le misure che prevedono investimenti di tipo pubblico, per i quali sussiste la difficoltà da parte di Enti locali potenziali beneficiari di reperire risorse proprie per cofinanziare gli interventi (Patto di stabilità, riduzioni di trasferimenti, limitata disponibilità di ricorrere ai mutui).

L'Autorità di Gestione ha modificato il programma, per innalzare al 100% la percentuale di Cofinanziamento pubblico a favore di misure che vedono quali beneficiari gli Enti locali.

Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013

L'art. 58 del Reg.(CE) n. 1198/2006, relativo alla Designazione delle autorità, stabilisce che ciascuno Stato membro, per garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, deve designare le seguenti Autorità:

- Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit.

In Italia, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni definito dall'art. 57, del richiamato Regolamento CE del Consiglio 1198/2006, sono state designate le tre autorità come di seguito descritto:


- Autorità di Gestione: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- Autorità di Certificazione: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore Nazionale - Ufficio Certificazione FEP - Sistemi Informativi;
- Autorità di Audit: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo di Coordinamento - Ufficio Coordinamento Controlli Specifici.

Per la gestione del Fondo, sono stati individuati degli Organismi Intermedi (O.I.), soggetti formalmente delegati allo svolgimento di compiti previsti dal Reg. (CE) n. 1198/2006 che sottoscrivono, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, apposite Convenzioni aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.


L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Servizio Pesca e Acquacoltura, costituisce l'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione che opera su delega dell'Amministrazione Centrale, sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione firmata dal Referente dell'Autorità di Gestione e dal Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione in data 15 marzo 2010.

Con la Deliberazione n. 50/40 del 10.11.2009 la Giunta Regionale aveva individuato quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione per la Regione Autonoma della Sardegna l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Servizio Autorità di Certificazione. Tale scelta era stata poi confermata con la Deliberazione n. 49/38 del 7.12.2011.

Lo schema seguente esplicita le relazioni fra le strutture dell'Amministrazione Regionale:

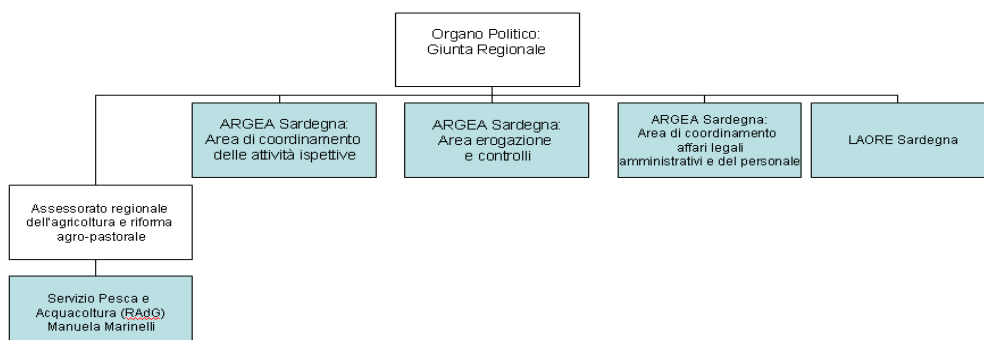

Per quanto riguarda la gestione del FEP si riporta di seguito un schema esemplificativo del funzionamento e delle interrelazioni delle strutture interessate:

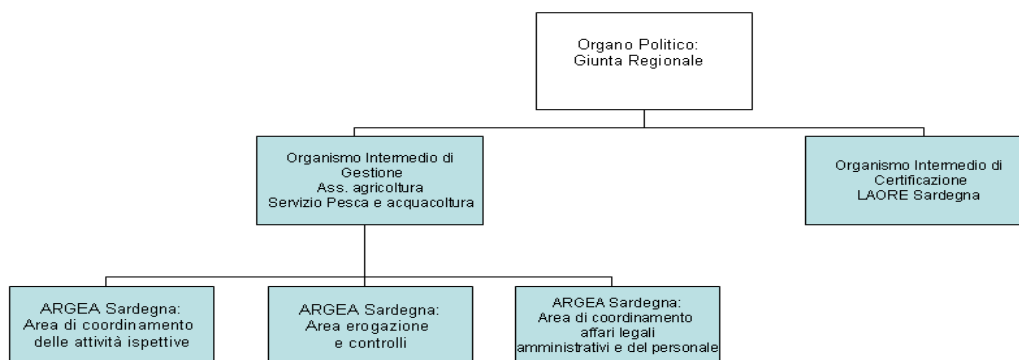

Tuttavia, in seguito all'impossibilità ribadita da parte del Servizio Autorità di Certificazione di espletare la funzione attribuita in seguito alla carenza di personale la Giunta Regionale con la deliberazione n. n. 9/44 del 23.2.2012, ha stabilito che le funzioni di Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione fossero affidate all'Agenzia per l'Attuazione dei Programmi Regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale LAORE Sardegna. Nella Regione Sardegna opera quale struttura operativa ARGEA Sardegna (Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura) - Area di coordinamento attività ispettive che svolge le attività ad essa assegnate sotto la responsabilità del Referente, dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio.

Le attività di rispettiva competenza del Referente dell'Autorità di Gestione e di ARGEA Sardegna sono codificate da un "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna¹⁶" che costituisce il riferimento operativo dell'Organismo Intermedio, in quanto contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso le quali vengono svolte le attività di competenza dell'Organismo Intermedio e le interrelazioni con le altre Autorità del Programma Operativo e gli Organismi Intermedi ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) 1198/2006.

Come anticipato nella sezione precedente, le principali criticità che hanno determinato un ridotto importo certificato nel triennio 2011-2013 sono le seguenti:

- problemi legati all'individuazione del referente dell'Autorità di Certificazione. Con la Deliberazione n. 50/40 del 10.11.2009 la Giunta Regionale aveva individuato quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione per la Regione Autonoma della Sardegna l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Servizio Autorità di Certificazione. Tale scelta era stata poi confermata con la Deliberazione n. 49/38 del 7.12.2011. Tuttavia, in seguito all'impossibilità ribadita dal Servizio Autorità di Certificazione di espletare la funzione attribuitale, a causa della carenza di personale, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 9/44 del 23.2.2012, ha stabilito che le funzioni di Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione fossero affidate all'Agenzia per l'Attuazione dei Programmi Regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale LAORE Sardegna. La convenzione tra LAORE Sardegna e l'Autorità di Certificazione è stata firmata solo nel mese di settembre del 2012.
- problematiche legate alla gestione delle misure attraverso il sistema informativo di gestione e monitoraggio SIPA (Sistema Italiano della pesca e dell'acquacoltura). Le spese possono essere portate a certificazione solo attraverso il completamento della procedura SIPA; in passato per incompatibilità del SIPA con la procedura prevista dai bandi regionali il caricamento delle spese sul sistema ha subito delle interruzioni. Attualmente tutte le problematiche SIPA sono state tutte risolte;
- difficoltà nella spesa delle risorse da parte dei beneficiari a causa della crisi finanziaria (che ha portato a varie rinunce e varianti in diminuzione dei progetti), difficoltà ad ottenere la fidejussione a garanzia delle somme anticipate, problemi legati al rispetto dei vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso (dovuto in particolare ai problemi legati al rinnovo delle concessioni demaniali per la misura 2.1);
- scarso interesse dimostrato dai potenziali beneficiari per alcune misure (in particolare le misure 1.4 e 1.5).

A seguito dell'esperienza maturata negli anni precedenti, si è reso necessario procedere

¹⁶ Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 4615/Det/90 dell'11.3.2011 e validato dall'AdG con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011.

all'individuazione di percorsi ottimali per accelerare la spesa delle risorse nella prospettiva del rispetto dell'obiettivo regionale nel quadro della regola dell' $n+2$. A tal fine è risultato in particolare necessario trovare risorse aggiuntive per le misure che hanno avuto maggior successo al fine di finanziare tutte le domande selezionate, ma alle quali non era possibile concedere il contributo a causa dei fondi limitati.

Al fine di accelerare la spesa delle risorse, con la Delibera 18/33 del 23.4.2013 sono state impartite le seguenti disposizioni:

- a) parte delle risorse assegnate alla misura 3.1 "Azioni collettive" in particolare quelle assegnate agli interventi previsti dall'art. 37, lettera n), del Regolamento (CE) n. 1198/2006, per un importo di euro 249.099 e dall'art. 37, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1198/2006, per un importo di euro 249.099, per un totale di euro 498.198, sono state destinate a finanziare tutte le domande presenti nella graduatoria della misura 3.4 approvata da ARGEA Sardegna con la Determinazione dell'Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive n. 260 dell'11.5.2012;
- b) le risorse previste dai bandi di attuazione della misura 2.1, pubblicati nel 2009 e nel 2012, non utilizzate per via delle poche domande ammesse a finanziamento e le risorse residue destinate all'attuazione delle misure 2.1 e 2.3 non ancora messe a bando, per un importo totale di euro 1.439.707, sono utilizzate per finanziare tutte le domande inserite nelle graduatorie della misura 2.3, inizialmente non finanziate a causa della carenza delle risorse inizialmente destinate alla misura;
- c) per l'attivazione della misura 1.2 da parte dell'Autorità di Gestione per l'anno 2013 sono state destinate le risorse residue non utilizzate per l'attuazione della misura 4.1 e parte delle risorse dell'Asse III;
- d) parte delle risorse residue non utilizzate nelle altre tipologie previste nella misura 1.5, sono state destinate a finanziare tutte le domande della graduatoria relativa alla tipologia 3, approvata con la Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di ARGEA Sardegna n. 1045 del 18.3.2013;
- e) le risorse residue delle misure 1.4 e 1.5, sono destinate all'attivazione della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle navi da pesca" a livello regionale da parte dell'Autorità di Gestione.

Si specificano di seguito le criticità riscontrate con l'indicazione delle attività poste in essere per il loro superamento. In generale, per tutte le misure, si segnalano diverse richieste di variazioni dei progetti che prevedono una riduzione del contributo e diverse rinunce a causa dell'impossibilità di sostenere la realizzazione degli interventi per mancata disponibilità economica. Si segnala, inoltre, la difficoltà per le imprese ad ottenere le fidejussioni a garanzia degli anticipi. Un rallentamento della spesa è stato causato anche dalla concessione di proroghe per la realizzazione degli interventi, concesse secondo quanto previsto dai diversi bandi.

Relativamente alle criticità si segnala quanto di seguito riportato per singola misura.

Diverse misure, in particolare le misure relative All'Asse I, sono state interessate da problematiche legate al funzionamento del sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP (SIPA). Tutte le problematiche sono state segnalate e risolte con la collaborazione dell'Autorità di gestione del FEP. L'istruttoria delle domande presentate nell'ambito della misura 1.3 è rimasta a lungo bloccata in quanto la misura è stata sospesa a livello nazionale dall'Autorità di Gestione del FEP per la necessità di un approfondimento richiesto dalla Commissione Europea circa l'ammissibilità degli intervenenti, in relazione alla condizione di non aumento della "abilità di cattura" degli stessi. In Sardegna, sono stati anche segnalati problemi legati alla difficoltà da parte dei beneficiari di ottenere certificazioni da parte di un organismo di classifica riconosciuto (come richiesto dal bando di attuazione), in particolare per gli interventi non riguardanti modifiche strutturali e motore. Le misure 1.4 e 1.5 non hanno ottenuto un buon successo in termini di partecipazione degli interessati, in particolare per via della modalità di attuazione delle misure. Queste misure prevedono l'erogazione di premi individuali a favore di pescatori che praticano la piccola pesca costiera per progetti finalizzati, tra l'altro, a migliorare le competenze professionali e la formazione e a promuovere l'organizzazione di filiera. Era inoltre prevista la concessione di compensazioni individuali a favore dei pescatori per la diversificazione dell'attività dei pescatori in ambiti diversi da quello della pesca marittima. Come evidenziato dall'Autorità di Gestione, le difficoltà riscontrate per l'attuazione delle misure 1.4 e 1.5 hanno riguardato tra l'altro l'obbligo (richiesto dalla normativa di riferimento del FEP) di prevedere le spese esclusivamente a carico dei pescatori; ciò ha scoraggiato le iniziative da realizzarsi da parte delle società e delle cooperative. Pertanto, una serie di problematiche sono state affrontate attraverso un costante confronto tra Autorità di Gestione, Organismo Intermedio e Commissione Europea; nonostante l'intenso lavoro svolto per accelerare la fase di attuazione, in generale a livello nazionale, le misure 1.4 e 1.5 non hanno raggiunto le performance attese in fase di programmazione. Da tale situazione è scaturita in diverse realtà regionali, ed anche in Sardegna, una parziale riprogrammazione delle risorse inizialmente allocate su tali misure. In particolare, nella Regione Sardegna le risorse residue delle misure 1.4 e 1.5 non utilizzate sono state destinate all'attivazione della misura 1.1 - Arresto definitivo. L'Asse 2 rappresenta, a livello nazionale, l'asse principale di avanzamento della spesa per l'area fuori Convergenza. Anche le misure dell'Asse 2 hanno comunque risentito fortemente del generale stato di crisi dell'economia che non consente alle imprese di eseguire investimenti, sia per la limitata capitalizzazione delle stesse sia per una forte difficoltà nell'acquisire dalle banche finanziamenti a fronte delle spese da sostenere per la realizzazione dei progetti. In Sardegna, il Responsabile di misura - ARGEA Sardegna - segnala infatti diverse richieste di variazioni dei progetti che prevedono una riduzione del contributo e diverse rinunce a causa dell'impossibilità di sostenere la realizzazione degli interventi per mancata disponibilità economica. Per le stesse ragioni, un rallentamento della spesa è stato causato anche dalla concessione di proroghe per la realizzazione degli interventi, concesse comunque secondo quanto previsto dai diversi bandi. Un'ulteriore problematica, che ha ridotto l'avanzamento della spesa, è legata alla situazione delle concessioni demaniali in Sardegna. Tenuto conto dei vincoli di destinazione d'uso previsti dai regolamenti comunitari, i bandi di attuazione delle misure 2.1 e 2.3 prevedono che al momento della presentazione della domanda, il richiedente debba dichiarare il proprio impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del

bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni. Tali disposizioni hanno creato problematiche alla partecipazione ai bandi nei casi (numerosi) in cui l'investimento fosse da realizzare in area oggetto di concessione demaniale; infatti, data l'attuale situazione in Sardegna in ordine alla scadenza delle concessioni demaniali, le imprese non possono garantire la disponibilità del bene né quindi assicurare il rispetto dei vincoli sopra citati. Ciò ha comportato in definitiva la ridotta partecipazione ai bandi; diversi concessionari hanno comunque presentato domanda ma ARGEA ha dovuto procedere al rigetto. Alcuni contenziosi si sono instaurati al riguardo e sono ancora pendenti. Altre imprese avevano partecipato ai bandi delle misure 2.1 e 2.3 pubblicati nel 2009 ed erano state ammesse a finanziamento in quanto la sentenza del TAR che ha annullato la proroga a tempo indeterminato delle concessioni demaniali risulta successiva (dicembre 2011). Al fine di evitare la revoca dei contributi già concessi, oltretutto in alcuni casi con investimenti già realizzati, l'Assessorato ha richiesto, in tali casi, la presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia del rispetto dei vincoli; tale soluzione è stata adottata anche in altre Regioni con problematica analoga. Peraltro in Sardegna diverse imprese non sono state in grado di produrre la polizza suddetta. Per quanto riguarda la misura 3.1 lett. m), così come a livello nazionale, le criticità riscontrate hanno riguardato la disciplina elaborata ed i tempi di approvazione dei Piani di Gestione Locale. Al riguardo, la commissione di valutazione delle proposte di Piano, nominata da ARGEA Sardegna con provvedimento del 21.11.2012, ha concluso i lavori nei primi mesi del 2014. Peraltro, ai fini dell'approvazione definitiva dei Piani, l'Amministrazione dovrà di seguito procedere alla valutazione delle raccomandazioni e/o richieste di modifica e/o integrazione da apportare al Piani di Gestione Locale. Il Piano di Gestione Locale dovrà essere poi inviato all'Autorità di Gestione nazionale del FEP che dovrà verificare la compatibilità delle misure previste dalle proposte di Piano di Gestione Locale con le misure poste in essere a livello nazionale. Il Ministero deve provvedere all'approvazione definitiva delle proposte di Piano di Gestione Locale dandone comunicazione alla Regione. Il ritardo della spesa è dovuto alla complessità di attuazione della misura, che prevede a titolo di esempio un elevato numero di verifiche e valutazioni intermedie dei Piani e l'approvazione finale degli stessi da parte dell'Autorità di Gestione nazionale. ARGEA Sardegna evidenzia peraltro un mancato avanzamento della spesa dovuto ai tempi di realizzazione degli interventi. Il rallentamento della spesa relativo alla misura 3.4, è dovuto principalmente al fatto che il bando di attuazione prevede 24 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi. Le principali criticità che hanno determinato un rallentamento della misura 4.1 sono state inizialmente connesse all'adozione di un approccio dal basso che ha comportato uno sforzo notevole per il coinvolgimento di tutti gli stakeholders del territorio, cui si sono aggiunte le complessità connesse alle procedure amministrative e gestionali da adottare. A seguito della costituzione dei gruppi le principali difficoltà emerse sono le seguenti:

- difficoltà organizzative interne;
- complessità di attuazione del piano di sviluppo locale;
- difficoltà di dare attuazione a quanto previsto per la realizzare delle azioni a gestione indiretta.

Sezione 4: Iniziative che si intendono adottare per ottimizzare l'attuazione dei programmi nel corso dell'anno 2014

Fondo Sociale Europeo - PO FSE Sardegna 2007-2013

Con riferimento all'interruzione dei pagamenti evidenziata nella Sezione precedente del documento, l'Autorità di Gestione, assieme all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione, ha intrapreso una intensa interlocuzione con i servizi della Commissione Europea, confidando di addurre al verbale di controllo della Commissione le controdeduzioni utili per riattivare il flusso finanziario dei pagamenti.

Nell'anno corrente le attività che l'Autorità di Gestione dovrà mettere in campo sono riconducibili sostanzialmente alla chiusura del Programma: facilitare la trasformazione della gran parte dei dispositivi, frutto della programmazione, in operazioni attuate o da completare; presidiare tutte le aree di criticità attuative (problematiche connesse alla realizzazione delle operazioni, alla rendicontazione delle spese, ad eventuali errori rilevati a seguito di controlli, ecc).

L'Autorità di Gestione dovrà inoltre considerare le risorse ancora non programmate e le eventuali economie, per il loro pronto reinvestimento nell'ambito di interventi caratterizzati da alta velocità di realizzazione.

Vale la pena ricordare, infine, che la sovrapposizione fra la fase di completamento e chiusura dell'attuale programmazione e l'avvio della nuova programmazione 2014-2020, comporterà inevitabilmente per l'Amministrazione un incremento degli sforzi da non sottovalutare.

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - PO FESR Sardegna 2007-2013

Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'avanzamento della spesa del PO FESR ed in linea con il mandato della Giunta regionale, l'Autorità di Gestione intende procedere con una serie di iniziative che consentiranno di ottimizzare la chiusura del Programma senza incorrere nel disimpegno delle risorse. In particolare si pone in evidenza che:

- l'Ufficio di controllo di I livello presso l'Autorità di Gestione sta progressivamente sostituendo nelle attività di propria competenza gli uffici di controllo delle Direzioni generali che hanno determinato rallentamenti nelle attività propedeutiche alla certificazione delle spesa degli interventi di competenza dei Responsabili di Linea di Attività;
- sarà avviata entro breve una ulteriore ricognizione tesa ad individuare nuovi progetti retrospettivi da inserire nelle prossime certificazioni di spesa;
- l'Autorità di Gestione provvederà a promuovere presso gli Assessorati azioni per accelerare tutte le attività riguardanti i progetti in corso;
- la specifica sorveglianza delle situazioni a rischio consentirà di verificare le risorse non programmate al fine di realizzare una riprogrammazione tempestiva delle risorse non programmate, sugli Assi più performanti e in *overbooking* di programmazione.

Tali iniziative si affiancheranno necessariamente a quelle delle Direzioni generali coinvolte nell'attuazione del Programma che dovranno provvedere al potenziamento dei Servizi e dei Gruppi di lavoro interessati alla gestione, monitoraggio e controllo del Programma, e dare priorità a tutte le attività inerenti il PO FESR 2007-2013.

Ai sensi di quanto disposto dagli "Orientamenti sulla chiusura dei Programmi operativi 2007-2013", approvati con Decisione C(2013)1573 del 20.03.2013, i progetti non operativi alla data di chiusura potranno essere inclusi nella certificazione finale delle spese e potranno essere conclusi successivamente – ovvero portati "a cavallo" con la nuova programmazione 2014-2020 – unicamente se di importo pari o superiore ai 5 milioni di euro.

L'Autorità di Gestione ha, pertanto, già avviato con gli Assessorati competenti sulle operazioni, una ricognizione per conoscere lo stato di attuazione dei progetti di maggiori dimensioni e verificare la possibilità di trasferire i progetti più critici di importo superiore ai 5 milioni di euro sul prossimo ciclo di programmazione comunitaria.

Rispetto alla procedura di interruzione dei pagamenti intermedi citata nella Sezione precedente del documento¹⁷, l'Autorità di Gestione si sta adoperando per fornire entro due mesi dal ricevimento della nota in lingua italiana (non ancora pervenuta alla data della redazione del presente documento), la descrizione delle misure adottate per migliorare il sistema di gestione e controllo del programma, in

¹⁷ Nota Ares(2014) 1104501 del 08.04.2014

particolare rispetto alle procedure di selezione delle operazioni con un esame approfondito di quelle che potrebbero presentare rischi di irregolarità.

L'Autorità di Gestione, in linea con quanto indicato nella nota della Commissione Europea, ha già avviato alcune misure correttive finalizzate a superare le criticità evidenziate dagli Assessorati, in particolare ha accentrato presso il proprio ufficio di controllo di I livello l'attività di controllo di alcune Linee di Attività di competenza di altri Assessorati.

Programma di Sviluppo Rurale - PSR Sardegna 2007-2013

Anche nel corso del 2014, per ottimizzare l'attuazione del programma, verranno predisposte alcune modifiche funzionali a garantire l'accelerazione della spesa.

Al fine di trovare soluzioni operative per risolvere le problematiche tecnico/amministrative, verrà intensificata l'attività di confronto con AGEA/SIN - Assessorato regionale dell'Agricoltura – ARGEA.

L'Autorità di Gestione inoltre convocherà incontri e verifiche periodiche con i Responsabili di Misura e i competenti Servizi territoriali di ARGEA per monitorare lo stato di attuazione del programma.

Verranno inoltre riproposte, su alcune misure dell' Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, le innovative procedure di istruttoria automatizzata e semiautomatizzata, già utilizzate con successo nel 2011, 2012 e 2013 che hanno consentito di liquidare, in brevissimo tempo, un elevato numero di domande.

Fondo Europeo per la Pesca - PO FEP 2007-2013

Come è risultato evidente dai lavori del Comitato di Sorveglianza dell'11 marzo 2014, le previsioni di spesa che le Regioni hanno comunicato per il 2014 lasciano diversi dubbi sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo assegnato per l'anno in corso; si ritiene che la quota di contributo comunitario a rischio per fine anno possa superare notevolmente quella lasciata sul campo nel 2013.

Le Regioni evidenziano che il raggiungimento dell'obiettivo di spesa è fortemente condizionato da cause congiunturali riferite alla crisi economica ed alla fragilità del settore pesca, oltre che da severi problemi di governance sia interni (riferibili all'Autorità di gestione ed agli Organismi Intermedi) che esterni.

Le Regioni hanno richiesto le seguenti misure tecniche, amministrative e organizzative finalizzate ad un miglioramento della gestione del Programma operativo ed alla accelerazione della spesa con l'obiettivo di evitare, o quantomeno ridurre, la quota di disimpegno della spesa per gli anni 2014 e 2015:

- istituzione di un tavolo tecnico (possibilmente con due sottocommissioni, obiettivo convergenza ed obiettivo competitività, in considerazione delle diverse regole finanziarie) con lo scopo di monitorare continuamente ed in modo puntuale lo stato di attuazione in modo da poter proporre tempestivamente eventuali misure correttive;
- flessibilità dei piani finanziari tale da consentire rimodulazioni e assestamenti fino al termine ultimo della programmazione;
- pianificazione e controllo da parte dell'Autorità di Gestione delle attività da svolgere, in relazione alle specifiche competenze di tutti i soggetti coinvolti nella gestione concorrente della misura 1.1 Arresto definitivo (Autorità di Gestione, Capitanerie e Organismi Intermedi), finalizzati all'accelerazione delle procedure gestionali, tali da consentire la certificazione delle spese per l'anno in corso per le Regioni per le quali siano stati già pubblicati i relativi bandi;
- rafforzamento dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori e supporto ai soggetti beneficiari delle misure 3.3, 2.1 e 2.3, così da incentivare la realizzazione di spese che potrebbero essere oggetto della certificazione dell'anno 2014;
- rafforzamento dell'attività di monitoraggio e supporto ai Gruppi di azione costiera per incentivare l'emanazione dei bandi e l'avvio delle procedure a gestione diretta di attuazione del Piano di sviluppo locale, al fine della realizzazione di spese che potrebbero essere oggetto della certificazione dell'anno 2014;
- potenziare il personale del Ministero per l'azione di supporto agli Organismi intermedi su tutti gli Assi prioritari del FEP;
- garantire un riscontro da parte del Ministero ai quesiti posti dalle Regioni in tempi brevi.
- abbreviare i tempi per l'approvazione dei piani di gestione locali;
- aumentare al massimo i termini per la presentazione delle dichiarazioni di spesa da parte del Referente dell'Autorità di Certificazione;

- massimizzare l'utilizzo del SIPA (Sistema Italiano della pesca e dell'acquacoltura) per lo scarico dei dati in modo tale da evitare richieste periodiche di dati alle Regioni.

A seguito di quanto concordato nel corso dell'ultimo Comitato di Sorveglianza FEP dell'11 marzo 2014, l'Autorità di Gestione è in procinto di istituire il tavolo tecnico che avrà il compito di valutare le azioni da porre in essere per scongiurare il rischio di disimpegno automatico dei fondi per l'annualità in corso.

Con particolare riferimento alla Regione Sardegna, in relazione agli obiettivi 2014 si intendono adottare le seguenti azioni:

- ottenere l'attivazione della misura 1.1 sull'arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca da parte del Ministero, ovvero provvedere alla riprogrammazione delle relative risorse;
- giungere all'approvazione definitiva dei Piani di Gestione Locale da parte dell'Autorità di Gestione entro i prossimi mesi;
- in un'ottica di massima collaborazione, supportare, tramite ARGEA Sardegna ed il servizio competente dell'Assessorato, i due Gruppi di Azione Costiera, al fine di superare le difficoltà che impediscono l'attuazione dei Piani di sviluppo locale e l'avanzamento della spesa;
- supportare i beneficiari – anche tramite le Associazioni di Categoria - nella presentazione della rendicontazione degli interventi sostenuti.

Appendice Statistica

PO FSE

I valori riportati in Appendice relativi alla *Dotazione Finanziaria*, al *Contributo Comunitario*, al Cofinanziamento Statale e al *Cofinanziamento Regionale* del PO FSE sono relativi alla Decisione C(2013) n.4582 del 19.07.2013.

I valori relativi alla *Spesa Programmata*, *Pagamenti e Impegni* sono stati estrapolati da SRTP e caricati sul sistema di monitoraggio regionale (SIL-FSE) e sono esposti nell'apposito paragrafo relativo al PO-FSE. I valori dei *Target* sono soggetti a ridefinizione.

PO FESR

I valori riportati in Appendice relativi alla *Dotazione Finanziaria*, al *Contributo Comunitario*, al Cofinanziamento Statale e al *Cofinanziamento Regionale* del PO FESR sono relativi alla Decisione C(2012) n.9845 del 19.12.2012.

I valori relativi alla *Spesa Programmata*, *Pagamenti e Impegni* (anni 2012 e 2013) caricati sul sistema di monitoraggio sono considerati al netto dei progetti PAC.

I dati relativi ai *Target intermedi* del 2013 (nota MISE 1416-U del 16 aprile 2013 e successive interlocuzioni nell'ambito del Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria) sono stati oggetto di ridefinizione.

PSR

I valori riportati in Appendice relativi alla *Dotazione Finanziaria*, al *Contributo Comunitario*, al Cofinanziamento Statale e al *Cofinanziamento Regionale* del PSR sono relativi alla riprogrammazione avviata con procedura scritta nel mese di dicembre 2013.

PO FEP

I valori riportati in Appendice relativi alla *Dotazione Finanziaria*, al *Contributo Comunitario*, al Cofinanziamento Statale e al *Cofinanziamento Regionale* del PO FEP sono relativi alla riprogrammazione avviata con procedura scritta nel mese di aprile 2014.

PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
	Dotazione Finanziaria - Valori in Euro			
PO FSE	675.053.206	291.716.408	295.821.776	87.515.022
Asse I – Adattabilità	123.049.518	49.219.807	59.063.769	14.765.942
Asse II – Occupabilità	174.963.009	69.985.204	83.982.244	20.995.561
Asse III - Inclusione Sociale	89.832.455	35.932.982	43.119.578	10.779.895
Asse IV - Capitale Umano	249.564.324	121.520.855	91.587.112	36.456.357
Asse V – Transnazionalità	11.280.104	4.512.042	5.414.450	1.353.613
Asse VI - Assistenza tecnica	26.363.796	10.545.518	12.654.622	3.163.656
	Composizione percentuale per Origine della Contribuzione			
PO FSE	100,0	43,2	43,8	13,0
Asse I – Adattabilità	100,0	40,0	48,0	12,0
Asse II – Occupabilità	100,0	40,0	48,0	12,0
Asse III - Inclusione Sociale	100,0	40,0	48,0	12,0
Asse IV - Capitale Umano	100,0	48,7	36,7	14,6
Asse V – Transnazionalità	100,0	40,0	48,0	12,0
Asse VI - Assistenza tecnica	100,0	40,0	48,0	12,0
	Composizione percentuale per Asse			
Totale PO FSE	100,0	100,0	100,0	100,0
Asse I – Adattabilità	18,2	16,9	20,0	16,9
Asse II – Occupabilità	25,9	24,0	28,4	24,0
Asse III - Inclusione Sociale	13,3	12,3	14,6	12,3
Asse IV - Capitale Umano	37,0	41,7	31,0	41,7
Asse V – Transnazionalità	1,7	1,5	1,8	1,5
Asse VI - Assistenza tecnica	3,9	3,6	4,3	3,6

segue PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.12.12	30.03.13	31.07.13	31.10.13	31.12.13	21.03.14
Spesa Programmata (delibere e avvisi) – comunicata dai RdL										
PO FSE	598.604.969	601.604.969	626.699.292	704.739.324	-	643.842.606	740.128.783		742.754.239	-
Asse I – Adattabilità	70.317.946	70.317.946	78.727.153	94.770.701	-	121.325.035	120.986.523		120.410.431	-
Asse II – Occupabilità	77.924.623	77.924.623	90.667.175	137.633.330	-	168.083.632	159.430.632		170.223.454	-
Asse III - Inclusione Sociale	77.571.244	77.571.244	75.890.357	75.890.357	-	88.890.396	85.204.396		85.204.396	-
Asse IV - Capitale Umano	343.450.372	346.450.372	358.362.402	370.927.921	-	238.812.264	345.052.801		336.866.236	-
Asse V - Transnazionalità	9.573.820	9.573.820	9.276.030	10.288.840	-	9.820.339	10.468.088		10.867.694	-
Asse VI - Assistenza tecnica	19.766.964	19.766.964	13.776.176	15.228.176	-	16.910.940	18.986.343		19.182.028	-
Impegni Caricati sul Sistema di Monitoraggio										
PO FSE	391.023.679	396.759.401	411.214.149	413.916.790	469.296.951	488.920.082	543.131.711	554.283.747	596.153.533	601.954.956
Asse I – Adattabilità	35.998.879	38.158.978	45.174.462	45.548.559	59.677.348	65.264.036	67.834.149	75.923.489	82.831.515	90.002.424
Asse II – Occupabilità	40.443.256	40.623.315	44.033.577	44.079.351	62.554.289	75.599.368	84.174.309	85.140.634	105.767.999	108.432.369
Asse III - Inclusione Sociale	68.833.358	68.833.358	68.980.258	68.980.258	69.219.152	69.219.152	69.219.112	69.219.113	72.322.957	71.170.748
Asse IV - Capitale Umano	236.117.018	239.175.878	243.010.599	243.028.690	261.305.617	262.296.980	305.180.810	307.273.030	316.148.442	314.302.305
Asse V - Transnazionalità	3.445.380	3.521.703	3.553.703	5.818.383	5.821.028	5.821.028	5.821.028	5.821.028	6.863.789	5.828.278
Asse VI - Assistenza tecnica	6.185.789	6.446.168	6.461.549	6.461.549	10.719.518	10.719.518	10.902.303	10.906.453	12.218.831	12.218.831
Pagamenti Caricati sul Sistema di Monitoraggio										
PO FSE	292.658.908	305.127.962	315.246.625	319.687.778	385.746.242	409.693.255	447.215.599	458.431.815	499.126.616	498.881.730
Asse I – Adattabilità	23.583.069	32.348.904	36.139.522	37.192.797	52.050.109	58.144.860	59.792.242	66.722.688	73.949.670	76.817.647
Asse II – Occupabilità	28.386.165	28.674.225	30.905.698	31.187.539	56.346.852	69.165.406	76.694.706	78.092.355	97.092.952	99.897.431
Asse III - Inclusione Sociale	55.255.686	55.431.519	55.994.716	55.994.716	62.318.835	62.700.116	63.657.924	63.657.924	66.721.081	66.536.312
Asse IV - Capitale Umano	181.856.639	184.899.968	187.564.392	190.660.829	207.794.525	212.426.677	238.656.093	241.305.079	250.417.440	244.759.412
Asse V - Transnazionalità	1.315.444	1.391.767	1.989.384	1.998.984	3.225.442	3.245.716	3.741.227	3.742.827	4.177.450	4.054.104
Asse VI - Assistenza tecnica	2.261.905	2.381.579	2.652.912	2.652.912	4.010.480	4.010.480	4.673.407	4.910.942	6.768.024	6.816.826

segue PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	31.05.12	31.07.12	31.10.12	31.12.12	30.05.13	31.07.13	31.10.13	31.12.13	31.05.14	31.10.14	31.12.14
Spesa Certificata												
PO FSE	277.103.853	295.982.319	296.067.019	-	398.508.730	430.360.103	437.641.060	466.287.778	468.457.133			
Asse I – Adattabilità	29.406.809	31.156.660	31.241.360	-	58.109.780	65.610.759	66.757.205	71.361.620	71.577.653			
Asse II – Occupabilità	26.846.854	29.453.157	29.453.157	-	68.569.358	74.668.599	75.470.790	86.882.639	87.533.327			
Asse III - Inclusione Sociale	51.683.542	53.036.554	53.036.554	-	57.976.047	61.628.780	62.630.123	63.471.178	63.467.706			
Asse IV - Capitale Umano	165.636.678	177.981.510	177.981.510	-	207.469.255	220.605.265	224.483.076	234.092.424	235.301.263			
Asse V – Transnazionalità	1.150.074	1.530.249	1.530.249	-	2.695.500	3.116.462	3.476.457	4.502.775	3.859.337			
Asse VI - Assistenza tecnica	2.379.897	2.824.189	2.824.189	-	3.688.789	4.730.238	4.823.408	5.977.143	6.717.849			
Previsioni di Spesa												
PO FSE	-	-	-	355.830.694	391.592.906	429.791.708	-	465.078.269	499.411.657	506.280.242	nd	nd
Asse I – Adattabilità	-	-	-	48.273.834	51.928.834	65.465.961	-	71.476.596	86.956.891	90.204.311	nd	nd
Asse II – Occupabilità	-	-	-	51.308.156	58.637.134	74.608.593	-	85.121.777	93.321.807	98.896.260	nd	nd
Asse III - Inclusione Sociale	-	-	-	54.350.093	58.393.251	61.438.515	-	63.410.739	64.100.739	64.293.656	nd	nd
Asse IV - Capitale Umano	-	-	-	197.060.101	213.511.132	220.765.973	-	235.264.001	244.333.924	240.679.764	nd	nd
Asse V – Transnazionalità	-	-	-	1.545.595	4.547.809	2.999.469	-	3.821.806	4.154.606	4.405.898	nd	nd
Asse VI - Assistenza tecnica	-	-	-	3.292.914	4.574.746	4.513.197	-	5.983.350	6.543.689	7.800.353	nd	nd
Target												
PO FSE	-	-	-	348.318.149	391.482.313	415.378.563	-	463.578.660	484.556.270	485.122.820	498.046.062	535.864.337*
Asse I – Adattabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse II - Occupabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse III - Inclusione Sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse IV - Capitale Umano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse V - Transnazionalità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse VI - Assistenza tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* target n+2

segue PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.10.12	31.12.12	30.03.13	30.05.13	31.07.2013	31.10.13	31.12.13	21.03.14	31.05.14
	Differenza tra Previsioni di Spesa e Target												
PO FSE	-	-	-	-	7.512.545	110.593	-	14.413.145	-	1.499.609	14.855.387	-	21.157.422
Asse I - Adattabilità	-	-	-	-	48.273.834	51.928.834	-	65.465.961	-	71.476.596	86.956.891	-	-
Asse II - Occupabilità	-	-	-	-	51.308.156	58.637.134	-	74.608.593	-	85.121.777	93.321.807	-	-
Asse III - Inclusione Sociale	-	-	-	-	54.350.093	58.393.251	-	61.438.515	-	63.410.739	64.100.739	-	-
Asse IV - Capitale Umano	-	-	-	-	197.060.101	213.511.132	-	220.765.973	-	235.264.001	244.333.924	-	-
Asse V - Transnazionalità	-	-	-	-	1.545.595	4.547.809	-	2.999.469	-	3.821.806	4.154.606	-	-
Asse VI - Assistenza tecnica	-	-	-	-	3.292.914	4.574.746	-	4.513.197	-	5.983.350	6.543.689	-	-
	Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni												
PO FSE	74,8	76,9	76,7	77,2		82,2	83,8		82,3	82,7	83,7	82,9	
Asse I - Adattabilità	65,5	84,8	80,0	81,7		87,2	89,1		88,1	87,9	89,3	85,4	
Asse II - Occupabilità	70,2	70,6	70,2	70,8		90,1	91,5		91,1	91,7	91,8	92,1	
Asse III - Inclusione Sociale	80,3	80,5	81,2	81,2		90,0	90,6		92,0	92,0	92,3	93,5	
Asse IV - Capitale Umano	77,0	77,3	77,2	78,5		79,5	81,0		78,2	78,5	79,2	77,9	
Asse V - Transnazionalità	38,2	39,5	56,0	34,4		55,4	55,8		64,3	64,3	60,9	69,6	
Asse VI - Assistenza tecnica	36,6	36,9	41,1	41,1		37,4	37,4		42,9	45,0	55,4	55,8	
	Percentuale della Spesa Certificata sulla Spesa Programmata												
PO FSE	46,3	0,0	47,2	42,0			0,0		59,1		63,1		
Asse I - Adattabilità	41,8	0,0	39,6	33,0			0,0		55,2		59,4		
Asse II - Occupabilità	34,5	0,0	32,5	21,4			0,0		47,3		51,4		
Asse III - Inclusione Sociale	66,6	0,0	69,9	69,9			0,0		73,5		74,5		
Asse IV - Capitale Umano	48,2	0,0	49,7	48,0			0,0		65,1		69,9		
Asse V - Transnazionalità	12,0	0,0	16,5	14,9			0,0		33,2		35,5		
Asse VI - Assistenza tecnica	12,0	0,0	20,5	18,5			0,0		25,4		35,0		

segue PO FSE Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.12.12	30.03.13	31.07.13	31.10.2013	31.12.13	21.03.14
	Percentuale degli Impegni sulla Dotazione Iniziale									
PO FSE	53,6	54,4	56,4	56,8	64,3	78,3	80,5	82,1	88,3	89,2
Asse I – Adattabilità	26,1	27,6	32,7	33,0	43,2	57,4	55,1	61,7	67,3	73,1
Asse II – Occupabilità	26,0	26,2	28,4	28,4	40,3	67,8	48,1	48,7	60,5	62,0
Asse III - Inclusione Sociale	76,6	76,6	76,8	76,8	77,1	83,0	77,1	77,1	80,5	79,2
Asse IV - Capitale Umano	77,1	78,1	79,3	79,3	85,3	95,7	122,3	123,1	126,7	125,9
Asse V – Transnazionalità	30,5	31,2	31,5	51,6	51,6	59,6	51,6	51,6	60,8	51,7
Asse VI - Assistenza tecnica	21,7	22,6	22,7	22,7	37,6	43,2	41,4	41,4	46,3	46,3
	Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Iniziale									
PO FSE	40,1	41,8	43,2	43,8	52,9	61,8	66,2	67,9	73,9	73,9
Asse I – Adattabilità	17,1	23,4	26,2	26,9	37,7	50,6	48,6	54,2	60,1	62,4
Asse II – Occupabilità	18,3	18,5	19,9	20,1	36,3	52,2	43,8	44,6	55,5	57,1
Asse III - Inclusione Sociale	61,5	61,7	62,3	62,3	69,4	73,7	70,9	70,9	74,3	74,1
Asse IV - Capitale Umano	59,4	60,4	61,2	62,2	67,8	73,1	95,6	96,7	100,3	98,1
Asse V – Transnazionalità	11,7	12,3	17,6	17,7	28,6	28,5	33,2	33,2	37,0	35,9
Asse VI - Assistenza tecnica	7,9	8,4	9,3	9,3	14,1	23,1	17,7	18,6	25,7	25,9
	Percentuale di Spesa Certificata sulla Dotazione Iniziale									
PO FSE	38,0	-	40,6	40,6	54,6	-	64,8	69,1	110,0	0,0
Asse I – Adattabilità	21,3	-	22,6	22,6	42,1	-	54,3	58,0	97,9	0,0
Asse II – Occupabilità	17,3	-	19,0	19,0	44,1	-	43,1	49,7	97,3	0,0
Asse III - Inclusione Sociale	57,5	-	59,0	59,0	64,5	-	69,7	70,7	94,8	0,0
Asse IV - Capitale Umano	54,1	-	58,1	58,1	67,7	-	89,9	93,8	135,0	0,0
Asse V – Transnazionalità	10,2	-	13,6	13,6	23,9	-	30,8	39,9	96,3	0,0
Asse VI - Assistenza tecnica	8,4	-	9,9	9,9	13,0	-	18,3	22,7	72,8	0,0

PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
	Dotazione Finanziaria - Valori in Euro			
PO FESR	1.361.343.530	680.671.765	456.104.353	224.567.412
Asse I - Società dell'Informazione	177.737.408	88.868.704	59.549.117	29.319.586
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	54.702.254	13.675.564	27.491.154	13.535.536
Asse III - Energia	164.674.100	88.924.014	50.758.597	24.991.488
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	273.858.391	68.464.598	137.630.217	67.763.575
Asse V - Sviluppo Urbano	196.836.921	88.576.614	72.543.037	35.717.269
Asse VI - Competitività	457.815.434	323.232.516	90.181.285	44.401.632
Asse VII - Assistenza tecnica	35.719.021	8.929.755	17.950.944	8.838.321
	Composizione percentuale per Origine della Contribuzione			
PO FESR	100,0	50,0	33,5	16,5
Asse I - Società dell'Informazione	100,0	50,0	33,5	16,5
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	100,0	25,0	50,3	24,7
Asse III - Energia	100,0	54,0	30,8	15,2
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	100,0	25,0	50,3	24,7
Asse V - Sviluppo Urbano	100,0	45,0	36,9	18,1
Asse VI - Competitività	100,0	70,6	19,7	9,7
Asse VII - Assistenza tecnica	100,0	25,0	50,3	24,7
	Composizione percentuale per Asse			
PO FESR	100,0	100,0	100,0	100,0
Asse I - Società dell'Informazione	13,1	13,1	13,1	13,1
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	4,0	2,0	6,0	6,0
Asse III - Energia	12,1	13,1	11,1	11,1
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	20,1	10,1	30,2	30,2
Asse V - Sviluppo Urbano	14,5	13,0	15,9	15,9
Asse VI - Competitività	33,6	47,5	19,8	19,8
Asse VII - Assistenza tecnica	2,6	1,3	3,9	3,9

segue PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.12.12	30.03.13	31.05.13	31.07.13	31.12.13	28.02.14
Spesa Programmata (delibere e avvisi)										
PO FESR	1.362.113.943	1.362.113.943	1.220.126.643	1.401.869.973	1.089.412.569	1.084.950.561	1.291.041.686		1.510.461.423	1.539.038.401
Asse I - Società dell'Informazione	130.216.995	130.216.995	75.764.068	196.357.805	99.754.855	106.365.672	109.708.995		179.341.780	187.720.371
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	134.194.250	134.194.250	119.575.555	60.850.240	53.907.384	53.927.178	63.381.741		68.992.776	68.992.776
Asse III - Energia	163.653.539	163.653.539	140.118.419	164.674.100	156.765.193	156.754.098	170.518.277		179.147.471	179.119.497
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	244.660.230	244.660.230	261.531.769	300.591.187	182.319.082	183.828.079	275.789.548		303.153.632	372.831.105
Asse V - Sviluppo Urbano	271.036.921	271.036.921	265.048.051	239.409.975	202.862.510	191.869.580	253.235.462		300.306.710	250.267.517
Asse VI - Competitività	382.632.988	382.632.988	343.150.578	404.051.321	368.067.085	366.504.144	392.634.203		447.426.291	447.996.947
Asse VII - Assistenza tecnica	35.719.021	35.719.021	14.938.202	35.935.345	25.736.460	25.701.809	25.773.460		32.092.763	32.110.186
Impegni Caricati sul Sistema di Monitoraggio										
PO FESR	563.620.648	571.055.104	649.827.924	758.395.078	839.627.992	834.702.014	884.364.135	906.878.772	1.138.046.344	1.153.049.508
Asse I - Società dell'Informazione	59.366.068	60.462.511	60.542.545	61.595.988	86.708.585	97.570.392	101.870.211	104.726.630	108.354.258	116.337.997
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	11.294.071	12.829.647	23.812.492	52.318.616	33.163.165	36.956.318	43.932.524	46.629.692	60.184.825	60.275.479
Asse III - Energia	35.158.897	35.258.798	70.030.182	107.278.802	116.878.074	116.909.401	119.016.012	120.024.074	126.845.101	127.234.961
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	48.140.309	50.341.966	56.874.914	61.149.486	97.175.282	86.886.283	94.037.280	102.409.834	186.866.220	188.734.332
Asse V - Sviluppo Urbano	81.721.793	82.147.692	116.599.375	138.361.061	133.667.194	125.974.078	153.343.226	159.852.416	214.456.178	215.608.395
Asse VI - Competitività	306.459.716	307.783.116	307.081.804	316.099.856	341.410.796	344.831.641	346.531.795	347.527.885	409.362.052	413.001.858
Asse VII - Assistenza tecnica	21.479.792	22.231.373	14.886.611	21.591.269	30.624.896	25.573.900	25.633.086	25.708.242	31.977.708	31.856.486
Pagamenti Caricati sul Sistema di Monitoraggio										
PO FESR	480.143.176	487.343.013	506.889.871	553.292.932	644.150.828	651.702.187	687.631.559	713.783.757	879.869.939	886.356.487
Asse I - Società dell'Informazione	37.860.085	40.816.784	35.131.954	39.291.166	54.730.169	63.248.265	65.885.495	68.775.120	78.395.484	79.222.083
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	10.590.392	11.797.543	16.844.782	19.378.948	28.557.539	28.629.532	29.920.039	34.411.063	47.065.470	47.436.446
Asse III - Energia	35.121.488	35.170.639	39.611.819	62.005.361	65.732.662	65.770.264	73.866.221	79.188.274	85.654.540	86.653.144
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	32.488.494	33.616.150	38.287.844	43.407.302	57.492.932	58.874.083	59.862.545	68.875.755	114.863.482	115.925.735
Asse V - Sviluppo Urbano	67.617.521	68.043.419	80.761.203	86.647.404	104.977.549	100.414.193	121.289.939	124.379.467	173.140.533	174.764.239
Asse VI - Competitività	286.344.460	287.348.580	286.687.432	288.896.599	316.055.006	317.922.069	318.993.444	320.149.030	359.201.449	360.711.750
Asse VII - Assistenza tecnica	10.120.735	10.549.898	9.564.837	13.666.152	16.604.971	16.843.782	17.813.876	18.005.049	21.548.980	21.643.087

segue PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	31.05.12	31.10.12	31.12.12	31.05.13	31.10.2013	31.12.13	31.05.14	31.10.04	31.12.14
Spesa Certificata										
PO FESR	453.633.459	480.021.958	-	596.351.896	612.839.524	624.169.373	784.838.892			967.853.074
Asse I - Società dell'Informazione	23.016.619	29.748.158	-	60.548.717	62.457.939	59.510.360	73.414.565			93.094.618
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	10.366.054	15.874.913	-	24.381.909	25.435.699	26.593.481	39.131.800			56.092.002
Asse III - Energia	35.374.162	36.041.378	-	39.381.691	42.425.943	43.013.714	46.882.044			92.520.024
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	24.826.956	27.758.528	-	39.546.758	41.867.095	44.553.640	104.908.117			148.472.170
Asse V - Sviluppo Urbano	67.101.211	75.656.461	-	101.746.585	106.948.937	115.288.386	148.392.738			192.852.384
Asse VI - Competitività	284.545.237	284.545.237	-	314.553.162	316.019.837	316.526.872	350.928.467			362.687.714
Asse VII - Assistenza tecnica	8.403.219	10.397.282	-	16.193.073	17.684.074	18.682.920	21.181.162			22.134.163
Previsioni di Spesa										
PO FESR	-	-	293.134.874	315.827.922	-		800.380.461	n.d.	n.d.	967.853.074
Asse I - Società dell'Informazione	-	-	17.743.126	26.070.010	-		-	n.d.	n.d.	93.094.618
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	-	-	4.792.168	5.843.384	-		-	n.d.	n.d.	56.092.002
Asse III - Energia	-	-	19.932.282	21.666.088	-		-	n.d.	n.d.	92.520.024
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	-	-	6.971.096	11.245.490	-		-	n.d.	n.d.	148.472.170
Asse V - Sviluppo Urbano	-	-	38.549.550	43.098.258	-		-	n.d.	n.d.	192.852.384
Asse VI - Competitività	-	-	201.528.734	203.607.231	-		-	n.d.	n.d.	362.687.714
Asse VII - Assistenza tecnica	-	-	3.617.918	4.297.462	-		-	n.d.	n.d.	22.134.163
Target										
PO FESR	-	218.984.186	267.272.611	335.522.891	637.800.000		779.600.000	935.239.697	1.013.762.058	1.001.988.800*
Asse I - Società dell'Informazione	-	28.590.639	34.895.190	43.805.966	-		-	122.105.167	132.357.070	62.430.866
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	-	8.799.343	10.739.695	13.482.165	-		-	37.580.316	40.735.545	43.423.177
Asse III - Energia	-	26.489.290	32.330.470	40.586.324	-		-	113.130.707	122.629.117	130.719.886
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	-	44.052.552	53.766.625	67.496.379	-		-	188.140.049	203.936.214	217.391.427
Asse V - Sviluppo Urbano	-	31.662.965	38.644.998	48.513.319	-		-	135.226.486	146.580.050	156.251.043
Asse VI - Competitività	-	73.643.675	89.882.916	112.835.265	-		-	314.518.091	340.924.907	363.418.299
Asse VII - Assistenza tecnica	-	5.745.721	7.012.716	8.803.472	-		-	24.538.881	26.599.155	28.354.103

* target n+2

segue PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.10.12	31.12.12	30.03.13	31.05.13	31.07.13	31.12.13	28.02.14	31.12.14
	Differenza tra Previsioni di spesa e Target											
PO FESR	-	-	- 218.984.186	-	-25.862.263	- 19.694.969	-	-637.800.000	-	20.780.461	-	- 34.135.726
Asse I - Società dell'Informazione	-	-	- 28.590.639	-	- 17.152.064	- 17.735.956	-	-	-	-	-	30.663.752
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	-	-	- 8.799.343	-	- 5.947.527	- 7.638.781	-	-	-	-	-	12.668.825
Asse III - Energia	-	-	- 26.489.290	-	- 12.398.188	- 18.920.236	-	-	-	-	-	- 38.199.862
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	-	-	- 44.052.552	-	- 46.795.529	- 56.250.889	-	-	-	-	-	- 68.919.257
Asse V - Sviluppo Urbano	-	-	- 31.662.965	-	- 95.448	- 5.415.061	-	-	-	-	-	36.601.341
Asse VI - Competitività	-	-	- 73.643.675	-	111.645.818	90.771.966	-	-	-	-	-	- 730.585
Asse VII - Assistenza tecnica	-	-	- 5.745.721	-	- 3.394.798	- 4.506.010	-	-	-	-	-	- 6.219.940
	Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni											
PO FESR	85,2	85,3	78,0	73,0		76,7	78,1	77,8	78,7	77,3	76,9	
Asse I - Società dell'Informazione	63,8	67,5	58,0	63,8		63,1	64,8	64,7	65,7	72,4	68,1	
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	93,8	92,0	70,7	37,0		86,1	77,5	68,1	73,8	78,2	78,7	
Asse III - Energia	99,9	99,7	56,6	57,8		56,2	56,3	62,1	66,0	67,5	68,1	
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	67,5	66,8	67,3	71,0		59,2	67,8	63,7	67,3	61,5	61,4	
Asse V - Sviluppo Urbano	82,7	82,8	69,3	62,6		78,5	79,7	79,1	77,8	80,7	81,1	
Asse VI - Competitività	93,4	93,4	93,4	91,4		92,6	92,2	92,1	92,1	87,7	87,3	
Asse VII - Assistenza tecnica	47,1	47,5	64,3	63,3		54,2	65,9	69,5	70,0	67,4	67,9	
	Percentuale della Spesa Certificata sulla Spesa Programmata											
PO FESR	33,3	-	39,3	-		54,7	-	47,5		52,0	-	
Asse I - Società dell'Informazione	17,7	-	39,3	-		60,7	-	56,9		40,9	-	
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	7,7	-	13,3	-		45,2	-	40,1		56,7	-	
Asse III - Energia	21,6	-	25,7	-		25,1	-	24,9		26,2	-	
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	10,1	-	10,6	-		21,7	-	15,2		34,6	-	
Asse V - Sviluppo Urbano	24,8	-	28,5	-		50,2	-	42,2		49,4	-	
Asse VI - Competitività	74,4	-	82,9	-		85,5	-	80,5		78,4	-	
Asse VII - Assistenza tecnica	23,5	-	69,6	-		62,9	-	68,6		66,0	-	

segue PO FESR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.07.12	31.12.12	28.02.13	31.05.13	31.07.13	31.10.13	31.12.13	28.02.14
Percentuale degli Impegni sulla Dotazione Iniziale											
PO FESR	41,4	41,9	47,7	55,7	61,7	61,3	65,0	66,6		83,6	84,7
Asse I - Società dell'Informazione	33,4	34	34,1	34,7	48,8	54,9	57,3	58,9		61,0	65,5
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	20,6	23,5	43,5	95,6	60,6	67,6	80,3	85,2		110,0	110,2
Asse III - Energia	21,4	21,4	42,5	65,1	71	71	72,3	72,9		77,0	77,3
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	17,6	18,4	20,8	22,3	35,5	31,7	34,3	37,4		68,2	68,9
Asse V - Sviluppo Urbano	41,5	41,7	59,2	70,3	67,9	64	77,9	81,2		109,0	109,5
Asse VI - Competitività	66,9	67,2	67,1	69	74,6	75,3	75,7	75,9		89,4	90,2
Asse VII - Assistenza tecnica	60,1	62,2	41,7	60,4	85,7	71,6	71,8	72,0		89,5	89,2
Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Iniziale											
PO FESR	35,3	35,8	37,2	40,6	47,3	47,9	50,5	52,4		64,6	65,1
Asse I - Società dell'Informazione	21,3	23	19,8	22,1	30,8	35,6	37,1	38,7		44,1	44,6
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	19,4	21,6	30,8	35,4	52,2	52,3	54,7	62,9		86,0	86,7
Asse III - Energia	21,3	21,4	24,1	37,7	39,9	39,9	44,9	48,1		52,0	52,6
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	11,9	12,3	14	15,9	21	21,5	21,9	25,2		41,9	42,3
Asse V - Sviluppo Urbano	34,4	34,6	41	44	53,3	51	61,6	63,2		88,0	88,8
Asse VI - Competitività	62,5	62,8	62,6	63,1	69	69,4	69,7	69,9		78,5	78,8
Asse VII - Assistenza tecnica	28,3	29,5	26,8	38,3	46,5	47,2	49,9	50,4		60,3	60,6
Percentuale di Spesa Certificata sulla Dotazione Iniziale											
PO FESR	33,3	-	35,3	-	43,8	-	45,0		45,8	57,7	
Asse I - Società dell'Informazione	12,9	-	16,7	-	34,1	-	35,1		33,5	41,3	
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	18,9	-	29	-	44,6	-	46,5		48,6	71,5	
Asse III - Energia	21,5	-	21,9	-	23,9	-	25,8		26,1	28,5	
Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale	9,1	-	10,1	-	14,4	-	15,3		16,3	38,3	
Asse V - Sviluppo Urbano	34,1	-	38,4	-	51,7	-	54,3		58,6	75,4	
Asse VI - Competitività	62,2	-	62,2	-	68,7	-	69,0		69,1	76,7	
Asse VII - Assistenza tecnica	23,5	-	29,1	-	45,3	-	49,5		52,3	59,3	

PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
	Dotazione Finanziaria - Valori in Euro			
PSR	1.284.746.987	571.596.000	620.017.109	93.133.878
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	318.764.940	154.124.859	130.813.287	56.062.837
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	769.890.909	338.752.000	431.138.909	0
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	22.327.989	12.047.214	7.196.543	3.084.233
Asse IV - Leader	162.419.318	61.680.641	46.421.589	32.081.045
Assistenza Tecnica	11.343.831	4.991.286	4.446.782	1.905.764
	Composizione percentuale per Origine della Contribuzione			
PSR	100,0	44,5	48,3	7,2
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	100,0	48,4	41,0	17,6
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	100,0	44,0	56,0	0,0
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	100,0	54,0	32,2	13,8
Asse IV - Leader	100,0	38,0	28,6	19,8
Assistenza Tecnica	100,0	44,0	39,2	16,8
	Composizione percentuale per Asse			
PSR	100,0	100,0	100,0	100,0
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	24,8	27,0	21,1	60,2
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	59,9	59,3	69,5	0,0
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	1,7	2,1	1,2	3,3
Asse IV - Leader	12,6	10,8	7,5	34,4
Assistenza Tecnica	0,9	0,9	0,7	2,0

segue PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.12.12	30.03.13	30.06.2013	14.10.2013	31.12.13
Spesa Programmata (delibere e avvisi)								
PSR	1.099.567.287	1.108.217.290	1.229.388.365	1.267.698.073	1.267.698.073	1.267.698.073	1.267.171.855	1.271.399.051
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	235.211.730	235.211.730	296.039.940	309.352.767	309.352.767	309.352.767	309.352.767	330.377.866
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	663.394.810	672.044.810	726.687.678	764.640.909	764.640.909	764.640.909	764.640.909	769.890.909
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	23.143.411	23.143.411	28.843.411	22.327.989	22.327.989	22.327.989	22.327.989	22.327.989
Asse IV - Leader	169.926.136	169.926.136	169.926.136	162.419.318	162.419.318	162.419.318	162.419.318	140.183.275
Assistenza Tecnica	7.891.200	7.891.200	7.891.200	8.957.090	8.957.090	8.430.872	8.430.872	8.619.012
Impegni Caricati sul Sistema di Monitoraggio								
PSR	787.044.281	795.291.860	856.895.919	893.774.341	906.521.811	970.799.885	970.799.885	1.060.646.181
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	85.794.860	94.042.430	109.456.577	152.661.745	162.194.907	164.435.912	164.435.912	220.237.190
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	663.394.810	663.394.810	708.491.733	696.026.800	696.026.800	747.071.248	747.071.248	769.815.517
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	10.843.411	10.843.410	10.966.411	13.128.623	13.603.804	14.910.316	14.910.316	17.398.704
Asse IV - Leader	20.000.000	20.000.000	20.090.000	24.078.353	26.805.102	36.121.537	36.121.537	44.645.608
Assistenza Tecnica	7.011.200	7.011.200	7.891.200	7.878.820	7.891.198	8.260.872	8.260.872	8.549.162
Pagamenti Caricati sul Sistema di Monitoraggio								
PSR	478.064.209	481.522.920	515.495.791	664.441.957	669.636.619	685.865.153	713.766.373	836.043.586
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	34.145.159	36.084.140	48.517.997	90.206.606	90.681.610	93.493.724	101.909.573	133.904.462
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	433.783.765	435.271.750	456.208.010	557.995.305	562.714.963	575.009.115	589.453.418	674.913.363
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	5.421.705	5.421.710	5.421.710	8.089.517	8.089.517	8.089.517	12.036.493	10.976.594
Asse IV - Leader	2.524.172	2.555.920	2.924.446	5.271.281	5.271.281	6.083.870	6.809.650	11.833.198
Assistenza Tecnica	2.189.407	2.189.410	2.423.633	2.879.249	2.879.249	3.188.927	3.557.239	4.415.969

segue PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
	Spesa Certificata			
PSR	478.064.209	664.441.957	835.810.417	
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	34.145.159	90.206.606	133.861.827	
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	433.783.765	557.995.305	674.722.828	
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	5.421.705	8.089.517	10.976.594	
Asse IV - Leader	2.524.172	5.271.281	11.833.198	
Assistenza Tecnica	2.189.407	2.879.249	4.415.969	
	Previsioni di Spesa			
PSR	-	660.844.970	855.724.620	1.017.671.182
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	-	103.419.159	149.030.561	208.934.471
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	-	539.090.526	667.443.893	756.319.593
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	-	6.921.705	17.357.327	14.567.951
Asse IV - Leader	-	8.524.172	17.851.280	31.933.198
Assistenza Tecnica	-	2.889.408	4.041.559	5.915.969
	Target			
PSR	-	658.473.860	844.314.773	1.017.350.287
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	-	-	-	-
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	-	-	-	-
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	-	-	-	-
Asse IV - Leader	-	-	-	-
Assistenza Tecnica	-	-	-	-

segue PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	31.12.12	30.03.13	30.06.2013	14.10.2013	31.12.13	31.12.14
	Differenza tra Previsioni di Spesa e Target								
PSR	478.064.209	-	-	5.968.097	-	-	-	11.409.847	320.895
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	34.145.159	-	-	90.206.606	-	-	-	-	-
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	433.783.765	-	-	557.995.305	-	-	-	-	-
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	5.421.705	-	-	8.089.517	-	-	-	-	-
Asse IV - Leader	2.524.172	-	-	5.271.281	-	-	-	-	-
Assistenza Tecnica	2.189.407	-	-	2.879.249	-	-	-	-	-
	Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni								
PSR	60,7	60,5	60,2	74,3	73,9	70,6	73,5	78,8	
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	39,8	38,4	44,3	59,1	55,9	56,9	62,0	60,8	
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	65,4	65,6	64,4	80,2	80,8	77,0	78,9	87,7	
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	50,0	50,0	49,4	61,6	59,5	54,3	80,7	63,1	
Asse IV - Leader	12,6	12,8	14,6	21,9	19,7	16,8	18,9	26,5	
Assistenza Tecnica	31,2	31,2	30,7	36,5	36,5	38,6	43,1	51,7	
	Percentuale della Spesa Certificata sulla Spesa Programmata								
PSR	43,5	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0	65,7	
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	14,5	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	40,5	
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	65,4	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	87,6	
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	23,4	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0	0,0	49,2	
Asse IV - Leader	1,5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	8,4	
Assistenza Tecnica	27,7	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	51,2	

segue PSR Sardegna 2007-2013 - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	29.02.12	31.05.12	31.07.12	30.03.13	31.05.13	30.06.2013	14.10.2013	31.12.13
Percentuale degli Impegni sulla Dotazione Iniziale								
PSR	61,3	61,9	66,7	69,6	70,6	75,6	75,6	82,6
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	26,9	29,5	34,3	47,9	50,9	51,6	51,6	17,1
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	86,2	86,2	92	90,4	90,4	97,0	97,0	59,9
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	48,6	48,6	49,1	58,8	60,9	66,8	66,8	1,4
Asse IV - Leader	12,3	12,3	12,4	14,8	16,5	22,2	22,2	3,5
Assistenza Tecnica	61,8	61,8	69,6	69,5	69,6	72,8	72,8	0,7
Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Iniziale								
PSR	37,2	37,5	40,1	51,7	52,1	53,4	55,6	65,1
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	10,7	11,3	15,2	28,3	28,4	29,3	32,0	10,4
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	56,3	56,5	59,3	72,5	73,1	74,7	76,6	52,5
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	24,3	24,3	24,3	36,2	36,2	36,2	53,9	0,9
Asse IV - Leader	1,6	1,6	1,8	3,2	3,2	3,7	4,2	0,9
Assistenza Tecnica	19,3	19,3	21,4	25,4	25,4	28,1	31,4	0,3
Percentuale di Spesa Certificata sulla Dotazione Iniziale								
PSR	37,2	-	-	51,7	-	-	-	65,1
Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	10,7	-	-	28,3	-	-	-	10,4
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	56,3	-	-	72,5	-	-	-	52,5
Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	24,3	-	-	36,2	-	-	-	0,9
Asse IV - Leader	1,6	-	-	3,2	-	-	-	0,9
Assistenza Tecnica	19,3	-	-	25,4	-	-	-	0,3

PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	Dotazione Finanziaria	Contributo Comunitario	Cofinanziamento Statale	Cofinanziamento Regionale
	Dotazione Finanziaria - Valori in Euro			
FEP	15.180.664	7.590.332	6.072.266	1.518.066
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	3.168.924	1.584.462	1.267.569	316.892
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	4.150.618	2.075.309	1.660.247	415.062
Asse III - Misure di interesse comune	4.835.196	2.417.598	1.934.078	483.520
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	2.730.652	1.365.326	1.092.261	273.065
Asse V - Assistenza Tecnica	295.274	47.637	118.110	29.527
	Composizione percentuale per Origine della Contribuzione			
FEP	100,0	50,0	40,0	10,0
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	100,0	50,0	40,0	10,0
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	100,0	50,0	40,0	10,0
Asse III - Misure di interesse comune	100,0	50,0	40,0	10,0
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	100,0	50,0	40,0	10,0
Asse V - Assistenza Tecnica	100,0	16,1	40,0	10,0
	Composizione percentuale per Asse			
FEP	100,0	100,0	100,0	100,0
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	20,9	20,9	20,9	20,9
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	27,3	27,3	27,3	27,3
Asse III - Misure di interesse comune	31,9	31,9	31,9	31,9
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	18,0	18,0	18,0	18,0
Asse V - Assistenza Tecnica	1,9	0,6	1,9	1,9

segue PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	30.09.12	31.12.12	28.02.13	30.09.2013	31.12.13	31.05.14	31.10.14	31.12.14
Spesa Programmata (delibere e avvisi)											
PO FEP	15.894.892	15.894.892	15.894.892	15.894.892	15.894.892	15.894.892	15.894.892	15.180.664	913.700	2.281.250	3.054.424
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	3.522.570	3.522.570	3.522.570	3.522.570	3.522.570	3.522.570	3.522.570	3.168.924	162.000	422.000	570.424
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	4.150.618	4.150.618	4.150.618	4.150.618	4.150.618	4.150.618	4.150.618	4.150.618	751.700	1.154.250	1.177.850
Asse III - Misure di interesse comune	4.981.982	4.981.982	4.981.982	4.981.982	4.981.982	4.981.982	4.981.982	4.835.196	-	300.000	601.150
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	2.883.866	2.883.866	2.883.866	2.883.866	2.883.866	2.883.866	2.883.866	2.730.652	-	400.000	700.000
Asse V - Assistenza Tecnica	355.856	355.856	355.856	355.856	355.856	355.856	355.856	295.274	-	5.000	5.000
Impegni Caricati sul Sistema di Monitoraggio											
PO FEP	2.511.745	2.552.657	3.898.848	3.898.848	2.535.939	2.535.939	7.683.328	8.009.044			
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	620.177	864.446			
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	2.431.766	2.472.678	2.432.845	2.432.845	2.432.845	2.432.845	3.036.333	3.117.780			
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	1.191.619	1.191.619			
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	1.363.706	1.363.706	-	-	2.730.652	2.730.651			
Asse V - Assistenza Tecnica	79.979	79.979	102.297	102.297	103.094	103.094	104.548	104.548			
Pagamenti Caricati sul Sistema di Monitoraggio											
PO FEP	377.712	516.138	752.229	752.229	748.194	748.194	1.240.779	1.838.262			
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	101.873	107.873			
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	303.837	442.264	649.931	649.931	645.099	770.099	1.034.358	1.625.841			
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	-	-			
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-	-	-	-	-	-			
Asse V - Assistenza Tecnica	73.874	73.874	102.297	102.297	103.094	103.094	104.548	104.548			

segue PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.10.12	31.12.12	28.02.13	31.05.13	30.09.2013	31.12.13	31.05.14	31.10.14	31.12.14
	Spesa Certificata								
PO FEP	6.000	710.304	710.304		710.304	1.811.940			
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-		-	107.873			
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	-	645.099	645.099		645.099	1.625.841			
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-		-	-			
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-		-	-			
Asse V - Assistenza Tecnica	6.000	65.205	65.205		65.205	78.226			
	Previsioni di Spesa								
PO FEP				455.000		3.320.000	2.725.640	4.116.790	4.866.364
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria				100.000		1.000.000	269.873	529.873	678.297
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura				250.000		2.200.000	2.377.541	2.780.091	2.803.691
Asse III - Misure di interesse comune				-		-	-	300.000	601.150
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca				-		-	-	400.000	700.000
Asse V - Assistenza Tecnica				105.000		120.000	78.226	83.226	83.226
	Target								
PO FEP						3.320.000			7.800.000
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria						1.000.000			-
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura						2.200.000			-
Asse III - Misure di interesse comune						-			-
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca						-			-
Asse V - Assistenza Tecnica						120.000			-

segue PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	30.09.12	31.12.12	28.02.13	31.05.13	30.09.2013	31.12.13	31.05.14	31.10.14	31.12.14
	Differenza tra Previsioni di Spesa e Target											
PO FEP	-	-	-	-	-	-	455.000	-	-	-	-	-2.933.636
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asse V - Assistenza Tecnica	-	-	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-
	Percentuale dei Pagamenti sugli Impegni											
PO FEP	15,0	20,2	19,3	19,3	29,5	29,5		16,1	23,0			
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-		16,4	12,5			
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	12,5	17,9	26,7	26,7	26,5	31,7		34,1	52,1			
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-		0,0	0,0			
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-	-	-	-		0,0	0,0			
Asse V - Assistenza Tecnica	92,4	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			
	Percentuale della Spesa Certificata sulla Spesa Programmata											
PO FEP					4,5	4,5		4,5	11,9			
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria					0,0	0,0		0,0	3,4			
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura					15,5	15,5		15,5	39,2			
Asse III - Misure di interesse comune					0,0	0,0		0,0	0,0			
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca					0,0	0,0		0,0	0,0			
Asse V - Assistenza Tecnica					18,3	18,3		18,3	26,5			

segue PO FEP 2007-2013 (O.I. Sardegna) - Indicatori strutturali e di efficienza

Asse	31.12.11	29.02.12	31.05.12	30.09.12	31.10.12	31.12.12	28.02.13	30.09.2013	31.12.13
Percentuale degli Impegni sulla Dotazione Iniziale									
PO FEP	15,8	16,1	24,5	24,5	-	16	16	45,3	52,8
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	17,6	5,7
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	58,6	59,6	58,6	58,6	-	58,6	58,6	73,2	20,5
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	-	24,6	7,8
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	47,3	47,3	-	-	-	100,0	18,0
Asse V - Assistenza Tecnica	22,5	22,5	28,7	28,7	-	29	29	29,4	0,7
Percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Iniziale									
PO FEP	2,4	3,2	4,7	4,7	-	4,7	4,7	8,0	12,1
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	2,9	0,7
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	7,3	10,7	15,7	15,7	-	15,5	18,6	24,9	10,7
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Asse V - Assistenza Tecnica	20,8	20,8	28,7	28,7	-	29	29	29,4	0,7
Percentuale di Spesa Certificata sulla Dotazione Iniziale									
PO FEP	-	-	-	-	0,04	4,5	4,5	4,6	21,9
Asse I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	0,0	6,6
Asse II - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	-	-	-	-	-	15,5	15,5	15,5	14,5
Asse III - Misure di interesse comune	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Asse V - Assistenza Tecnica	-	-	-	-	1,7	18,3	18,3	18,3	0,8

